

PMP项目管理

《第2章 项目运行环境》



本章框架



项目运行环境

影响项目的要素

项目的合规性

事业环境因素VS组织过程资产

组织系统

组织结构类型

矩阵型VS项目型VS职能型

项目治理

管理要素

项目有关的职能

项目管理办公室PMO

支持VS控制VS指令

组织级项目管理

项目集VS项目组合

价值交付系统

创造价值

交付组件



影响项目的因素



影响项目的因素



项目合规性

合规性：什么程度的过程严格性和质量保证是合适的？

管家（项目经理）需**遵守**其组织内外得到适当授权的法律、规则、法规和要求。

但高绩效项目会寻求通过各种方法将合规性更充分地融入项目文化，从而与可能相互冲突的各种准则更好地**保持一致性**。管家需努力遵守旨在**保护**他们及其组织、干系人和广大公众的准则。


如果管家在行动或计划是否符合既定准则方面遇到了相互冲突的准则或问题，他们需要**寻求**适当的**建议和指导**。



影响项目的因素




项目影响两大因素

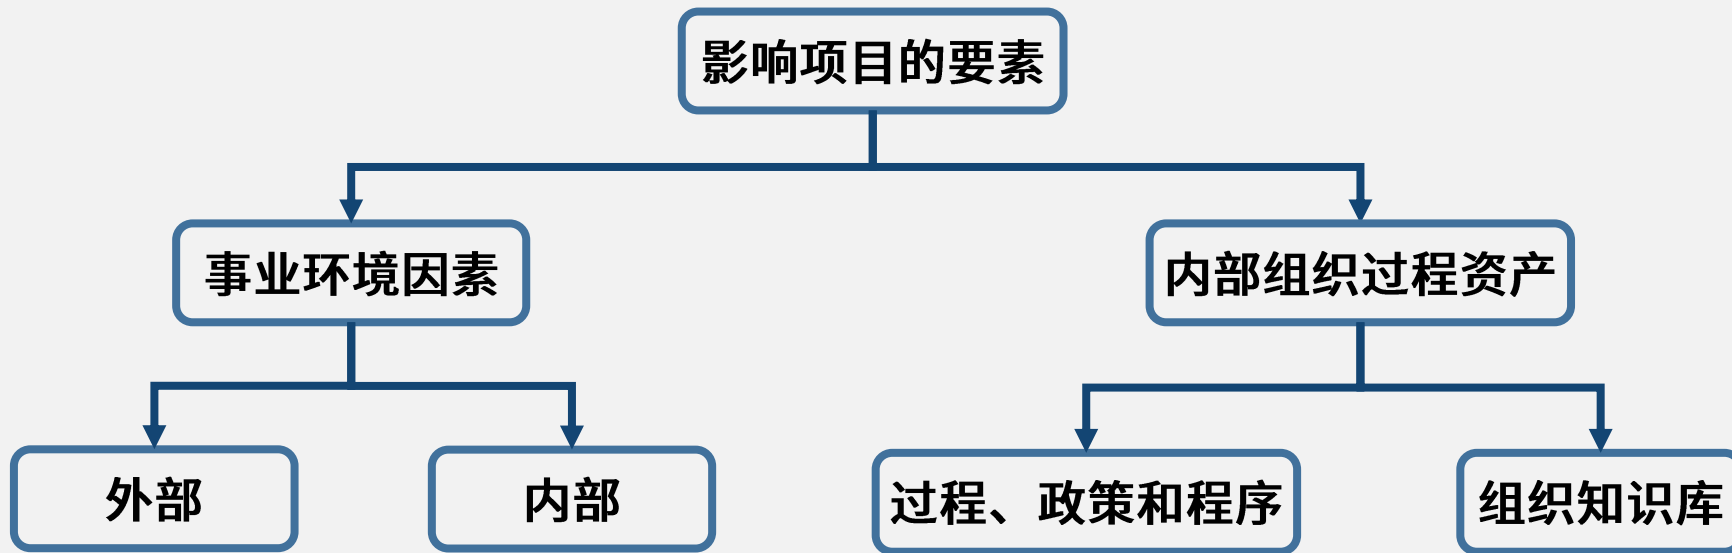

事业环境因素源于**项目外部**（往往是**企业外部**）的环境，组织过程资产源于**企业内部**，可能来自企业自身、项目组合、项目集、其他项目或这些的组合。



影响项目的因素

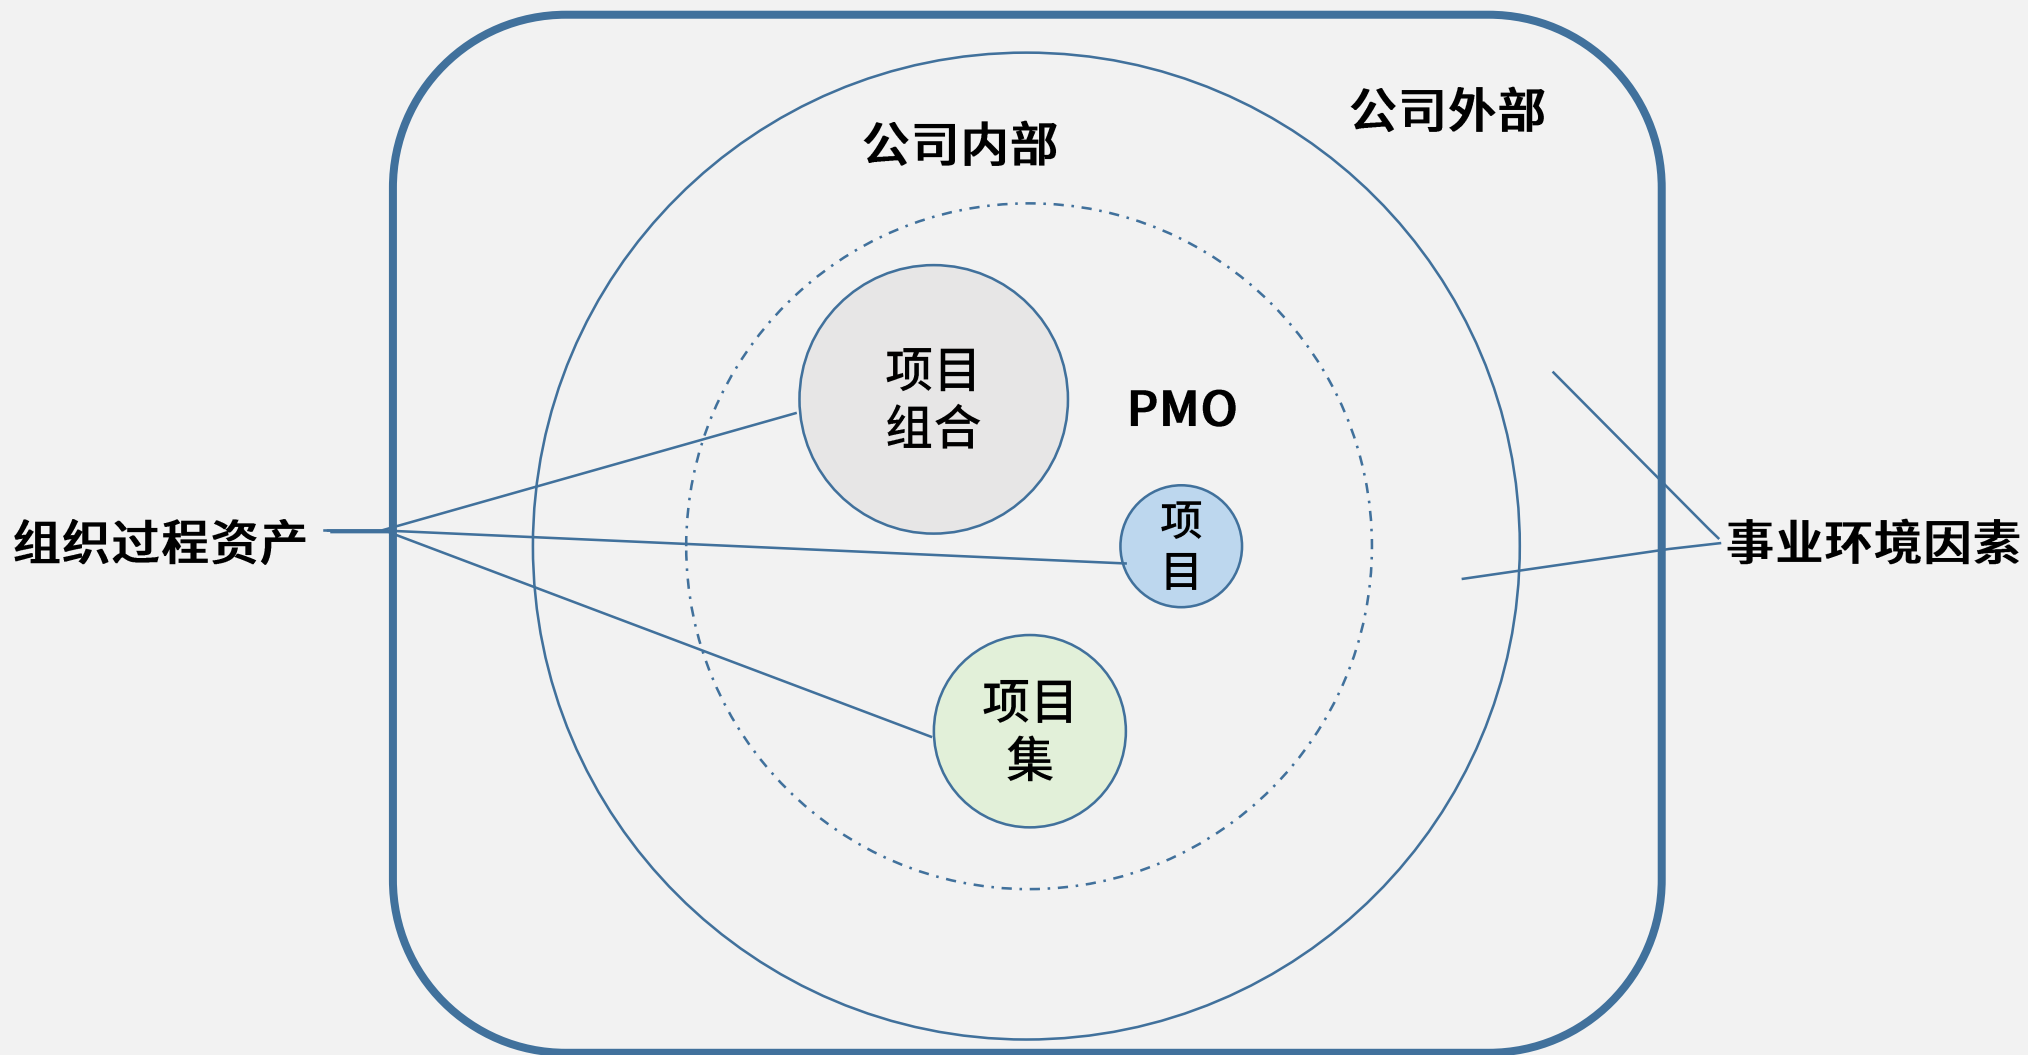



影响项目的因素



事业环境因素		组织过程资产	
外部	内部	过程、政策和程序	组织知识库
社会和文化影响与问题	组织文化、结构和治理	启动程序流程	配置管理知识库
市场条件	设施和资源的地理分布	规划程序流程	财务数据库
物理环境要素	基础设施	执行程序流程	历史信息与经验教训知识库
商业数据库	信息技术软件	监控程序流程	问题与缺陷管理数据库
政府或行业标准 学术研究	资源可用性	收尾程序流程	测量指标数据库
财务考虑因素	员工能力		以往的项目的项目档案
公司外部	公司层面，项目外部	PMO或职能部门	项目信息更新



影响项目的因素



事业环境因素	组织过程资产
客观存在	可累加的
可能有 帮助 或者障碍	对未来 有帮助 的
项目经理 必须 遵守	项目经理 可选择 使用



影响项目的因素



目前项目章程的草案正在起草过程中，目前企业的组织结构正在进行剧烈地调整。为了满足业务要求，公司高层领导决定将职能型的组织结构调整为矩阵型的组织结构。这属于什么影响项目章程制定的输入？

- A.事业环境因素
- B.组织过程资产
- C.假设日志
- D.商业论证



影响项目的因素



区分两大因素

目前项目章程的草案正在起草过程中，目前企业的组织结构正在进行剧烈地调整。
为了满足业务要求，公司高层领导决定将职能型的组织结构调整为矩阵型的组织结构。这属于什么影响项目章程制定的输入？

- A.事业环境因素
- B.组织过程资产
- C.假设日志
- D.商业论证



影响项目的因素



某公司希望将软件项目的默认参数配置存储在计算机数据库中，以方便后续项目做参考，这家公司在更新什么？

- A.项目管理信息系统
- B.组织过程资产
- C.事业环境因素
- D.商业数据库



影响项目的因素



区分两大因素

某公司希望将软件项目的默认参数配置存储在计算机数据库中，以方便后续项目做参考，这家公司在更新什么？

A.项目管理信息系统

B.组织过程资产

C.事业环境因素


D.商业数据库



组织系统



组织系统

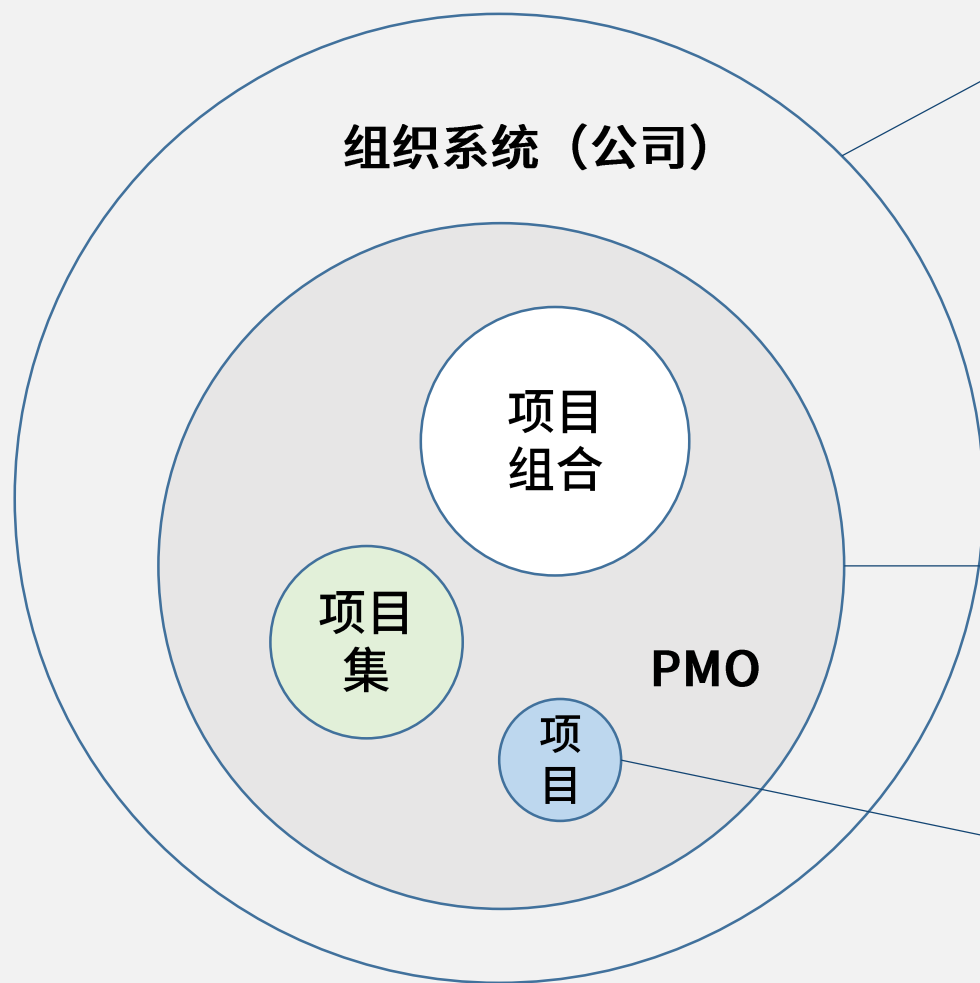

组织系统

单个组织内多种因素的交互影响创造出一个独特的系统，会对在该系统内运行的项目造成影响。其因素包括：

◆ 组织结构类型

◆ 治理框架

◆ 管理要素

项目管理办公室 (PMO)

对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织结构。

项目


运行项目时需要应对组织结构和治理框架带来的制约。




组织系统



组织结构类型

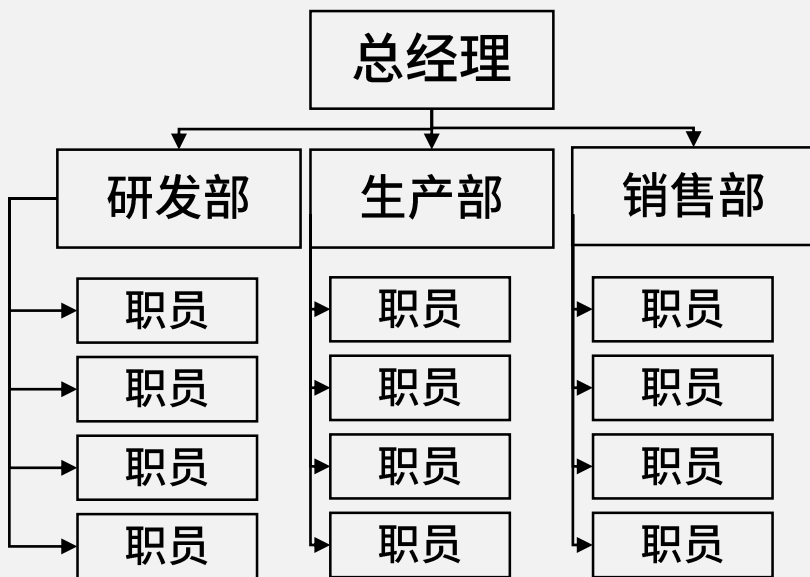

职能型

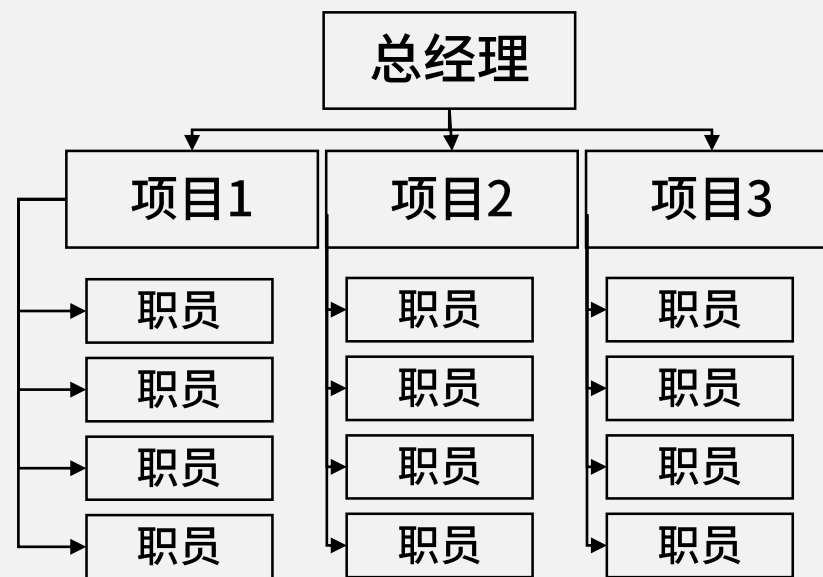


项目型




组织系统




组织结构类型

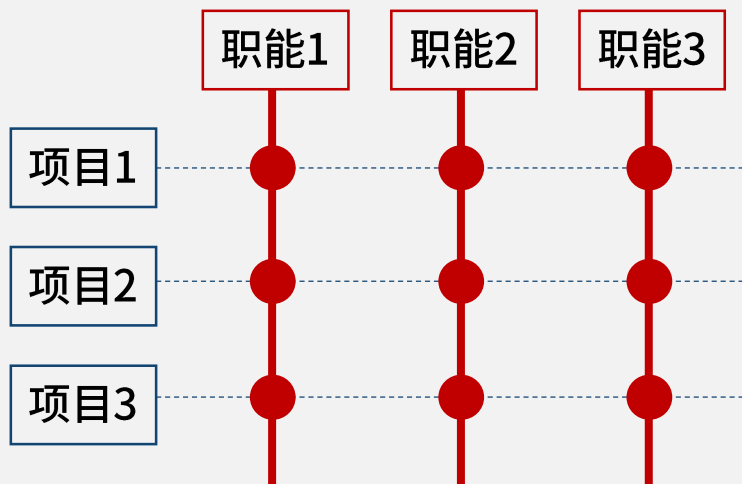

矩阵—弱

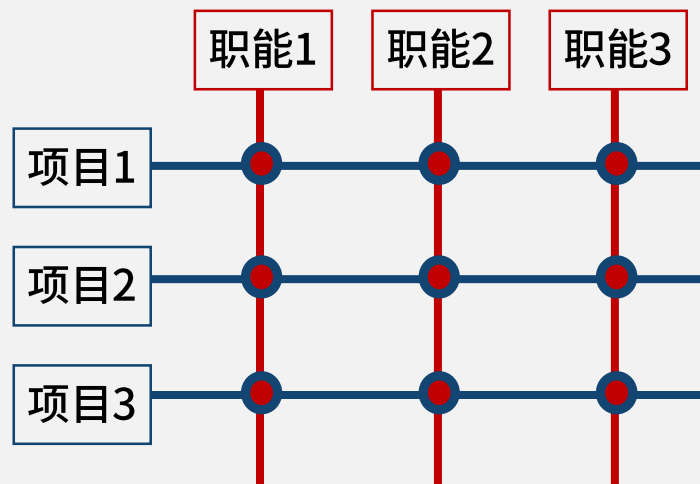

矩阵—平衡

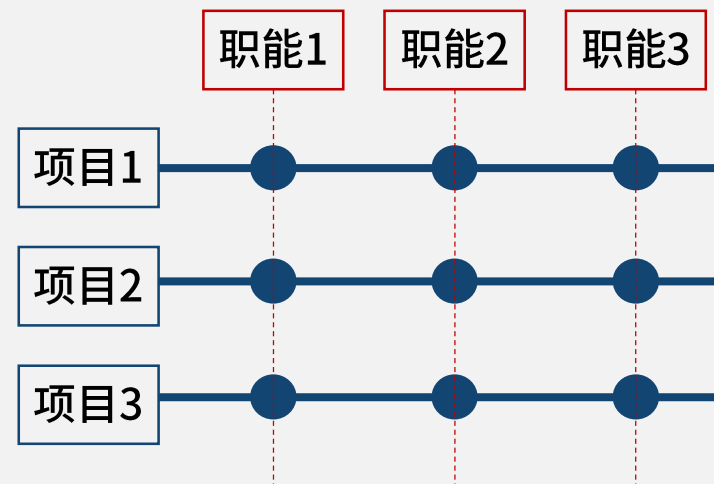

矩阵—强



组织系统



组织结构类型

组织结构类型	预算管理人	工作安排人	项目经理的角色	资源可用性
职能（集中式）	职能经理	职能	几乎无	极少或无
矩阵—弱	职能经理	职能	协调员	低
矩阵—平衡	混合	职能	兼职	低到中
矩阵—强	项目经理	项目经理（职能）	全职	中到高
项目导向	项目经理	项目	全职	高到几乎全部

注：考试中不明确说明，默认使用平衡矩阵



组织系统



项目经理带领团队正在进行一个质改项目，项目经理和职能经理对资源有着一定调配权。完成一个阶段的任务后，对于后续工作任务的取舍，职能经理具有最终决定权。这描述的是哪种组织类型？

- A.弱矩阵
- B.强矩阵
- C.平衡型矩阵
- D.职能型



组织系统



组织结构类型

项目经理带领团队正在进行一个质改项目，项目经理和职能经理对资源有着一定调配权。完成一个阶段的任务后，对于后续工作任务的取舍，**职能经理具有最终决定权**。这描述的是哪种组织类型？

- A.弱矩阵
- B.强矩阵
- C.平衡型矩阵
- D.职能型



组织系统



治理框架

治理指组织**各个层面**的有组织的或有结构的**安排**，旨在确定和影响组织成员的行为。包括规则、政策、程序、规范、关系、系统等。

项目治理是指用于**指导项目管理**活动的框架、功能和过程。

治理系统提供了一个框架，其中**包含指导活动的职能和流程**，治理框架包括但不限于：


- 监督
- 价值评估
- 决策能力
- 控制
- 各组件之间的整合



组织系统



管理要素（职能）

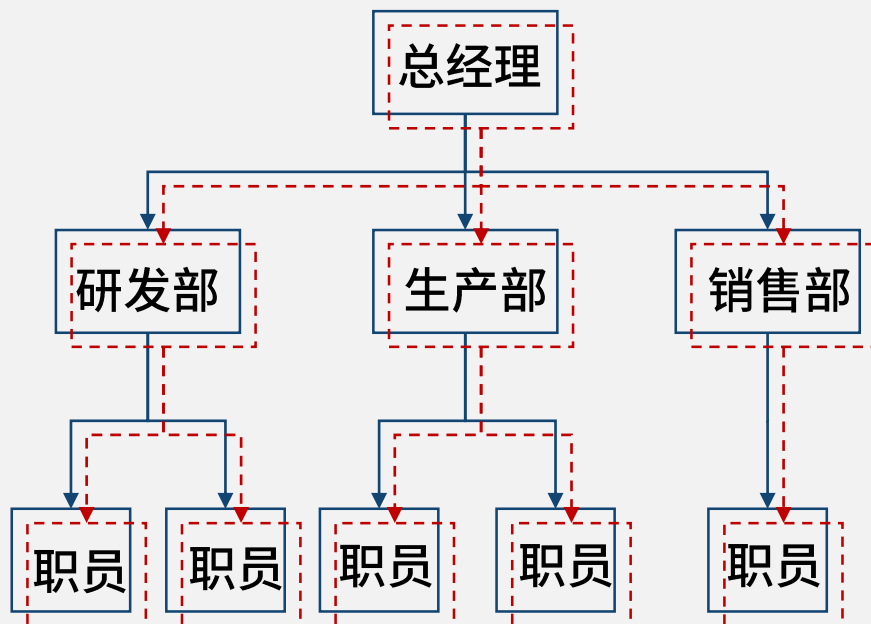

组织根据其选择的**治理框架**和**组织结构类型**分配一般管理要素（即管理职能）。分配到各个层级的**职责、终责和职权**表明了各个层级的员工在组织结构**内执行**上述职能的方式。



组织系统



管理要素（职能）

项目交付是由人驱动的，与项目有关的职能由人履行，可由一个人履行也可以由一组人履行

右边是一些项目中常见职能及其责任人的示例，除开这些职能外往往还可能还需要一些其他职能以实现目标成果



提供监督协调（领导）

提供目标和反馈（客户）

引导和支持（敏捷教练）

开展工作并贡献洞察（团队）

运用专业知识（主题专家）

提供业务方向和洞察（商业分析师）

提供资源和方向（发起人、倡导者）


维持治理（高层领导）



组织系统



项目管理办公室（PMO）

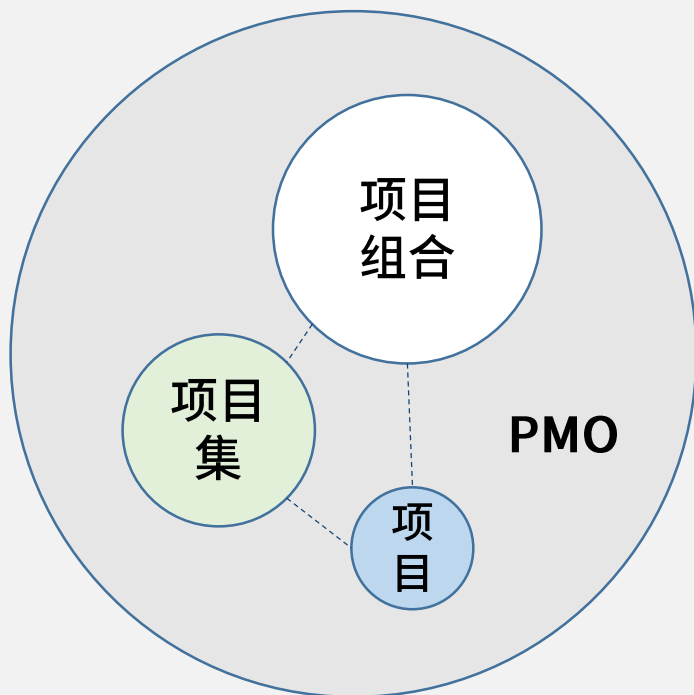

项目管理办公室（Project Management Office, PMO）对与项目相关的治理过程进行**标准化**，并促进资源、方法论、工具和技术共享的一个组织结构。PMO 有几种不同类型：

- **支持型**：担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践，以及来自其他项目的信息和经验教训。（[资源库](#)）
- **控制型**：不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从。（控制程度中等）
- **指令型**：直接管理和控制项目。项目经理由 PMO 指定并向其报告。（控制程度高）



组织系统



项目管理办公室（PMO）

PMO 的一个主要职能是通过各种方式向项目经理提供支持：

- 对 PMO 所辖的全部项目的**共享资源**进行管理；
- 识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；
- **指导、辅导、培训**和监督；
- 通过项目审计，监督对项目管理标准、政策、程序和模板的遵守程度；
- 制定和管理项目政策、程序、模板和其他共享的文件（组织过程资产）；
- 对跨项目的沟通进行**协调**。



组织系统



项目经理被任命管理一个复杂的软件开发项目，并且该项目的规模是在不断增加的。因为项目经理之前的项目都是一些非常简单的软件项目，所以该项目进入执行阶段时就面临了一系列挑战。在一次相关方会议中，职能经理表示自己刚刚参与过本公司的一项较为复杂的软件开发项目。项目经理应该怎么做？

- A.分析项目范围扩大是否会给项目带来影响
- B.与职能经理沟通并吸取相关经验
- C.从PMO处获取历史记录及指导原则
- D.与相关方一起讨论解决方案



组织系统



项目管理办公室（PMO）

项目经理被任命管理一个复杂的软件开发项目，并且该项目的规模是在不断增加的。因为项目经理之前的项目都是一些非常简单的软件项目，所以该项目进入执行阶段时就**面临了一系列挑战**。在一次相关方会议中，**职能经理**表示自己刚刚**参与过**本公司的一项较为复杂的软件开发项目。项目经理应该怎么做？

- A. 分析项目范围扩大是否会给项目带来影响
- B. **与职能经理沟通并吸取相关经验**
- C. **从PMO处获取历史记录及指导原则**
- D. 与相关方一起讨论解决方案

虽然生活中可能会选B去执行
考试考察理想状态，分工明确



组织系统



大型软件交付项目的项目经理正在最终确定项目治理，项目经理希望实施与组织项目管理办公室 (PMO) 要求的多项政策不相符的程序。项目经理认为，由于技术的独特性，项目治理中概述的程序对于这个特定项目是必要的。项目经理应该做什么？

- A. 让利益相关方参与修改 PMO 概述的政策
- B. 与 PMO 讨论提议的变更
- C. 忽略初始程序并遵循 PMO 概述的政策
- D. 推进项目治理并通知 PMO



组织系统



大型软件交付项目的项目经理正在最终确定项目治理，项目经理**希望实施**与组织项目管理办公室 (PMO) 要求的多项政策**不相符的程序**。项目经理认为，由于技术的独特性，项目治理中概述的程序对于这个特定项目是必要的。项目经理应该做什么？

- A. 让利益相关方参与修改 PMO 概述的政策
- B. 与 PMO 讨论提议的变更**
- C. 忽略初始程序并遵循 PMO 概述的政策
- D. 推进项目治理并通知 PMO

PM切勿自作主张

涉及大的流程改动，需请示沟通



组织级项目管理（OPM）




组织级项目管理 (OPM)



组织战略



项目组合示例

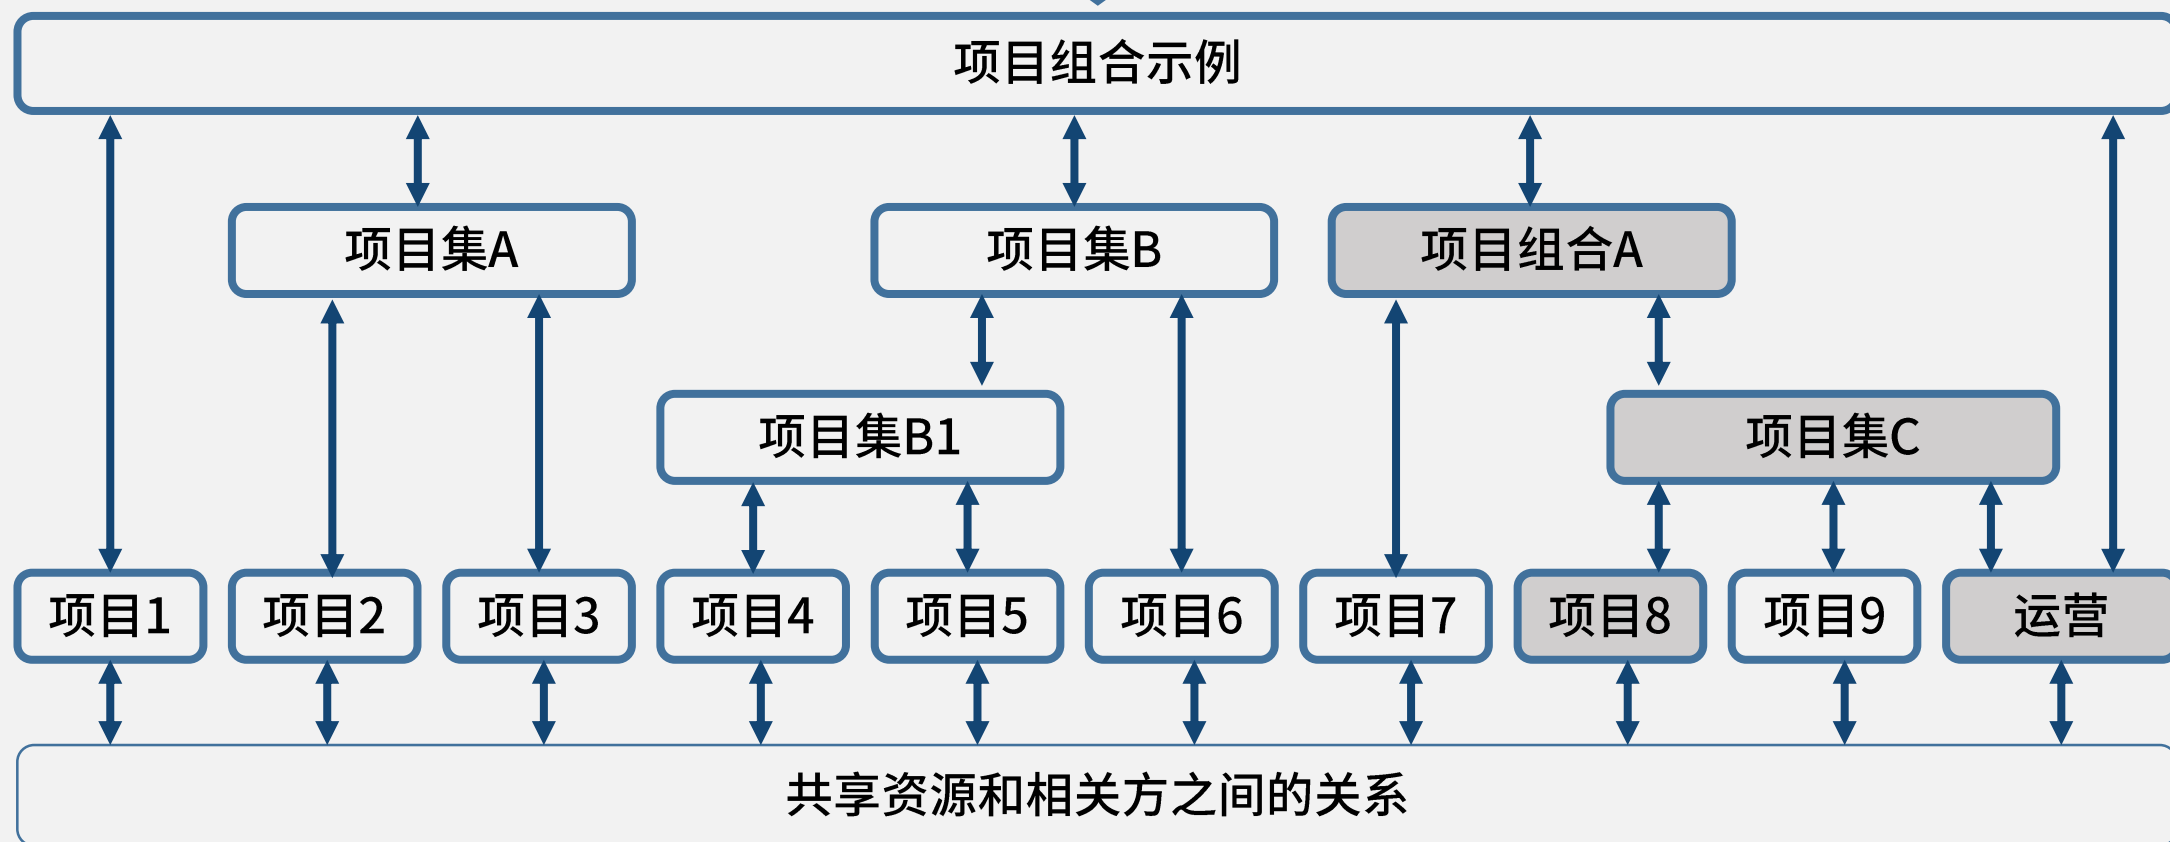




组织级项目管理 (OPM)



项目、项目集与项目组合

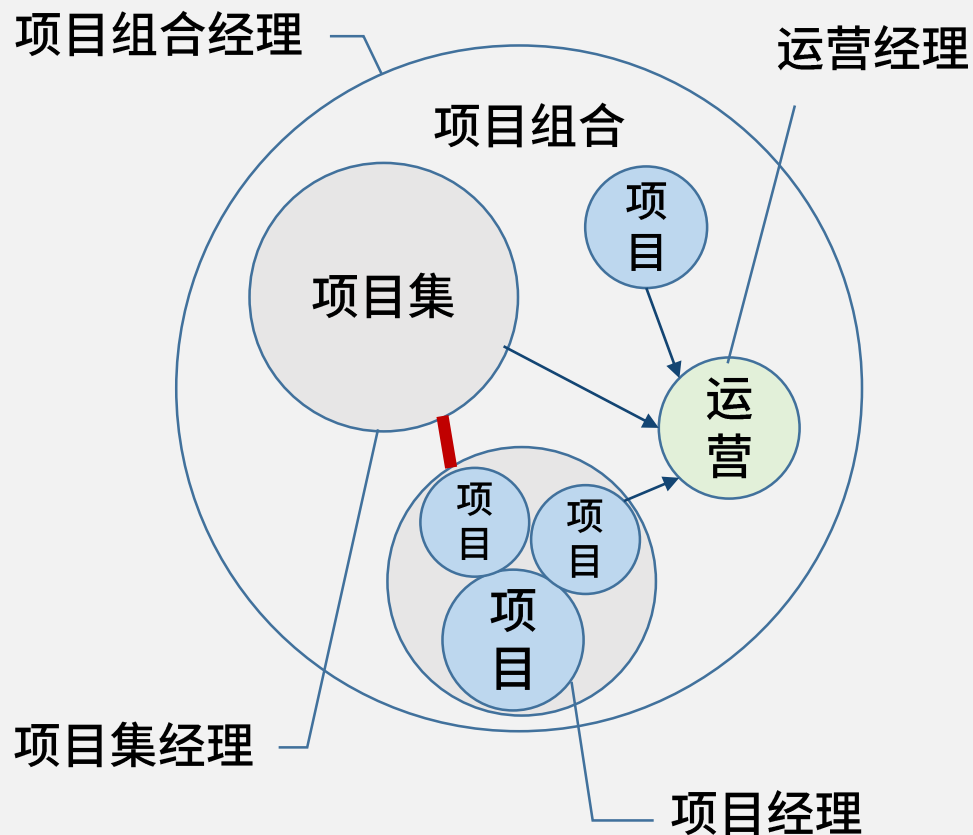

项目管理

注重项目**本身**的**相互依赖**关系，以确定管理项目的最佳方法。

项目集管理

注重作为组成部分的项目与项目集**之间的依赖**关系，以确定管理这些项目的最佳方法。

项目组合管理


是指为了实现**战略目标**的集中管理。项目组合中的项目集或项目**不一定彼此依赖**或直接相关。在开展组织和项目组合规划时，要基于风险、资金和其他考虑因素对**项目组合组件排列优先级**。



组织级项目管理 (OPM)



项目、项目集与项目组合

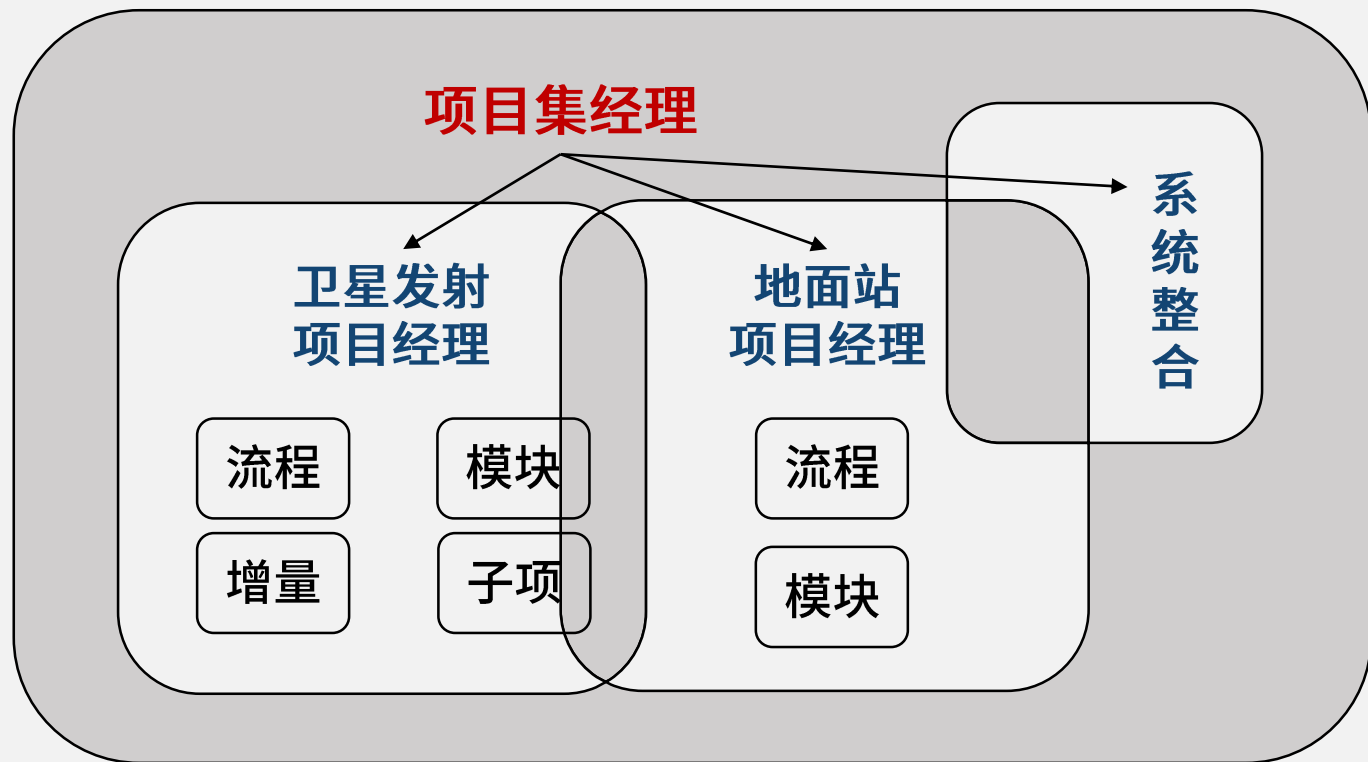

$$1+1>2$$

项目集是经过**协调**管理以便获得单独管理这些项目时无法取得的收益和控制的一组相关联的项目。

项目集经理**并不对项目**进行管理，而是**对项目之间的集成或冲突工作**进行协调。项目集经理的管理对象是项目经理。

集成：如督办手续，买材料；


冲突：如同时要使用一条路。



组织级项目管理 (OPM)



项目、项目集与项目组合

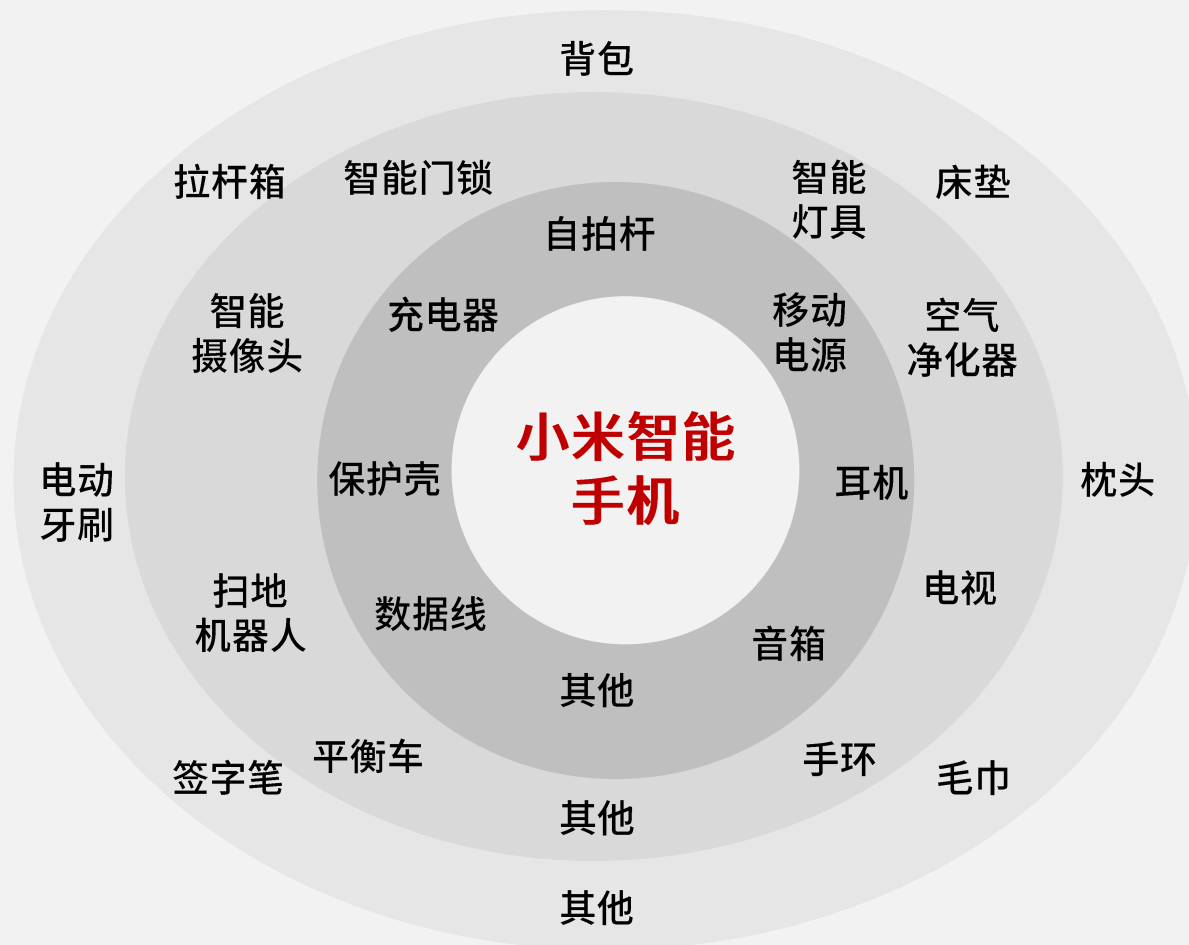

项目组合中的项目集或项目**不一定彼此依赖**或直接相关。在开展组织和项目组合规划时，要基于风险、资金和其他考虑因素对**项目组合组件排列优先级**。

项目组合管理的目标是确保组织在**“做正确的事”**，而不侧重如何**“正确地做事”**。



组织级项目管理（OPM）



项目、项目集与项目组合

级别	核心	管理者对象	管理内容	成果标准	关注
项目	执行	项目团队成员	项目之 内	项目基准	正确地做事
项目集	集成	项目经理及项目集	项目之 间 依赖关系	需求收益	正确地做事
项目组合	选择	项目组合管理人员	项目之间 不一定依赖	战略效益	做正确的事



组织级项目管理（OPM）



A公司有三个项目准备启动，项目1，2和3都是为了实现同一个战略目标而开展的，公司正在对这三个项目进行优先级排序。这是在执行什么活动？

- A.运营管理
- B.项目组合管理
- C.项目启动
- D.项目集管理



组织级项目管理 (OPM)



项目、项目集与项目组合

A公司有三个项目准备启动，项目1，2和3都是为了实现同一个战略目标而开展的，公司正在对这三个项目进行**优先级排序**。这是在执行什么活动？

A.运营管理

B.项目组合管理

C.项目启动

D.项目集管理




组织级项目管理 (OPM)



组织级项目管理 (OPM)

越位思考，本位操作

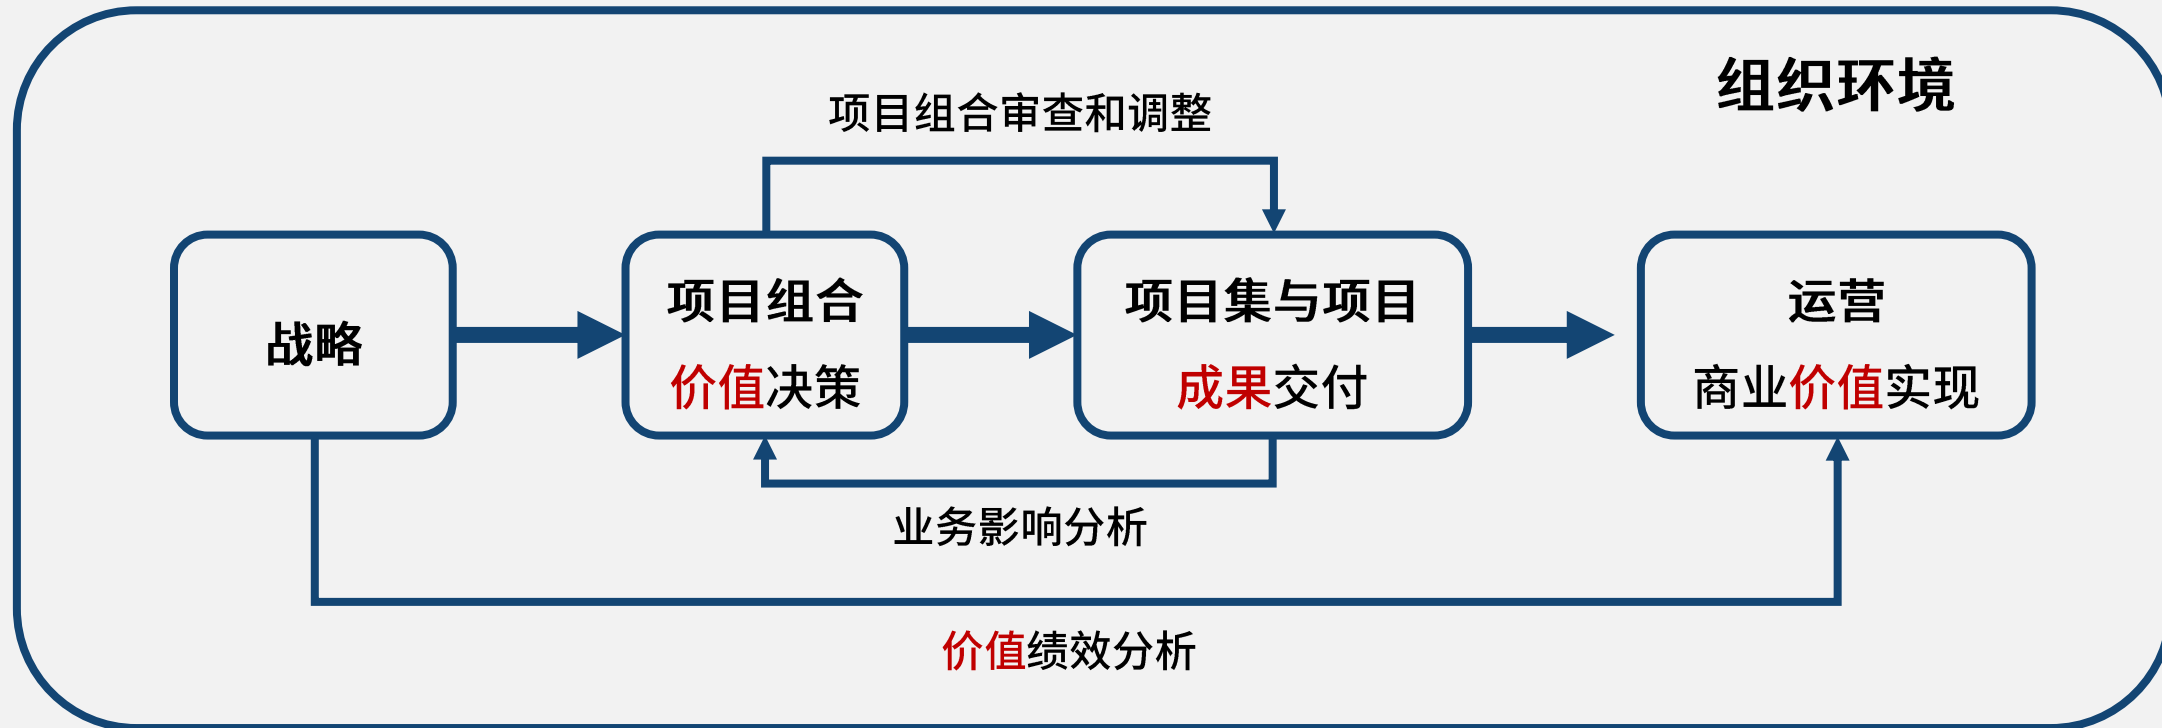

OPM 指为实现**战略目标**而整合项目组合、项目集和项目管理与组织驱动因素的**框架**。



价值交付系统



创造价值



组织为干系人创造价值，项目创造价值的方式示例包括（但不限于）：

- 创造**满足客户**或最终客户需要的新产品、服务或成果
- **提高效率**、生产力、效果或响应能力
- **维持**以前的项目集、项目或业务运营所带来的收益
- 做出积极的**社会或环境**贡献
- 推动必要的变革，以促进**组织**向期望的未来状态过渡


可以单独或共同使用多种**组件**（例如项目组合、项目集、项目、产品和运营）以创造价值。



价值交付系统



这些组件（项目组合、项目集、项目、产品和运营）共同组成了一个符合组织战略的价值交付系统。

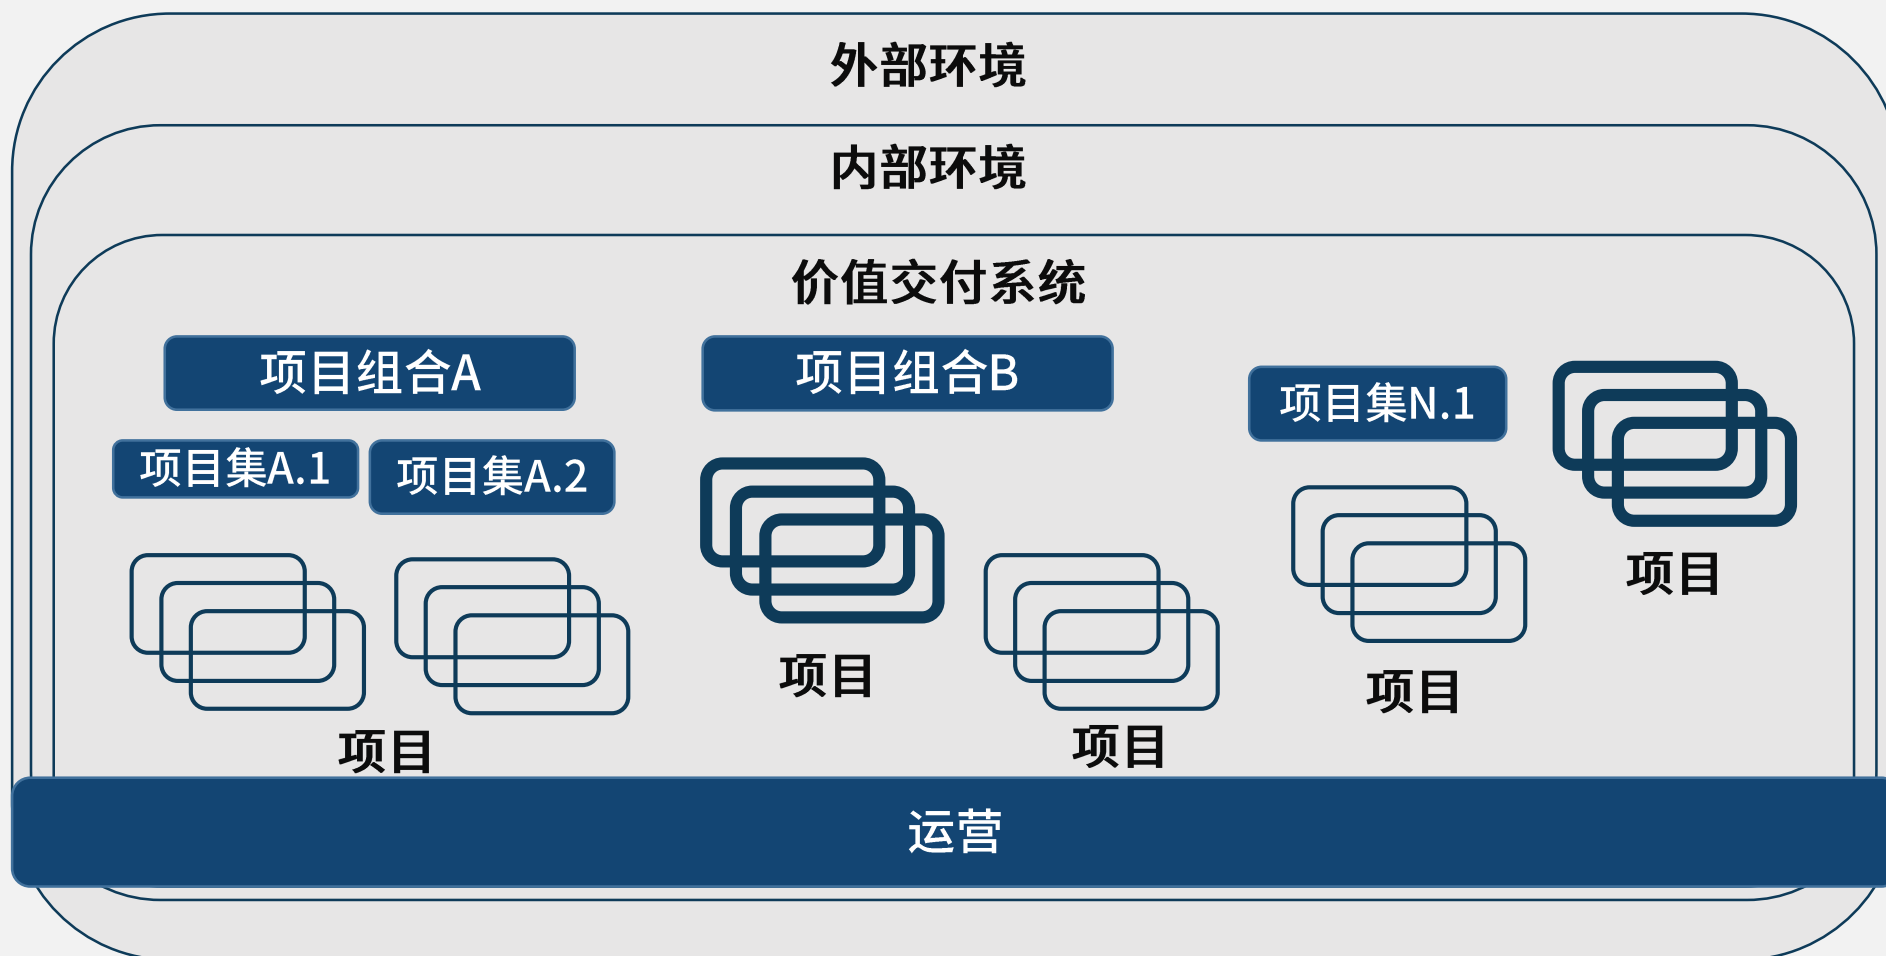



本章小结



项目运行环境

影响项目的要素

- 项目的合规性 必须遵守，合规问题优先找合规团队/专家/部门等
- 事业环境因素（不可控） 客观存在的、必须遵守的、有利有弊
- 组织过程资产（可控） 主观累加的、可选择使用、对未来有帮助

组织系统

- 组织结构类型 矩阵型VS项目型VS职能型 默认是平衡矩阵
- 项目治理 用于指导项目管理活动的框架、功能和过程
- 项目有关的职能 提供监督协调、提供目标和反馈、引导和支持等
- 项目管理办公室PMO 支持VS控制VS指令 默认支持型，资源库


组织级项目管理

- 项目（正确地做事） 按基准执行单个项目
- 项目集（正确地做事） 侧重项目间的依赖关系
- 项目组合（做正确的事） 为实现战略目标进行优先级排序

价值交付系统

- 创造价值
- 交付组件 例如项目组合、项目集、项目、产品和运营

► 拓展补充



(希赛) 感谢您的观看
