


PMP项目管理

《第03章 人-项目经理与团队》



人-框架

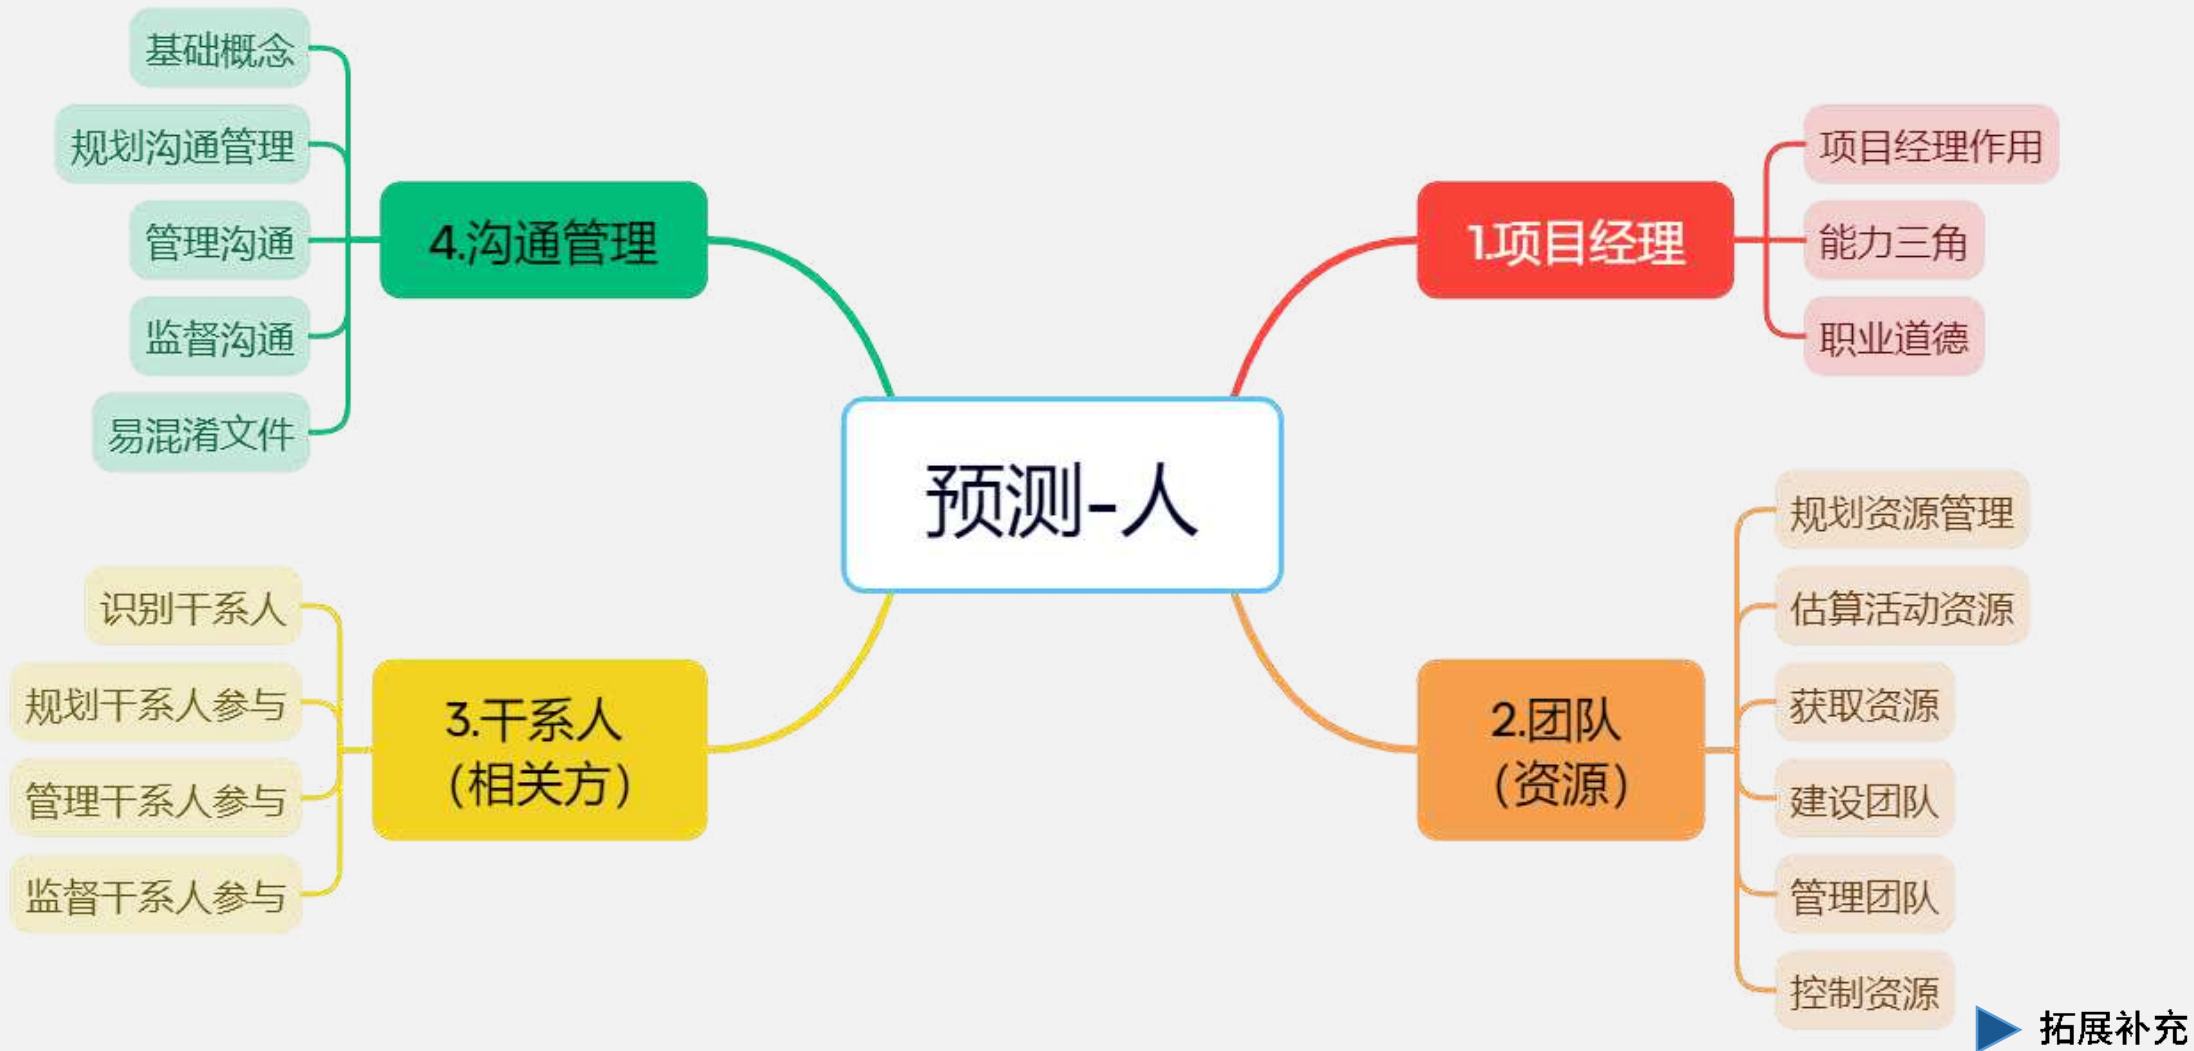



项目经理作用



项目经理的作用



角色与成员

大型团队中项目经理可能领导上百位成员，**各自有不同的**职责和技能；

在团队中的成员

对团队成果负责，需要从整体的角度来看待**团队产品**，以便进行规划、协调和完成；

知识和技能


无需承担项目中的每个角色，但应具备项目管理知识、技术知识、理解和经验。项目经理通过**沟通领导项目团队进行规划和协调**。



项目经理的作用



项目经理和职能经理的区别

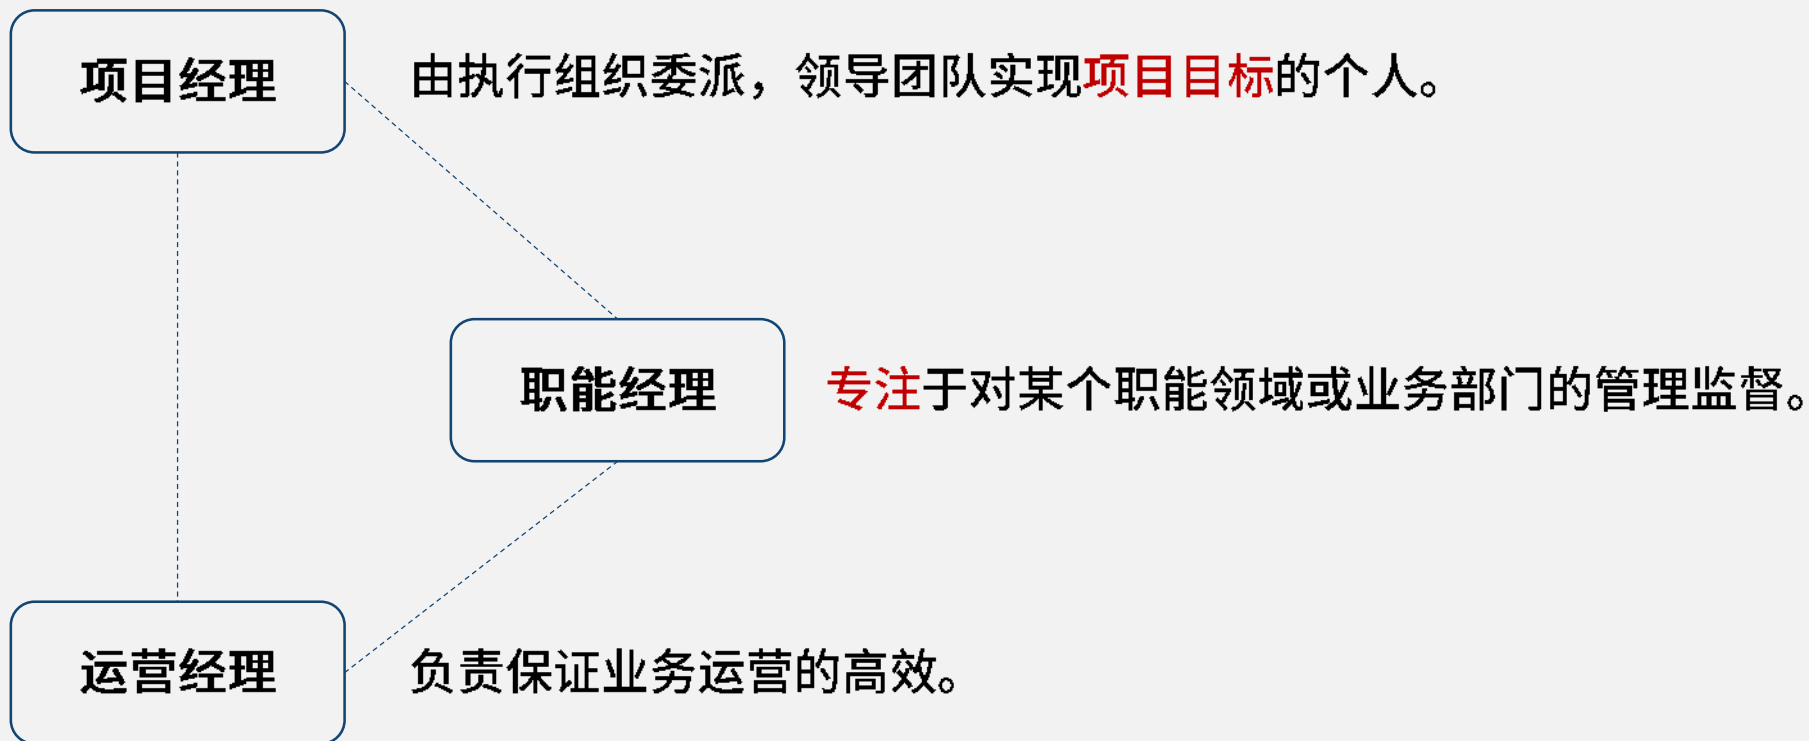




项目经理的作用



项目经理的能力三角

PMI人才三角©

- **技术项目管理**——与项目、项目集和项目组合管理特定领域相关的知识、技能和行为，即角色履行的技术方面。
- **领导力**——指导、激励和带领团队所需的知识、技能和行为，可帮助组织达成业务目标。
- **战略和商务管理**——纵览组织概括并有效协商和执行有利于战略调整 and 创新的决策和行动。

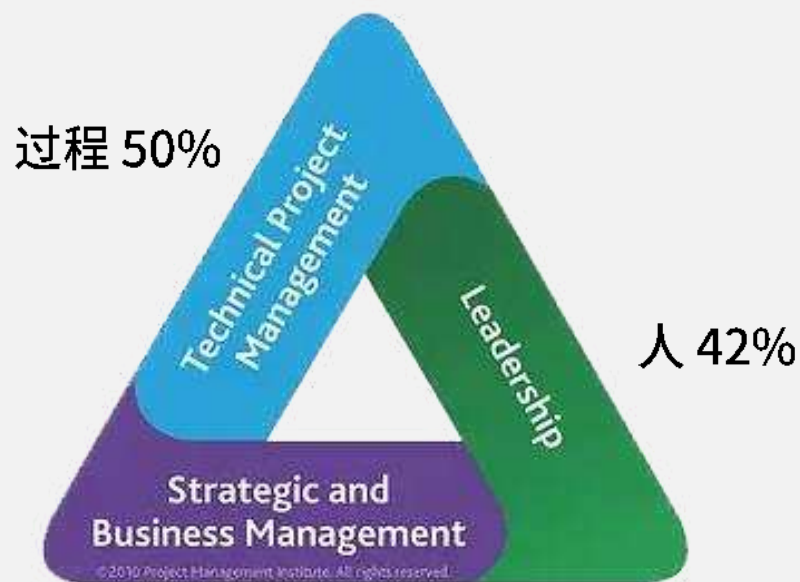

PMI's Talent Triangle



项目经理的作用



项目经理的职业道德

责任、尊重、公正、诚实

- 保持个人正直诚信；
- 解决利益冲突；
- 平衡相关方的利益；
- 尊重他人知识产权；
- 妥善解决文化敏感问题；
- 对项目管理行业作出贡献。

做一个圣人

为天地立心，
为生民立命，
为往圣继绝学，
为万世开太平。



项目经理的作用



项目经理考试必备

一、圣人视角

- 1、浩然正气，不与龌龊为伍，不畏强权，尽量往积极选项上靠
- 2、不偷工减料、甲乙双方共赢，大家好才是真的好，优选达成一致，达成共识
- 3、积极主动解决问题，不消极等待和坐以待毙
- 4、先内后外，分内事自己搞定，不轻易甩锅给领导
- 5、不抛弃不放弃，帮助团队成员成长
- 6、为团队定规矩、让大家都遵守规矩
- 7、遇到问题先分析、协商、沟通之后再行动

二、遥相呼应

题干问什么，答案就答什么。用理论答题，不用实践经验答题，考试是理想情形。
尊重题干背景，即使感觉不合理，也要基于题中场景进行判定，不臆造补充。



项目经理的作用



公司新签一项目合同表明，如果在交付日期之前完成，客户会给公司一笔可观的奖励。项目组为此而非常努力。在项目可交付成果快要全部完成时，一团队成员告诉你，有一项交付成果满足合同的要求，但是提供不了客户所需的功能。如果晚提交该项交付成果，将不能提前完成项目。你应该采取什么措施？

- A. 就这样递交交付成果
- B. 告诉客户情况是这样的，寻找一个双方都能接受的解决方法
- C. 开始由客户编写引起延误的列表以准备谈判
- D. 悄悄削减其他活动以为修复该交付成果节约时间



项目经理的作用



项目经理的职业道德

公司新签一项目合同表明，如果在交付日期之前完成，客户会给公司一笔可观的奖励。项目组为此而非常努力。在项目可交付成果快要全部完成时，一团队成员告诉你，有一项交付成果满足合同的要求，但是提供不了客户所需的功能。如果晚提交该项交付成果，将不能提前完成项目。你应该采取什么措施？

- A. 就这样递交交付成果
- B. 告诉客户情况是这样的，寻找一个双方都能接受的解决方法
- C. 开始由客户编写引起延误的列表以准备谈判
- D. 悄悄削减其他活动以为修复该交付成果节约时间

注意：职业道德这部分的考察方式，跟实情略有脱节，仅限于PMP考试。记住三个词：圣人、浩然正气，不与龌龊为伍



项目经理的作用



项目经理的技能

通过以下方式**管理关系和冲突**：

- 建立信任；
- 解决顾虑；
- **寻求共识**；
- 平衡相互竞争和对立的目标；
- 运用**说服、协商、妥协和解决冲突**的技能；
- 发展和培养个人及专业网络；
- 以长远的眼光来看待人际关系是与项目同样重要；
- 持续发展和运用政治敏锐性。

通过以下方式进行**沟通**：

- 花大量的时间沟通（研究显示，顶尖的项目经理投入约 90% 左右的时间在沟通上）；
- 管理期望；
- 诚恳地接受反馈；
- 提出建设性的反馈；
- 询问和倾听。



项目经理的作用



项目进行中，团队成员向项目经理抱怨说，项目经理和职能领导给的指令不一致，不知道该听谁的。项目经理该怎么做？

- A.与团队开会，澄清目标
- B.与职能领导对质并谴责职能领导
- C.与职能领导开会，澄清目标
- D.向职能领导及其团队分发更新的沟通管理计划



项目经理的作用



项目经理的技能

项目进行中，团队成员向项目经理抱怨说，项目经理和职能领导给的指令不一致，不知道该听谁的。项目经理该怎么做？

- A.与团队开会，澄清目标
- B.与职能领导对质并谴责职能领导
- C.与职能领导开会，澄清目标
- D.向职能领导及其团队分发更新的沟通管理计划



项目经理的作用



在项目的实施阶段，新任命的团队负责人与项目经理联系，以核实团队的任务和进度。由于团队负责人缺乏管理经验，团队工作并没有按计划进行，这可能会导致项目延误。项目经理应该做什么？

- A.为新任命的团队负责人提供指导
- B.要求人力资源总监任命一名高级团队负责人
- C.通知项目发起人可能的延误
- D.直接管理项目团队以避免项目延误



项目经理的作用



在项目的实施阶段，新任命的团队负责人与项目经理联系，以核实团队的任务和进度。由于团队负责人缺乏管理经验，团队工作并没有按计划进行，这可能会导致项目延误。项目经理应该做什么？

- A. 为新任命的团队负责人提供指导
- B. 要求人力资源总监任命一名高级团队负责人
- C. 通知项目发起人可能的延误
- D. 直接管理项目团队以避免项目延误



项目团队管理


资源管理



高绩效团队



高绩效团队的特征

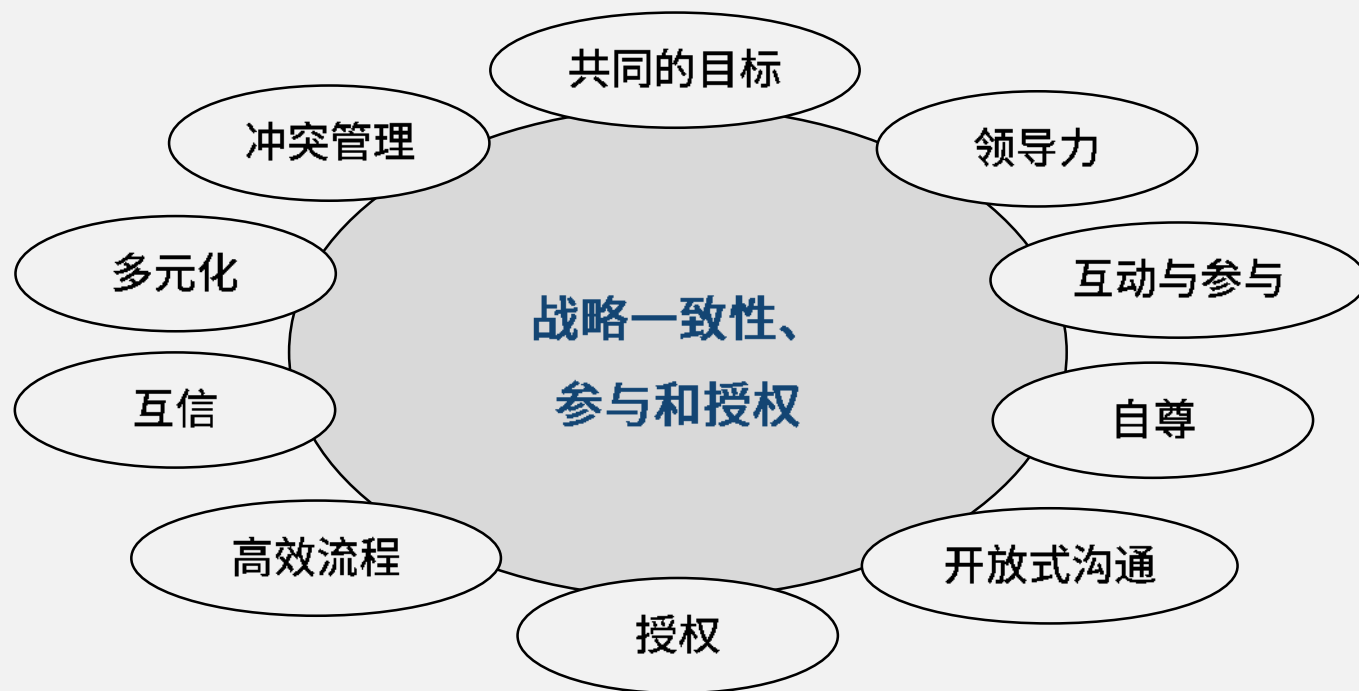



项目资源管理



没有特别说明的情况下，“资源”默认为“人力资源”，也就是团队成员。

项目资源管理

团队资源管理


指的是人力资源。

实物资源管理

包括设备、材料、设施和基础设施



项目资源管理

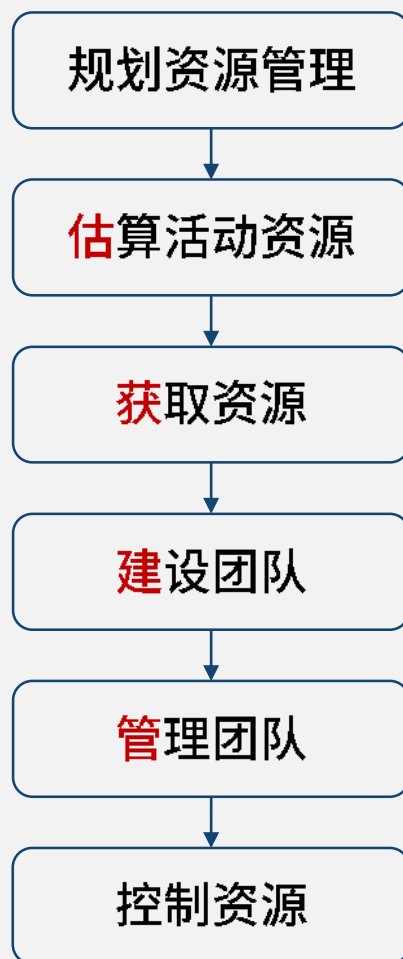



本章框架



人-团队

规划资源管理

层级型、责任分配矩阵、文本型

资源管理计划

团队章程

估算活动资源

资源日历和项目日历

获取资源

决策、预分派、谈判

建设团队

团队建设的五阶段（塔克曼阶梯理论）

集中办公和虚拟团队、激励、培训、情商、冲突管理、团队建设

管理团队


基本概念

控制资源

基本概念



规划资源管理

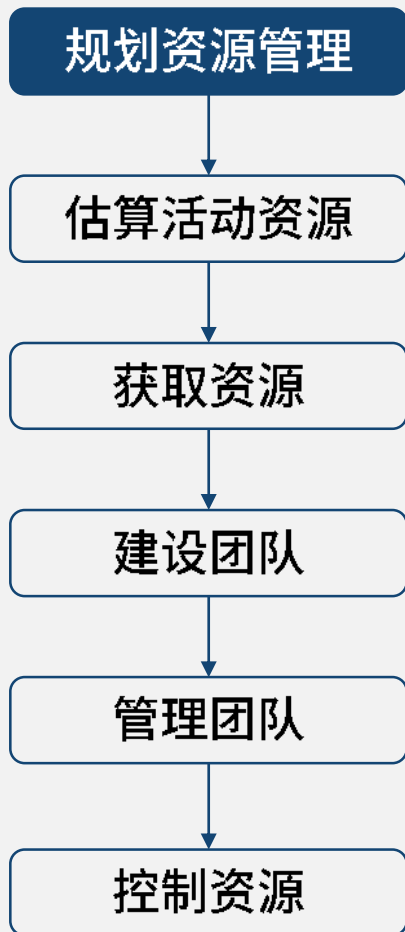

规划资源管理是定义如何估算、获取、管理和利用团队以及实物资源的过程。本过程的主要作用是，根据项目类型和复杂程度确定适用于项目资源的管理方法和管理程度。


本过程仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。



规划资源管理



注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

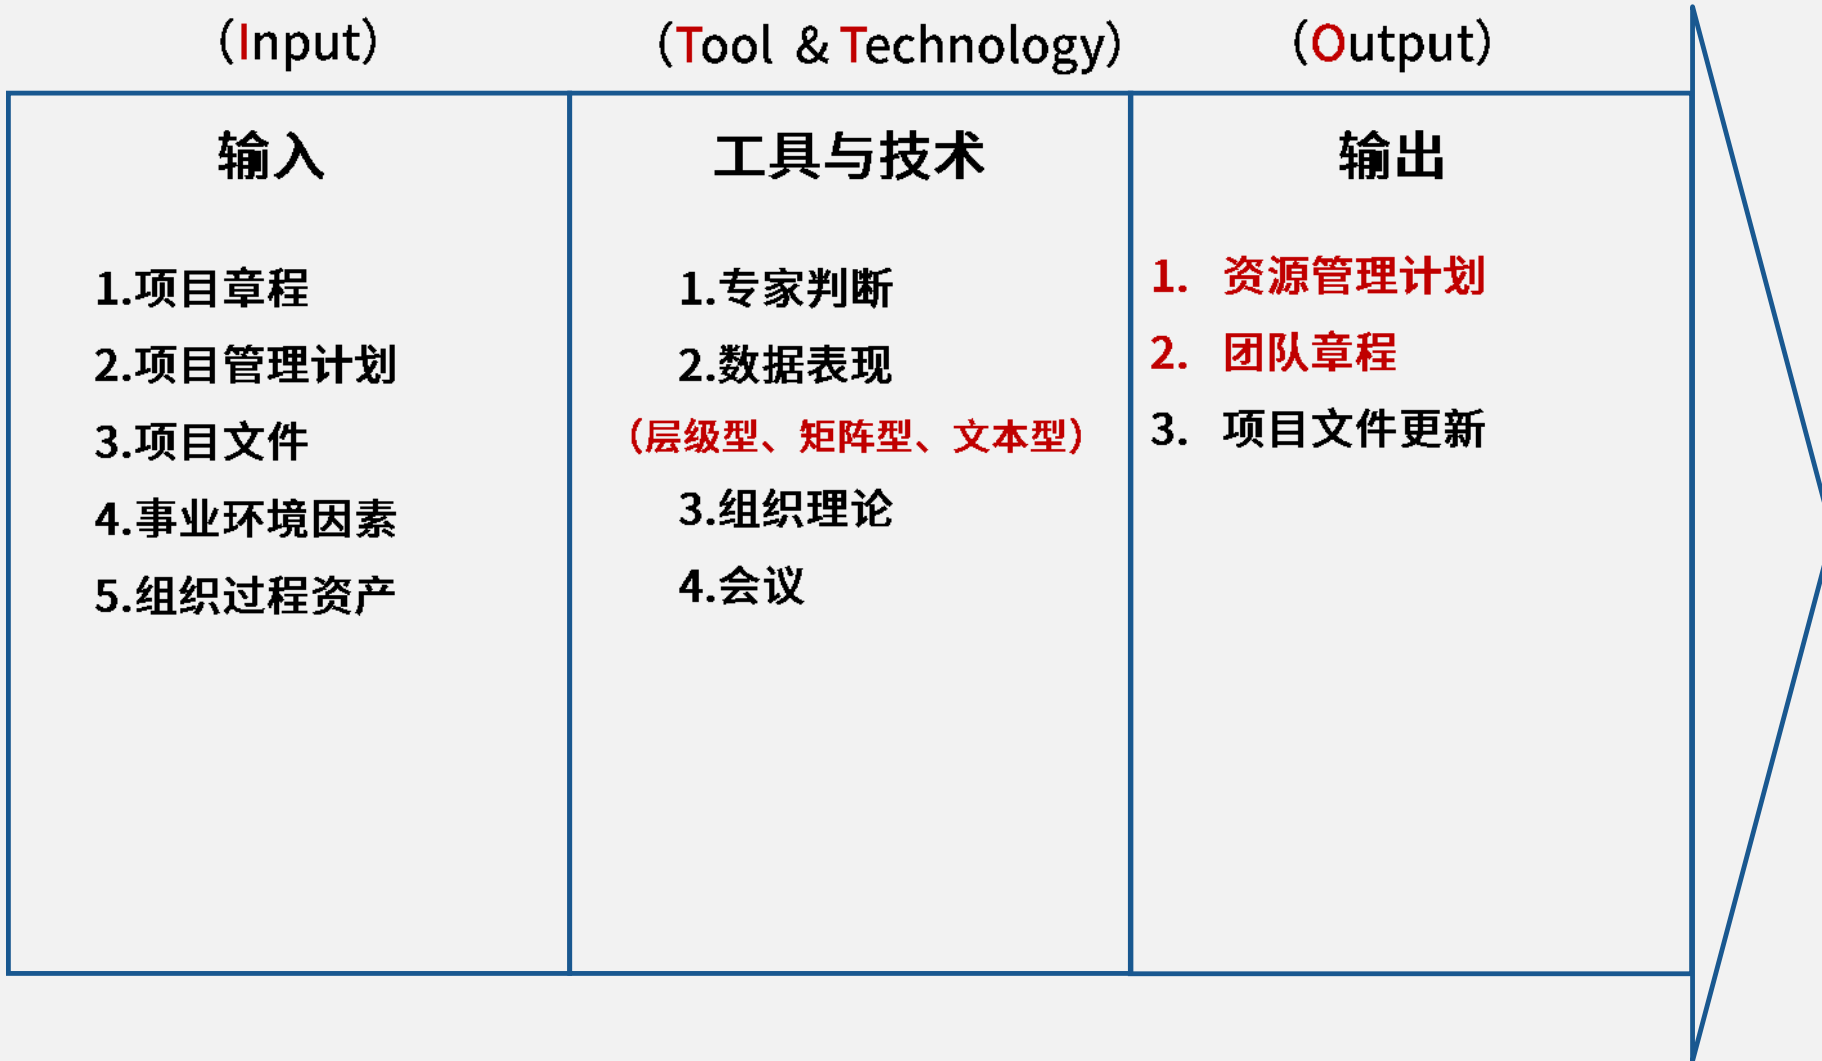




规划资源管理



规划项目资源

有多种格式来记录和阐明团队成员的角色与职责。大多数格式属于**层级型**、**矩阵型**或**文本型**。无论使用什么方法来记录团队成员的角色，目的都是要确保每个工作包都有明确的责任人，确保全体团队成员都清楚地理解其**角色和职责**。

层级型可用于表示**高层级**角色，而**文本型**则更适合用于记录**详细职责**。

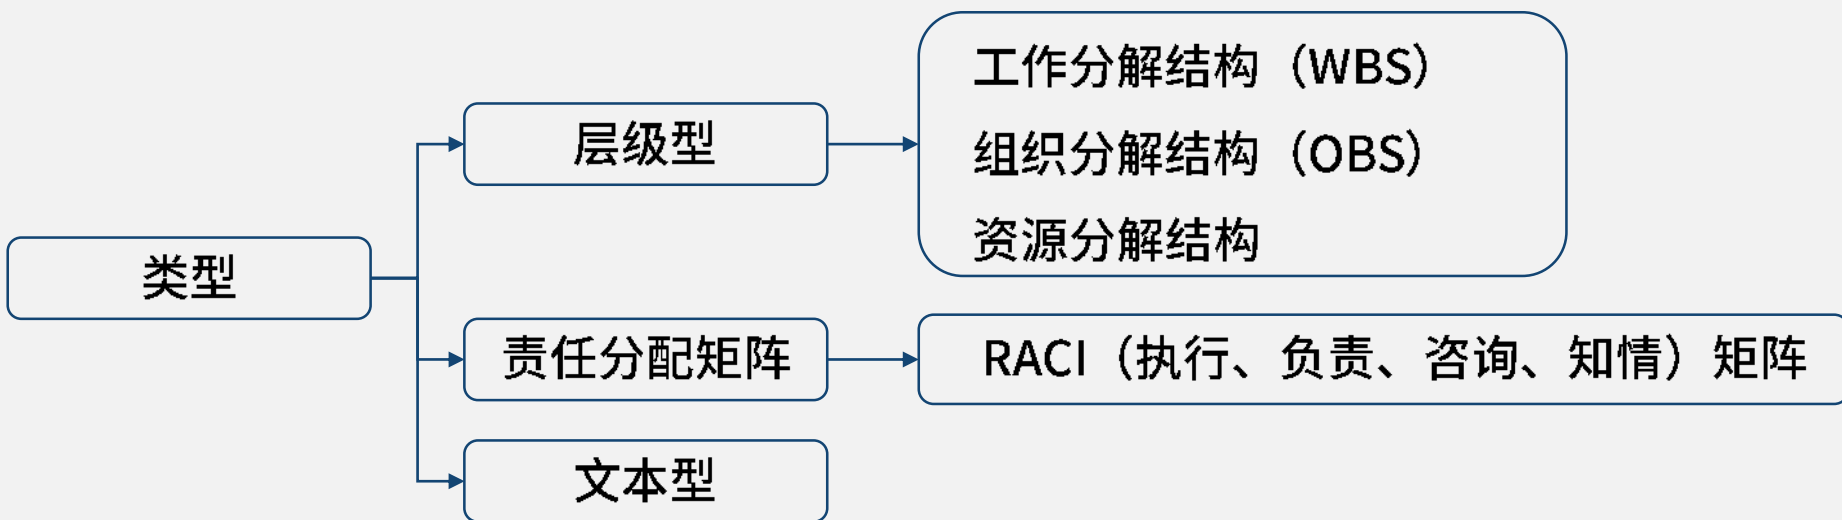




规划资源管理




因事设岗，因岗寻人，以终为始
事 (WBS) - 岗 (OBS) - 人 (RBS)

规划项目资源——层级型

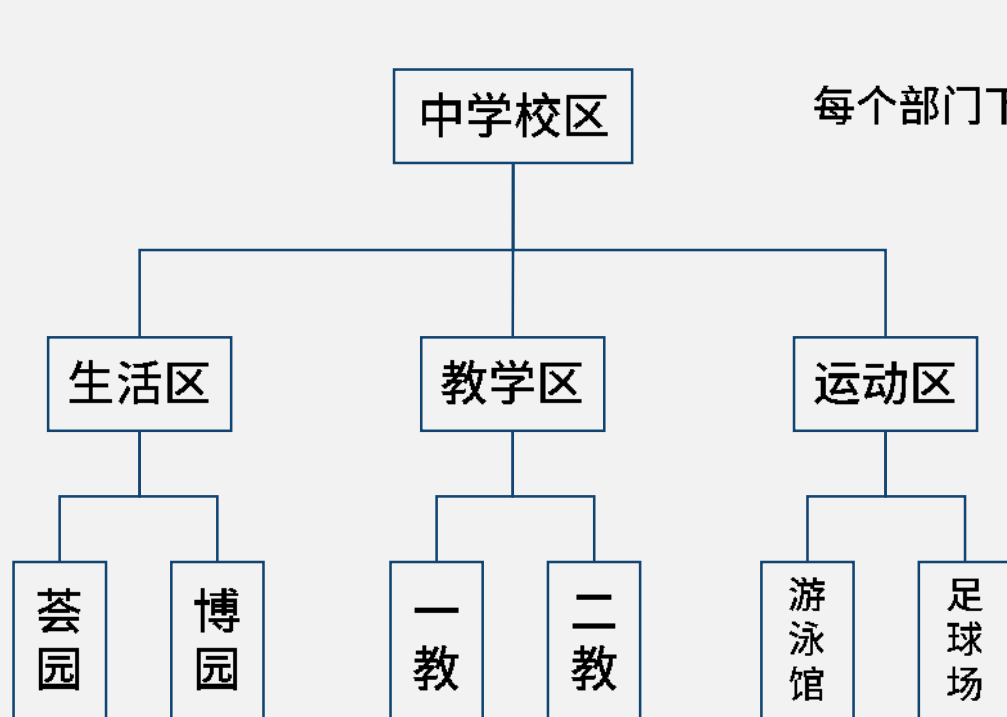

工作分解结构 (WBS)
Work Breakdown Structure

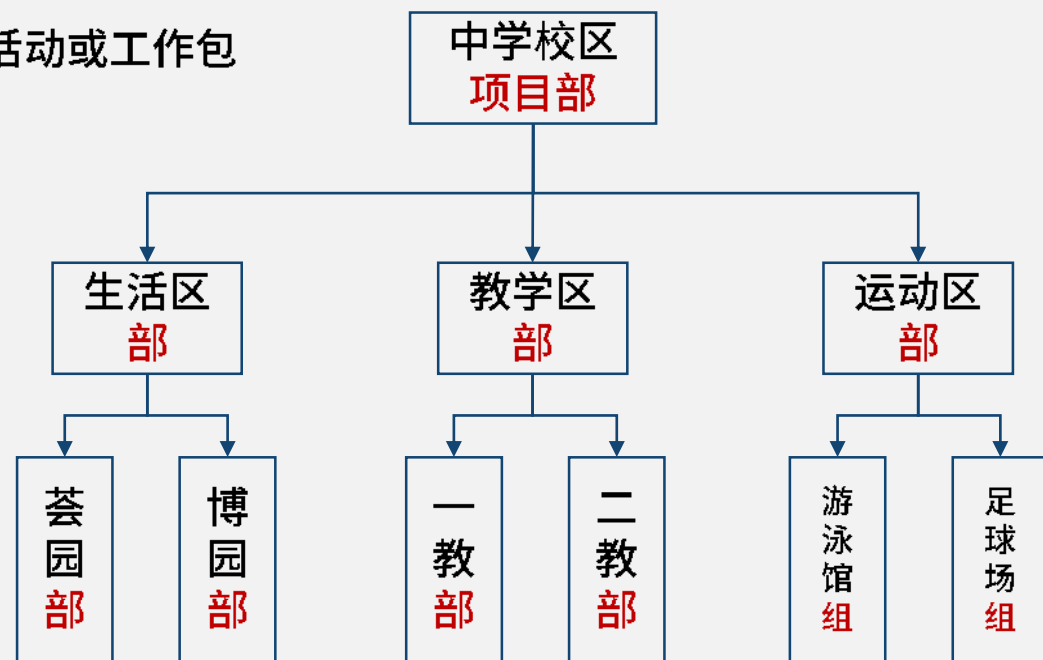


组织分解结构 (OBS) 指令关系
Organizational Breakdown Structure



规划资源管理



规划项目资源——层级型

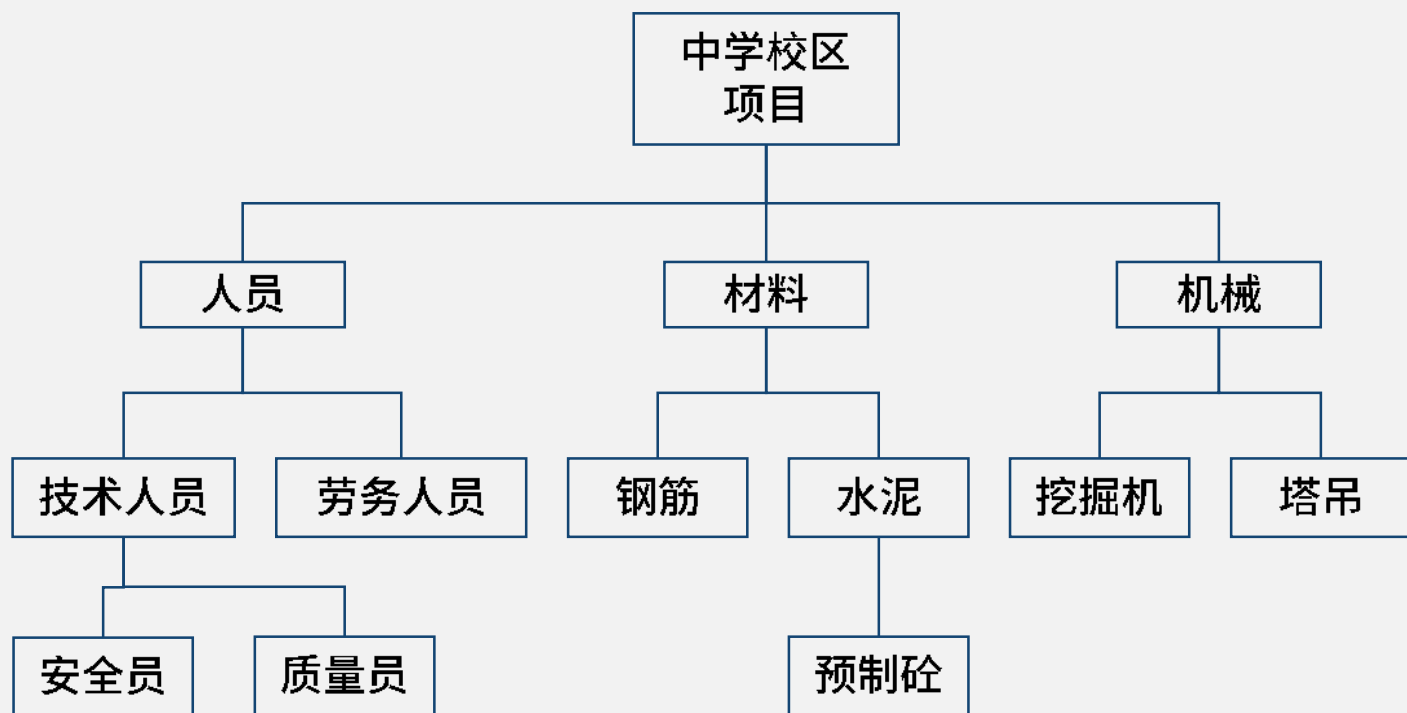

资源分解结构

Resource Breakdown Structure

资源分解结构是资源依类别和类型的层级展现。信息细到可以与**工作分解结构（WBS）**相结合。

资源类别包括（但不限于）人力、材料、设备和用品，**资源类型**则包括技能水平、要求证书、等级水平或适用于项目的其他类型。

在**规划资源管理过程**中，资源分解结构用于指导项目的分类活动。在**获取资源**过程中，资源分解结构是一份完整的文件，用于获取和监督资源。



规划资源管理



你被一家家具制造公司聘为新产品经理。你的公司一家在市场上打拼了几十年，并且占据办公家具市场的主导地位，你从组织各职能部门获取了12名拥有不同技能水平的团队成员，在形成完整的WBS后，你需要根据他们的技能分配对应的项目工作。请问以下哪一项可以帮助到你？

- A.RACI矩阵
- B.项目范围说明书
- C.资源分解结构
- D.活动清单



规划资源管理



你被一家家具制造公司聘为新产品经理。你的公司一家在市场上打拼了几十年，并且占据办公家具市场的主导地位，你从组织各职能部门获取了12名拥有不同技能水平的团队成员，在形成完整的WBS后，你**需要根据**他们的**技能分配对应**的项目**工作**。请问以下哪一项可以帮助到你？

- A.RACI矩阵
- B.项目范围说明书
- C.资源分解结构**
- D.活动清单



规划资源管理



考作用：避免职责不清，分工不明

责任分配矩阵RAM（Responsibility Assignment Matrix）

责任分配矩阵展示项目**资源**在各个工作包中的**任务分配**。在大型项目中，可以制定**多个层次**的**RAM**。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而**避免职权不清**。

WBS		唐僧	孙悟空	猪八戒	沙和尚
整合管理	计划				
	监督				
	管理				
采购	衣				
	食				
安全	海				
	陆				
	空				



规划资源管理



责任分配矩阵RAM

责任分配矩阵RAM的一个例子是 **RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵**。分配给每项工作的资源可以是个人或小组，项目经理也可根据项目需要，选择“领导”或“资源”等适用词汇，来分配项目责任。如果团队是由**内部和外部人员**组成，**RACI 矩阵**对明确划分角色和职责**特别有用**。

RACI矩阵	人员				
活动	张三	李四	王五	陈一	赵六
创建章程	A	R	I	I	I
收集需求	I	A	R	C	C
提交变更	I	A	R	R	C
制定计划	A	C	I	I	R

R=执行，A=负责，C=咨询，I=知情


RACI（执行、负责、咨询和知情）矩阵
Responsible,
Accountable,
Consulted,
Informed



规划资源管理



考作用：如果题干说是大型复杂，内外协作的项目，
RACI矩阵会更比RAM更加适用

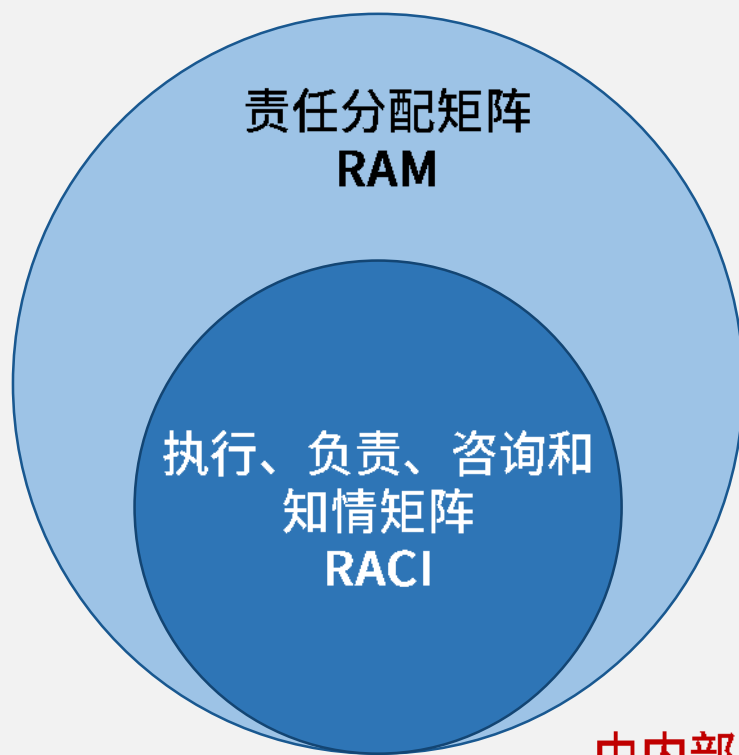

由内部和外部人员组成



规划资源管理



A公司是生产日常用品的公司，近期该公司决定开展一个对供应链进行优化的大型项目，这个项目是一个联合开发项目，60多名团队成员来自于5家不同公司，项目环境十分复杂。你意识到，在这样的环境中，团队成员的分工如果不够清晰，会给项目带来巨大的交付风险。接下来你应该重点关注下列哪一项？

- A. 责任分配矩阵
- B. 执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵
- C. 资源日历
- D. 项目组织图



规划资源管理



A公司是生产日常用品的公司，近期该公司决定开展一个对供应链进行优化的大型项目，这个项目是一个联合开发项目，60多名团队成员来自于5家不同公司，项目环境十分复杂。你意识到，在这样的环境中，团队成员的分工如果不够清晰，会给项目带来巨大的交付风险。接下来你应该重点关注下列哪一项？

- A. 责任分配矩阵
- B. 执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵
- C. 资源日历
- D. 项目组织图



规划资源管理



资源管理计划

考法：

- 1、问角色/职责首选RAM/RACI，别忘了资源管理计划里面也有
- 2、团队成员需要培训，先更新资源管理计划再培训更优
- 3、作用-资源领域的纲领性文件

作为项目管理计划的一部分，资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为**团队管理计划**和**实物资源管理计划**。资源管理计划可能包括（但不限于）：

- 识别资源
- 获取资源
- 项目团队资源管理
- 资源控制

- 项目组织图
- **角色与职责**（角色-职权-职责-能力）
- 团队建设
- 培训策略
- 认可计划

How to do!

不包含谁具体做什么！



规划资源管理



项目经理刚被任命管理一个软件升级项目，项目发起人想要充分参与项目，提出要获取项目团队成员名单，项目经理应该采取以下哪项措施来识别潜在团队成员？

- A.邀请专业人员进行分析
- B.创建组织结构图
- C.与职能经理沟通以获取潜在的项目团队成员
- D.制定资源管理计划



规划资源管理



项目经理刚被任命管理一个软件升级项目，项目发起人想要充分参与项目，提出**要获取项目团队成员名单**，项目经理应该**采取以下哪项措施来识别**潜在团队成员？

- A.邀请专业人员进行分析
- B.创建组织结构图
- C.与职能经理沟通以获取潜在的项目团队成员
- D.制定资源管理计划**



规划资源管理



当数据集成团队和数据迁移团队的领域重叠时，项目会出现问题。目前不清楚谁将负责这些领域的交付。项目经理接下来应该做什么？

- A.审查项目范围以调整项目团队
- B.审查工作分解结构（WBS）以调整项目团队
- C.审查资源管理计划以调整项目团队
- D.审查项目整合计划以调整项目团队



规划资源管理



当数据集成团队和数据迁移团队的领域重叠时，项目会出现问题。目前不清楚谁将负责这些领域的交付。项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查项目范围以调整项目团队
- B. 审查工作分解结构（WBS）以调整项目团队
- C. 审查资源管理计划以调整项目团队
- D. 审查项目整合计划以调整项目团队



规划资源管理



团队章程

考法：内容及作用-记录团队价值观、共识和工作指南

团队章程是为团队创建**团队价值观、共识和工作指南**的文件。团队章程对项目团队成员的**可接受行为**确定了**明确的期望**。尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观。

团队章程可能包括（但不限于）：

- 团队价值观
- 沟通指南
- 决策标准和过程
- 冲突处理过程
- 会议指南
- 团队共识



规划资源管理



你是一家消费品生产企业的项目经理。因为项目性质的原因，你对团队成员的纪律要求非常高，需要在特定的时间内完成工作任务。但是由于工作量过大，成员疲于应对，组织给项目增派了一名其他团队的成员。而该团队成员之前任职于自组织团队，他认为只要工作能够完成，不用在意工作时间和地点，这导致了他与团队成员之间的屡次冲突。请问作为项目经理，你应该如何与他沟通？

- A. 将该团队成员从团队中开除，因为他的这种态度是你不能容忍的；
- B. 与该成员讨论，强调守时对于团队凝聚力的重要性
- C. 因为是团队成员内部的问题，让团队自行解决
- D. 与该成员沟通，指导该成员团队章程中的规定对于一个成功高效团队的重要性，以便所有人都了解并遵守团队章程



规划资源管理




你是一家消费品生产企业的项目经理。因为项目性质的原因，你对团队成员的纪律要求非常高，需要在特定的时间内完成工作任务。但是由于工作量过大，成员疲于应对，组织给项目增派了一名其他团队的成员。而该团队成员之前任职于自组织团队，**他认为**只要工作能够完成，不用在意工作时间和地点，这**导致了他与团队成员之间的屡次冲突**。请问作为项目经理，你应该如何与他沟通？

- A. 将该团队成员从团队中开除，因为他的这种态度是你不能容忍的；
- B. 与该成员讨论，强调守时对于团队凝聚力的重要性
- C. 因为是团队成员内部的问题，让团队自行解决
- D. 与该成员沟通，指导该成员团队章程中的规定对于一个成功高效团队的重要性，以便所有人都了解并遵守团队章程**



估算活动资源

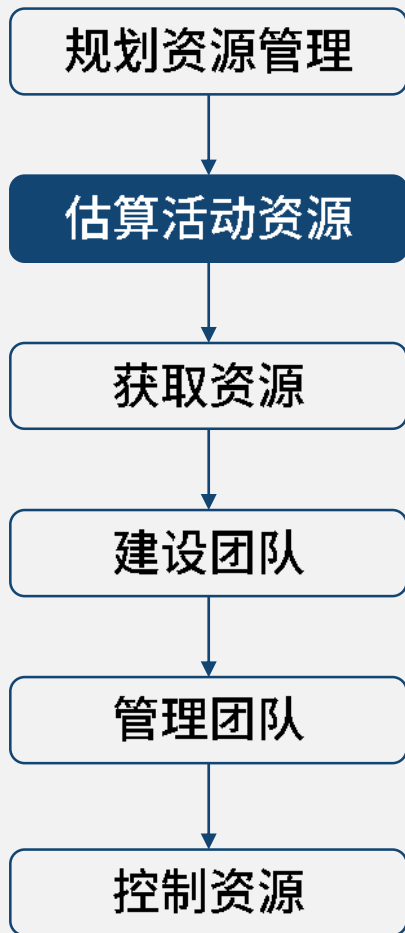


估算活动资源是**估算**执行项目所需的团队资源，以及材料、设备和用品的**类型和数量**的过程。

本过程的主要作用是，明确完成项目所需的资源种类、数量和特性。本过程应根据需要在整个项目期间**定期开展**。



估算活动资源

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

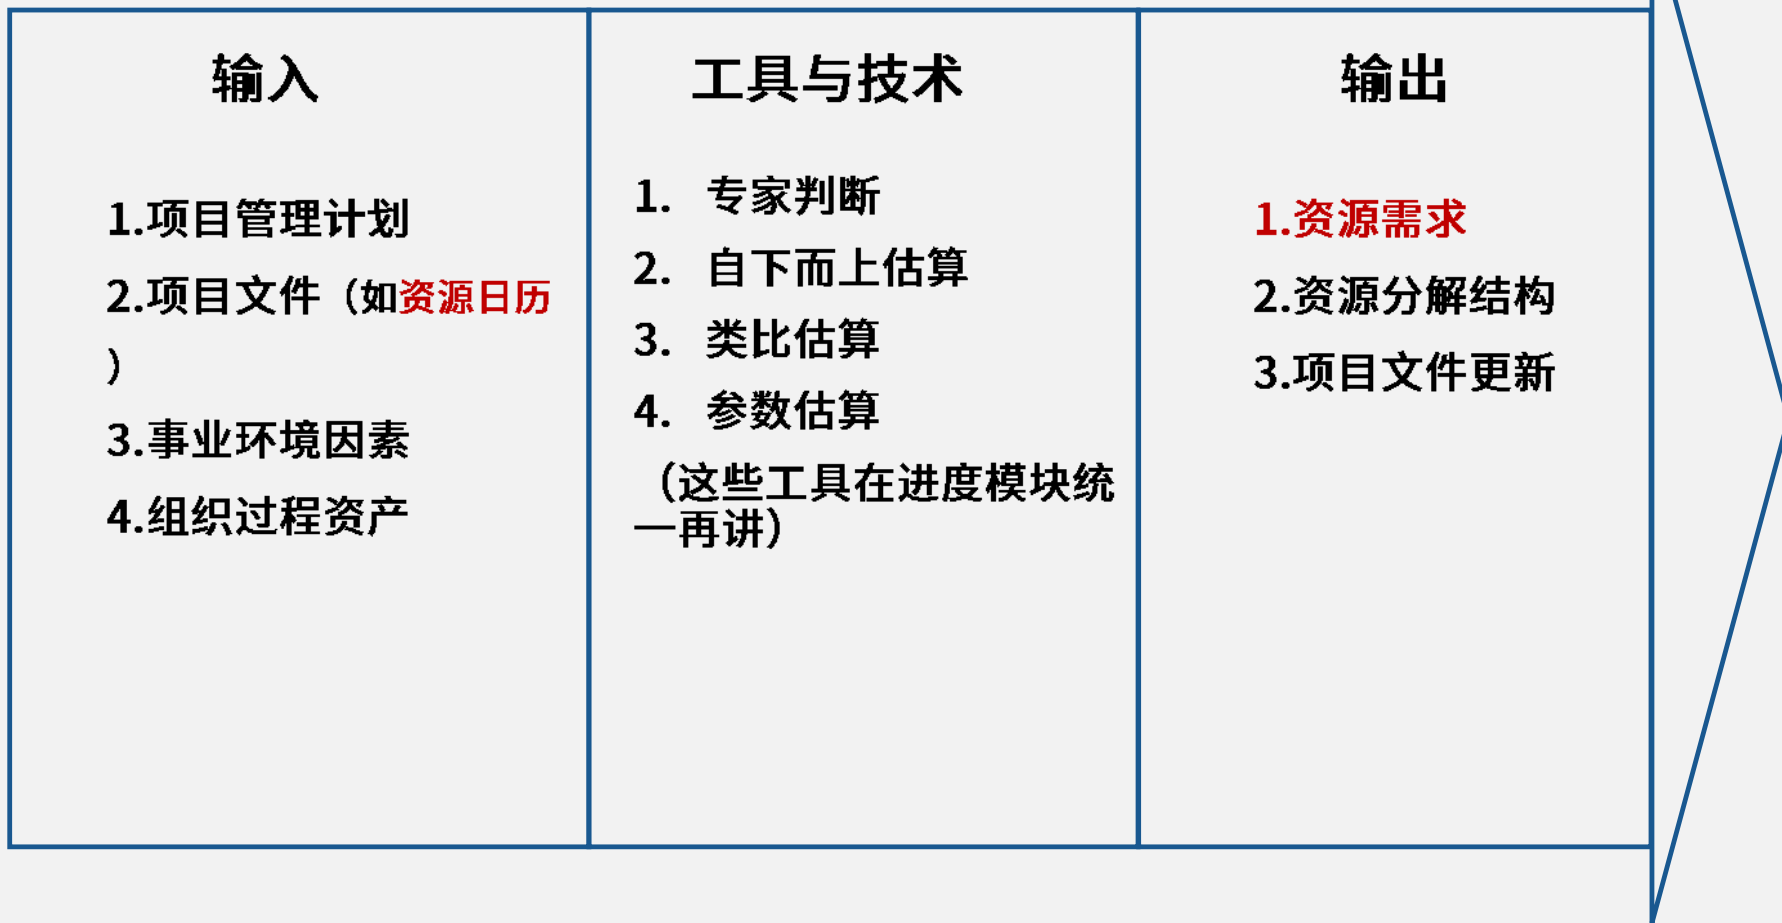



估算活动资源



项目日历vs资源日历

10月 可排课时间 项目日历

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
			10月1日	10月2日	10月3日	10月4日
10月5日	10月6日	10月7日	10月8日	10月9日	10月10日	10月11月
10月12日	10月13日	10月14日	10月15日	10月16日	10月17日	10月18日
10月19日	10月20日	10月21日	10月22日	10月23日	10月24日	10月25日
10月26日	10月27日	10月28日	10月29日	10月30日		

项目日历:

编排开展计划活动的工作日或轮流班次，以及不开展计划活动的非工作日的日历。项目日历影响到所有的活动。



估算活动资源



项目日历vs资源日历

10月 希赛罗老师资源日历

周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
			10月1日 休	10月2日 休	10月3日 休	10月4日 休
10月5日 休	10月6日 休	10月7日 休	10月8日 休	10月9日	10月10日 班	10月11月 CSPM
10月12日 ACP	10月13日 PMP	10月14日 Prince2	10月15日 NPDP	10月16日 PMP	10月17日 休	10月18日 CSPM
10月19日 ACP	10月20日 PMP	10月21日	10月22日 NPDP	10月23日 PMP	10月24日 休	10月25日 CSPM
10月26日 ACP	10月27日 PMP	10月28日 Prince2	10月29日 NPDP	10月30日 PMP		

资源日历：

识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。

资源日历规定了在项目期间确定的团队和实物资源**何时可用、可用多久。**



估算活动资源



《资源需求》


项目名称：

准备日期：

编号	资源类型	数量	假设	说明
	JAVA程序员	2		5年以上经验
	C语言程序员	3		
	测试	2		自动化测试
				



获取资源

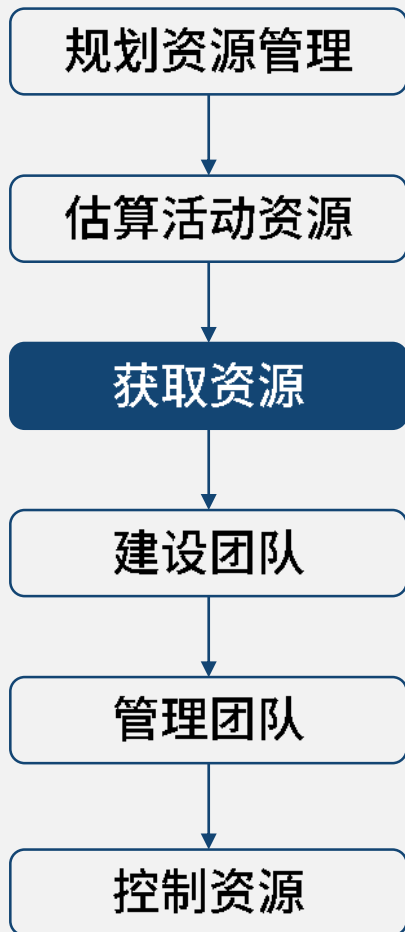

获取资源是获取项目所需的团队成员、设施、设备、材料、用品和其他资源的过程。本过程的主要作用是，**概述和指导资源的选择**，并将其**分配给相应的活动**。本过程应根据需要在整个项目期间**定期开展**。

项目所需资源可能来自项目执行组织的内部或外部。**内部资源**由**职能经理或资源经理**负责获取（分配），**外部资源**则是通过**采购过程**获得。



获取资源

获取资源的三种情况：

1. 富余-择优（多标准决策分析）
2. 紧张-协商（谈判）
3. 谈判不了就去招募采购

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件(如资源需求) 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 决策（多标准决策分析） 2. 人际关系与团队技能（谈判） 3. 预分派 4. 虚拟团队	1. 物质资源分配单 2. 项目团队派工单 3. 资源日历 4. 变更请求 5. 项目管理计划更新 6. 项目文件更新

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背



获取资源



方法——决策

多标准决策分析

根据标准的相对**重要性对标准进行加权**，加权值可能因资源类型的不同而发生变化。可使用的选择标准包括：

可用性、成本、能力；

经验、知识、技能、态度、国际因素等。

标准		权重	得分	加权得分
基本要求	可用性	0.1	80	8
	成本	0.2	75	15
	能力	0.1	87	8.7
独特要求	经验	0.1	95	9.5
	知识	0.1	75	7.5
	技能	0.1	80	8
	态度	0.1	60	6
	国际因素	0.2	95	19
合计		1	/	81.7



获取资源



方法——预分派

预分派指**事先确定**项目的实物或团队资源，可在下列情况下发生：

- 在**竞标过程中**承诺分派特定人员进行项目工作；如施工单位签署的合同中会明确规定派出管理的项目经理人员。
- 项目取决于特定人员的**专有技能**；
- 在完成资源管理计划的**前期工作之前**，制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。



获取资源



原则：先内后外

人际关系与团队技能——谈判

很多项目需要针对所需资源进行谈判，项目管理团队需要与下列各方谈判：

- 职能经理。 (协商)
- 执行组织中的其他项目管理团队。
- 外部组织和供应商。

在资源分配谈判中，项目管理团队影响他人的能力很重要，如同在组织中的政治能力一样重要。



获取资源



项目经理加入一个市政维修项目，在确定了项目所需执行活动之后，需要获取相应的资源。

为了获取项目所需的组织内部成员，项目经理首先应该怎么做？

- A. 上报发起人，由发起人调配
- B. 与职能经理协商获取资源
- C. 从其他项目中挑选团队成员
- D. 通过采购的方式来获取资源



获取资源



项目经理加入一个市政维修项目，在确定了项目所需执行活动之后，需要获取相应的资源。

为了获取项目所需的组织内部成员，项目经理首先应该怎么做？

- A. 上报发起人，由发起人调配
- B. 与职能经理协商获取资源
- C. 从其他项目中挑选团队成员
- D. 通过采购的方式来获取资源



获取资源



项目章程刚刚获得批准，项目发起人已允许开始实施该项目，项目经理已确认本项目的一个关键资源在同一时间也被另一个项目需要，这将影响本项目的交付，项目经理应该怎么做？

- A.与另一个项目的项目经理会面，以找到适用于两个项目的资源优化解决方案
- B.与项目集经理讨论将该项目优先于其他项目，以便获得关键资源
- C.为关键资源支付加班费以完成工作时间以外的工作
- D.与客户洽谈，看看项目交付期限是否能因资源可用性问题而延迟



获取资源



项目章程刚刚获得批准，项目发起人已允许开始实施该项目，项目经理已确认本项目的一个关键资源在同一时间**也被另一个项目需要**，这将影响本项目的交付，项目经理应该怎么做？

- A.与另一个项目的项目经理会面，以找到适用于两个项目的资源优化解决方案
- B.与项目集经理讨论将该项目优先于其他项目，以便获得关键资源
- C.为关键资源支付加班费以完成工作时间以外的工作
- D.与客户洽谈，看看项目交付期限是否能因资源可用性问题而延迟



获取资源



工件

实物资源分配单

实物资源分配单记录了项目将使用的材料、设备、用品、地点和其他实物资源。

项目团队派工单


项目团队派工单记录了团队成员及其在项目中的角色和职责，可包括项目团队名录，还需要把人员姓名插入项目管理计划的其他部分，如项目组织图和进度计划。

资源日历

资源日历识别了每种具体资源可用时的工作日、班次、正常营业的上下班时间、周末和公共假期。资源日历规定了在项目期间确定的团队和实物资源何时可用、可用多久。



建设团队

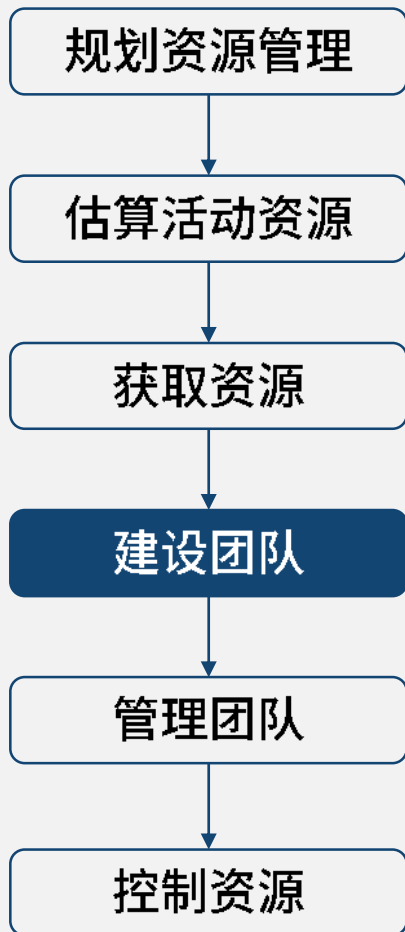

建设团队是工作能力，**促进团队成员互动，改善团队整体氛围**，以提高项目绩效的过程。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及**提升整体项目绩效**。本过程需要在整个项目期间开展。



建设团队

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 集中办公 2. 虚拟团队 3. 沟通技术 4. 人际关系与团队技能 (冲突管理、影响力、激励、谈判、团队建设) 5. 认可与奖励 6. 培训 7. 个人和团队评估 8. 会议	1. 团队绩效评价 2. 变更请求 3. 项目管理计划更新 4. 项目文件更新 5. 事业环境因素更新 6. 组织过程资产更新



建设团队



项目经理应该能够**定义、建立、维护、激励、领导和鼓舞项目团队**，使团队高效运行，并实现项目目标。**团队协作**是项目成功的关键因素，而**建设高效的项目团队**是项目经理的主要职责之一。

建设项目团队的目标包括（但不限于）：

- 提高团队成员的**知识和技能**

以提高他们完成项目可交付成果的能力，并降低成本、缩短工期和提高质量；

- 提高团队成员之间的**信任和认同感**

以提高士气、减少冲突和增进团队协作；

- 创建富有生气、凝聚力和协作性的**团队文化**，

从而：（1）提高个人和团队生产效率，振奋团队精神，促进团队合作；（2）促进团队成员之间的交叉培训和辅导，以分享知识和经验；

- 提高团队**参与决策**的能力

使他们承担起对解决方案的责任，从而提高团队的生产效率，获得更有效和高效的成果。




建设团队



考法：

- 1、区分团队在不同阶段的表现
- 2、项目经理（PM）在不同阶段应该如何管理团队

团队建设五阶段

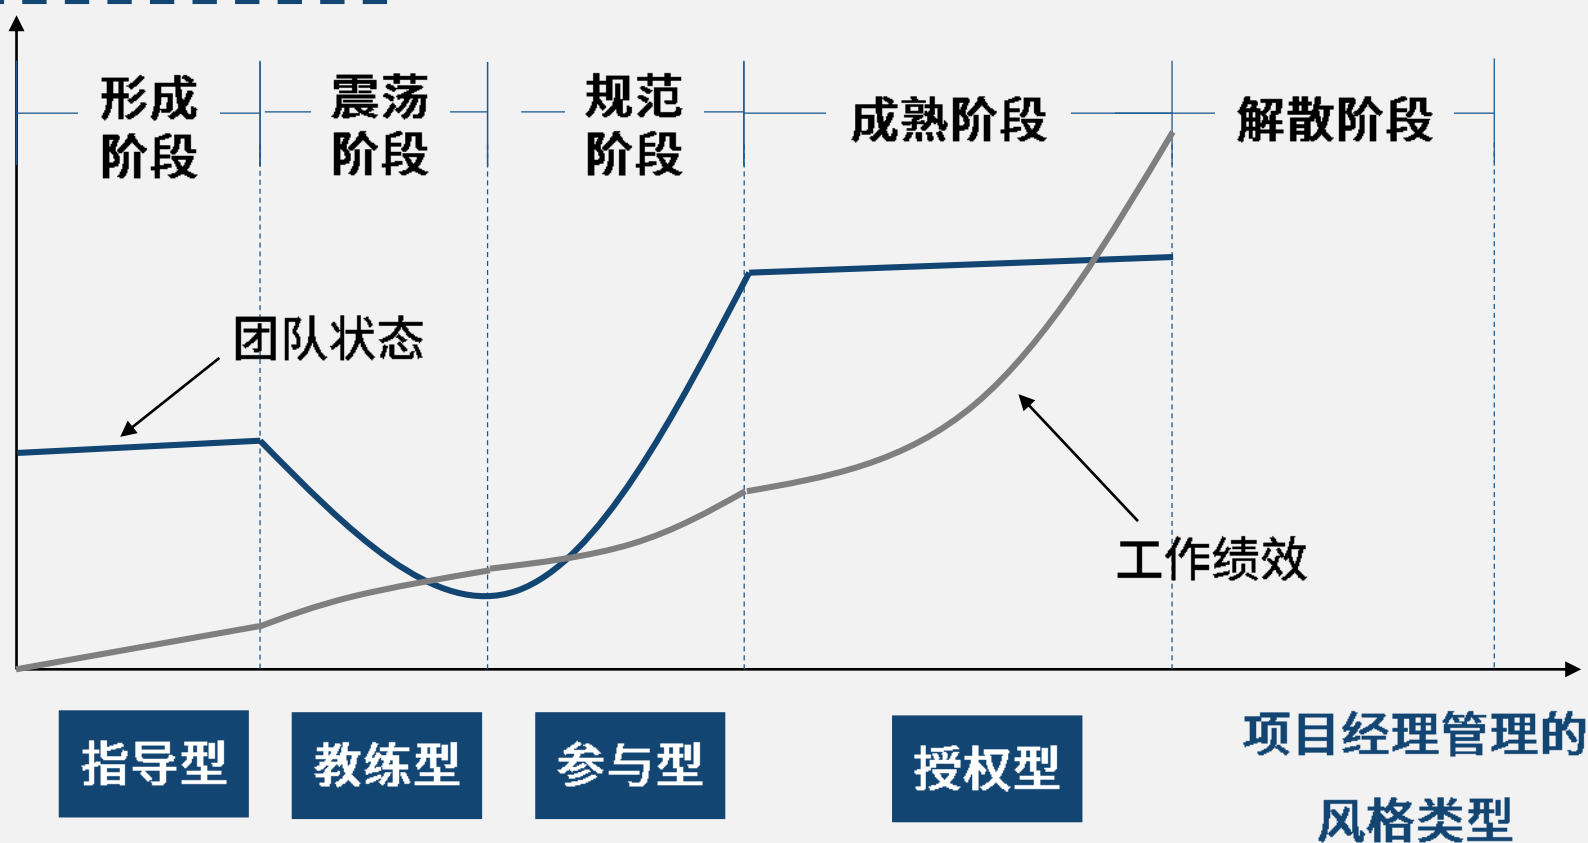

塔克曼阶梯理论



建设团队



团队建设五阶段

阶段	说明
形成阶段 (Forming)	团队成员相互认识，了解项目情况及他们在项目中的角色与职责。团队成员倾向于相互独立，不一定开诚布公。
震荡阶段 (Storming)	如果团队成员不能用合作和开放的态度对待不同观点和意见，团队环境可能变得事与愿违。
规范阶段 (Norming)	团队成员开始协同工作，并调整各自的工作习惯和行为来支持团队，团队成员会学习相互信任。
成熟阶段 (执行阶段) (Performing)	团队组织有序的工作，团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题。
解散阶段 (Adjourning)	团队完成所有工作，团队成员离开项目。通常在项目可交付成果完成之后，或者在收尾过程中，释放人员，解散团队。

- ★ 尽管这些阶段通常按顺序进行，但团队停滞在某个阶段或退回到较早阶段的情况也并非罕见；
- ★ 而如果团队成员曾经共事过，项目团队建设也可跳过某个阶段。



建设团队



团队建设五阶段

在给项目团队分配任务后，项目经理发现一些团队成员感到不舒服。相同的团队成员在理解分配给他们的任务时遇到困难，而其他团队成员则在挑战基于项目分配的时间表。塔克曼阶梯理论的哪个阶段正在发生？

- A：形成阶段
- B：成熟阶段
- C：震荡阶段
- D：规范阶段



建设团队



团队建设五阶段

在给项目团队分配任务后，项目经理发现一些团队成员感到不舒服。相同的团队成员在理解分配给他们的任务时遇到困难，而其他团队成员则在挑战基于项目分配的时间表。塔克曼阶梯理论的哪个阶段正在发生？

- A：形成阶段
- B：成熟阶段
- C：震荡阶段**
- D：规范阶段



建设团队



方法——集中办公和虚拟团队



集中办公



虚拟团队



建设团队



方法——集中办公和虚拟团队

	优点	缺点
虚拟团队	更多技术熟练的资源 降低成本、减少出差及搬迁费用 拉近团队成员与供应商、客户的距离	沟通 时差 文化差异 缺乏监控手段
集中办公 (作战室)	改善沟通和工作关系 提高工作效率 便于管理和监控	可能增加成本 受制于工作场地



建设团队



方法——沟通技术

在解决集中办公或虚拟团队的团队建设问题方面，**沟通技术**至关重要。它有助于为集中办公团队营造一个融洽的环境，促进虚拟团队（尤其是团队成员分散在不同时区的团队）更好地理解。可采用的沟通技术包括：

- **共享门户** 共享信息库（例如网站、协作软件或内部网）对虚拟项目团队很有帮助。
- **视频会议** 视频会议是一种可有效地与虚拟团队沟通重要技术。
- **音频会议** 音频会议有助于与虚拟团队建立融洽的相互信任的关系。
- **电子邮件/聊天软件** 使用电子邮件和聊天软件定期沟通也是一种有效的方式。



建设团队



方法——团队管理工具

团队管理	想做	个人/团队评估-激励
	能做	培训
	领导	领导力-影响力
	协调	冲突管理-谈判-团队建设-情商



建设团队



模型——激励理论

激励

激励为某人采取行动**提供了理由**。提高团队参与决策的能力并鼓励他们独立工作。

认可与奖励

需要对成员的优良行为给予认可与奖励。只有能满足被奖励者的某个**重要需求**的奖励，才是有效的奖励。

金钱是奖励制度中的**有形奖励**，然而也存在各种同样有效、甚至更加有效的**无形奖励**：大多数项目团队成员会因得到成长机会、获得成就感、得到赞赏以及用专业技能迎接新挑战，而受到激励。




建设团队




激励的核心-击中对方的需求!

模型——激励理论

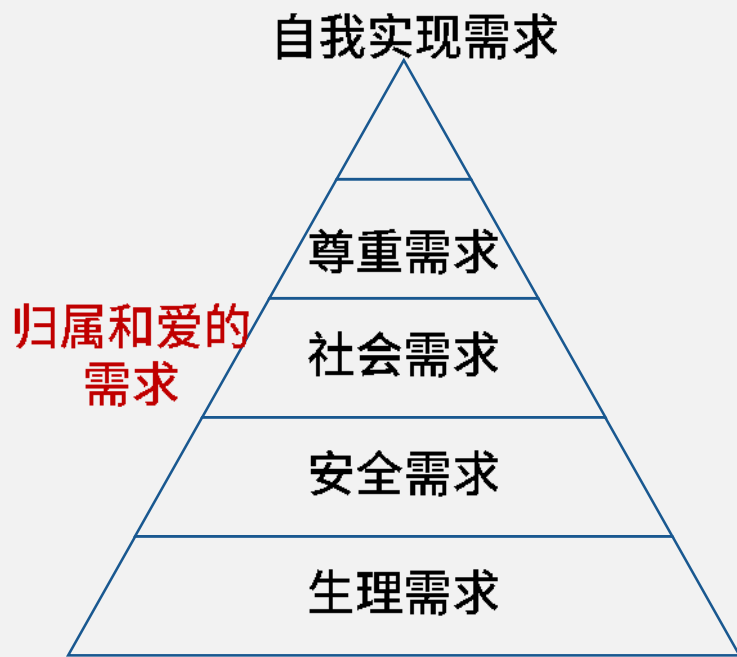

马斯洛的需求层次理论




激励因素

做好了有益，做坏了无害；
如责任、自我发展、认可等。

保健因素

做好了无益，做坏了有害；
如工资、同事关系、安全等。

赫兹伯格的双因素理论

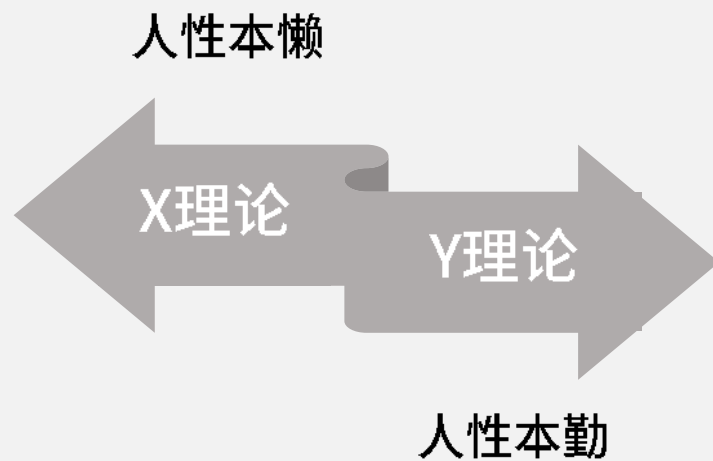

麦克雷戈的X理论和Y理论



建设团队



项目经理依据组织的管理要求对项目进行管理。项目经理鼓励团队成员开展目标的制定，没有对员工严格的管理制度，认为员工热衷于发挥自己的才能和创造性；大多数人都具有解决组织问题的能力。项目经理信奉的是什么理论？

- A.需求层次理论
- B.双因素理论
- C.Y理论
- D.生理需要



建设团队



项目经理依据组织的管理要求对项目进行管理。项目经理鼓励团队成员开展目标的制定，**没有对员工严格的管理制度**，认为员工热衷于**发挥自己的才能和创造性**；大多数人都具有解决组织问题的能力。项目经理信奉的是什么理论？

- A.需求层次理论
- B.双因素理论
- C.Y理论**
- D.生理需要




建设团队



方法——培训

- 1、培训的适用场景：**技能不足，能力不足**
- 2、培训的步骤：**先分析培训需求，再制定培训方案，把培训策略放入资源管理计划中，再按计划进行培训（先分析后行动）**
- 3、培训的原则：**先内后外**
- 4、培训VS指导：培训包含指导，**指导更偏向于实践**

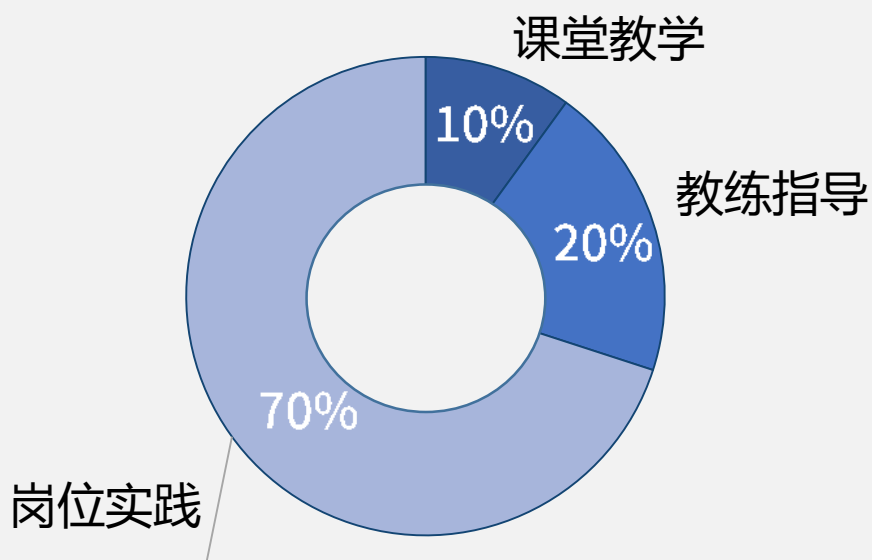

我说你听，你说我听
我做你看，你做我看

培训包括旨在提高项目团队成员能力的全部活动，可以是**正式或非正式的**，方式包括课堂培训、在线培训、计算机辅助培训、在岗培训、辅导及训练。

如果项目团队成员**缺乏必要的管理或技术技能**，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。

按**资源管理计划**中的安排来实施预定的培训。

根据管理项目团队过程中的**观察、交谈和项目绩效评估的结果**，来开展必要的计划外培训。

培训可以由内部或外部培训师来执行。



建设团队



项目经理组织一个跨国项目，项目团队成员来自多个国家。在项目进展中期，项目经理审查发现，项目已经严重落后于进度。经分析，确定是因为其他国家的团队成员缺乏相应的技术技能。项目经理应该怎么做？

- A.与团队成员组织虚拟会议，重新分配工作
- B.提交变更请求，以替换团队成员
- C.更新资源管理计划，包含必要的培训
- D.要求职能经理确保团队成员获得必要的培训



建设团队



项目经理组织一个跨国项目，项目团队成员来自多个国家。在项目进展中期，项目经理审查发现，项目已经严重落后于进度。经分析，确定是因为其他国家的团队成员缺乏相应的技术技能。项目经理应该怎么做？

- A.与团队成员组织虚拟会议，重新分配工作
- B.提交变更请求，以替换团队成员
- C.更新资源管理计划，包含必要的培训
- D.要求职能经理确保团队成员获得必要的培训



建设团队



一个新成员加入了一个正在进行的软件项目的项目团队。该团队成员是唯一可用的资源，但没有适当的经验来完成这些活动。项目经理应该怎么做才能确保该团队成员缺乏经验不会对项目产生负面影响？

- A.为新团队成员安排培训课程，以填补他们的经验空白
- B.确保在项目时间表内为该团队成员召开指导会议
- C.每周向所有项目团队成员提供反馈，包括新成员
- D.将此作为问题记录在项目问题日志中并与资源经理交谈



建设团队



一个新成员加入了一个正在进行的软件项目的项目团队。该团队成员是唯一可用的资源，但没有适当的经验来完成这些活动。项目经理应该怎么做才能确保该团队成员缺乏经验不会对项目产生负面影响？

- A.为新团队成员安排培训课程，以填补他们的经验空白
- B.确保在项目时间表内为该团队成员召开指导会议**
- C.每周向所有项目团队成员提供反馈，包括新成员
- D.将此作为问题记录在项目问题日志中并与资源经理交谈



建设团队



方法——领导力和影响力

影响力

矩阵环境中，项目经理对团队成员通常没有或仅有**很小的命令职权**，适时施展影响力，对保证项目成功非常关键。影响力主要体现在如下各方面：

- 说服他人；
- 清晰表达观点和立场；
- 积极且有效的倾听；
- 了解并综合考虑各种观点；
- 收集相关信息，在维护相互信任的关系下，解决问题并达成一致意见。

领导力

成功的项目需要强有力的领导技能，领导力是**领导团队、激励团队**做好本职工作的能力。它包括各种不同的技巧、能力和行动。且领导力在项目生命周期中的所有阶段都很重要。有多种领导力理论，定义了适用于不同情形或团队的领导风格。领导力对沟通愿景及鼓舞项目团队高效工作十分重要。

给我上，跟我上，让我上。




建设团队



人际关系技能——情商

情商：人的情绪品质和对社会的适应能力，包括个人情感和他人情感
情商可以培训，情商涵盖面很广，遇到大概率正确

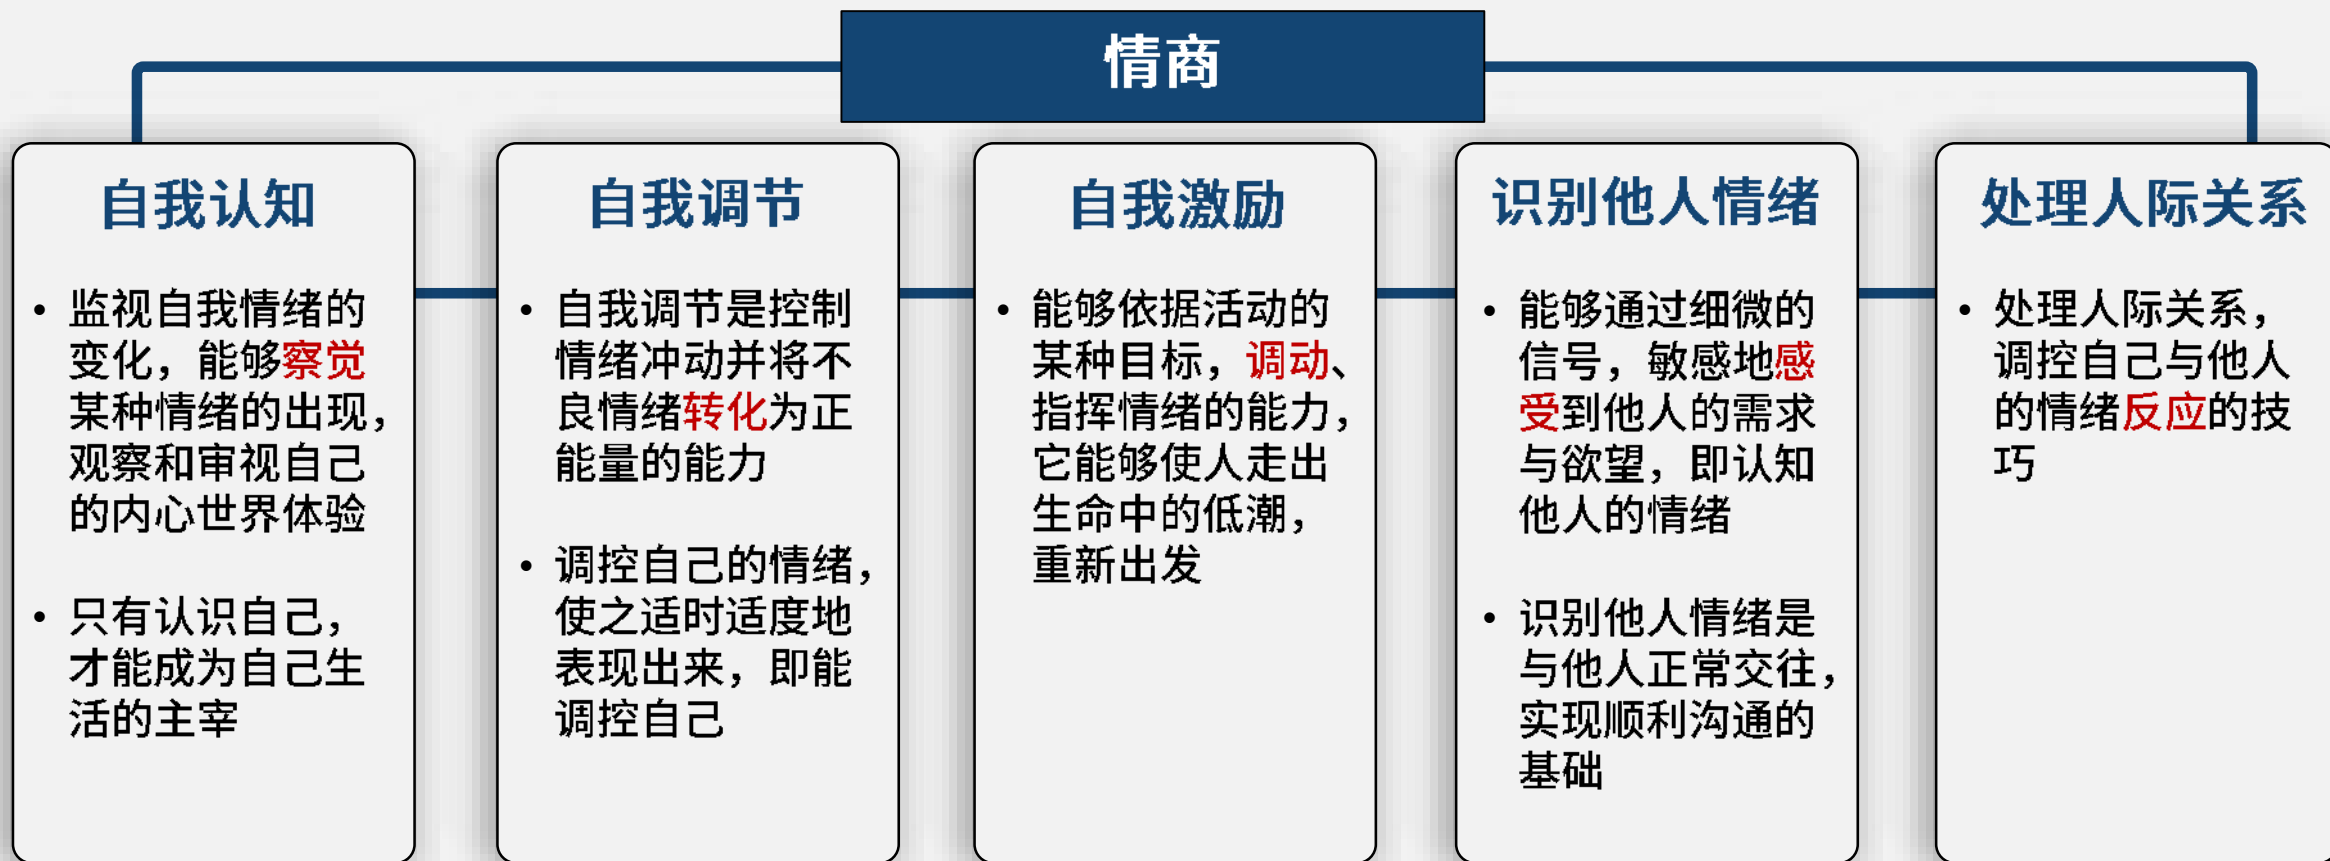




建设团队



人际关系技能——情商

谈判

第n层	共同愿景				
第三层					
第二层					
第一层					

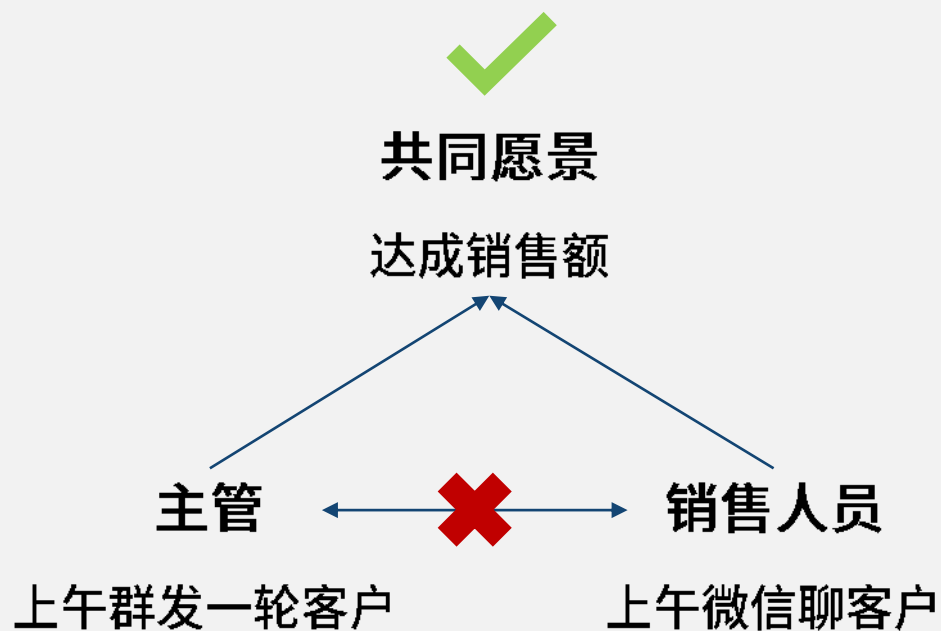

说服职能经理/项目经理，让他/她看到项目具有良好的前景，会影响他/她把最佳资源分配给这个项目而不是竞争项目。



建设团队



一名团队成员在头脑风暴会议期间不如团队其他成员活跃。项目经理与团队成员单独交谈并得知该团队成员有轻微听力障碍，团队成员感谢项目经理的关注。然后项目经理决定更改会议的时间和空间，以确保每个人都能参与。项目经理使用了哪些人际交往技巧？

- A.冲突管理
- B.人脉
- C.影响
- D.情商



建设团队



一名团队成员在头脑风暴会议期间不如团队其他成员活跃。项目经理与团队成员单独交谈并得知该团队成员有轻微听力障碍，团队成员感谢项目经理的关注。然后项目经理决定**更改会议的时间和空间**，以**确保每个人都能参与**。项目经理使用了哪些人际交往技巧？

- A.冲突管理
- B.人脉
- C.影响
- D.情商**



建设团队



模型——冲突管理


引起冲突的原因	解释
资源稀缺	导致人们对资源分配有不同的意见
进度计划	在项目工作任务的时间安排方面存在不一致的意见
工作优先级排序	对项目各工作的优先顺序意见不一致
技术观点不同	对有关技术问题意见不一致
工作风格和管理程序	人们的工作风格和喜好的管理程序不同
成本	对应该花多大代价做一件事情有不同意见
个性	人与人个体之间的差异



建设团队



模型——冲突管理

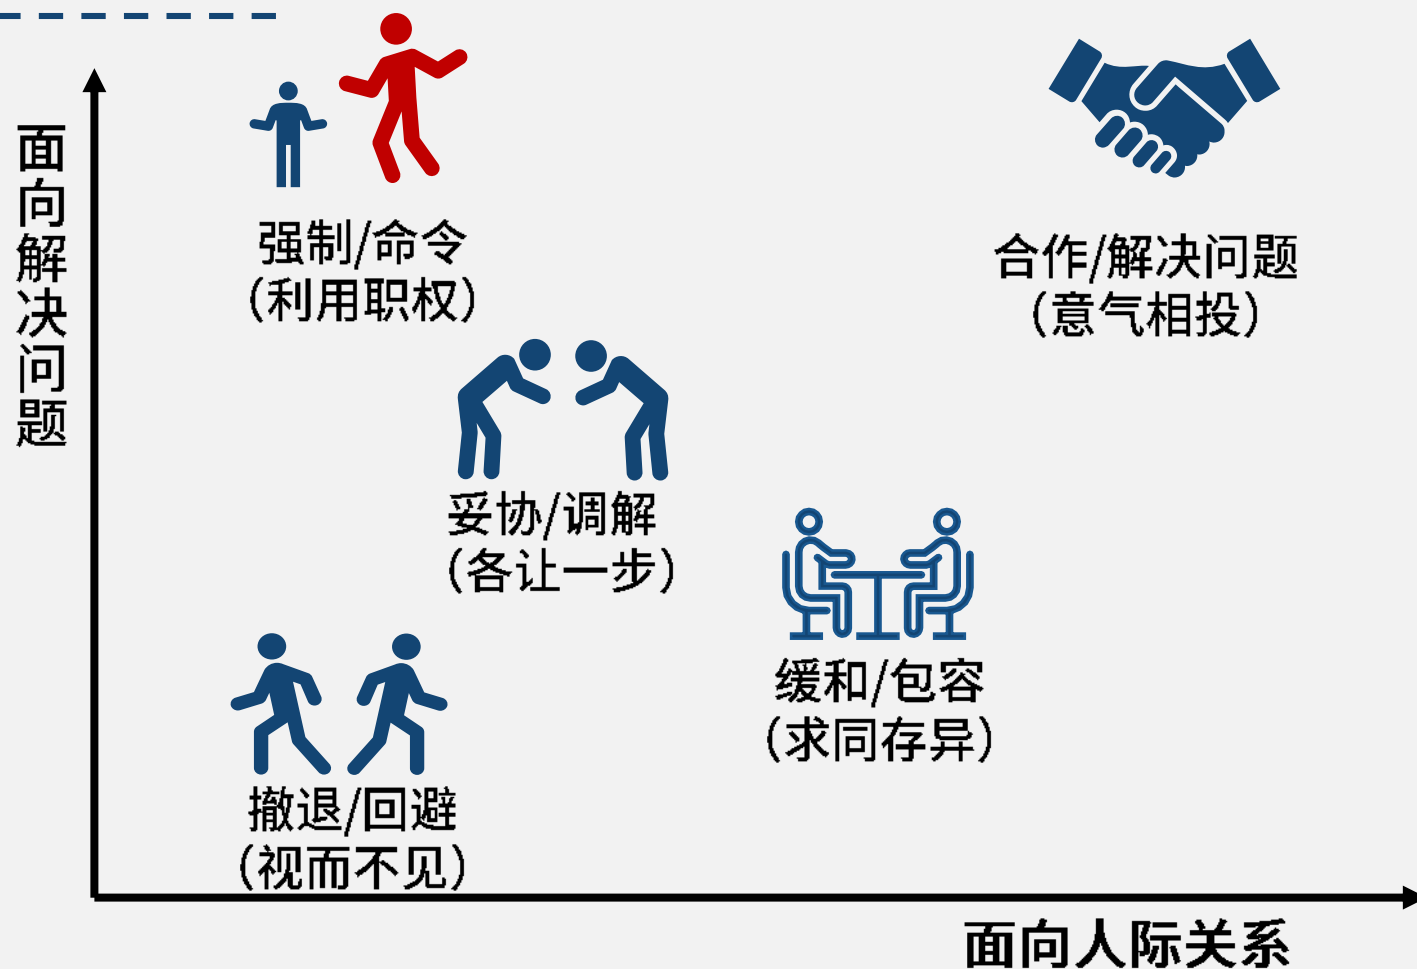



建设团队



模型——冲突管理

解决方法	解释
撤退/回避	从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。
缓和/包容	强调一致而非差异； 为维持和谐与关系而退让一步 ，考虑其他方的需要。
妥协/调解	为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案，但这种方法有时会导致“双输”局面。
强迫/命令	以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢—输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢输”局面。
合作/解决问题	综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺，这种方法可以带来双赢局面。

Accommodating

Compromising



建设团队



模型——冲突管理

考法：明确五种冲突解决方式的定义，依据情景判断使用何种方式
题干一般分为两种：

- 1、只描述了出现冲突的场景，问用哪种冲突管理的方式？
- 2、描述了出现冲突的场景以及如何解决冲突，问属于那种冲突管理的方式？

	是否解决冲突本身	情景	关键词
撤退/回避	否	1. 冲突本身微不足道 2. 超出项目经理权限	推迟，等待
缓和/包容	否	共同的一致目标，暂时化解	求同存异，单方退让
妥协/调解	是	各退一步，Lose-lose，双输	双方各退一步，平均
强迫/命令	是	推行一方，win-lose，赢输 特别紧急的时候	命令，快速、立即决策
合作/解决问题	是	双方合作，win-win，双赢 长期根本解决问题	对话、合作、长期、有效、解决 (没其他约束时首选)



建设团队



在项目执行期间，一名项目团队成员辞职，一名新的初级成员加入团队。为了顺利过渡，项目经理指派了一名高级项目团队成员传授知识并支持初级团队成员。项目经理随后收到高级团队成员的反馈，称该初级成员提交的交付成果质量较差，应该从团队中移除，但是项目经理检查了可交付成果，发现其符合质量要求。项目经理应该使用哪种技术来解决此问题？

- A：合作/解决问题
- B：妥协/调解
- C：缓和/包容
- D：强迫/命令



建设团队



此题属于第一种，只给了冲突的场景，没说怎么处理的冲突，没有约束的情况下优选合作/解决问题。

在项目执行期间，一名项目团队成员辞职，一名新的初级成员加入团队。为了顺利过渡，项目经理指派了一名高级项目团队成员传授知识并支持初级团队成员。项目经理随后收到高级团队成员的反馈，称该初级成员提交的交付成果质量较差，应该从团队中移除，但是项目经理检查了可交付成果，发现其符合质量要求。项目经理应该使用哪种技术来解决此问题？

A：合作/解决问题

B：妥协/调解

C：缓和/包容

D：强迫/命令



建设团队



在一个大型项目即将完成之际，政府颁布了一项新的法规使项目不得不暂停，因为这项法规的颁布可能会给最终产品带来严重的问题。由于项目发起人要求尽快结束该项目，两名主管人员产生了激烈冲突，开发主管认为项目应该继续进行并按正常程序收尾，另一名测试主管则认为该项目不应继续下去，项目经理应当采用何种冲突解决方式来提供长期解决方案？

- A.妥协/调解
- B.合作/解决问题
- C.缓和/包容
- D.强迫/命令



建设团队



在一个大型项目即将完成之际，政府颁布了一项新的法规使项目不得不暂停，因为这项法规的颁布可能会给最终产品带来严重的问题。由于项目发起人要求尽快结束该项目，两名主管人员产生了激烈冲突，开发主管认为项目应该继续进行并按正常程序收尾，另一名测试主管则认为该项目不应继续下去，项目经理应当采用何种冲突解决方式来提供长期解决方案？

- A. 妥协/调解
- B. 合作/解决问题**
- C. 缓和/包容
- D. 强迫/命令



建设团队



一个智能语音系统的研发项目正在进行中，一位干系人强烈表示希望添加一项功能，不然将不会继续合作。但是项目经理此前针对此功能已经做过市场调研了，此功能添加的必要不大。项目经理又分析了影响，添加该功能对当前项目的整体影响不大，因为该干系人态度强硬，决定还是添加该功能。请问这是哪一种冲突管理方法？

- A.合作/解决
- B.缓和/包容
- C.撤退/回避
- D.妥协/调解



建设团队



此题属于第二种，既给了冲突的场景，又说了如何处理冲突。那就根据关键词来判定属于哪一种方式。

一个智能语音系统的研发项目正在进行中，一位干系人强烈表示希望添加一项功能，不然将不会继续合作。但是项目经理此前针对此功能已经做过市场调研了，此功能添加的必要不大。项目经理又分析了影响，添加该功能对当前项目的整体影响不大，因为该干系人态度强硬，决定还是添加该功能。请问这是哪一种冲突管理方法？

- A.合作/解决
- B.缓和/包容**
- C.撤退/回避
- D.妥协/调解

com·prom·ise /'kɒmprəmaɪz/ 

1. [C] an agreement made between two people or groups in which each side gives up some of the things they want so that both sides are happy at the end 妥协; 折中; 互让; 和解



建设团队



方法——团队建设

考作用：提升士气，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境
如：士气低落，刚刚形成，成员之间不熟悉，看不惯，无法协同等等

团队建设是通过举办各种活动，**强化团队的社交关系**，打造积极合作的工作环境。团队建设活动既可以是状态审查会上的五分钟议程，也可以是为改善人际关系而设计的、在非工作场所专门举办的专业提升活动。

非正式的沟通和活动有助于建立信任和良好的工作关系。团队建设在项目**前期必不可少**，但它更是个**持续的过程**。



建设团队



玩具制造公司准备开发新的玩具，任命你为此项目的项目经理，据此，你从各个资源库调取了完成此项目的资源。此项目的团队成员之前没有合作过项目，并且无法很好的协同工作，项目经理应该怎么办？

- A.利用冲突管理的方式来解决冲突
- B.使用集中办公的方式将团队集中在一起进行工作
- C.使用沟通技术解决团队间的沟通问题
- D.开展团队建设活动强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境



建设团队



玩具制造公司准备开发新的玩具，任命你为此项目的项目经理，据此，你从各个资源库调取了完成此项目的资源。此项目的团队成员之前没有合作过项目，并且无法很好的协同工作，项目经理应该怎么办？

- A.利用冲突管理的方式来解决冲突
- B.使用集中办公的方式将团队集中在一起进行工作
- C.使用沟通技术解决团队间的沟通问题
- D.开展团队建设活动强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境**



建设团队



团队绩效评价

考法：先分析后行动

项目经理有职责关心绩效不足的成员，帮助其分析问题，完成成长

有效的团队建设策略和活动可以提高团队绩效，从而提高实现项目目标的可能性。

评价团队有效性的指标可包括：

- 个人技能的改进，从而使成员更有效地完成工作任务；
- 团队能力的改进，从而使团队成员更好地开展工作；
- 团队成员离职率的降低；
- 团队凝聚力的加强，从而使团队成员公开分享信息和经验，并互相帮助来提高项目绩效。

例如：KPI、OKR、360度评估。



建设团队



一个项目团队已经在一起很长时间了，由三位不同的项目经理领导。最近，一名团队成员的表现一直在下降，并影响了项目交付。当前项目经理应该做什么来确保团队绩效得到改善和持续？

- A.请求将新的团队成员添加到团队中
- B.组织季度团队建设活动
- C.与团队成员互动并制定发展计划
- D.与职能经理联系以更换团队成员



建设团队




一个项目团队已经在一起很长时间了，由三位不同的项目经理领导。最近，一名团队成员的表现一直在下降，并影响了项目交付。当前项目经理应该做什么来确保团队绩效得到改善和持续？

- A. 请求将新的团队成员添加到团队中
- B. 组织季度团队建设活动
- C. 与团队成员互动并制定发展计划**
- D. 与职能经理联系以更换团队成员



管理团队

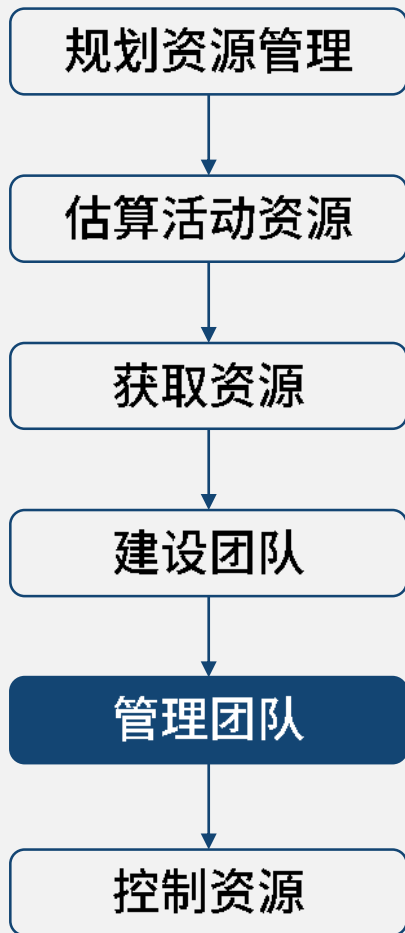

管理团队是跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。本过程的主要作用是，**影响团队行为、管理冲突以及解决问题**。本过程需要在整个项目期间开展。



管理团队

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效报告 4. 团队绩效评价 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 人际关系与团队技能 (冲突管理、情商、影响力、领导力) 2. 项目管理信息系统	1. 变更请求 2. 项目管理计划更新 3. 项目文件更新 4. 事业环境因素更新



管理团队



管理团队的基本概念

管理团队过程关注**团队资源**。包括（但不限于）：

- ①促进团队协作，创建高效团队；
- ②团队管理（运用沟通、冲突管理、谈判、领导技能）；
- ③分配有挑战性的任务，表彰优秀绩效；
- ④监督团队成员完成工作的意愿和能力，提供指导与支持；
- ⑤项目经理可以寻求职能经理的协助。



管理团队



项目经理注意到公司的一位营销主管总是显得压力很大。项目经理注意到，他的绩效正在逐渐下降，并影响到项目的可交付成果。项目经理应该做什么？

- A. 让营销主管对他们的工作和产出负责
- B. 与人力资源部（HR）一起审查主管业绩下降的情况
- C. 表现出同理心并赞扬营销主管的优势
- D. 将营销主管的任务分配给另一个项目团队成员



管理团队



项目经理注意到公司的一位营销主管总是显得压力很大。项目经理注意到，他的绩效正在逐渐下降，并影响到项目的可交付成果。项目经理应该做什么？

- A. 让营销主管对他们的工作和产出负责
- B. 与人力资源部（HR）一起审查主管业绩下降的情况**
- C. 表现出同理心并赞扬营销主管的优势
- D. 将营销主管的任务分配给另一个项目团队成员



管理团队



鼓励团队

在管理团队的过程，需要对成员进行适当地认可和鼓励，鼓励时注意“对症下药”，切合被鼓励者的需求和期望，对团队成员的激励可以是**内在的**，也可以是**是外在的**。

内在激励主要与个人内心相关，包括个人责任感、成就与挑战、对于工作的信念等，而不是关注奖励。

外在激励主要是围绕外部奖励（如奖金）进行的。

一般项目的许多工作都与内在激励相一致，一般来说团队**优先选择内在激励**。



管理团队



项目经理接管了过去几周没有项目经理的项目。团队感到迷茫，有一些团队成员对项目的下一步和最终结果感到困惑。新的项目经理应该做什么？

- A. 设定短期目标，以在内部营造一种成功的文化，并激励团队成员实现这些目标
- B. 避免冲突，让团队自行组织他们希望如何处理项目任务
- C. 要求项目发起人为团队成员提供关于结果的项目方向
- D. 将情况上报给指导委员会，并要求为该项目分配更多时间



管理团队



项目经理接管了过去几周没有项目经理的项目。团队感到迷茫，有一些团队成员对项目的下一步和最终结果感到困惑。新的项目经理应该做什么？

- A. 设定短期目标，以在内部营造一种成功的文化，并激励团队成员实现这些目标
- B. 避免冲突，让团队自行组织他们希望如何处理项目任务
- C. 要求项目发起人为团队成员提供关于结果的项目方向
- D. 将情况上报给指导委员会，并要求为该项目分配更多时间



管理团队



交付时间表非常紧张，项目接近交付日期，项目发起人经常向项目经理发送警报以避免任何进度延误，项目团队到目前为止的表现在可接受的水平，但项目经理希望确保团队的绩效水平一直保持到最后，项目经理应该采取什么行动来激励项目团队的绩效？

- A.颁发感谢证书以鼓励团队
- B.向团队成员发送正式通知，指示他们保持绩效
- C.雇用一些临时团队成员来帮助完成额外的工作
- D.告知团队来自项目发起人的交付压力



管理团队




交付时间表非常紧张，项目接近交付日期，项目发起人经常向项目经理发送警报以避免任何进度延误，项目团队到目前为止的表现在可接受的水平，但项目经理希望确保团队的绩效水平一直保持到最后，项目经理应该采取什么行动来激励项目团队的绩效？

- A.颁发感谢证书以鼓励团队
- B.向团队成员发送正式通知，指示他们保持绩效
- C.雇用一些临时团队成员来帮助完成额外的工作
- D.告知团队来自项目发起人的交付压力



控制资源

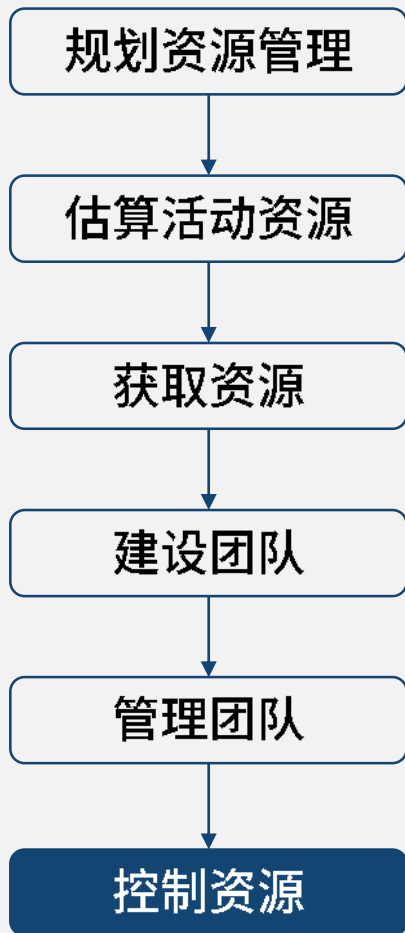

控制资源是确保按计划为项目分配**实物资源**，以及根据资源使用计划监督资源实际使用情况，并采取必要纠正措施的过程。本过程的主要作用是，确保所分配的**资源适时适地可用于项目**，且在不再需要时被释放。


本过程需要在整个项目期间开展。



本章小结



知识点总结

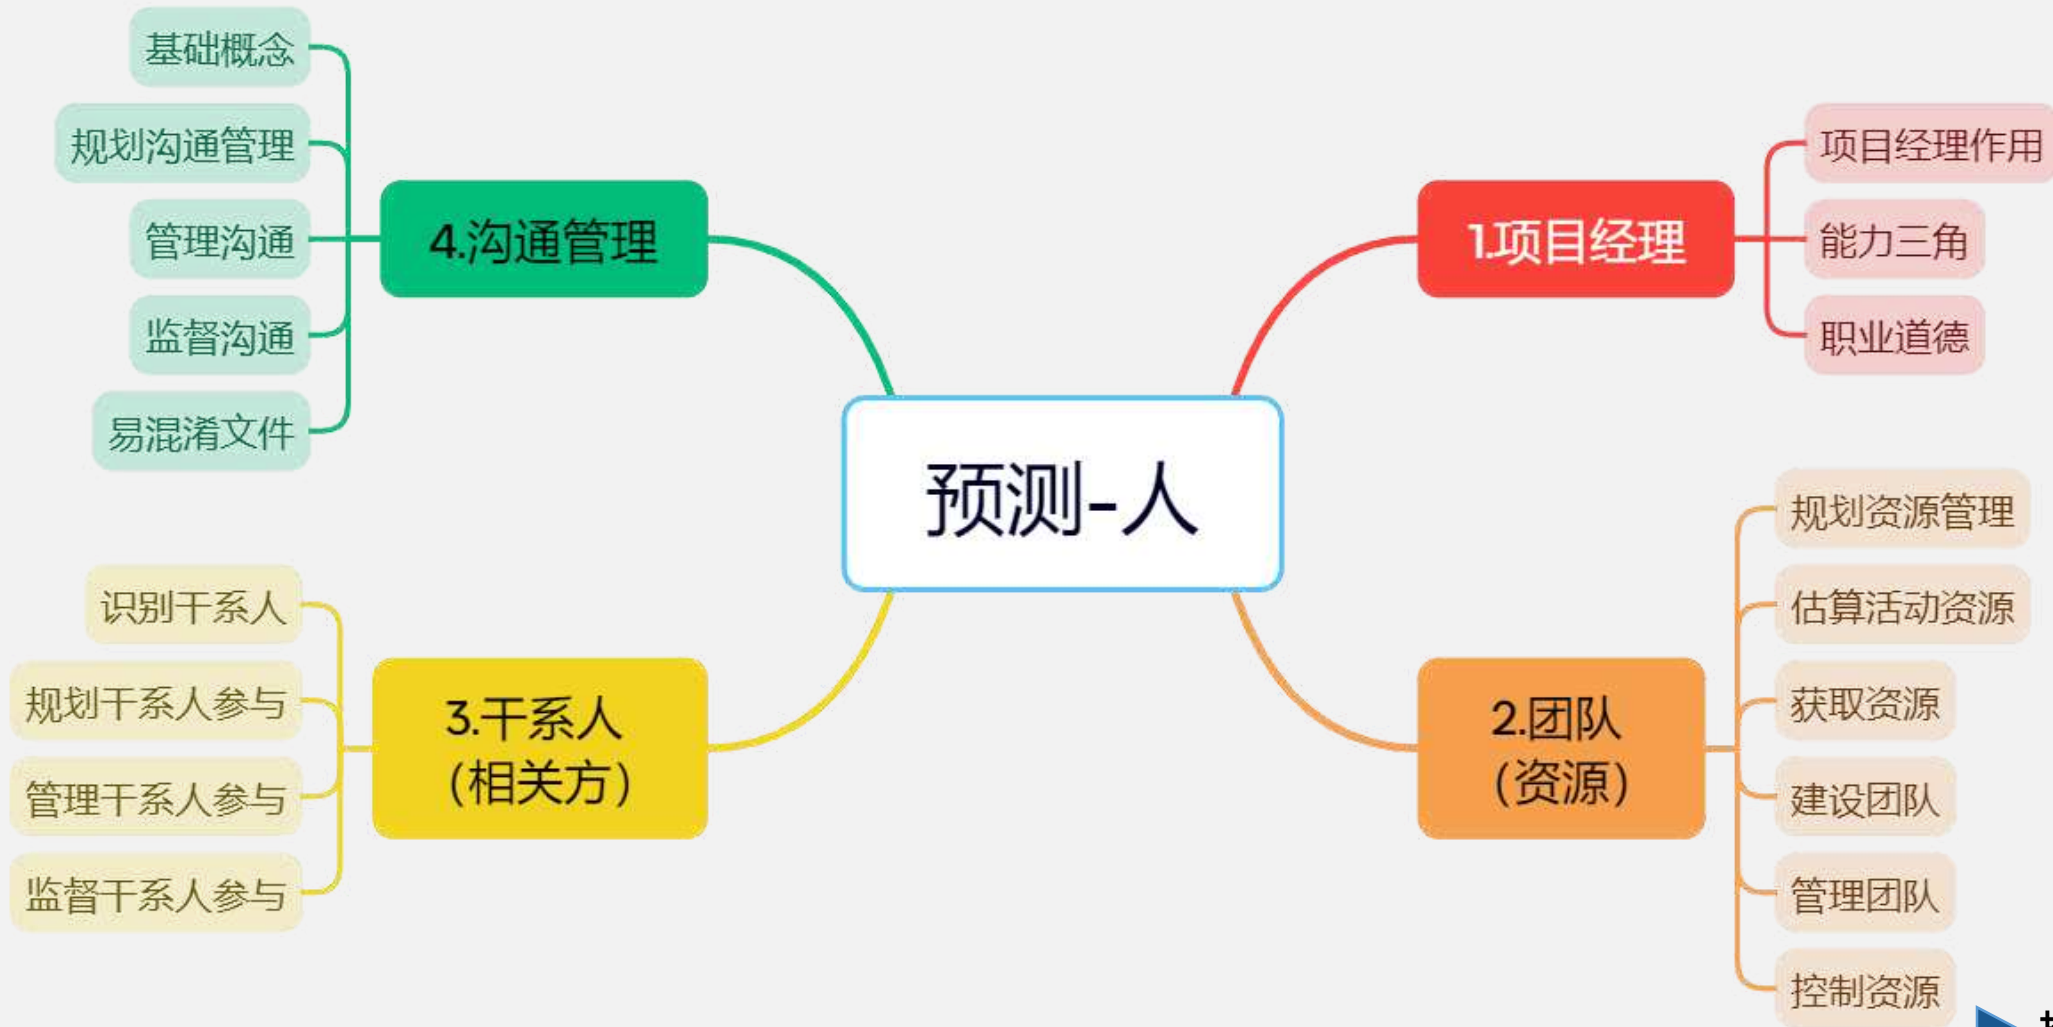



本章小结



人-团队

规划资源管理

组织理论

层级型

几种分解结构的区别：WBS/OBS/RBS

责任分配矩阵

团队成员的角色职责不明，分工不清用RAM，内部外部适用RACI

文本型

资源管理计划

资源管理计划的内容和作用

资源管理的纲领性文件

团队章程

价值观、处事规则、问题解决流程的共识

估算活动资源

资源日历

资源日历了解组织成员可用性，项目日历确定整个项目中的节假日和公休

获取资源

决策

多标准决策分析

预分派

在项目开始之前就已经由高层分配到项目上的资源

谈判

通过与职能经理、其他项目经理或供应商谈判（协商）来获取资源，先内后外



人-团队

建设团队

定义 促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程

团队建设的五阶段
(塔克曼阶梯理论)

形成：明确团队成员的角色和职责（指导型）；震荡：产生矛盾冲突（教练型）；规范：尝试去解决问题，协同工作（参与型）；成熟：像成熟的单位有序地运作，高效完成工作（授权型）；解散：项目结束，团队解散

集中办公和虚拟团队

集中办公方便高效沟通

虚拟团队解决地理位置不同

激励

认可与奖励

有形奖励和无形奖励

激励理论

需求层次理论、X-Y理论、双因素理论等——击中对方的需求！

培训

成员能力不足，缺乏知识，技能不足，不能放弃，需要培训

情商

人的情绪品质和对社会的适应能力，包括个人情感和他人情感

冲突管理

冲突管理的定义

当成员间发生分歧或冲突时，应该使用冲突管理技能使他们达成一致意见

五种冲突解决办法

撤退/回避、缓和/包容、妥协/调解、强迫/命令、合作/解决问题（优选达成一致）

团队建设

提升团队士气，强化团队的社交关系，打造积极合作的工作环境

输出-团队绩效评价

项目经理有职责关心绩效不足的成员，帮助其分析问题，完成成长

管理团队

基本概念

促进团队协作，整合团队成员的工作，从而创建高效团队

控制资源


基本概念

控制资源过程关注实物资源，例如设备、材料、设施和基础设施。管理团队过程关注团队成员

问题解决流程

先分析，后行动

拓展补充



(=) 希赛 | 感谢您的观看
