

PMP项目管理

《第06章 过程-需求与范围》

范围就是项目到底应该做什么？范围≠需求

需求：客户想要的。范围：项目团队要做的。



想一想



请问以下几种情况，哪一种是项目中最期望看到的？

- A.该做的事情没做完
- B.该做的事情没做完，但是做了很多其他的事情
- C.该做的事情做完了，没有做额外的工作
- D.该做的事情做完了，还做了很多其他的工作




范围管理的内涵



范围管理的步骤

项目范围管理

包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。

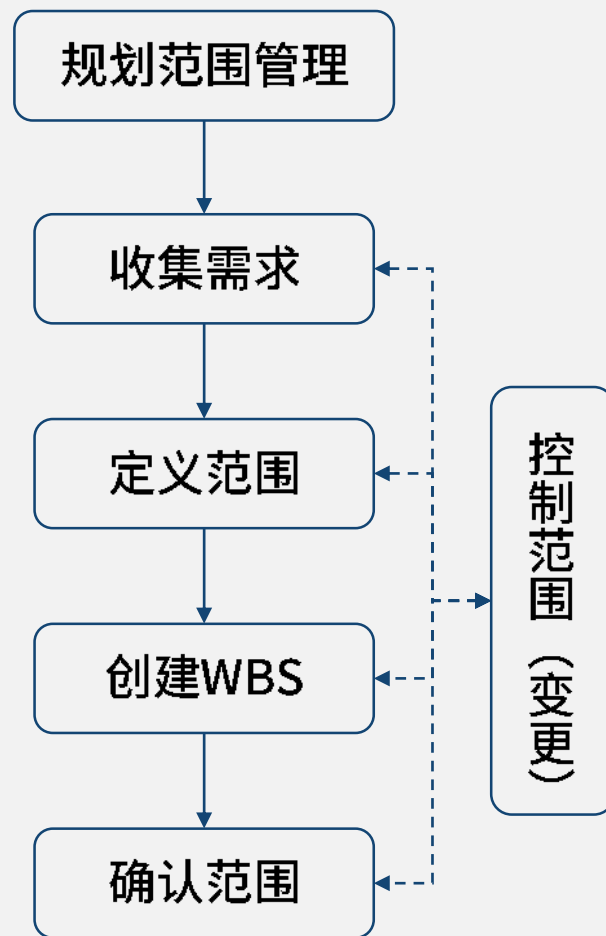




范围管理的内涵




项目环境中“范围”的两种含义

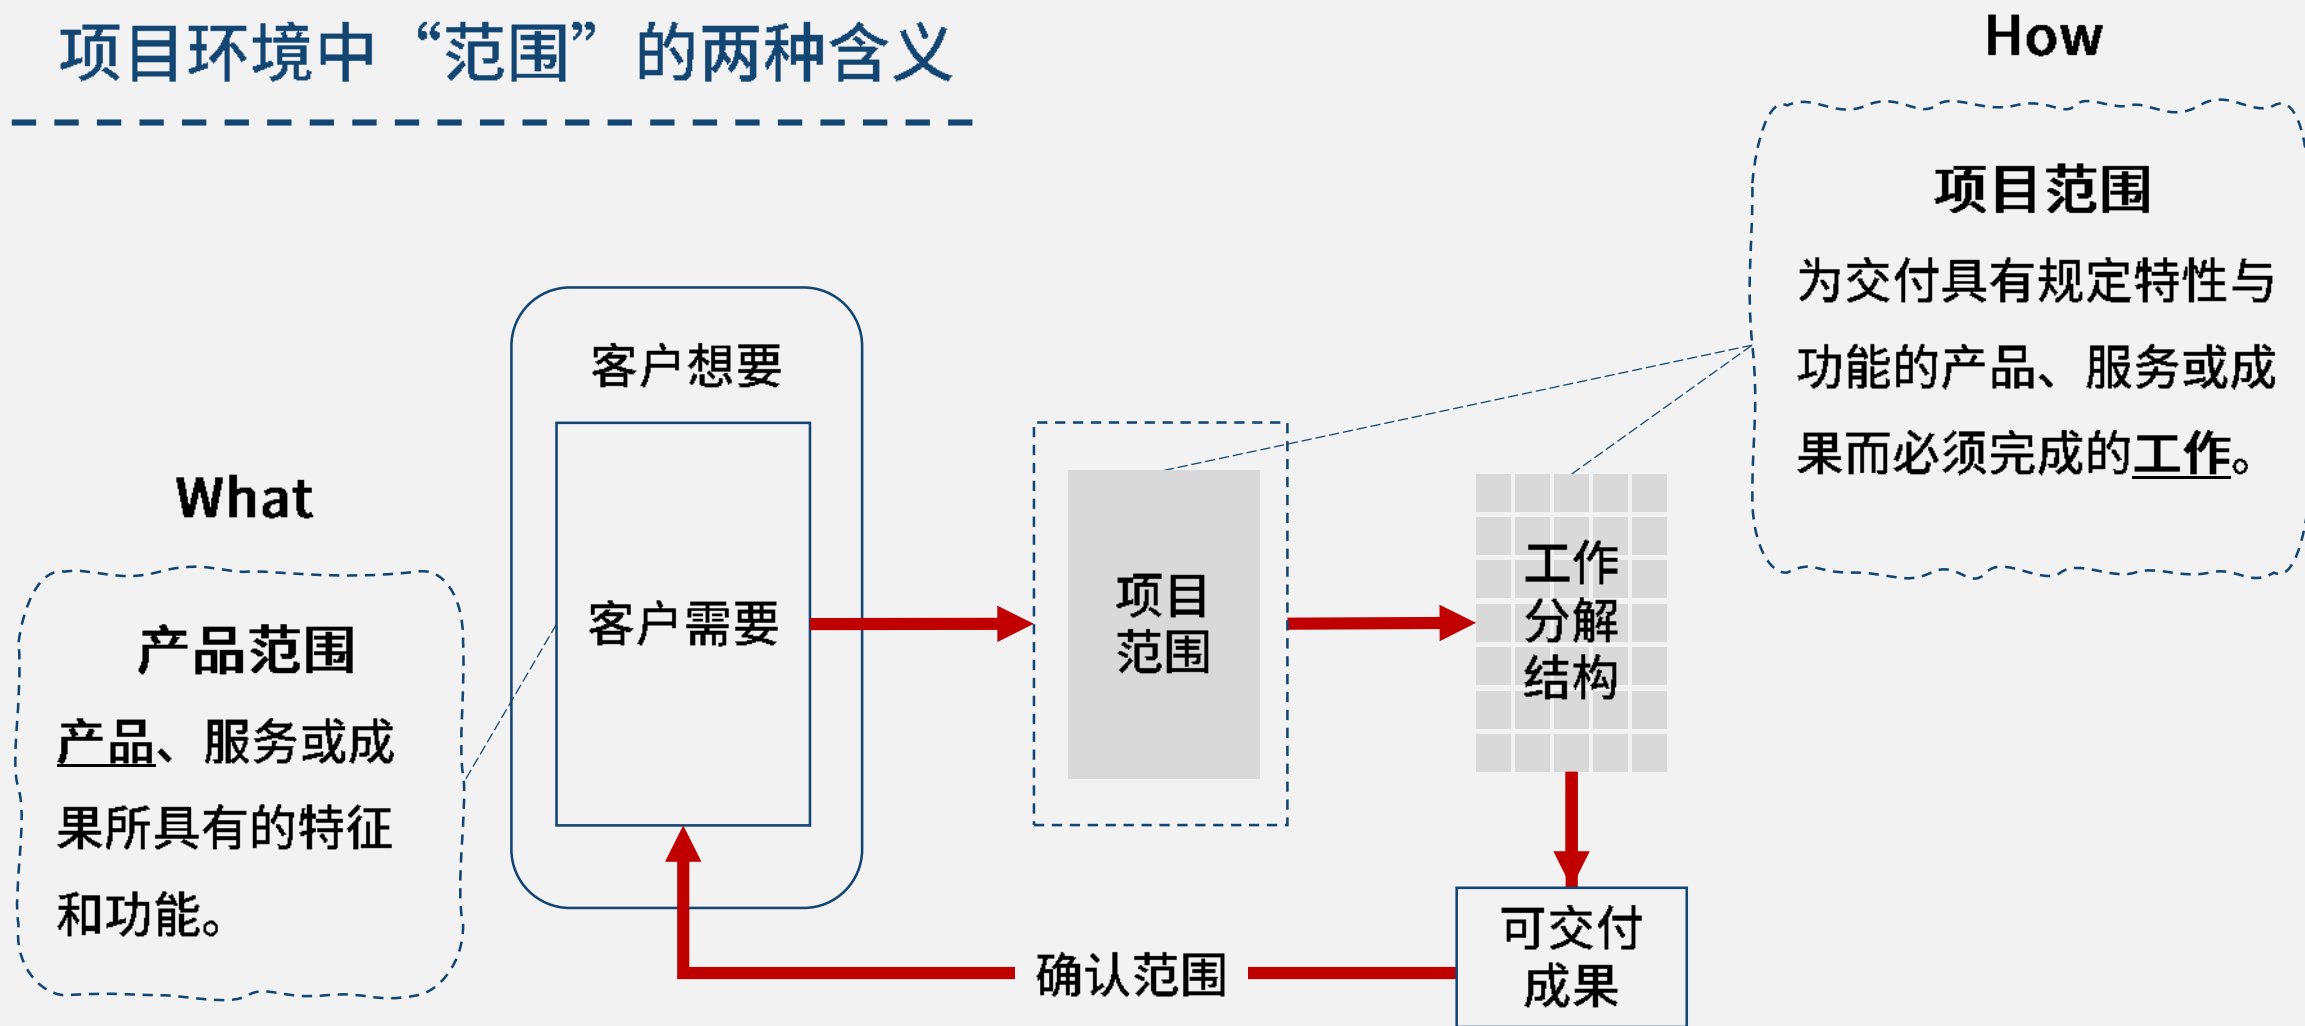



规划范围管理

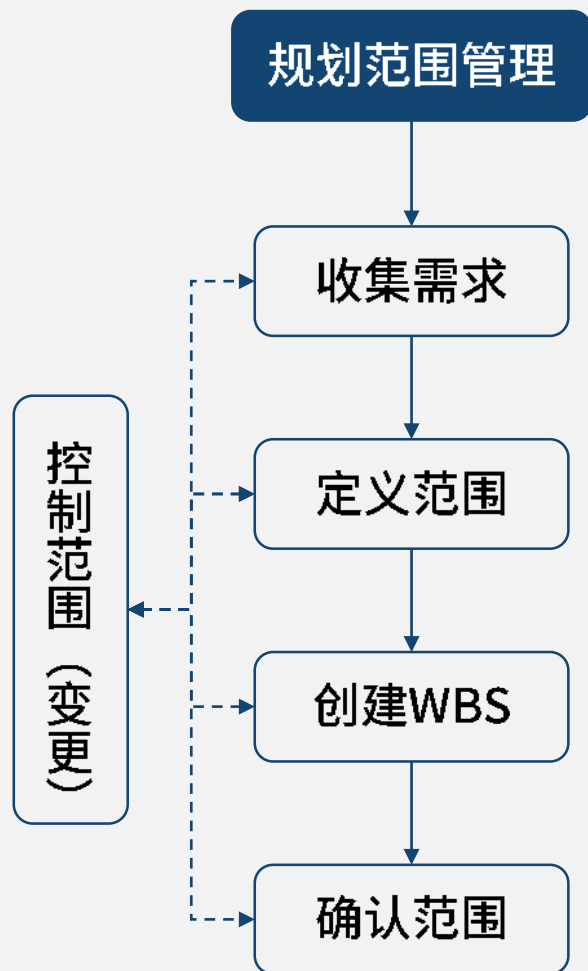

规划范围管理是为记录如何定义、确认和控制项目范围及产品范围，而创建范围管理计划的过程。本过程的主要作用是，在整个项目期间对如何管理范围提供**指南和方向**。

本过程**仅开展一次**或仅在项目的预定义点开展。



规划范围管理



注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背





规划范围管理



规划范围管理的输出文件

需求管理计划

How to do!

需求 → 产品 → 工作

范围管理计划



规划范围管理



工件——需求与范围管理计划

How to do!

<u>需求</u> 管理计划	<u>范围</u> 管理计划
1、如何规划、跟踪和报告各种<u>需求</u>活动； 2、配置管理活动，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及<u>变更审批</u>权限； 3、<u>需求优先级</u>排序过程； 4、测量<u>指标</u>及使用这些指标的理由； 5、反映哪些<u>需求属性</u>将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。	1、制定项目<u>范围</u>说明书； 2、根据详细项目<u>范围</u>说明书创建 WBS； 3、确定如何审批和维护<u>范围</u>基准； 4、正式验收已完成的项目<u>可交付成果</u>。
也称作“商业分析计划”，描述将如何分析、记录和管理项目和 <u>产品需求</u> 。	描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。



规划范围管理



一个实施企业资源规划（ERP）软件的项目已经完成。项目经理希望将可交付成果的所有权移交给 IT 部门。为确保可交付成果的验收，项目经理应查阅哪一份文件？

- A. 范围管理计划
- B. 需求管理计划
- C. 需求文件
- D. 项目章程



规划范围管理




一个实施企业资源规划（ERP）软件的项目已经完成。项目经理希望将可交付成果的所有权移交给 IT 部门。为确保**可交付成果的验收**，项目经理应查阅哪一份文件？

- A.范围管理计划
- B.需求管理计划
- C.需求文件
- D.项目章程



收集需求

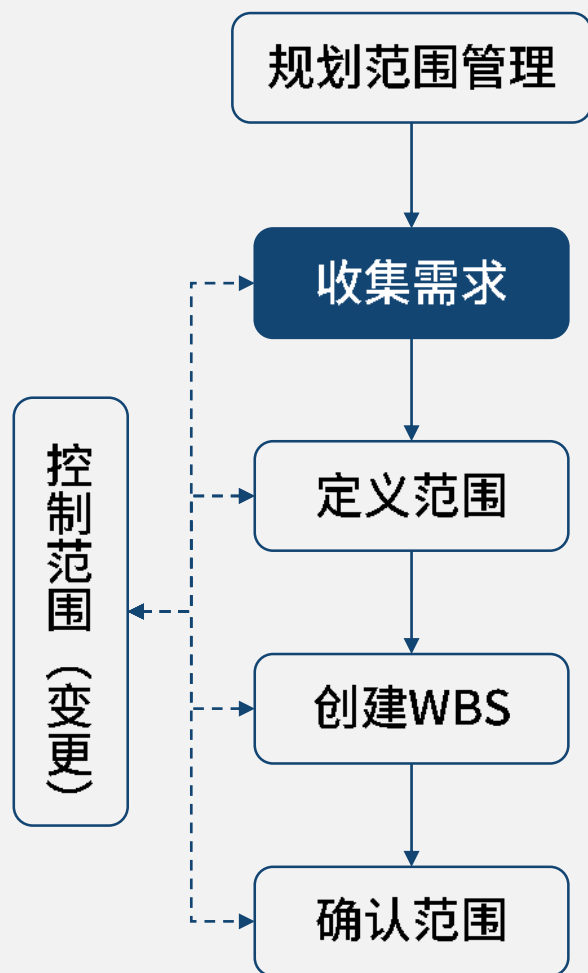

收集需求是为实现目标而确定、记录并管理相关方的需要和需求的过程。本过程的主要作用是，**为定义**产品范围和项目范围**奠定基础**，且**仅开展一次**或仅在项目的预定义点开展。



收集需求

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背


输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 商业文件 5. 协议 6. 事业环境因素 7. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据收集 (头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照、德尔菲法) 3. 数据分析 (文件分析) 4. 决策 (投票、多标准决策分析) 5. 数据表现 (亲和图、思维导图) 6. 人际关系与团队技能 (名义小组技术、观察/交谈、引导) 7. 系统交互图 8. 原型法	1. 需求文件 2. 需求跟踪矩阵



收集需求



方法——数据收集

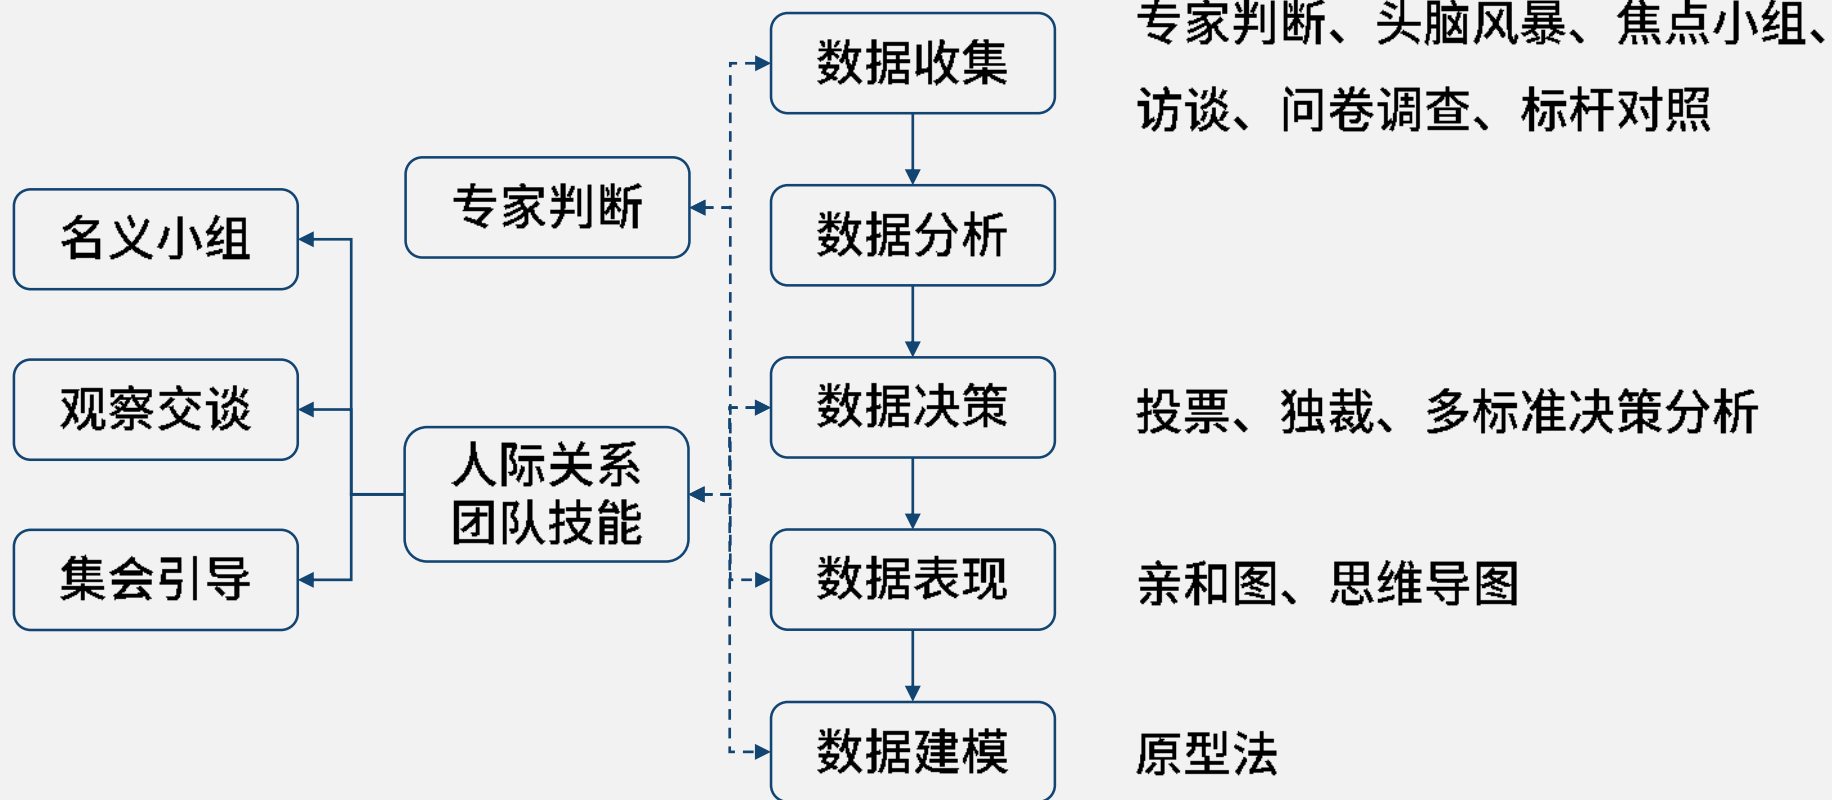




收集需求的技术




方法——数据收集

关键词：创新创意、天马行空、集思广益
追求数量、多多益善、大胆假设、不做评判

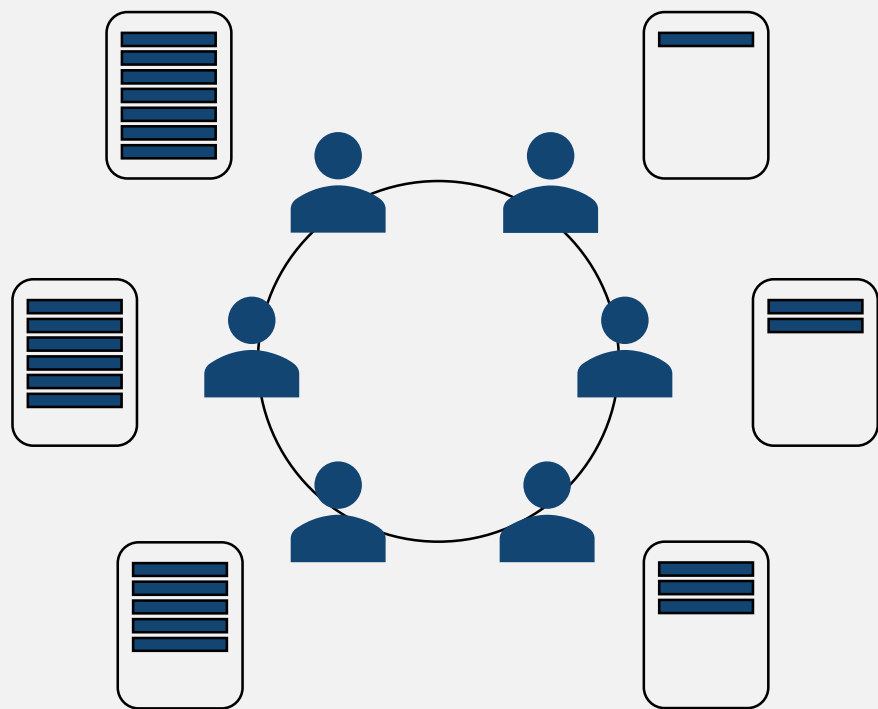

头脑风暴

关键词：投票、排序

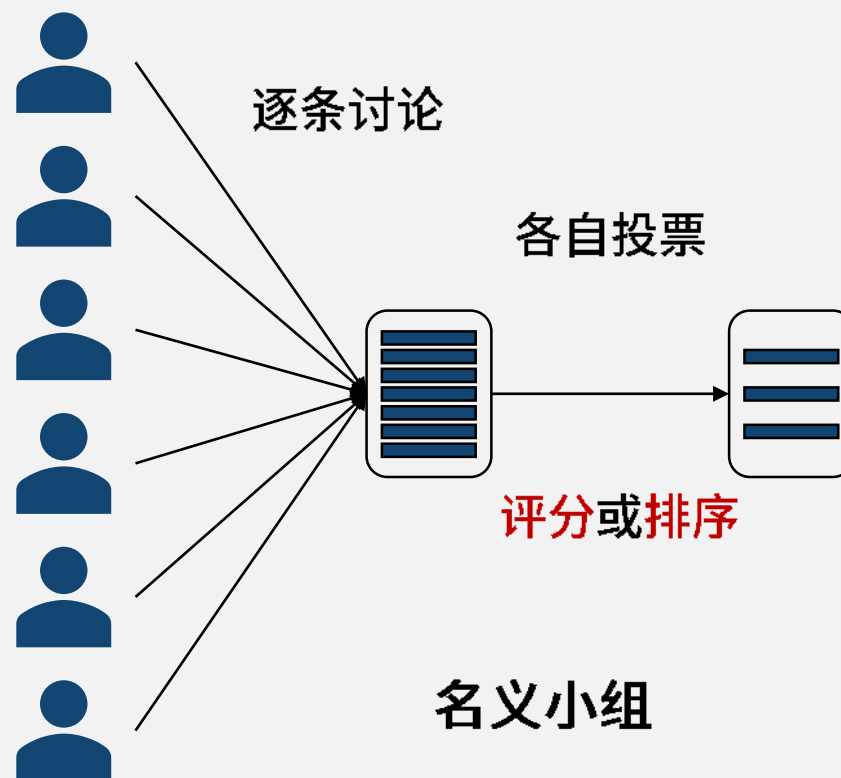




收集需求的技术




方法——数据收集

关键词：机密、隐私、保密
收集准确、真实不带偏见的信息



访谈
(鲁豫有约)

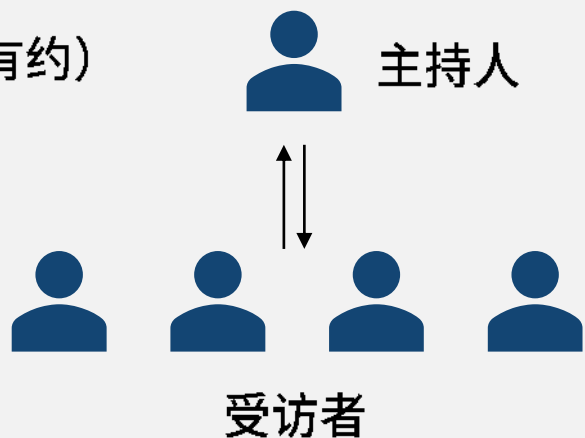


关键词：主持人、围绕焦点讨论

聚焦
观察

焦点小组

- 1、**开放式**提问开始主题；
封闭式提问确认观点；
- 2、确保所有人参与；
- 3、总结信息。

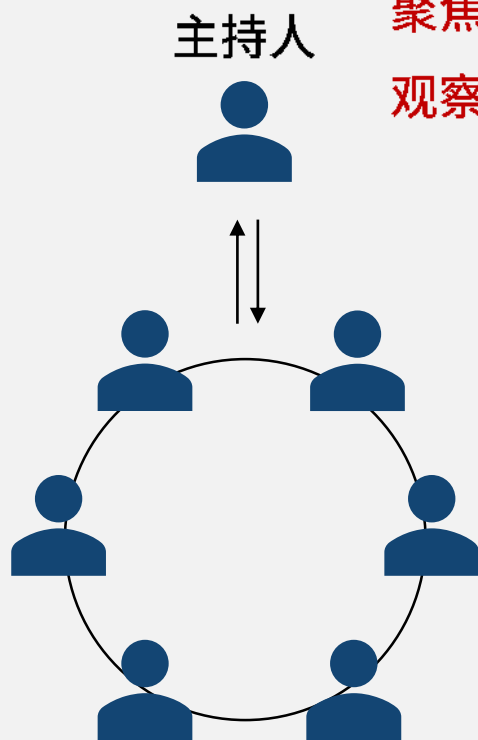



收集需求的技术



方法——数据收集

关键词：地理位置分散、
受访者比较多、快速收集

问卷调查

关键词：匿名，避免光环效应，保持客观公正
多轮，是为了趋向一致，达成一致






收集需求的技术



方法——标杆对照

关键词：参考，借鉴

标杆对照是将实际或计划的项目实践或项目的质量标准与可比项目的实践进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。标杆对照也允许用不同应用领域或行业的项目做类比。

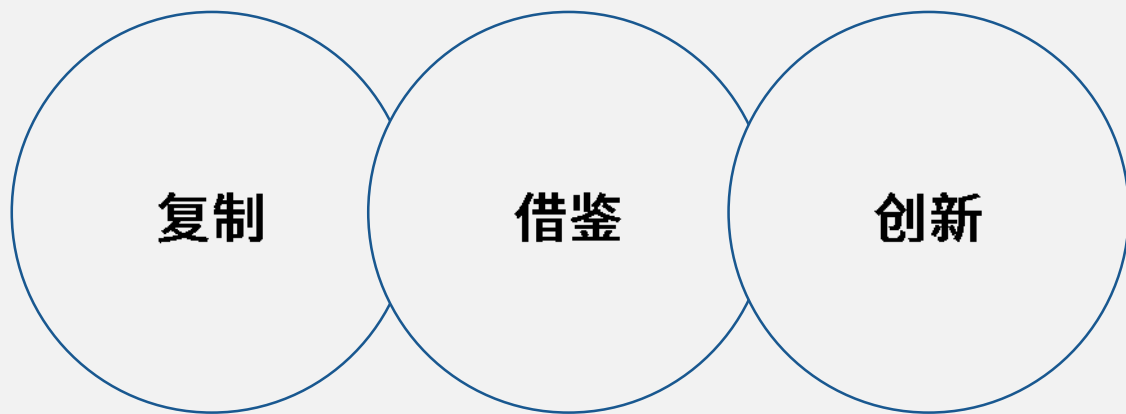



收集需求的技术



关键词：找有经验的人获取一些意见想法，拍脑袋
万金油工具，哪都能用，哪都不聚焦，非首选！

方法——专家判断

知识领域	管理过程
项目整合管理	制定项目章程、制定项目管理计划、指导与管理项目工作、管理项目知识、监控项目工作、实施整体变更控制、结束项目或阶段
项目范围管理	规划范围管理、收集需求、定义范围、创建WBS
项目进度管理	规划进度管理、定义活动、估算活动持续时间
项目成本管理	规划成本管理、估算成本、制定预算、控制成本
项目质量管理	规划质量管理
项目资源管理	规划资源管理、估算活动资源
项目沟通管理	规划沟通管理、监督沟通
项目风险管理	规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对、实施风险应对
项目采购管理	规划采购管理、实施采购、控制采购
项目相关方管理	识别相关方、规划相关方参与、管理相关方参与

专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的**专业知识**而做出的，关于当前活动的**合理判断**，这些专业知识可来自具有专业学历、知识、技能、经验或培训经历的任何小组或个人。在PMBOK指南中，专家判断作为一种方法与技术，用在35个管理过程中。



收集需求的技术



方法——数据收集

考法：给出情景，让你选适用哪种方法



方法	适用情况
头脑风暴法	用来产生和收集对项目需求与产品需求的 <u>多种创意</u> 的一种技术。
名义小组	用于促进头脑风暴的一种技术，通过 <u>投票排列</u> 最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴或优先排序。
访谈	通过直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。 访谈经常是 <u>“一对一”</u> ，也可以是 <u>“一对多”</u> 访谈。访谈也可用于获取 <u>机密信息</u> 。
焦点小组	由一位受过训练的 <u>主持人引导</u> 大家进行 <u>互动式讨论</u> 。焦点小组往往比“一对一”的访谈 <u>更热烈</u> 。



收集需求的技术



方法——数据收集



方法	适用情况
问卷调查	<u>受众多样化</u> ，需要 <u>快速完成</u> 调查，受访者 <u>地理位置分散</u> ，并且适合开展统计分析。
德尔菲技术	由一组选定的 <u>专家回答问卷</u> ，并对每一轮需求收集的结果再给出反馈，以期达成共识。 专家的答复只能交给主持人，以保持 <u>匿名状态</u> 。
标杆对照	将实际或计划的产品、过程和实践，与其他可比组织的实践进行比较，以便识别最佳实践。
专家判断	专家判断是指基于某应用领域、知识领域、学科和行业等的 <u>专业知识</u> 而做出的，关于当前活动的 <u>合理判断</u> 。





收集需求的技术



相关方识别工作已完成，并且相关方位于许多不同国家，项目经理需要基于项目章程中确定的高层级需求所提出的详细需求。为了快速从这些相关方收集信息，应采用的最佳数据收集技术是哪一项？

- A.与各相关方召开单独的会议
- B.与相关方召开Web会议
- C.焦点小组会议
- D.调查（即问卷调查）



收集需求的技术



相关方识别工作已完成，并且相关方位于**许多不同国家**，项目经理需要基于项目章程中确定的高层级需求所提出的**详细需求**。为了**快速**从这些相关方收集信息，应采用的最佳数据收集技术是哪一项？

- A. 与各相关方召开单独的会议
- B. 与相关方召开Web会议
- C. 焦点小组会议
- D. 调查（即问卷调查）



收集需求的技术



项目经理首次负责一个多阶段的项目，一个阶段完成后才能开始下一个阶段。在定义范围时，项目经理遇到了一些障碍。项目经理应该如何解决？

- A.与关键相关方讨论以获得建议
- B.将定义范围作为一个工作包外包给供应商
- C.在进度计划中预留额外的定义范围的时间
- D.在范围明确之前，不去确定项目的最终交付日期



收集需求的技术



项目经理首次负责一个多阶段的项目，一个阶段完成后才能开始下一个阶段。在定义范围时，项目经理遇到了一些障碍。项目经理应该如何解决？

- A.与关键相关方讨论以获得建议
- B.将定义范围作为一个工作包外包给供应商
- C.在进度计划中预留额外的定义范围的时间
- D.在范围明确之前，不去确定项目的最终交付日期



收集需求的技术



一家汽车制造厂商想要开拓新领域，高层管理人员决定制造公司的第一款无人驾驶新能源汽车。但项目团队成员缺乏无人驾驶新能源汽车领域的知识，不知道如何定义和控制该款汽车的性能。若要确保该款汽车的性能，项目经理应该怎么做？

- A.专家判断
- B.更新质量管理计划
- C.问卷调查
- D.执行标杆对照



收集需求的技术



一家汽车制造厂商想要开拓新领域，高层管理人员决定制造公司的第一款无人驾驶新能源汽车。但项目团队成员**缺乏**无人驾驶新能源汽车**领域的知识**，不知道如何定义和控制该款汽车的性能。若要确保该款汽车的性能，项目经理应该怎么做？

- A.专家判断
- B.更新质量管理计划
- C.问卷调查
- D.执行标杆对照**



收集需求的技术



方法——数据决策技术

决策方法	解释
投票	为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的集体决策技术和过程。本技术用于生成、归类 and 排序产品需求。常见：一致同意、大多数原则、相对多数原则。
独裁	某一个人负责为整个集体制定决策。必要时可起到 高效决策 作用。
多标准决策	该技术借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，以对众多创意进行评估和排序。




收集需求的技术




方法——数据表现

头脑风暴

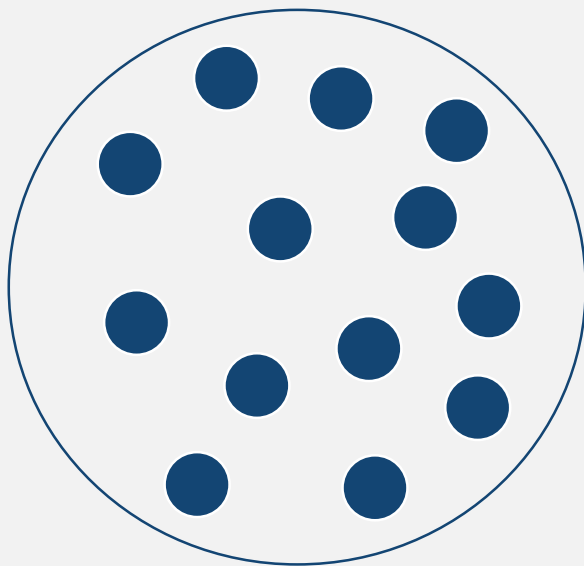


亲和图

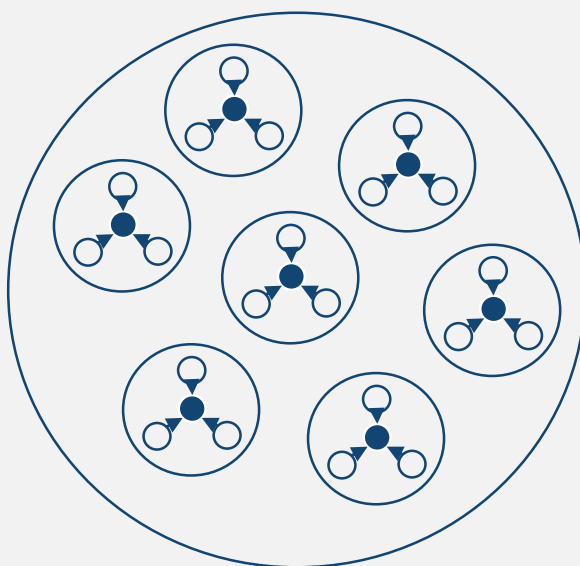

关键词：聚类、分类

思维导图

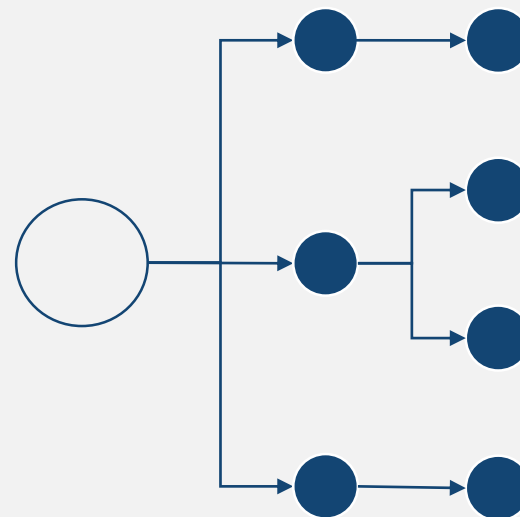

关键词：逻辑梳理



收集需求的技术



方法——数据建模

考法：作用——收集对需求的早期反馈

原型法

原型法是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的模型，并据此征求对需求的早期反馈。原型包括微缩产品、计算机生成的二维和三维模型、实体模型或模拟。

原型法支持渐进明细的理念。





收集需求的技术



公司一直专注传统工业化制造领域20年，业绩一直无法突破1亿。最近公司决定进军新型产品市场，进行平台布局，但公司没有新型产品市场技术研发的相关资源，更不要说对应的经验。项目经理应使用什么工具或技术来收集需求？

- A.原型法
- B.专家判断
- C.鱼骨图
- D.德尔菲技术



收集需求的技术



公司一直专注传统工业化制造领域20年，业绩一直无法突破1亿。最近公司决定进军新型产品市场，进行平台布局，但公司**没有**新型产品市场技术研发的**相关资源**，更不要说对应的经验。项目经理应使用什么工具或技术来收集需求？

- A.原型法
- B.专家判断
- C.鱼骨图
- D.德尔菲技术




收集需求的技术



方法——人际关系和团队技能

引导的作用：侧重达成一致达成共识，有分歧注意不站队

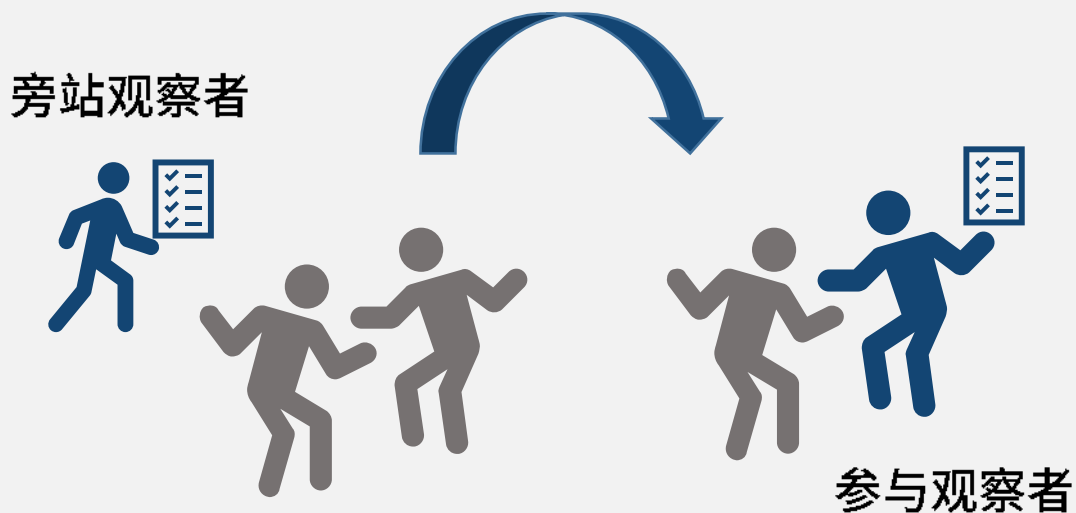

观察：也称为“工作跟随”，当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时适用。



引导：引导与主题研讨会结合使用，把主要相关方召集在一起定义产品需求。研讨会可用于快速定义跨职能需求并协调相关方的需求差异。与分别召开会议相比，研讨会能够更早发现并解决问题。



收集需求的技术



项目经理管理一个复杂项目，项目团队正在与相关方沟通，以对项目的范围达成共识，相关方对项目管理报告和文件是否包含始终未定，难以明确项目中需要达到的需要。为明确范围的详细描述，项目经理应该怎么做？

- A.协调具有不同期望的关键相关方，使得他们对项目的边界达成共识
- B.制定变更管理计划，以便后续变更的处理
- C.组织团队进行收集需求，记录并管理相关方的需要
- D.由团队内部成员确定需求后，与客户进行沟通



收集需求的技术



项目经理管理一个复杂项目，项目团队正在与相关方沟通，以对项目的范围达成共识，相关方对项目管理报告和文件**是否包含始终未定**，难以明确项目中需要达到的需要。为**明确范围**的详细描述，项目经理应该怎么做？


- A.协调具有不同期望的关键相关方，使得他们对项目的边界达成共识
- B.制定变更管理计划，以便后续变更的处理
- C.组织团队进行收集需求，记录并管理相关方的需要
- D.由团队内部成员确定需求后，与客户进行沟通



收集需求



收集需求的工件

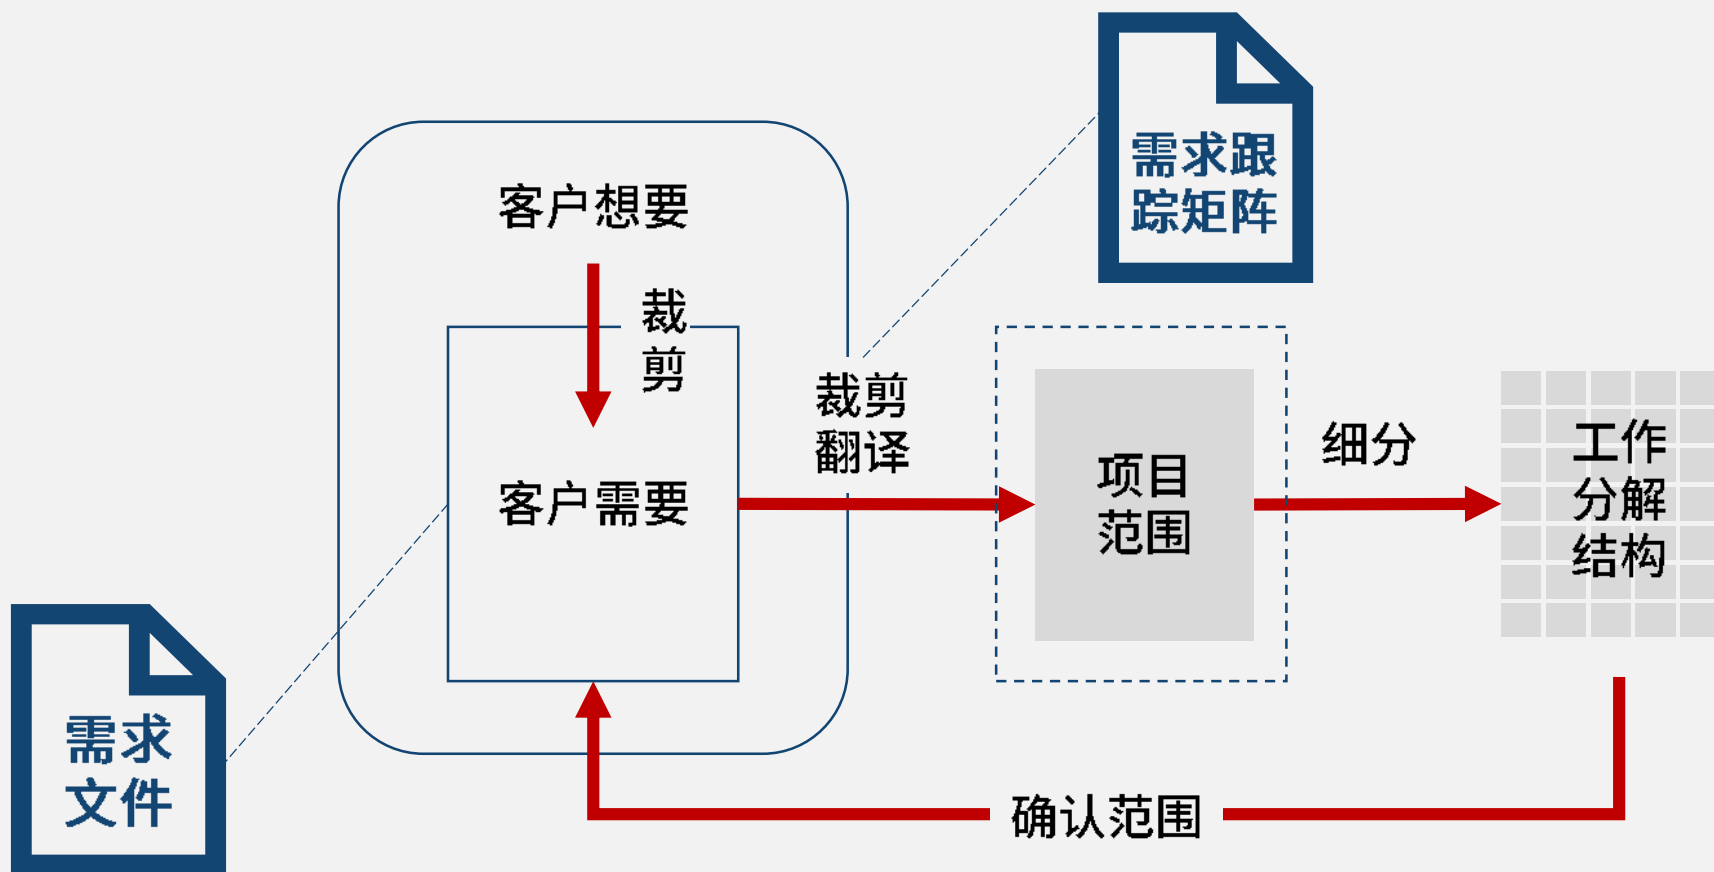




收集需求



工件——需求文件

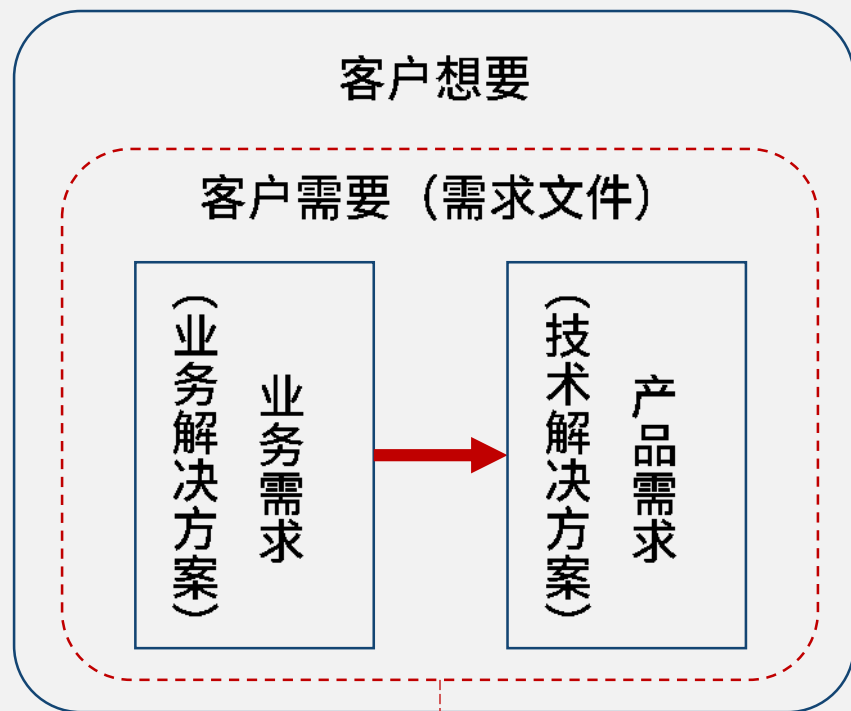

被认可的需求具有基准作用

需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。只有明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要相关方愿意认可的需求，才能作为基准。

需求可以分为业务解决方案和技术解决方案。前者是相关方的需要，后者是指如何实现这些需要。

需求的类别包括：

业务需求、相关方需求、解决方案需求（功能需求+非功能需求）、过渡和就绪需求、项目需求、质量需求等。



收集需求



工件——需求文件

SMART原则

Specific 具体的

Measurable 可衡量

Attainable 可达到

Relevant 相关性

Time-bound 截止期限

编号	需求	相关方	分类	排序	验收标准	测试或确认方法	阶段或发布时间
1							
2							
3							



收集需求



公司启动了一个预算为300万的软件产品开发项目，项目经理识别项目相关方后，发现该项目的相关方来自不同的部门。项目经理在收集需求的会议中发现某些相关方提出了价值500万的需求，项目经理应该怎么做？

- A.记录需要澄清和分析的所有需求
- B.提交变更请求并分析影响
- C.在项目范围说明书中包含所有的需求
- D.更新相关方登记册以包含这些需求



收集需求



公司启动了一个**预算为300万**的软件产品开发项目，项目经理识别项目相关方后，发现该项目的相关方来自不同的部门。项目经理在收集需求的会议中发现某些相关方提出了**价值500万的需求**，项目经理应该怎么做？


- A.记录需要澄清和分析的所有需求
- B.提交变更请求并分析影响
- C.在项目范围说明书中包含所有的需求
- D.更新相关方登记册以包含这些需求



收集需求



工件——需求跟踪矩阵

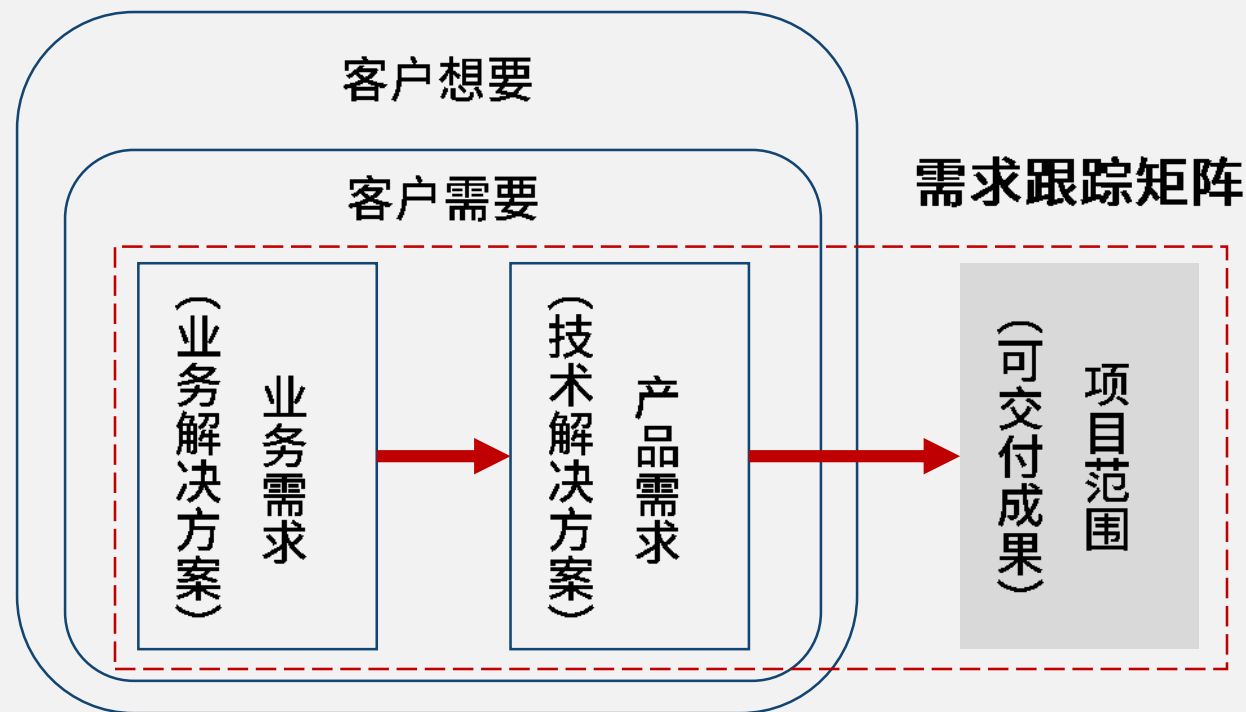

把**产品需求**从其来源连接到能满足需求的**可交付成果**的一种表格。

提供了在整个项目生命周期中**跟踪需求**的一种方法，有助于确保需求文件中被批准的每项需求在项目结束的时候都能交付。

最后，需求跟踪矩阵还为**管理产品范围变更**提供了框架。



收集需求



考作用：出现要求/需求/期望和可交付成果不一致，首选审查它。

和需求文件的区别：一个仅需求，一个是需求和可交付成果桥梁

工件——需求跟踪矩阵

需求跟踪矩阵								
项目名称								
成本中心								
项目描述								
标识	关联标识	需求描述	业务需要、机会、目的和目标	项目目标	WBS可交付成果	产品设计	产品开发	测试案例
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							

需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性，包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态（如进行中、已取消、已推迟、新增加、已批准、被分配和已完成）和状态日期。



收集需求



项目经理为某公司开发一个人脸识别系统，在项目评审会议期间，项目经理向客户展示了该人脸识别系统的模型，客户认为该识别系统未达到精准识别的要求，要求使用更高级别的技术来进行升级。项目经理若要避免这个问题，事先怎么做？

- A.完成项目管理计划
- B.制定详细的范围说明书
- C.创建需求跟踪矩阵
- D.识别项目相关方



收集需求




项目经理为某公司开发一个人脸识别系统，在项目评审会议期间，项目经理向客户展示了该人脸识别系统的模型，客户认为该识别系统**未达到精准识别**的要求，要求使用更高级别的技术来进行升级。项目经理若要避免这个问题，**事先**怎么做？

- A.完成项目管理计划
- B.制定详细的范围说明书
- C.创建需求跟踪矩阵**
- D.识别项目相关方



定义范围

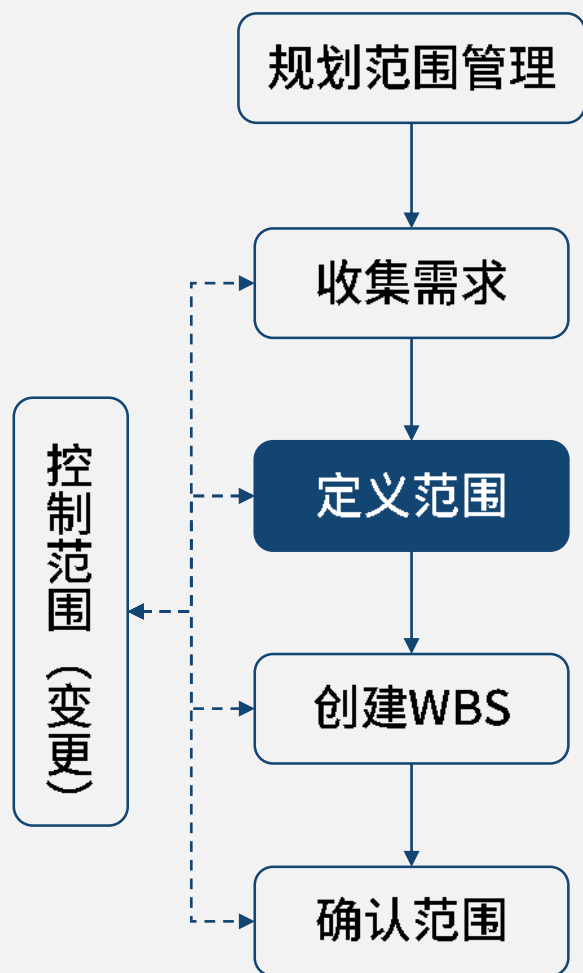

定义范围是制定**项目和产品详细描述**的过程。本过程的主要作用是，描述产品、服务或成果的边界和验收标准。



定义范围

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1.项目章程 2.项目管理计划 3.项目文件 4.事业环境因素 5.组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 (备选方案分析) 3. 决策 (多标准决策分析) 4. 人际关系与团队技能 (引导) 5. 产品分析	1. 项目范围说明书 2. 项目文件更新




定义范围



工件——范围说明书

需求：客户想要的
范围：项目团队要做的
范围来自于需求，范围 $\neq$ 需求

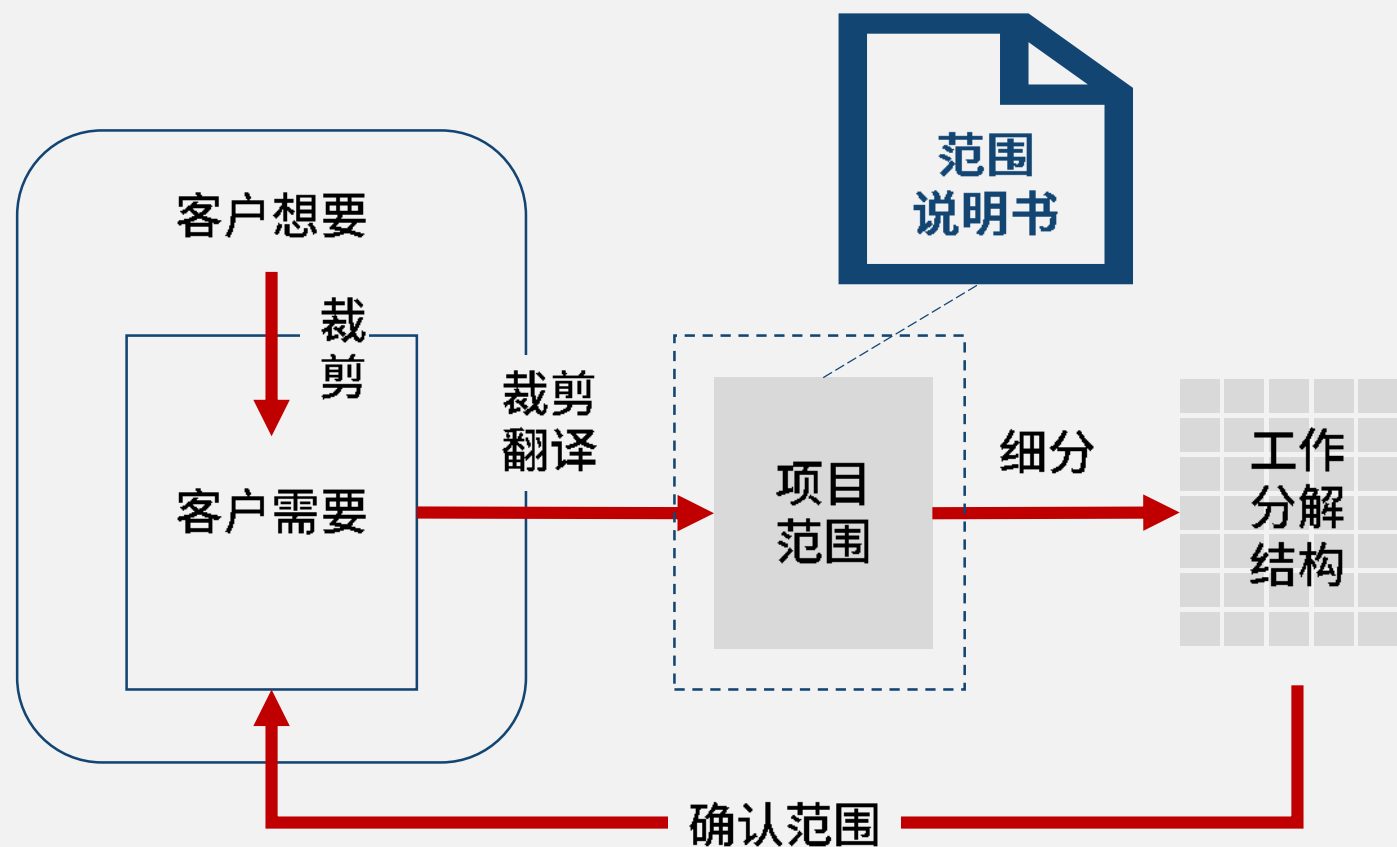

定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。

定义范围过程要从《需求文件》中选取最终的项目需求，然后制定出关于项目及其产品、服务或成果的边界和验收标准。



定义范围

考内容：常考可交付成果和验收标准
考作用：1、初步定义了项目范围的边界
2、后期验收的参考文件



工件——范围说明书

总结：需求文件（头）—需求跟踪矩阵（桥梁）—范围说明书（尾）

详细的项目范围说明书包括以下内容：

- 1、产品范围描述：逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果的特征。
- 2、**可交付成果**：可交付成果既包括组成项目产品或服务各种结果，也包括各种辅助成果，例如，项目管理报告和文件。对可交付成果的描述可详可略。
- 3、**验收标准**：可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件。
- 4、项目的除外责任：识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理相关方的期望及减少范围蔓延。



定义范围



工件——范围说明书

项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程度完全不同。

项目章程	项目范围说明书
项目目的	项目范围描述（渐进明细）
可测量的项目目标和相关的成功标准	项目可交付成果
高层级需求	验收标准
高层级项目描述、边界定义	项目排除项
主要可交付成果	
总体里程碑进度计划	
.....	



定义范围



项目的第一个可交付成果已经准备就绪，项目经理邀请相关方进行审批，其中一名相关方表示一些需求并未实施，拒绝验收。然而项目经理认为相关方的需求超出了项目范围。项目经理首先应该怎么做？

- A.与利益相关者一起审查质量管理计划
- B.接受利益相关者的立场并实施要求
- C.对来自利益相关者的新要求应用变更控制流程
- D.与干系人一起审查项目范围说明书的项目排除部分



定义范围




项目的第一个可交付成果已经准备就绪，项目经理邀请相关方进行审批，其中一名相关方表示一些需求并未实施，拒绝验收。然而项目经理认为相关方的需求超出了项目范围。项目经理首先应该怎么做？

- A.与利益相关者一起审查质量管理计划
- B.接受利益相关者的立场并实施要求
- C.对来自利益相关者的新要求应用变更控制流程
- D.与干系人一起审查项目范围说明书的项目排除部分



创建WBS

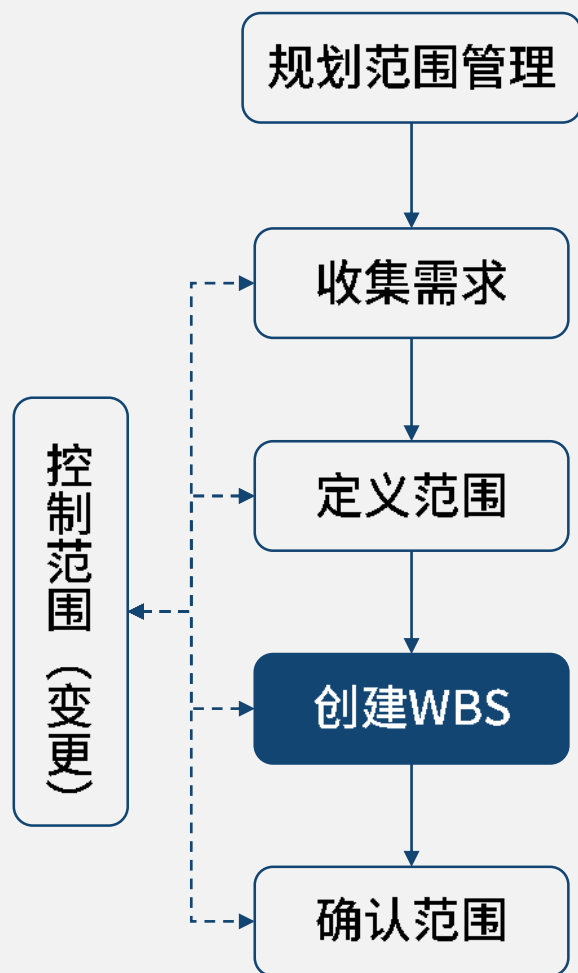

创建工作分解结构（WBS）是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。本过程的主要作用是，为所要交付的内容提供架构，它仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。



创建WBS

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 (如项目范围说明书) 3. 事业环境因素 4. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 分解	1. 范围基准 2. 项目文件更新




创建WBS



创建工作分解结构Work Breakdown Structure (WBS)

是把项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的组件的过程。

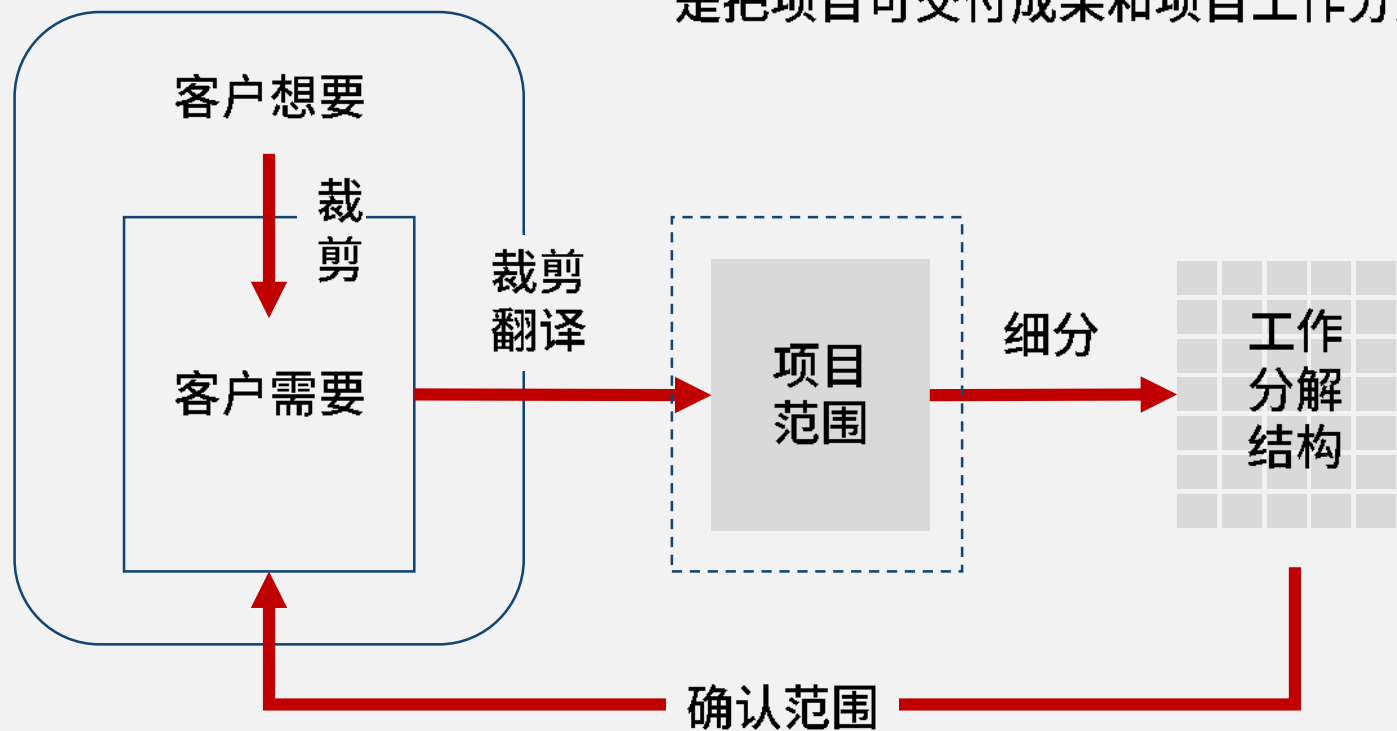

WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。

在“工作分解结构”这个词语中，“工作”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。

WBS 最底层的组成部分称为工作包，比工作包更小的叫活动。



定义范围



项目经理正在进行项目范围管理的工作，目前在和项目团队成员一起创建工作分解结构（WBS）。项目经理应如何规划WBS？

- A.以客户为导向
- B.以团队为导向
- C.以成本为导向
- D.以可交付成果为导向



定义范围



项目经理正在进行项目范围管理的工作，目前在和项目团队成员一起创建工作分解结构（WBS）。**项目经理应如何规划WBS？**


- A.以客户为导向
- B.以团队为导向
- C.以成本为导向
- D.以可交付成果为导向**



创建WBS



方法——WBS分解技术

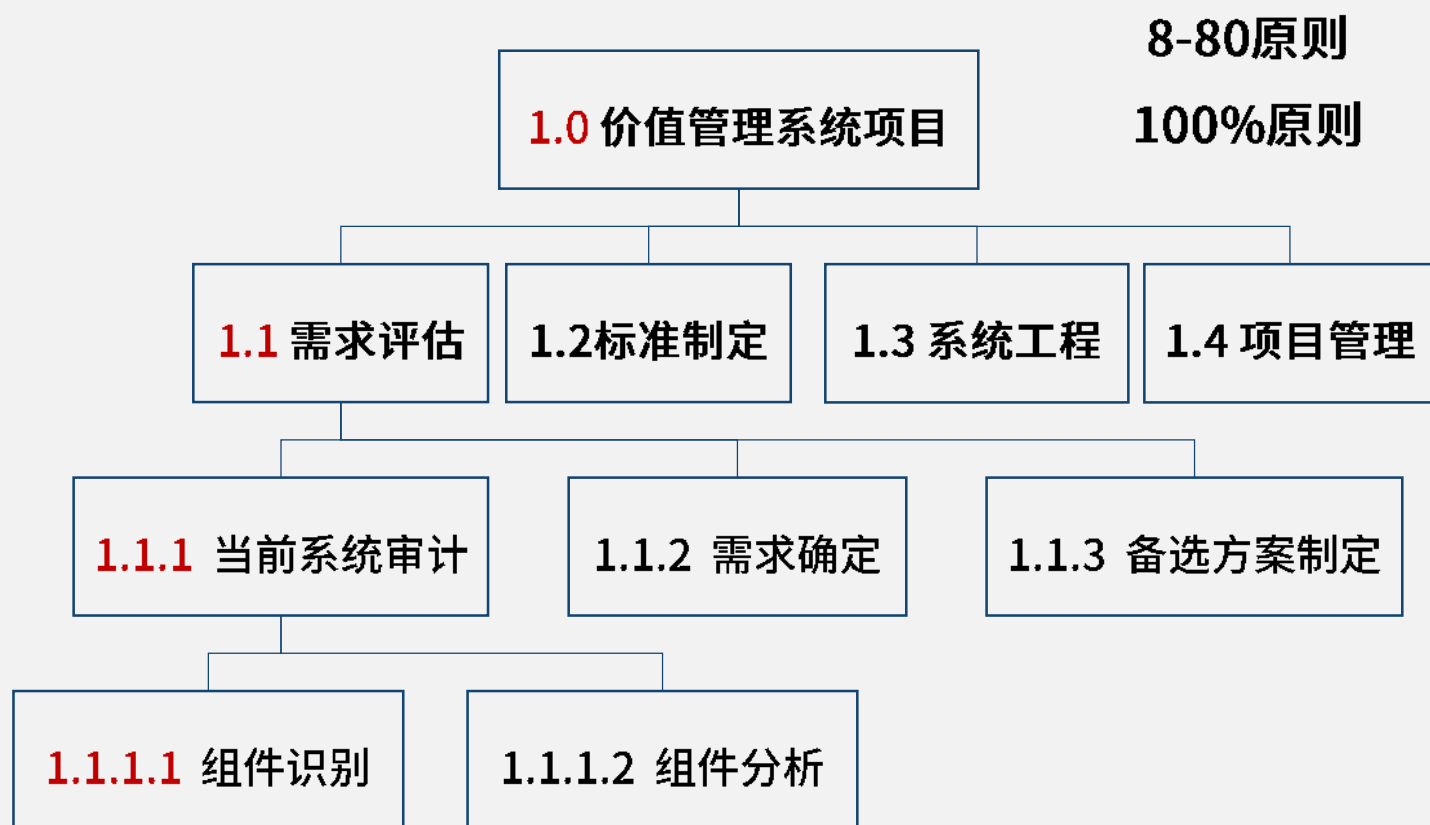

1、自上而下：

逐层细化分解；

2、自下而上：

用于归并较低层次组件；

3、滚动式规划：

详细规划近期要完成的工作，粗略规划远期工作。


远期工作可能客观上信息不足导致当前无法分解，可能为了快速启动主观上只做粗略规划。



创建WBS



方法——WBS分解技术

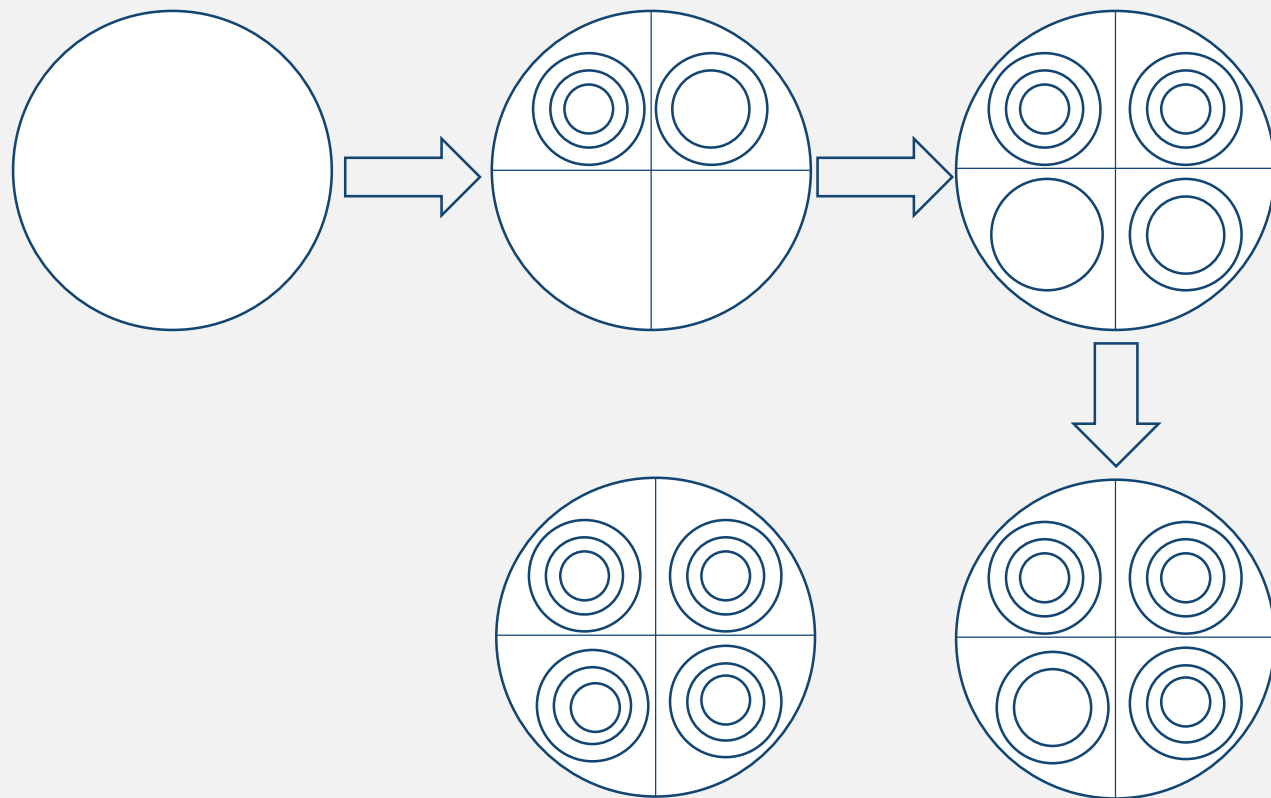

滚动式规划



创建WBS



项目经理管理一个新项目，项目经理了解到在前一个项目中，团队成员多次遗漏项目工作，导致经常返工。若要避免此情况，项目经理应该做什么？

- A.创建WBS，确保包含全部工作
- B.收集所有相关方的需求避免工作的遗漏
- C.将工作等分，确保每个团队成员做的内容相同
- D.为团队成员提供培训，以满足额外任务的要求



创建WBS



项目经理管理一个新项目，项目经理了解到在前一个项目中，团队成员**多次遗漏**项目工作，导致经常返工。若要**避免**此情况，项目经理应该做什么？

- A.创建WBS，确保包含全部工作
- B.收集所有相关方的需求避免工作的遗漏
- C.将工作等分，确保每个团队成员做的内容相同
- D.为团队成员提供培训，以满足额外任务的要求



创建WBS



考作用：对WBS的详细描述

工件——WBS词典

WBS 词典中的内容可能包括（但不限于）：

■ 账户编码标识	■ 工作描述
■ 假设条件和制约因素	■ 负责的组织
■ 进度里程碑	■ 相关的进度活动
■ 所需资源	■ 成本估算
■ 质量要求	■ 验收标准
■ 技术参考文献	■ 协议信息



边界清单



展开明细



创建WBS



一家智能化公司计划推出新产品，以提高公司的知名度，负责该产品的项目经理中途离开项目，一名经验丰富的项目经理被安排负责该项目，一周后，一个负责组件整合的项目团队成员告知项目经理，有两个组件无法组合到一起，项目经理立即展开调查，发现造成该问题的原因是对组件工作的详细描述有偏差。项目经理是从哪份文件中确认的？

- A.WBS字典
- B.WBS
- C.需求文件
- D.项目范围说明书



创建WBS



一家智能化公司计划推出新产品，以提高公司的知名度，负责该产品的项目经理中途离开项目，一名经验丰富的项目经理被安排负责该项目，一周后，一个负责组件整合的项目团队成员告知项目经理，有**两个组件**无法组合到一起，项目经理立即展开调查，发现造成该问题的原因是对组件工作的**详细描述**有偏差。项目经理是从哪份文件中确认的？

A.WBS字典

B.WBS

C.需求文件

D.项目范围说明书




创建WBS




范围基准是三件套，包括：范围说明书、WBS、WBS词典

工件——范围基准

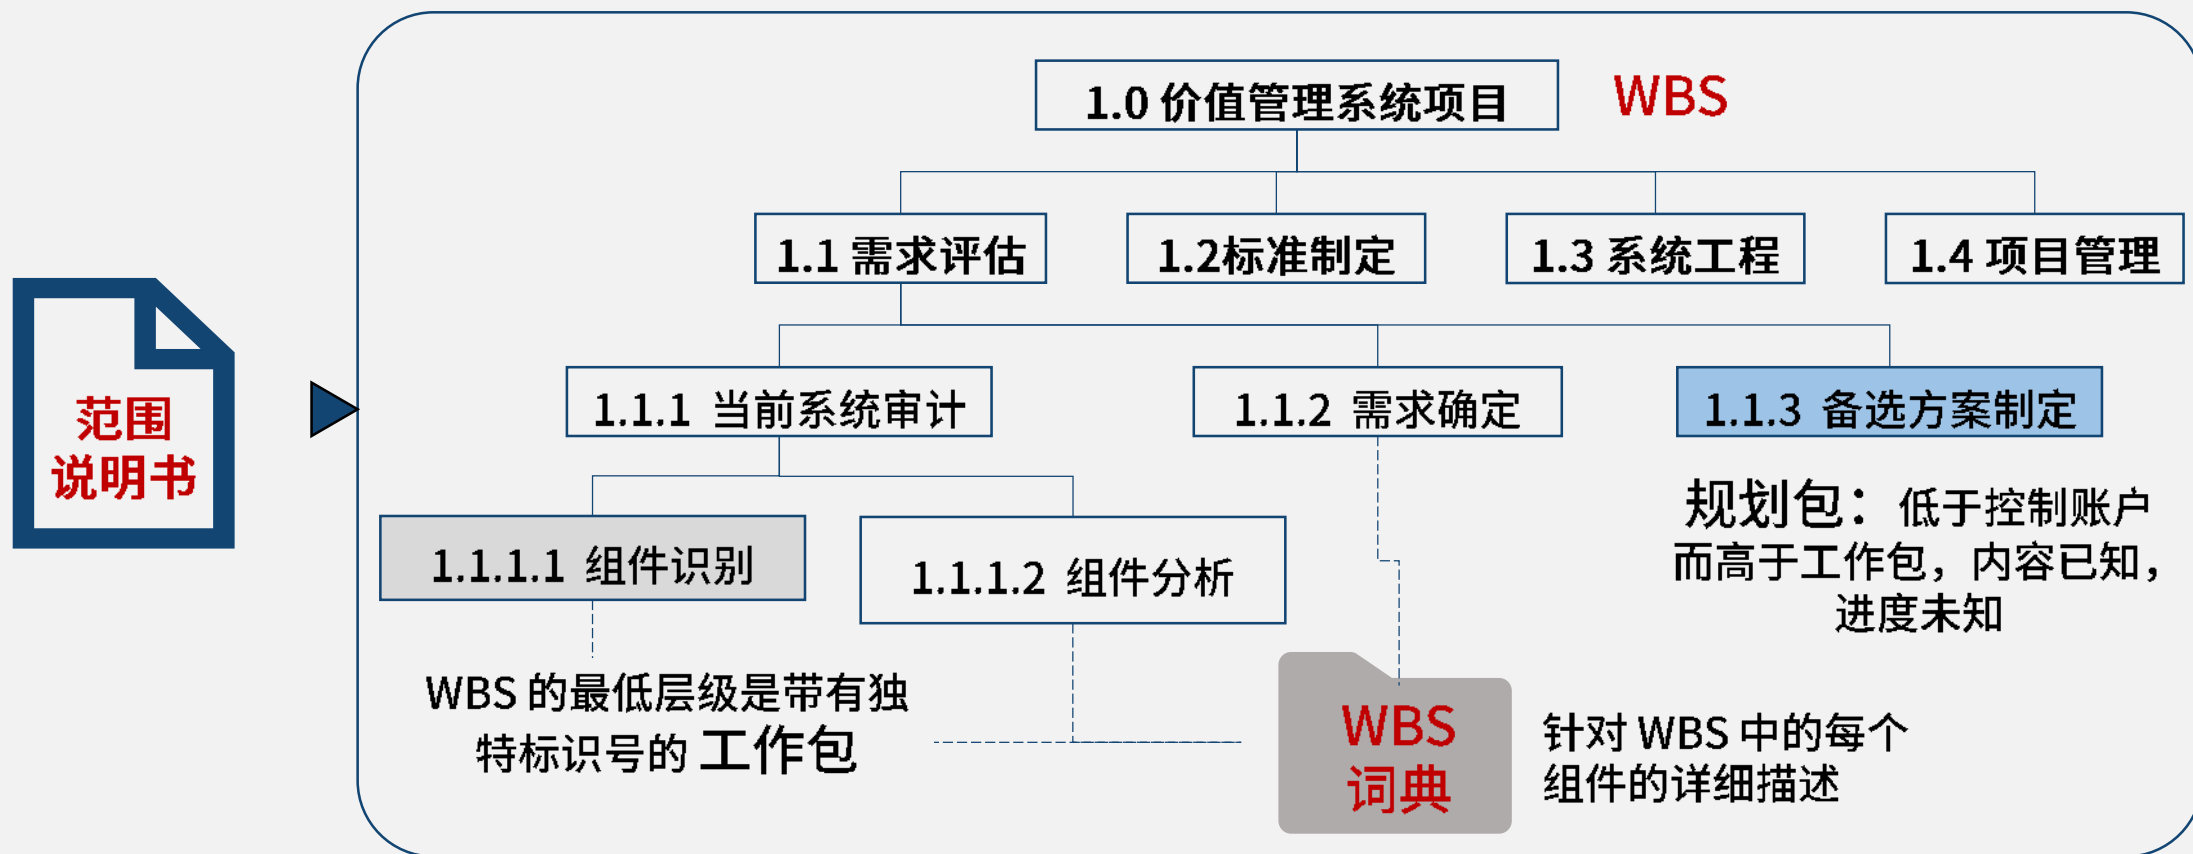



确认范围

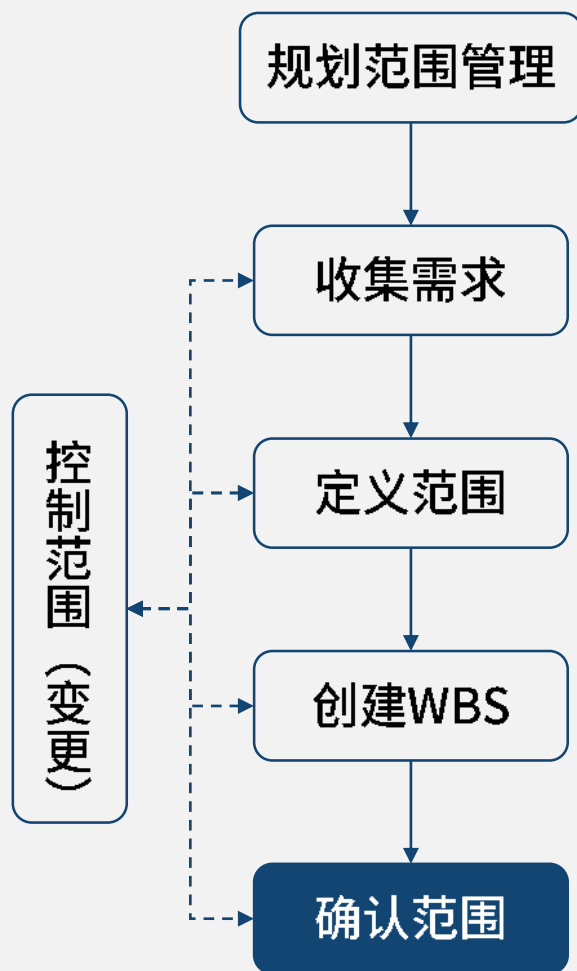

易混淆：一定要区分定义范围和确认范围：

确认范围是做验收！

定义范围是前期确定要做什么！

确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性；同时通过确认每个可交付成果，来**提高最终产品、服务或成果获得验收**的可能性。本过程应根据需要在整个项目期间定期开展。

Validate (确认/验证) Scope



确认范围

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 核实的可交付成果 4. 工作绩效数据	1. 检查 2. 决策（投票）	1. 验收的可交付成果 2. 工作绩效信息 3. 变更请求 4. 项目文件更新



确认范围





确认范围的概念

1、考顺序：控制质量—确认范围—收尾

2、考区分：控制质量VS确认范围

控制质量：是否满足**质量标准**

确认范围：是否满足**验收标准/客户需求**

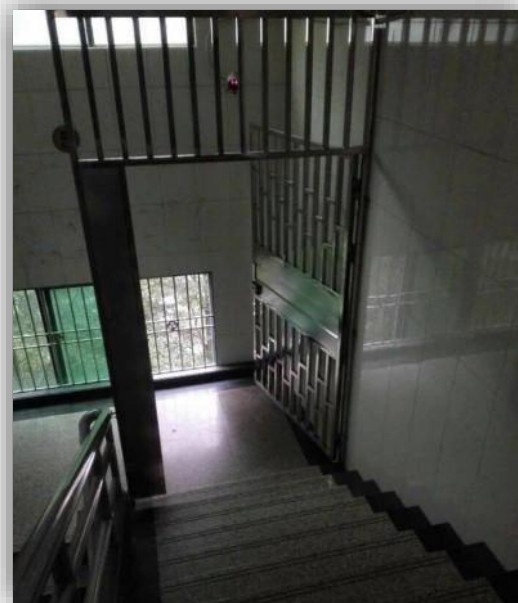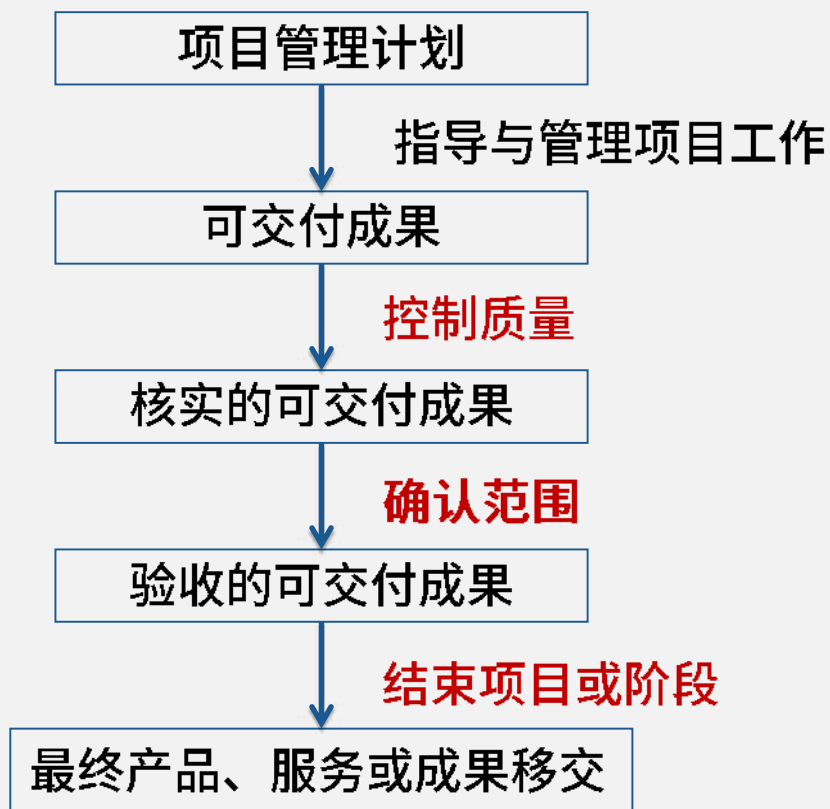

由客户或发起人审查从控制质量过程输出的核实的可交付成果，是对可交付成果的确认和**最终验收**。

确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于，前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。



确认范围的概念

										结束项目或阶段		
1	核	验	2	核	验	3	核	验	4	核	验	最终产品、服务或成果验收
												移交给运营或下一阶段
												项目文件形成最终版
												关闭合同协议（供应商）
												最终报告
												提前终止
												释放资源



确认范围



项目经理与客户一起进行检查，确认项目可交付成果是否符合产品验收标准并满足客户的期望。这些行动属于下列哪一个过程的组成部分？

- A.控制质量
- B.项目或阶段收尾
- C.控制范围
- D.确认范围



确认范围



项目经理与客户一起进行检查，确认项目可交付成果是否符合**产品验收标准**并满足客户的**期望**。这些行动属于下列哪一个过程的组成部分？

- A.控制质量
- B.项目或阶段收尾
- C.控制范围
- D.确认范围**



确认范围



项目经理为一家金融公司实施信息系统。一位高级 IT 经理表示质量控制未发现任何故障，并且新系统已为最终用户做好准备。项目经理应该怎么做？

- A.开始关闭项目或阶段过程
- B.分发最终项目报告
- C.验证项目范围并获得发起人批准
- D.将产品转让给客户



确认范围



项目经理为一家金融公司实施信息系统。一位高级 IT 经理表示**质量控制未发现任何故障，并且新系统已为最终用户做好准备**。项目经理应该怎么做？

- A.开始关闭项目或阶段过程
- B.分发最终项目报告
- C.验证项目范围并获得发起人批准**
- D.将产品转让给客户



确认范围



确认范围的依据

验收依据有：验收标准/范围说明书/范围基准/合同

内容	解释
产品范围描述	逐步细化在项目章程和需求文件中所述的产品、服务或成果的特征
验收标准	可交付成果通过验收前必须满足的一系列条件
可交付成果	为完成某一过程、阶段或项目而必须产出的任何独特并可核实的产品、成果或服务能力，可交付成果也包括辅助成果，如项目管理报告和文件。对可交付成果的描述略可略可详
项目的除外责任	识别排除在项目之外的内容。明确说明哪些内容不属于项目范围，有助于管理相关方的期望及减少范围蔓延



确认范围



项目经理与供应商签订了构建新系统的合同。在验收测试阶段，项目经理注意到系统质量不是很让人满意，项目经理应该如何支持他们向供应商提出的索赔？

- A.在风险登记册中记录系统中的问题已被识别
- B.表明供应商未经批准更改了验收标准
- C.分享以前类似范围的项目的不成功结果
- D.提供测试失败的结果以及商定的验收标准



确认范围



项目经理与供应商签订了构建新系统的合同。在验收测试阶段，项目经理注意到系统质量不是很让人满意，项目经理应该如何支持他们向供应商提出的索赔？

- A.在风险登记册中记录系统中的问题已被识别
- B.表明供应商未经批准更改了验收标准
- C.分享以前类似范围的项目的不成功结果
- D.提供测试失败的结果以及商定的验收标准



确认范围



确认范围的执行

时间：

确认范围在每个可交付成果生成时或者在阶段审查点开展（阶段结束时）。

事件：

通过检查开展测量、审查与确认等活动，来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准。

人物：

符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明相关方对项目可交付成果的正式验收。



确认范围



项目团队制作的OA软件已经完成，项目经理准备将其交付给客户方，后得知该客户正在外出差，于是项目经理联系对方的项目经理并完成OA软件的交付。到了约定的付款日期，项目经理并未收到客户的付款。通过电话联系，客户方声称项目经理并没有将OA软件移交给自己，因此拒绝接受。项目经理事先应该怎么做来避免该问题？

- A.获得客户代表的签字
- B.查看合同中付款日期是否合理
- C.控制产品范围
- D.上报发起人



确认范围




项目团队制作的OA软件已经完成，项目经理准备将其交付给客户方，后得知该客户正在外出差，于是项目经理联系对方的项目经理并**完成OA软件**的交付。到了约定的付款日期，项目经理并未收到客户的付款。通过电话联系，客户方声称项目经理并没有将OA软件移交给自已，因此**拒绝接受**。项目经理事先应该怎么做来避免该问题？

- A.获得客户代表的签字
- B.查看合同中付款日期是否合理
- C.控制产品范围
- D.上报发起人



控制范围

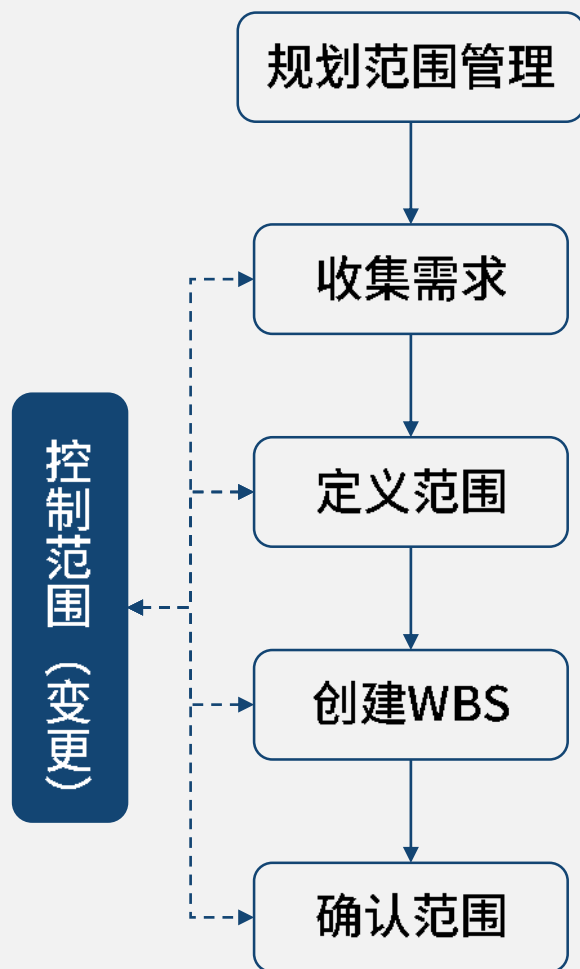


考法：本过程的作用—监督范围状态，管理范围基准的变更

控制范围是监督项目和产品的范围状态，管理范围**基准变更的过程**。本过程的主要作用是，在整个项目期间保持对**范围基准的维护**，且需要在整个项目期间开展。



控制范围

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

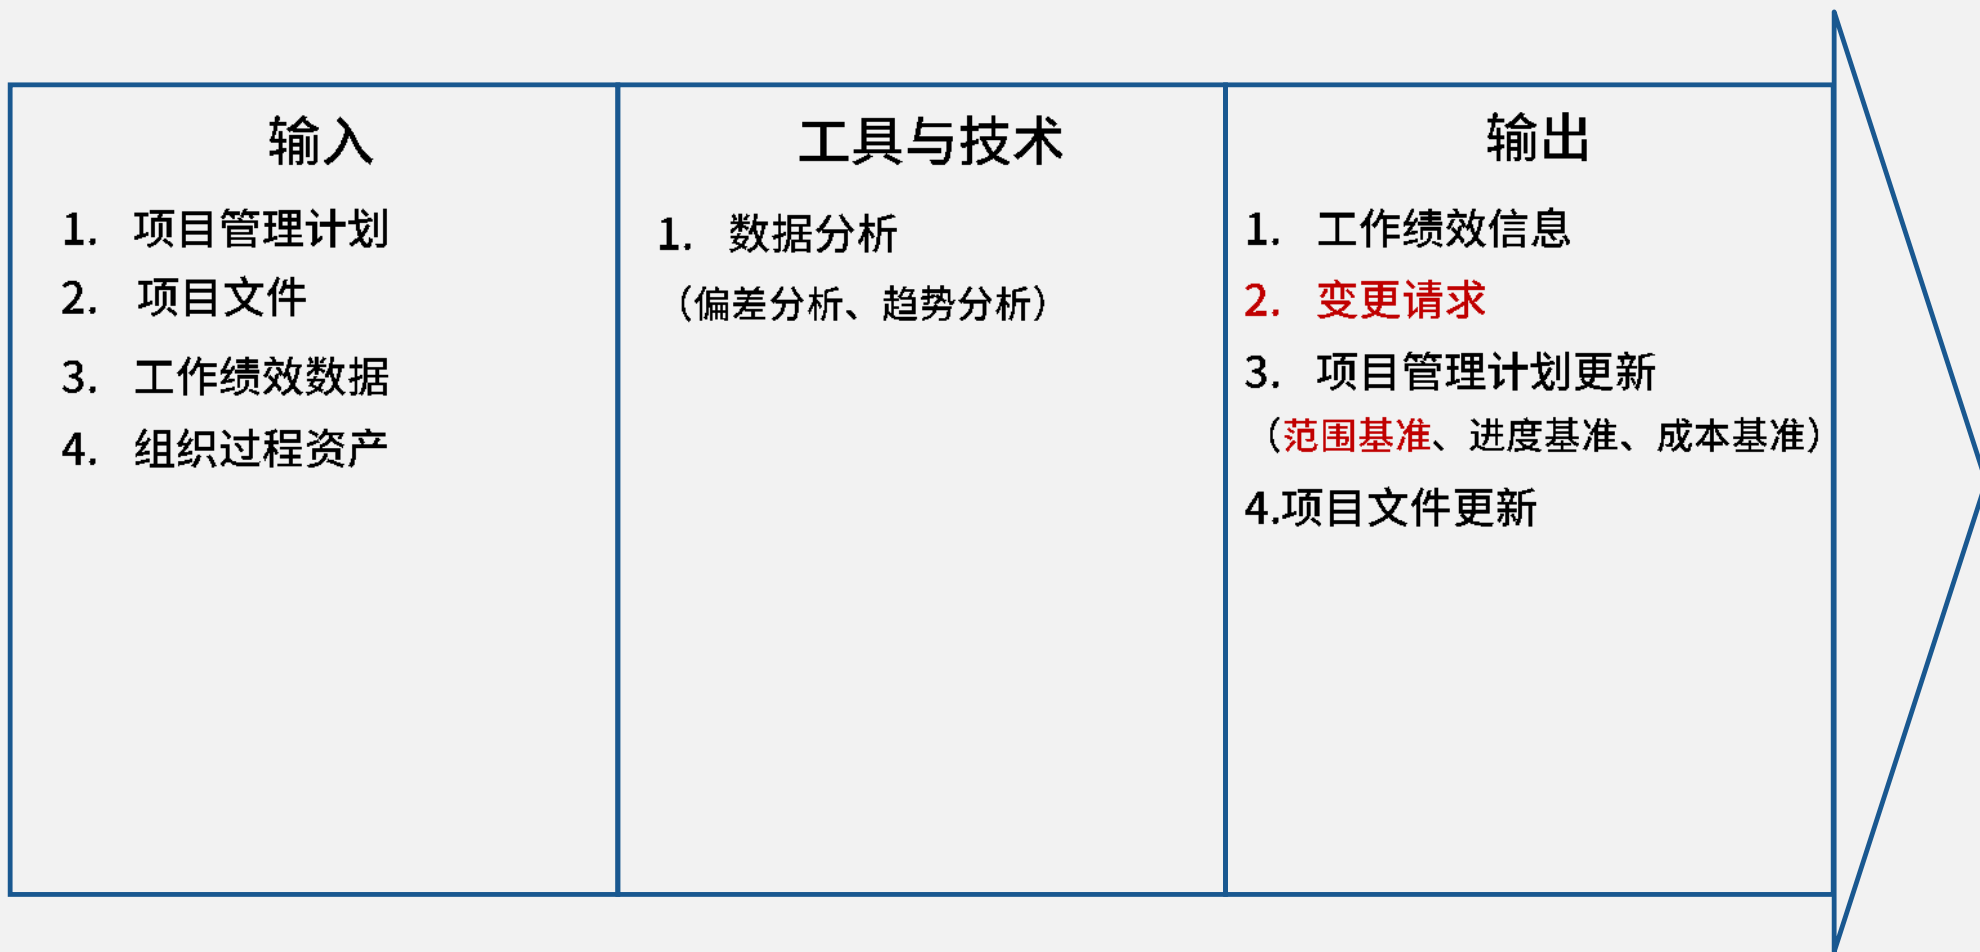



控制范围



项目经理正在与客户合作，以获得软件项目文档交付物的正式验收。客户表示，由于交付物与项目要求不一致，因此目前的交付物无法使用。在审查文件后，客户告诉项目经理，这些要求不准确，无法满足项目的需求。以下哪项有助于解决此问题？

- A.创建工作分解结构
- B.范围控制
- C.范围定义
- D.范围确认



控制范围



项目经理正在与客户合作，以获得软件项目文档交付物的正式验收。客户表示，由于交付物与项目要求不一致，因此目前的交付物无法使用。在审查文件后，客户告诉项目经理，**这些要求不准确，无法满足项目的需求**。以下哪项有助于**解决**此问题？

- A.创建工作分解结构
- B.范围控制**
- C.范围定义
- D.范围确认




控制范围



方法——有变更，走流程

考法：不管是范围蔓延还是镀金，都是失败的！
有变更，走流程，范围管理的核心是做且只做！

在整个项目期间保持对范围基准的维护，且需要在整个项目期间开展。

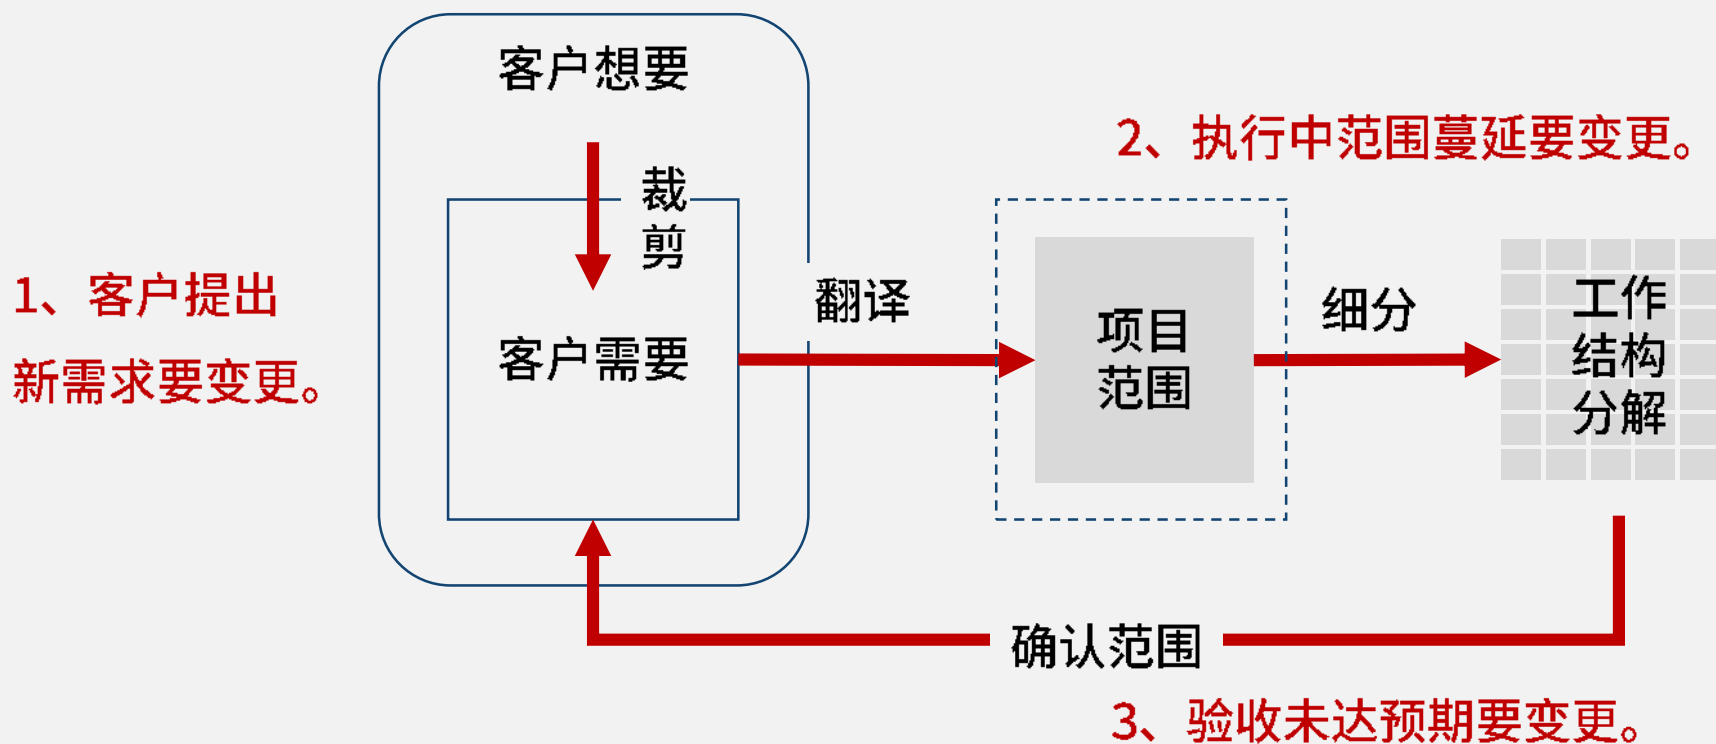

未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为**范围蔓延**。



控制范围



项目经理在一家承包公司领导一个项目，而项目团队刚刚完成了一个迭代。产品通过了检验，但产品中增加了一项附加功能。客户注意到附加功能，并认为它会给产品带来新的风险。项目经理应该怎么做才能避免以后出现这种情况？

- A.与客户合作以确保该功能增加价值
- B.遵循适当的变更控制流程并评估变更的进一步影响
- C.管理范围基准以影响推动变化的因素
- D.与客户进行频繁的审查，以确保产品按预期工作



控制范围



项目经理在一家承包公司领导一个项目，而项目团队刚刚完成了一个迭代。产品通过了检验，但**产品中增加了一项附加功能**。客户注意到附加功能，并认为它会给产品带来新的风险。项目经理应该怎么做才能**避免**以后出现这种情况？

- A. 与客户合作以确保该功能增加价值
- B. 遵循适当的变更控制流程并评估变更的进一步影响**
- C. 管理范围基准以影响推动变化的因素
- D. 与客户进行频繁的审查，以确保产品按预期工作



控制范围



在项目执行阶段，项目经理发现工作分解结构（WBS）中遗漏一个工作包。项目经理应该怎么做？

- A. 压缩进度计划以适应来自该工作包的额外工作量
- B. 更新项目进度计划和人力资源计划
- C. 分析影响以及让项目回到正轨将要采取的变更
- D. 将遗漏的工作包增加到WBS



控制范围



在项目执行阶段，项目经理发现工作分解结构（WBS）中遗漏一个工作包。项目经理应该怎么做？

- A. 压缩进度计划以适应来自该工作包的额外工作量
- B. 更新项目进度计划和人力资源计划
- C. 分析影响以及让项目回到正轨将要采取的变更
- D. 将遗漏的工作包增加到WBS



本章小结



规划范围管理

需求管理计划VS范围管理计划

均为指南性文件，无具体范围和需求



项目范围管理

收集需求

事先应该收集所有相关方的需求

工件

需求文件

应记录所有的需求，但是不一定要做

需求跟踪矩阵

需求和可交付成果的对应表格

定义范围

范围说明书

产品范围描述、可交付成果、验收标准、项目的除外责任

需求文件（仅需求）VS需求跟踪矩阵（需求和可交付成果连接在一起）VS范围说明书（找可交付成果）

创建WBS

对全部工作范围的层级分解，输出WBS和WBS词典

确认范围 (正式验收)

内涵

确认可交付成果满足业务需求，满足验收标准

验收的依据

范围基准（验收标准）或合同

可交付成果流向图

已完成-控制质量-确认范围-收尾之间的先后顺序

控制范围

内涵

监督范围，管理范围基准变更


范围蔓延

不支持，做且只做；发现正在做，立即叫停并分析影响；做完了，补变更控制流程

方法

专家判断、头脑风暴、访谈、焦点小组、问卷调查、标杆对照、德尔菲、决策、亲和图、思维导图、名义小组、引导、原型法、备选方案分析、分解、滚动式规划

拓展补充



(=) 希赛 | 感谢您的观看
