

PMP项目管理

《第10章 项目生命周期与组织变革》

重点：

四种生命周期辨析

什么是混合

变革步骤



项目的生命周期




项目的生命周期



项目的生命周期的类型

项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段。

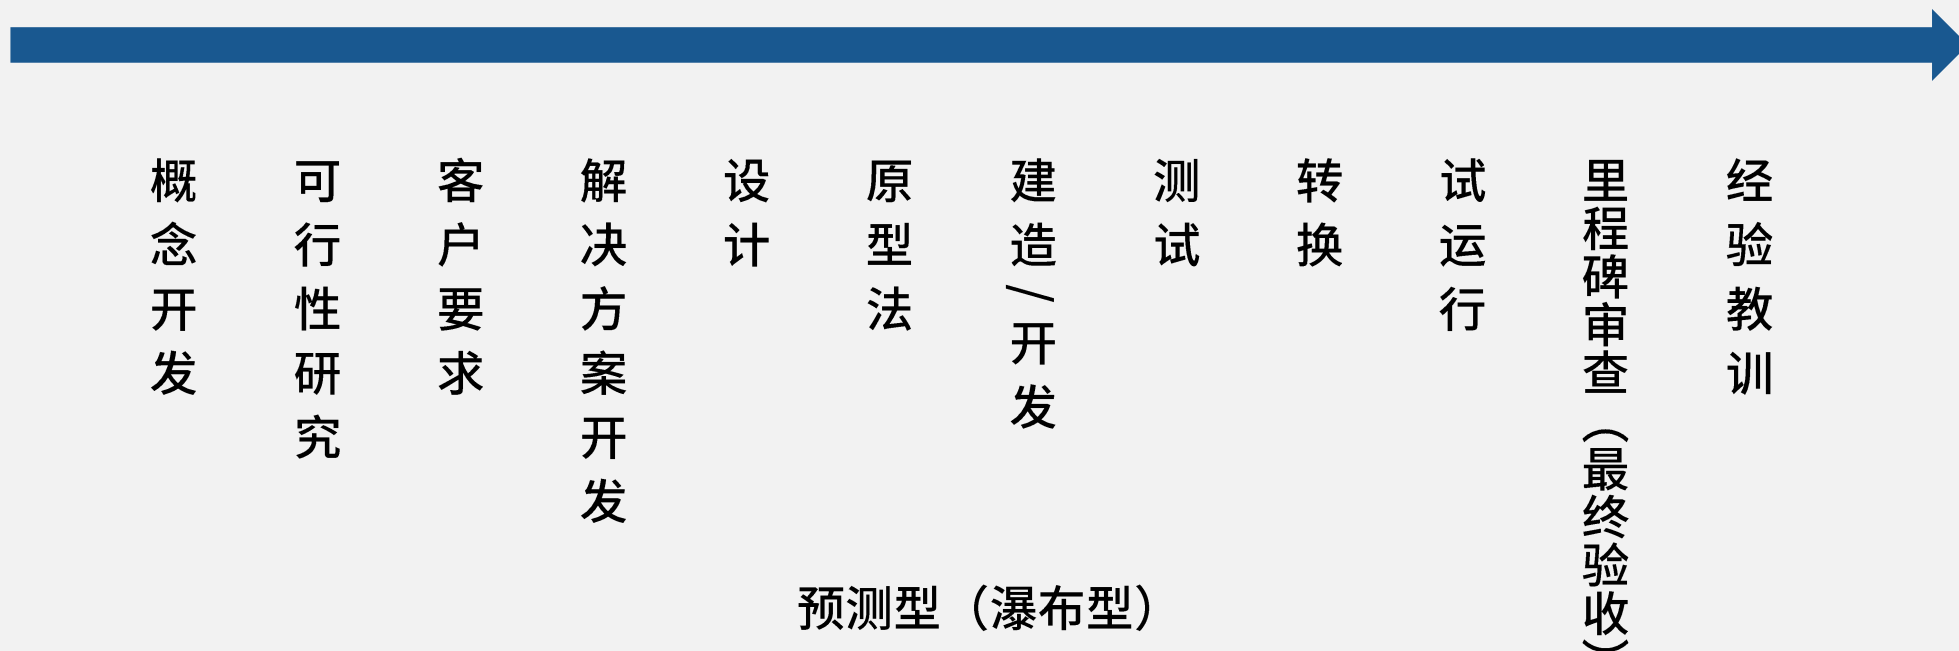




项目的生命周期



项目的生命周期的类型



预测型（瀑布型）

变更程度低（范围明确）、一次交付

变更程度低（范围明确）、多次交付



交付1




交付2




交付3

增量型

变更程度高（范围模糊）、一次交付



迭代1



迭代2



交付

迭代型

敏捷型（适应型）= 迭代 + 增量


变更程度高（范围模糊）、多次交付



项目的生命周期



项目的生命周期的类型




迭代1




迭代2



交付1



迭代1



迭代2



交付2

迭代型

增量型


敏捷型（适应型）=迭代+增量

变更程度高（范围模糊）、多次交付



项目的生命周期

项目的生命周期的类型

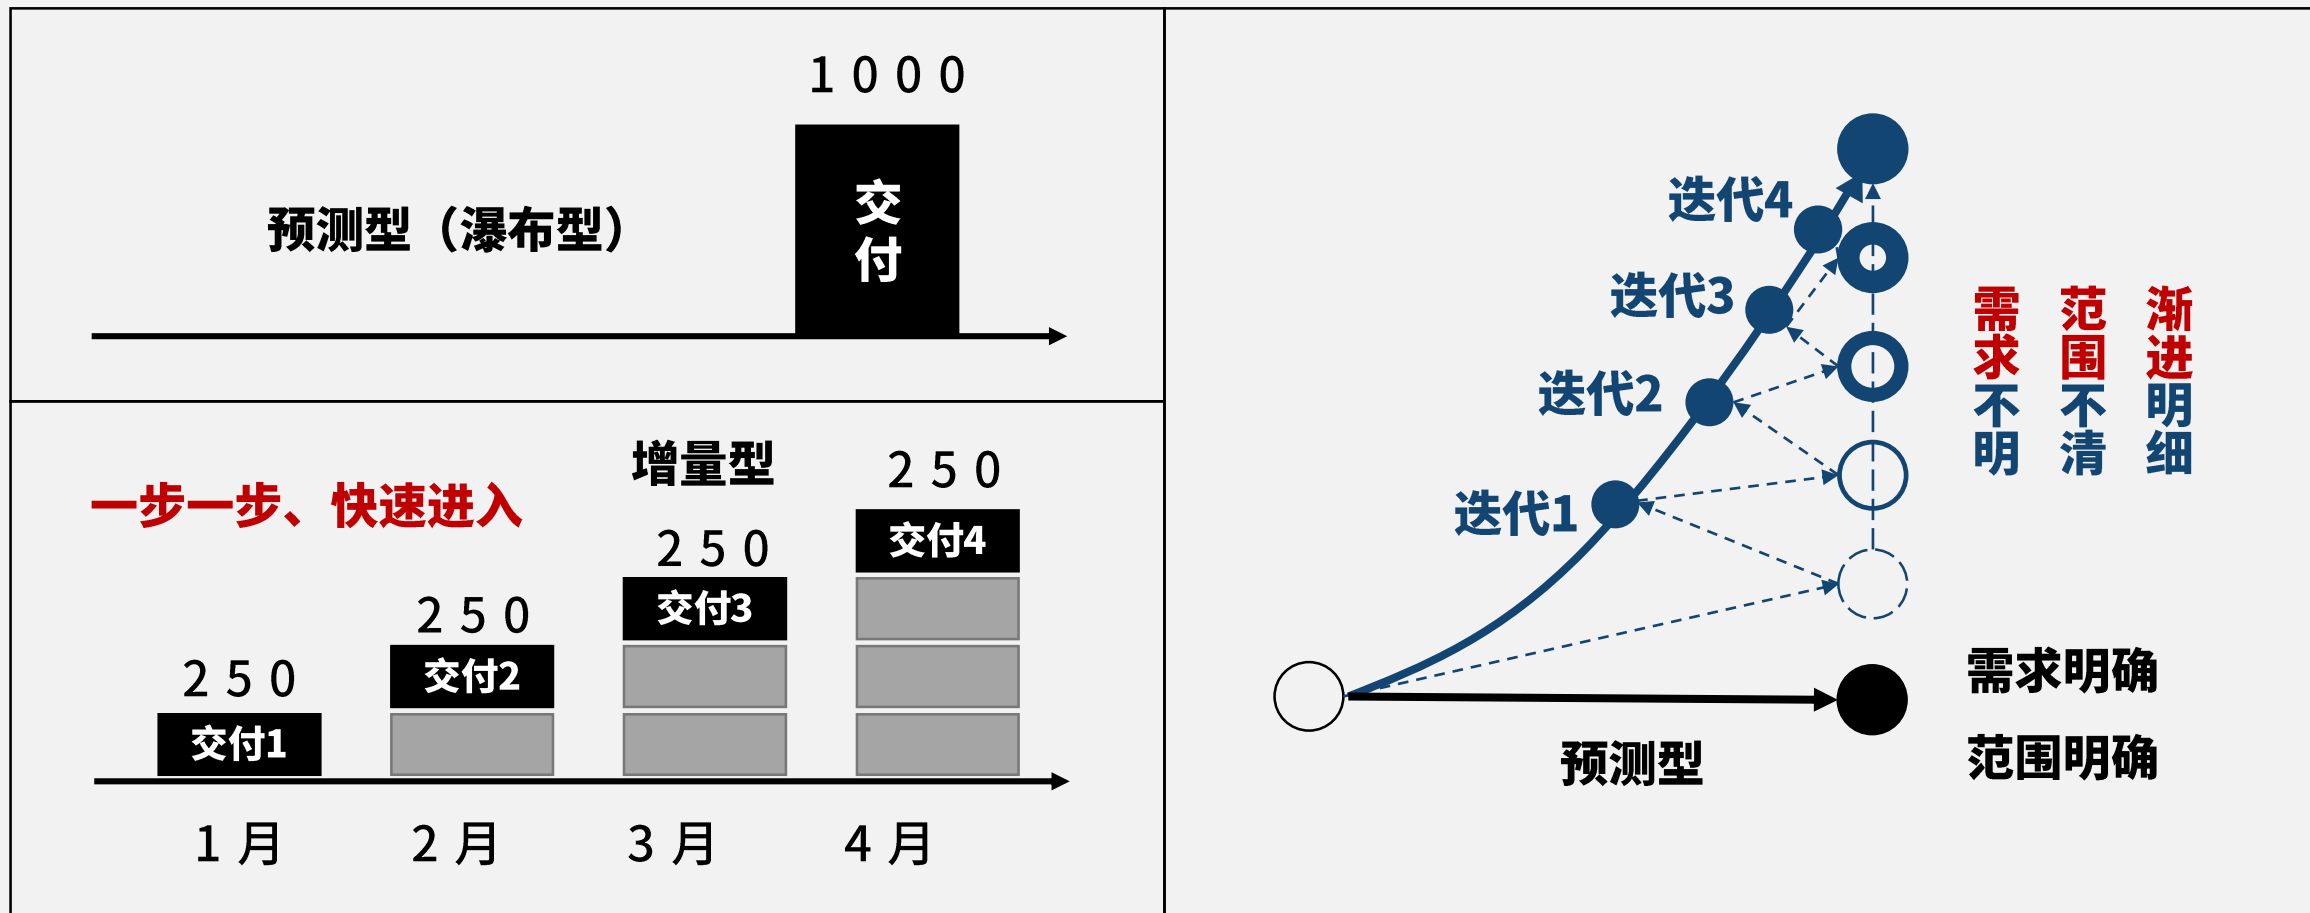




项目的生命周期



补充说明

预测（瀑布）型

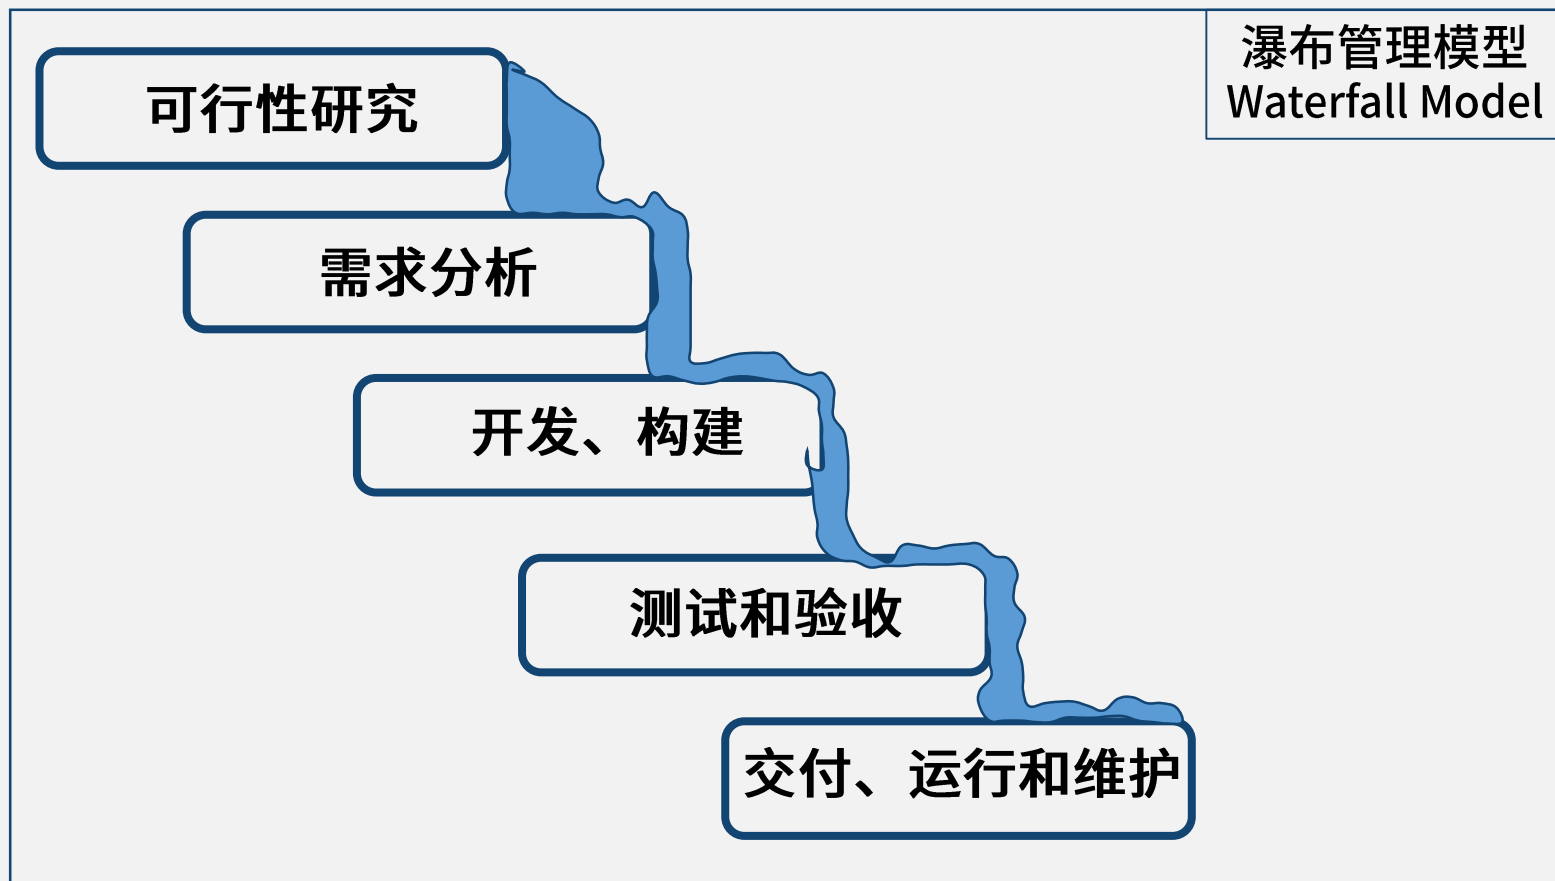



项目的生命周期



补充说明

迭代型



.....
.....
.....
加上一些小细节




名称
项目需求.docx
项目需求改.docx
项目需求改1.docx
项目需求改2.docx
项目需求完成版.docx
项目需求完成版1.docx
项目需求最终版.docx
项目需求最终版1.docx
项目需求最终版2.docx
项目需求最最终版.docx
项目需求最最终版1.docx
项目需求绝对不改最终版.docx
项目需求绝对不改最终版1.docx



项目的生命周期

▶ 补充说明


增量型

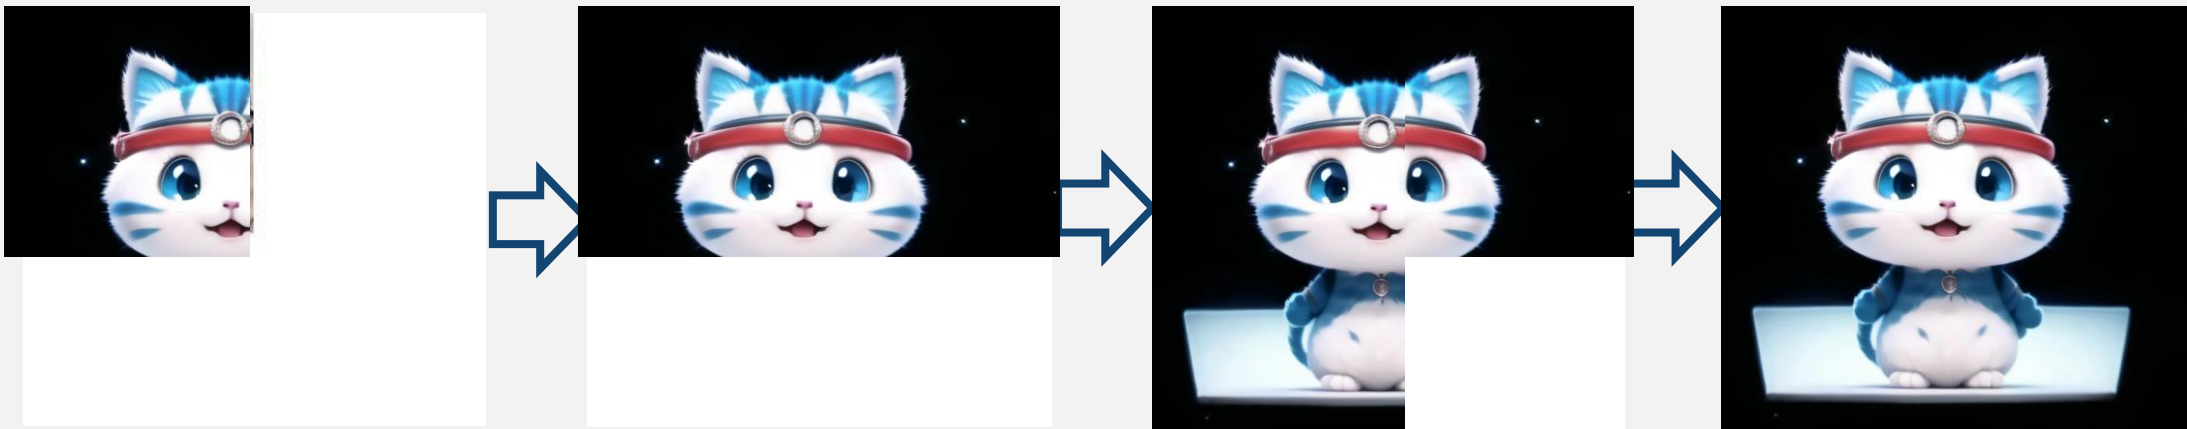



项目的生命周期

项目的生命周期的类型

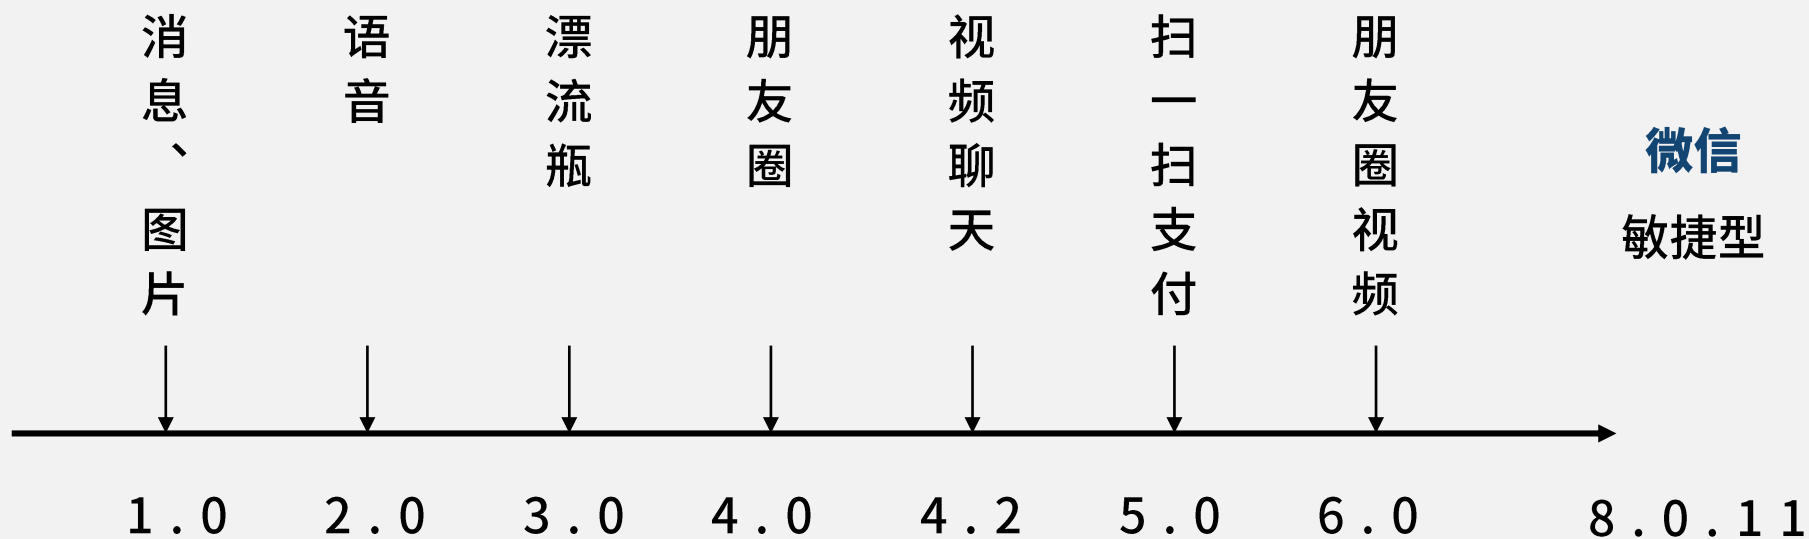




项目的生命周期



项目的生命周期的类型

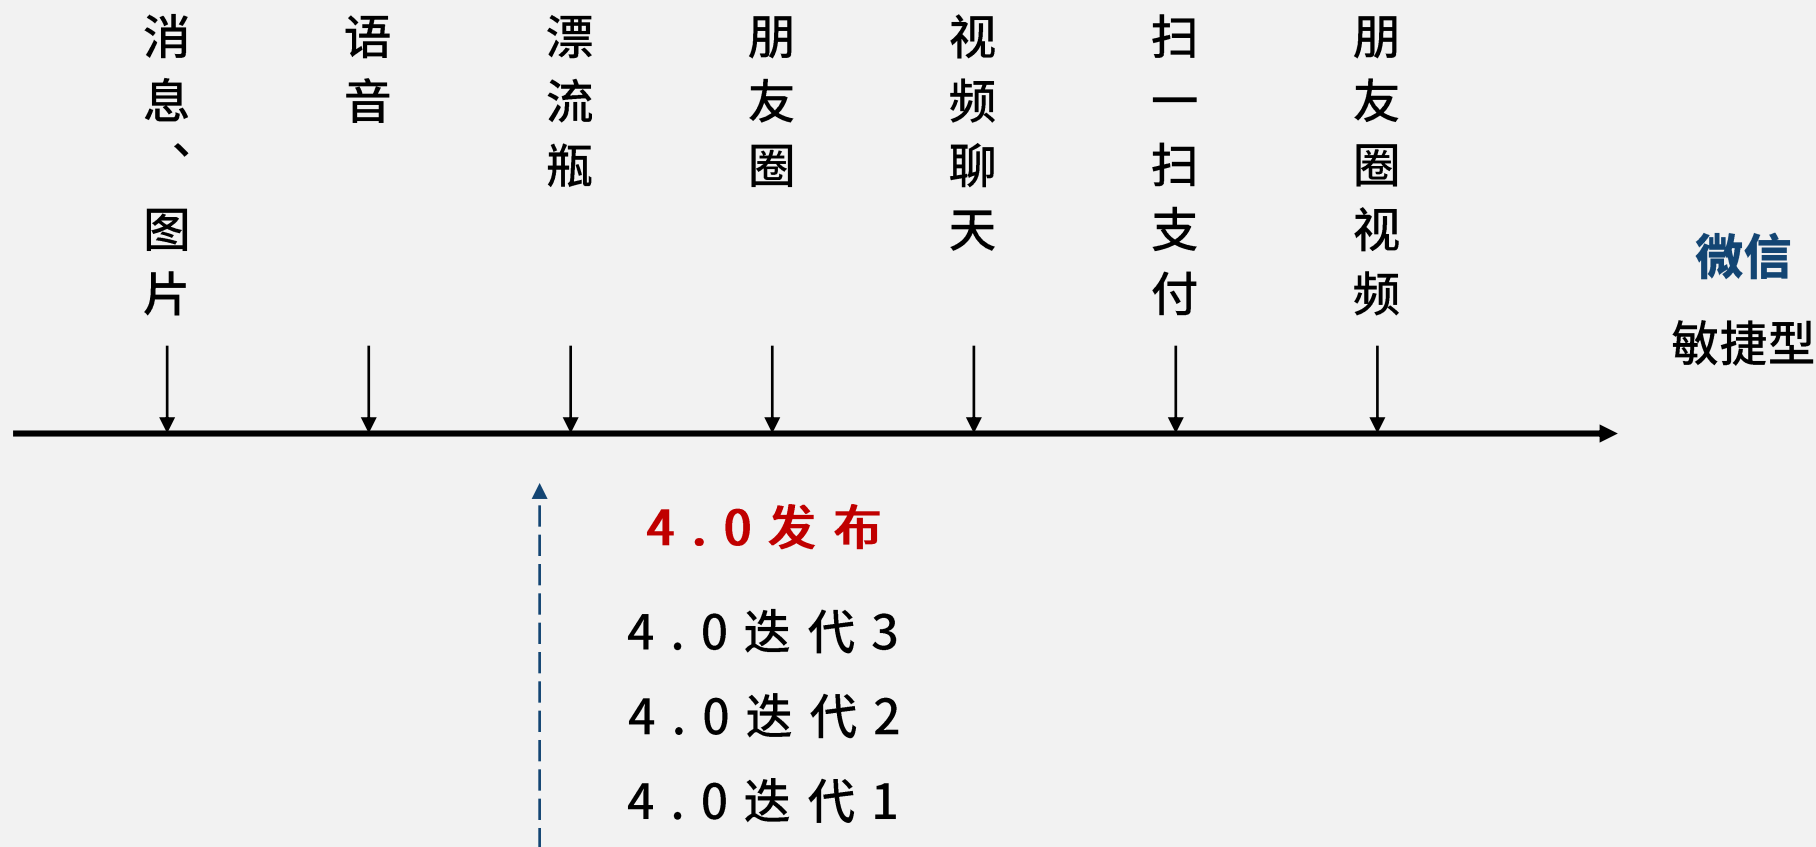




项目的生命周期



项目的生命周期的类型

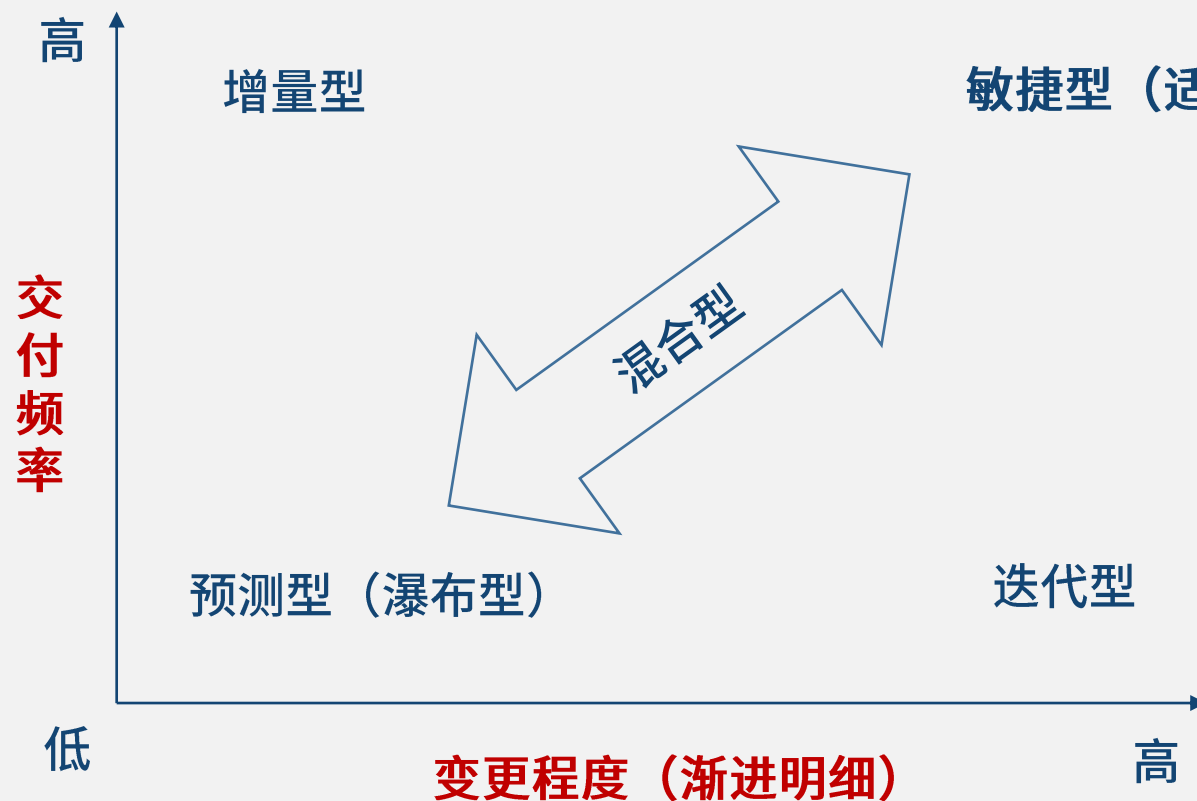

敏捷型 (适应型) = 增量 & 迭代



项目的生命周期



类型	描述
预测型	一种更为传统的方法，提前进行大量的计划工作，然后一次执行；执行是一个连续的过程。 也称为计划型或瀑布式。
迭代型	这种方法允许对未完成的工作进行反馈，从而用一次次的迭代去改进和修改该工作。
增量型	这种方法是在逐渐预定的时间内向客户提供各个已经完成的，可立即使用的可交付成果。
适应型	这种方法既有迭代，也有增量，便于完善工作，频繁交付。



项目的生命周期



特征				
方法	需求	活动	交付	目标
预测型	固定	整个项目仅执行一次	一次交付	管理成本
迭代型	动态	反复执行直至修正	一次交付	解决方案的正确性
增量型	当期固定总体动态	对给定增量执行一次	频繁小规模交付	速度
敏捷型	动态	反复执行直至修正	频繁小规模交付	通过频繁小规模交付和反馈实现的客户价值

计划始终贯穿其中：每种生命周期都有计划要素；
不同之处在于完成多少计划以及何时完成



项目的生命周期

一个设备零件制造公司新签约了一个客户，需要公司完成多个组件的制造，所有组件的范围是清晰的，但是该客户与公司第一次合作，想要提供高质量的产品，客户的要求是上一个组件完成并进行验收后，才会支付下一个组件的费用，若验收不通过，则会终止与公司的合作。项目经理应该使用哪种方法最合适？

- A.预测
- B.迭代
- C.增量
- D.敏捷



项目的生命周期

项目的生命周期的类型

一个设备零件制造公司新签约了一个客户，需要公司完成**多个组件**的制造，所有组件的**范围是清晰**的，但是该客户与公司第一次合作，想要提供高质量的产品，客户的要求是上一个组件完成并进行**验收后**，才会支付下一个组件的费用，若验收不通过，则会终止与公司的合作。项目经理应该使用哪种方法最合适？

- A.预测
- B.迭代
- C.增量**
- D.敏捷



项目的生命周期



一家公司希望拓展业务，增加企业竞争力，公司高层决定研发一个复杂的产品，该产品计划3年内完成，任命一名经验丰富的项目经理，项目经理得知，该项目需求会随市场的变化而变化。而管理层希望产品能够快速进入市场，因为公司需要通过它们来争取到市场份额。项目经理应该建议使用什么方法来完成该项目？

- A.预测
- B.增量
- C.迭代
- D.适应



项目的生命周期



项目的生命周期的类型

一家公司希望拓展业务，增加企业竞争力，公司高层决定研发一个复杂的产品，该产品计划3年内完成，任命一名经验丰富的项目经理，项目经理得知，该项目**需求**会随市场的**变化**而变化。而管理层希望产品能够**快速进入**市场，因为公司需要通过它们来争取到市场份额。项目经理应该建议使用什么方法来完成该项目？

- A.预测
- B.增量
- C.迭代
- D.适应**



混合型生命周期



先敏捷后预测

预测和敏捷结合

**预测法为主
敏捷法为辅**

**敏捷法为主
预测法为辅**



混合型生命周期



先敏捷后预测

早期采用敏捷开发生命周期，
之后是预测型的发布阶段

实例：开发某种新的高科技产品，然后面向
成千上万的用户推出，并对他们进行培训

可能由不同的团队实施

敏捷型

敏捷型

敏捷型

预测型

预测型

预测型



混合型生命周期



预测和敏捷结合

团队正在逐渐地向敏捷过渡，使用方
法如短迭代、每日站会和回顾

在项目的其他方面，如前期评估、工作分
配和进度跟踪等，仍然遵循了预测法

敏捷型	敏捷型	敏捷型
预测型	预测型	预测型



混合型生命周期



预测法为主
敏捷法为辅

以敏捷方法处理具有不确定性、复杂性或范围蔓延可能的项目的一部分，而使用预测法管理项目的其余部分

实例：承包商首先在地面上进行一些小规模的安装试验，以确定最佳的安装方法，并在有足够时间解决问题时尽早发现问题，随后通过试验和调整，增量地改进过程

预测型

敏捷型 敏捷型 敏捷型

预测型

预测型



混合型生命周期



敏捷法为主
预测法为辅

当某个特定要素不可协商，或者使用敏捷方法不可执行时，使用这种方法

实例：集成由不同供应商开发的外部组件，这些外部组件不能或不会以协作或增量方式合作。在组件交付之后，需要单独集成

敏捷型

敏捷型

敏捷型

预测型 预测型 预测型



混合型生命周期



为何需要混合生命周期

加快投资回报：基于项目风险设计混合生命周期。增量方法会将资源集中，使项目成果更早完工；

创造商业价值：项目管理的目标是在给定的当前环境下尽可能以最好的方式创造商业价值。“我们怎样做才能最成功？”；

刺探风险：在探讨各种想法时，若要管理风险，迭代方法或敏捷方法将会有所帮助；

交付中间价值：当组织无法交付中间价值时，敏捷方法可能不是很有用；

快速获取反馈：敏捷频繁向客户交付，并给团队带来反馈。利用反馈重新规划下一部分工作。




组织变革



组织变革



变革管理模型

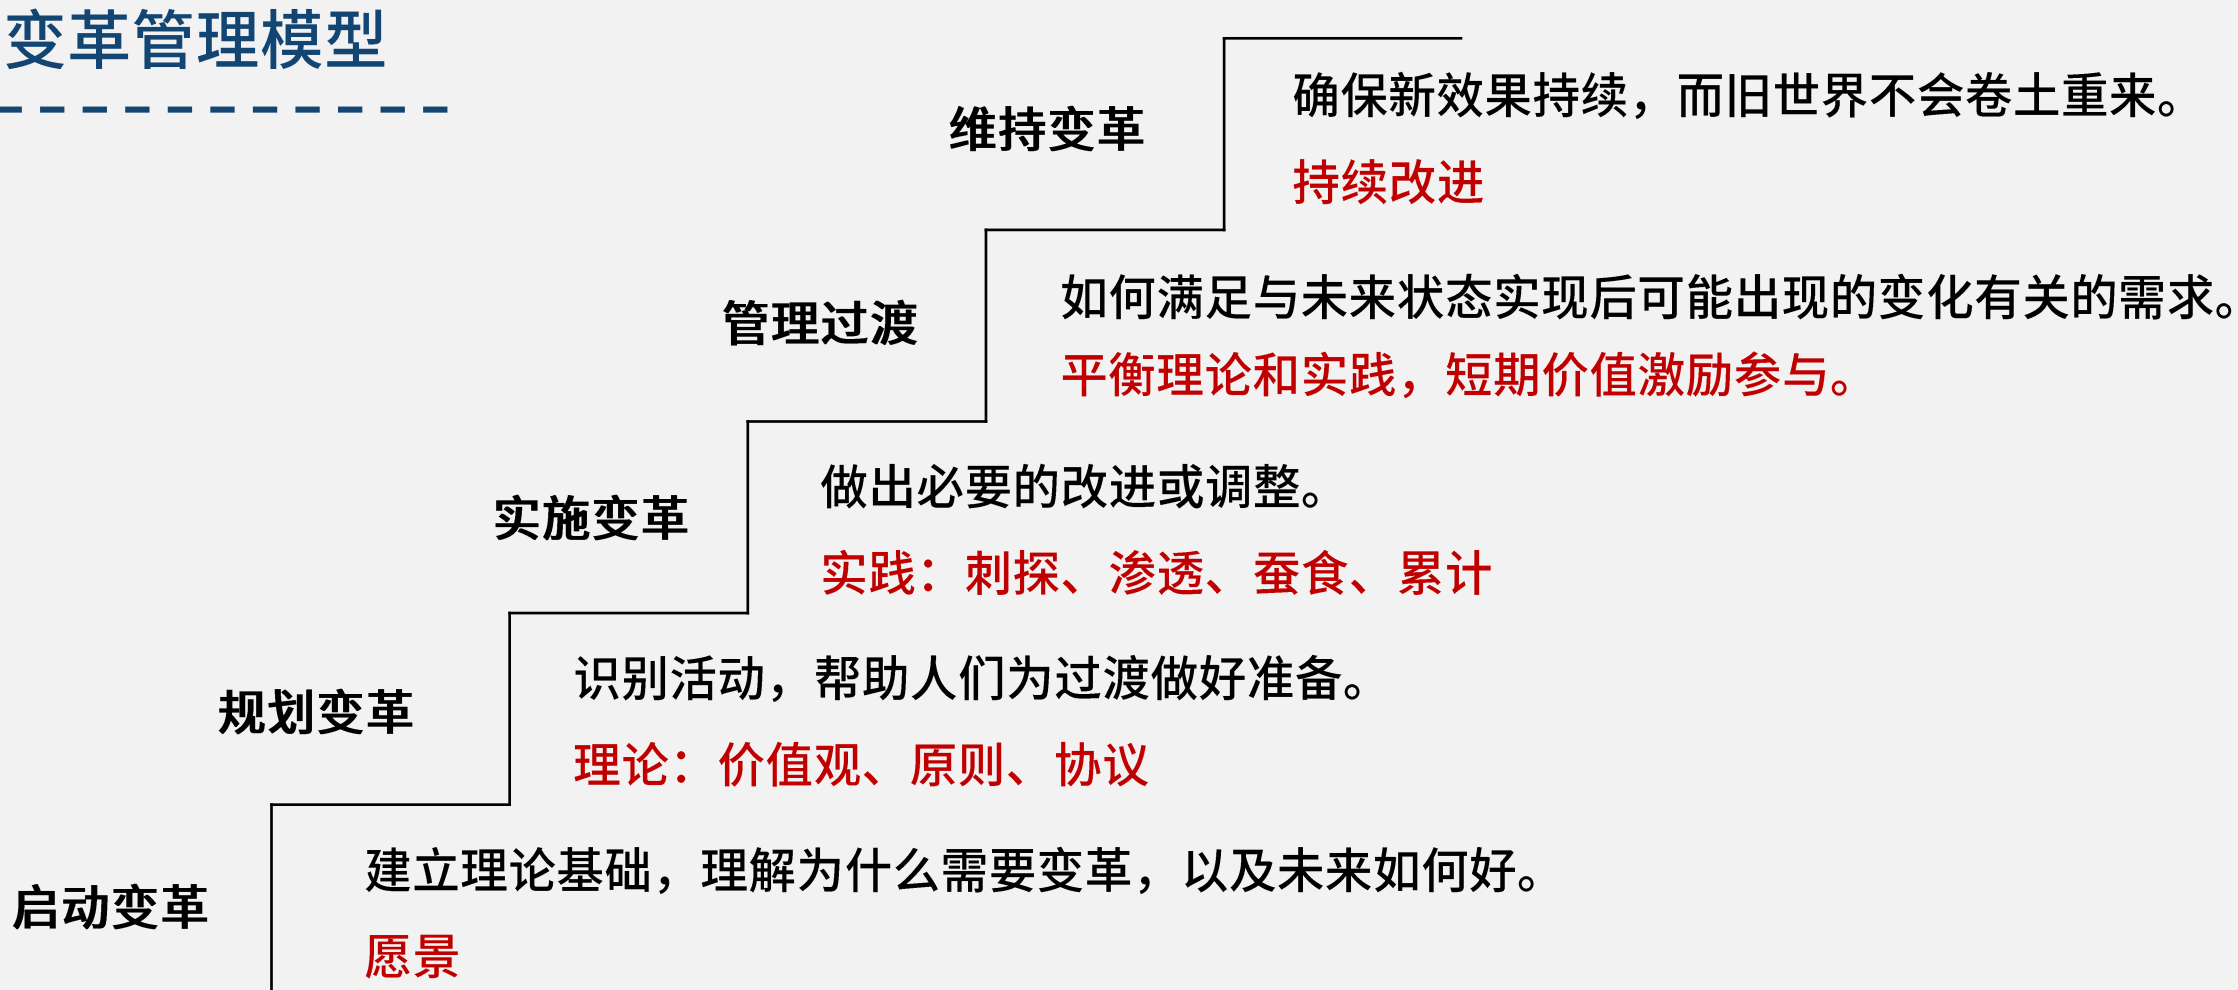



组织变革



变革管理模型

一位项目经理最近加入了组织。在面谈过程中，项目经理展示了敏捷交付的经验，项目管理办公室（PMO）经理请求他协助实施敏捷方法。项目经理要开始在组织内采用敏捷，应该怎么做？

- A.评估组织的文化以确定敏捷是否适用于项目交付，并确定要使用的实践
- B.要求所有项目经理和业务经理接受项目经理之前使用的敏捷框架的培训
- C.建议项目管理办公室经理继续采用组织当前使用的预测方法，直到所有正在执行的项目结束
- D.与开发人员和测试人员一起召开敏捷研讨会，以获得他们在项目中使用敏捷实践的支持



组织变革



变革管理模型

一位项目经理最近加入了组织。在面谈过程中，项目经理展示了敏捷交付的经验，项目管理办公室（PMO）经理请求他协助实施敏捷方法。项目经理要开始在组织内采用敏捷，应该怎么做？

- A.评估组织的文化以确定敏捷是否适用于项目交付，并确定要使用的实践
- B.要求所有项目经理和业务经理接受项目经理之前使用的敏捷框架的培训
- C.建议项目管理办公室经理继续采用组织当前使用的预测方法，直到所有正在执行的项目结束
- D.与开发人员和测试人员一起召开敏捷研讨会，以获得他们在项目中使用敏捷实践的支持



组织变革



变革管理模型

项目经理使用预测的方法和同一批利益相关方一起共事了4年，利益相关方已经熟悉这种方法并投资了许多项目。在项目经理准备与同一批利益相关方启动一个新项目的前半个月，组织强烈鼓励所有的项目经理采用敏捷方法去管理项目，项目经理应该怎么做？

- A.继续在新项目使用预测方法，因为利益相关方已经熟悉这种方式
- B.与利益相关方分享和讨论敏捷方法的好坏，并为新项目选择他们喜欢的方式
- C.在新项目中使用敏捷方法，并为不熟悉敏捷的相关方安排相关培训
- D.只与团队分享新项目采用敏捷方法的利弊，并让他们决定使用哪种方法



组织变革



变革管理模型

项目经理使用预测的方法和同一批利益相关方一起共事了4年，利益相关方已经熟悉这种方法并投资了许多项目。在项目经理准备与同一批利益相关方启动一个新项目的前半个月，组织强烈鼓励所有的项目经理**采用敏捷方法**去管理项目，项目经理应该怎么做？


- A.继续在新项目使用预测方法，因为利益相关方已经熟悉这种方式
- B.与利益相关方分享和讨论敏捷方法的好坏，并为新项目选择他们喜欢的方式**
- C.在新项目中使用敏捷方法，并为不熟悉敏捷的相关方安排相关培训
- D.只与团队分享新项目采用敏捷方法的利弊，并让他们决定使用哪种方法



组织变革

敏捷适用性筛选器

文化	是否具有支持该方法 并已建立信任的团队环境？ 团队是否有自主决策能力？
项目	变更速度极快？ 增量交付可行？ 项目关键性如何？
团队	适当规模的团队？ 客户/业务反馈？ 敏捷经验水平？

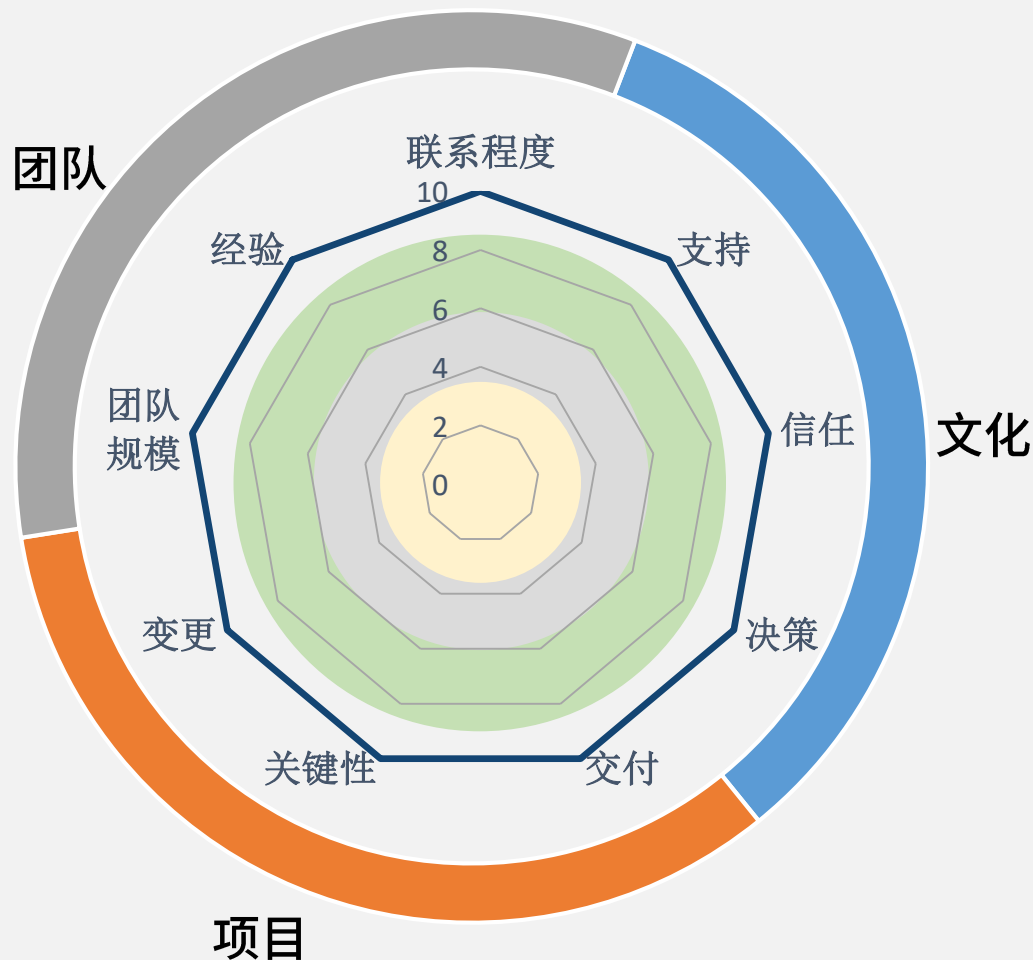



组织变革



敏捷适用性筛选器

类别	指标	1（完全一致）……………10（完全不一致）
文化	支持方法	高级发起人是否了解并支持在项目中使用敏捷方法？
	团队信任度	确信团队能将其愿景和需求转换为成功的产品或服务？
	团队决策能力	团队可否自主做出有关如何实施工作方面的本地决策？
团队	团队规模	1-9=1，10-20=2，21-30=3，……，111-150=8，151-200=9，201-更多=10
	经验水平	核心团队角色是否有敏捷必备的经验 and 技能水平？
	客户/业务联系	团队每天是否能联系到至少一名业务/客户代表以询问问题和获取反馈？
项目	变更可能性	每月需求变更或发现新需求的可能性是多少？
	产品或服务关键性	正在构建的产品或服务的关键性（因可能的缺陷导致的损失）
	增量交付	产品或服务能否按比例构建和评估？



组织变革

敏捷适用性筛选器

一家公司想要向敏捷转型，并在找一个适当的项目做为试点。以下哪个是最合适的试点项目？

- A 项目a: 估计工期: 1 年;团队规模: 10
- B 项目 b: 估计工期: 1 个月;团队规模: 10
- C 项目 c: 估计工期: 6 个月;团队规模: 50
- D 项目 d: 估计工期: 9 个月;团队规模: 7



组织变革

敏捷适用性筛选器

一家公司想要向敏捷转型，并在找一个适当的项目做为试点。以下哪个是最合适的试点项目？

A 项目a: 估计工期: 1 年;团队规模: 10

B 项目 b: 估计工期: 1 个月;团队规模: 10

C 项目 c: 估计工期: 6 个月;团队规模: 50


D 项目 d: 估计工期: 9 个月;团队规模: 7



组织变革

拓展

变革管理专家威廉·布里奇斯（William Bridges）强调转型过程在变革管理进程中的核心地位。

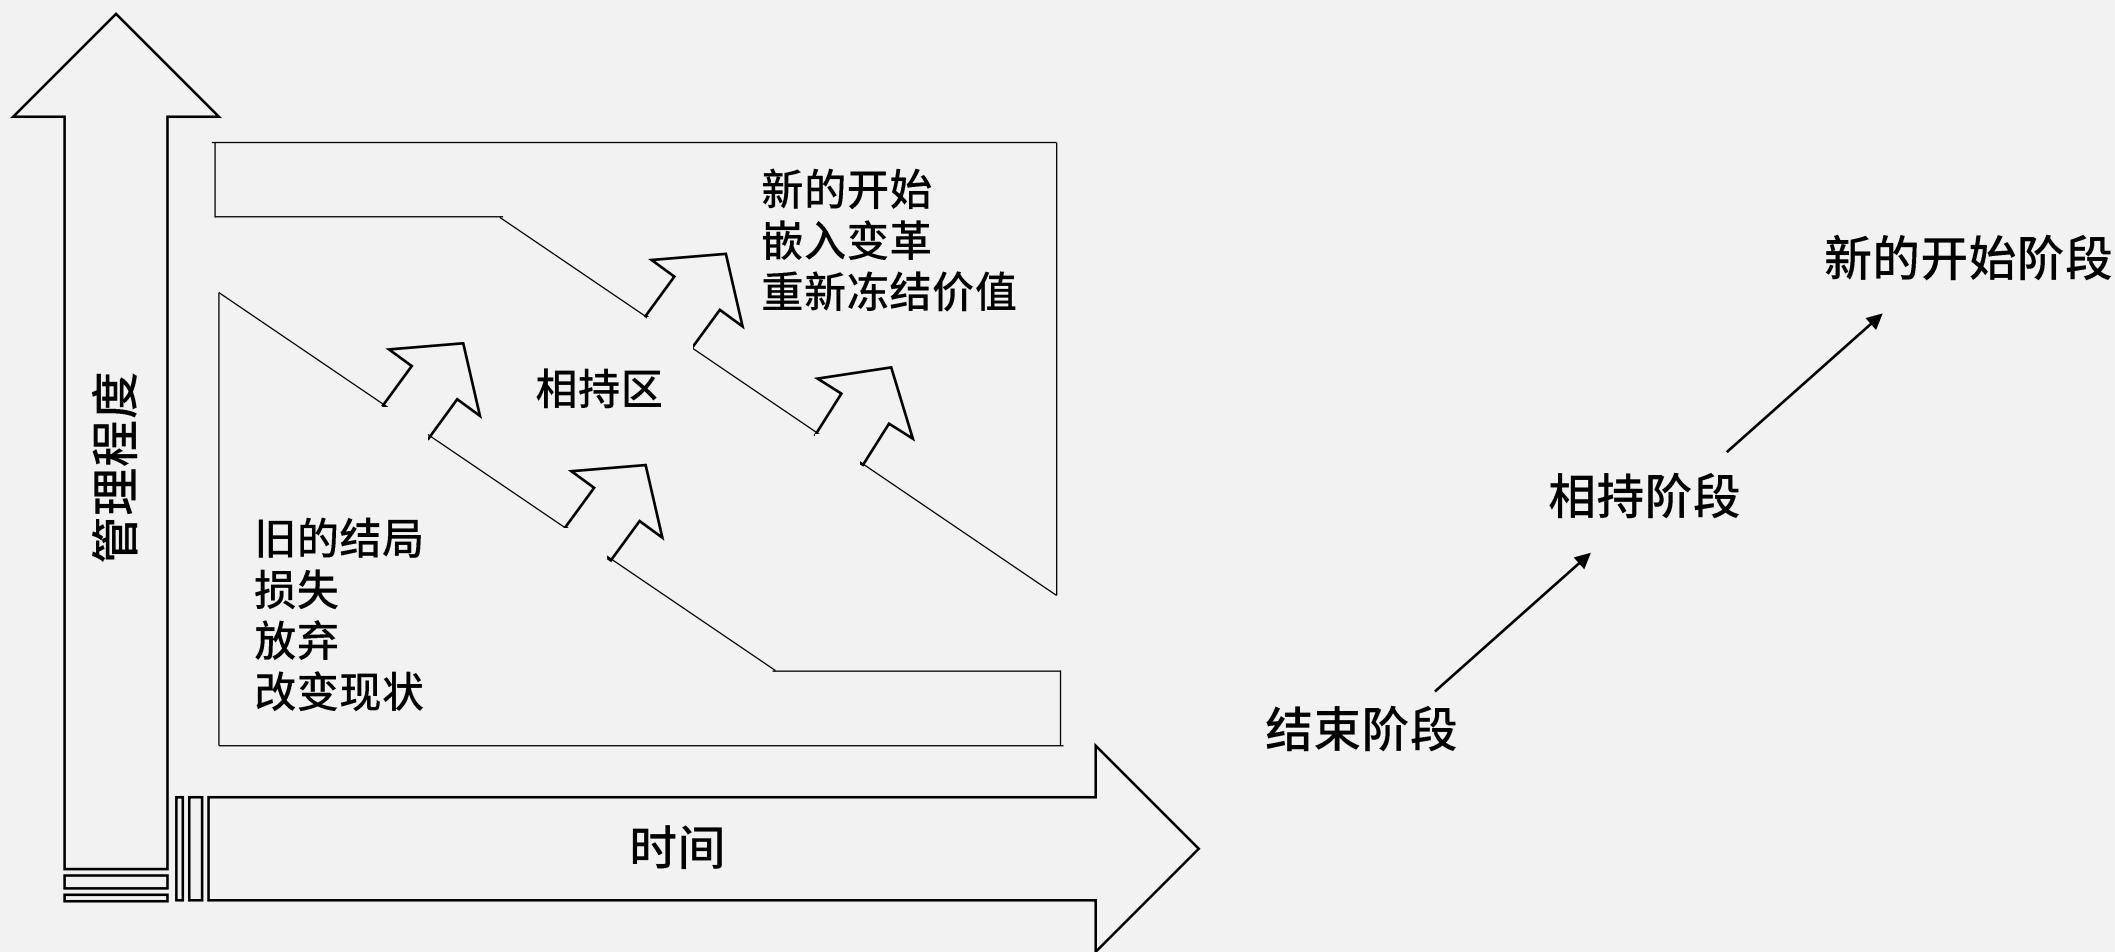



组织变革

拓展

科特的变革管理八大误区

误区一：过于自满

误区二：未能建立足够强大的指导联盟

误区三：低估愿景的力量

误区四：10倍、100倍或1000倍地放大愿景

误区五：允许阻挡愿景的障碍存在

误区六：未能创造短期收益

误区七：过早宣布胜利

误区八：忽视将变革融入企业文化




组织变革



拓展

科特的重大变革八步法

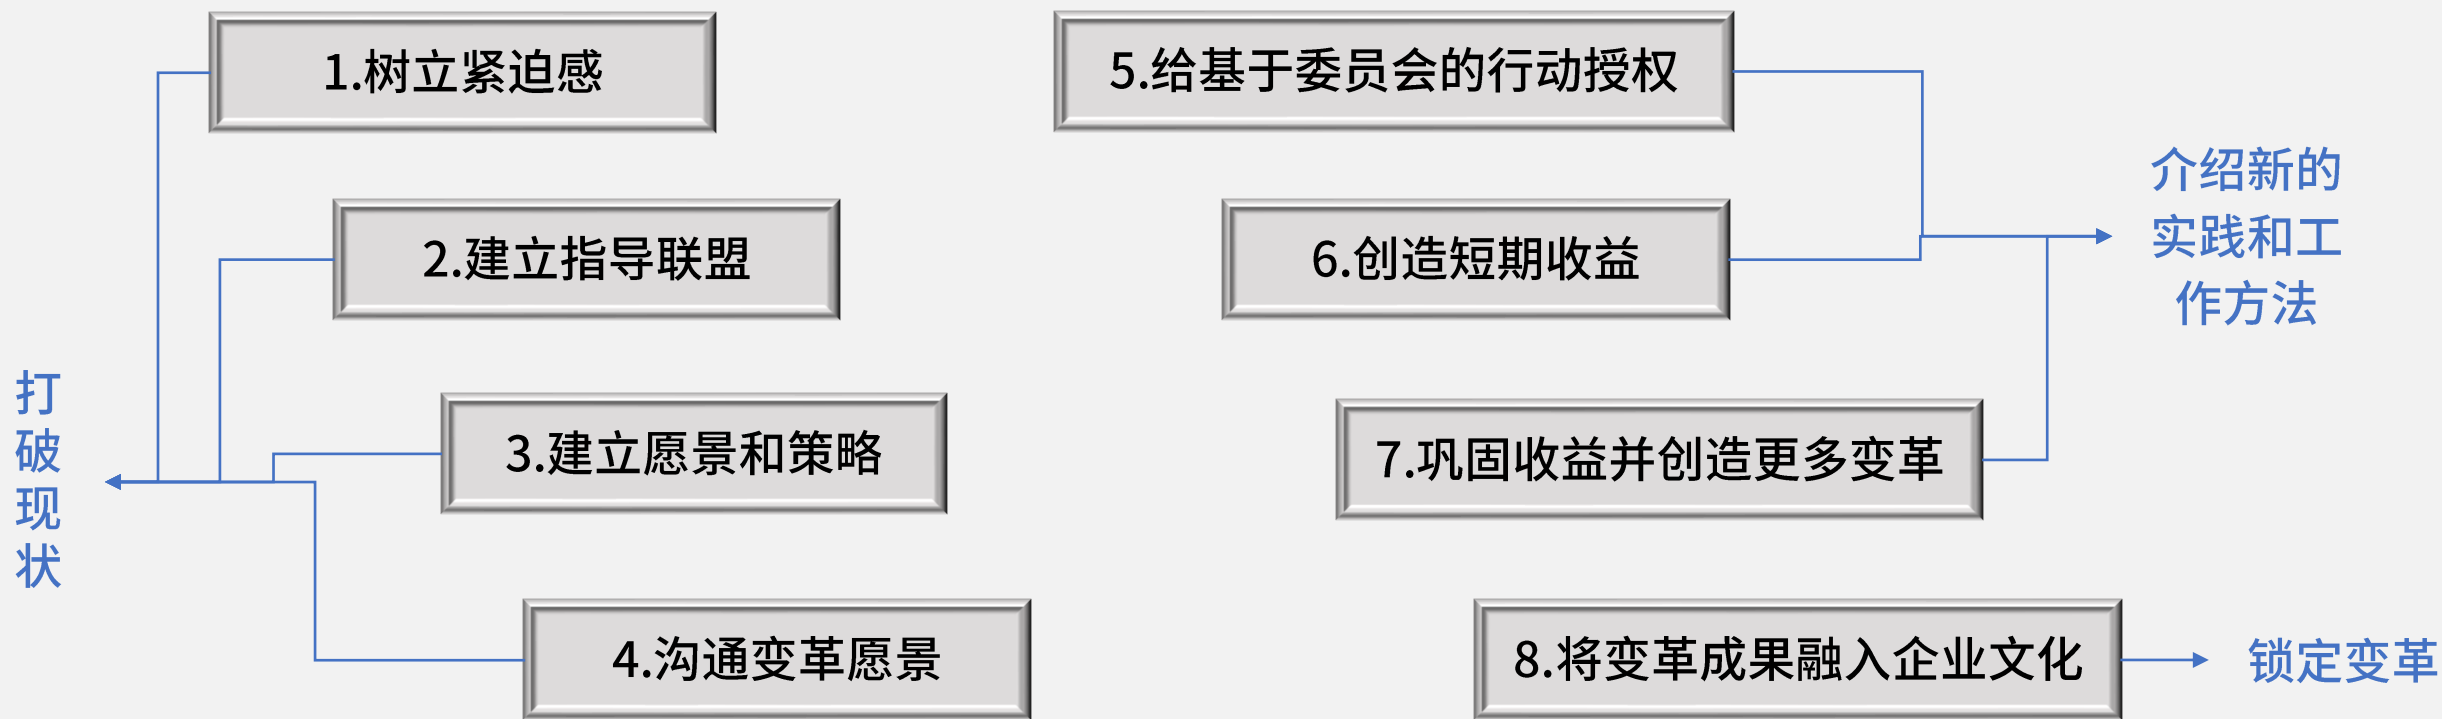

科特的重大变革八步法



组织变革

拓展

一个好的愿景有三个重要特指：明确性、动力性和一致性。

有效愿景的几项关键特征如下：

- 1) 充满想象。描绘了一幅未来的图景。
- 2) 吸引力。有利于增加员工、客户、股东和其他利益相关方的长期利益。
- 3) 可行性。目标现实、可实现。
- 4) 重点突出。为决策提供明确指导。
- 5) 灵活性。它足够普适，允许个人采取主动，并在条件或约束发生变化时做出替代计划和响应。
- 6) 可交流性。容易在5分钟或者更短时间内分享和清晰交流。



组织变革

拓展

科特确定了有效传播愿景的七大关键要素：

- 1) 保持简单。去掉行话、内部词汇和复杂句子。
- 2) 使用比喻、类比和例子。例如，一张简单的图（甚至是一些图片）可以胜过千言万语。
- 3) 适用不同场合。从电梯演讲到广播备忘录，从小型会议到全员简报，信息需要在各种不同的场合之间传递。
- 4) 重复，重复，再重复。思想在被内化和理解之前必须被多次听到。
- 5) 以身作则。重要人物行为需要与愿景保持一致。不一致行为会废掉所有其他形式的沟通。
- 6) 解释表面上的不一致。虎头蛇尾和未解决的协调问题会破坏所有沟通的可信度。
- 7) 给予和索取。双向沟通总是比单向沟通更有效。



组织变革




拓展

变革平衡公式

$$C = (D \times V \times F) > R$$

- 对现状的不满程度 (D)
- 对更好替代方案的愿景 (V)
- 实现目标所采取的第一步行动 (F)
- 组织中的阻力 (R)
- 变革 (C)



(希赛) 感谢您的观看
