


PMP® 考前冲刺 (一)

项目绩效域

讲师：杨波

2024年8月



开篇语

做一件事并不难，难的是在于坚持；坚持一下也不难，难的是坚持到底。因为坚持，毛毛虫能够破蛹成蝶，亲吻蓝天；因为坚持，柔弱的溪水能够到达大海，拥抱那一片蔚蓝；因为坚持，平凡的人能够实现梦想，打开成功的大门。流水不争先，争的是滔滔不绝。



CONTENTS


- 人员管理
- 过程管理
- 商业环境



第一部分 人员管理



干系人绩效域

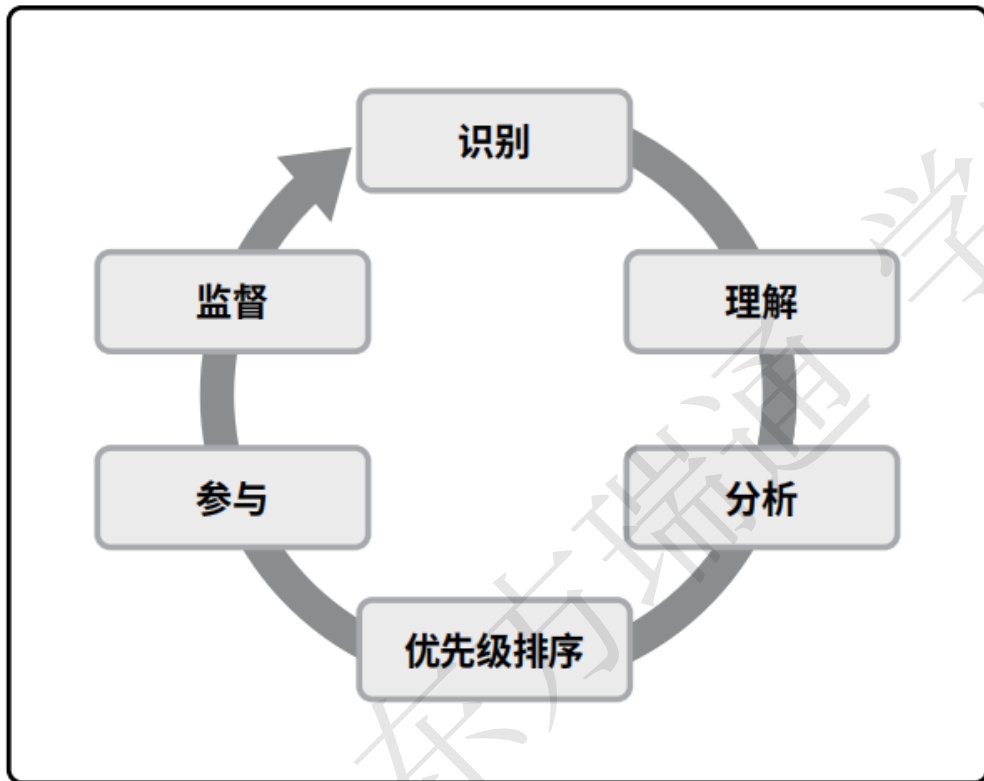

让干系人参与**目标制定和重要决策**，
对目标赞成

引导干系人参与项目，保持**良好工作关系**

项目受益者对项目的**支持和满意**

项目干系人的**有效参与**能促进**项目的成功**

理解反对者，有效开展转变工作

干系人管理

- 尽早结构化识别（全员持续参与）
- 干系人分析（权力、利益、影响力、需求、期望、态度）
- 干系人分类排序（权力利益方格、凸显模型）
- 记录干系人（更新干系人登记册）
- 参与程度分类（干系人参与评估矩阵）
- 制定参与策略（基于分类信息和参与程度，制定干系人参与计划）
- 制定沟通计划（基于沟通需求、技术、方法、文化和参与策略制定沟通管理计划）
- 管理干系人（担心、焦虑、疑惑、犹豫、不确定、不参与、不支持、不满意...）
- 管理沟通（遵循沟通管理计划，收集、分发、传递、处理信息）
- 监督参与（干系人分析、重新分类排序、更新干系人登记册和参与度评估矩阵）
- 调整参与策略与沟通策略（先更新干系人参与计划，再更新沟通管理计划）

干系人练习

鉴于先前与某客户共事的经验教训，项目经理注意到，客户对发送给他待其审批的文件的处理时间比较长，总是超过约定时间表，在与该客户举行的初始启动会上，项目经理应该如何为新项目解决此问题？

- A. 更新项目风险登记册，在其中注明可能会发生延误的情况。
- B. 告知客户需要额外增加资源，使客户有更多时间审核待审批文件。
- C. 告知客户其有责任按时完成相关文件审批。
- D. 与客户共同确定可接受的文件审批期限。

干系人练习

在管理某项目时，项目经理刚刚注意到，尽管前几张月度发票都很清晰，但还是受到客户拖延，所收到的实际发票款项也出现延误支付的情况，而且未按合同约定的付款日程表支付，最近的发票只是获得部分支付。项目经理该做什么？

- A 将未付款的情况增加到问题日志中，并对付款情况持续跟踪。
- B 与客户举行会议，以解决该问题。
- C 审查过往项目，了解与付款相关的经验教训。
- D 安排与项目团队开会，并更新采购管理计划。

干系人练习

为了开展一个敏捷项目，将一个客户设计成矩阵型组织。项目经理正在现场与来自该组织不同部门的关键相关方一同开展工作，项目经理应该如何应对不同的相关方？

- A：项目经理正在客户的营业场所开展工作，因此他/她遵循所有关键相关方的指示。
- B：这是一个敏捷项目，因此仅听从项目经理的主管和该组织职能部门经理的指示。
- C：由于观点各异，因此要进行相关方分析并根据结果行事。
- D：所有相关方都很重要，因此项目经理应该遵循管理层和关键相关方的指示。

干系人练习

一位关键的项目相关方在一个复杂的敏捷项目开始时就表现出兴趣，但随着冲刺的推进，由于需要承担额外职责，该关键相关方参与度下降。几个冲刺过后，该关键相关方拒绝了一项功能方面的可交付成果。下一个冲刺期间，团队需要对被拒绝的可交付成果进行返工，项目经理本应采取什么措施来避免发生这种情况？

- A：记录项目愿景和目标。
- B：分析相关方属性的变化。
- C：让关键相关方参与下一冲刺的决策过程。
- D：根据相关方的需要对相关方沟通进行定制。

干系人练习

一个项目团队正在计划下一次冲刺评审。项目经理收到高级经理的电子邮件，要求使用比发送给项目管理办公室(PMO)的月度报告更详细的模板获取项目状态。团队使用电子产品待办事项和看板来跟踪进度。项目经理接下来应该做什么？

- A. 让高级经理访问产品待办事项。
- B. 与高级经理一起组织看板审查。
- C. 联系高级经理并讨论他们的需求。
- D. 修改PMO模板以包含信息。

干系人练习

客户的项目经理在项目的最后阶段发生了变化。项目经理如何避免项目延迟关闭。

- A.更新干系人参与计划。
- B.审查最新的项目状态报告，并向干系人更新。
- C.将案件上报给客户的管理团队。
- D.提前向客户开具项目付款发票。

干系人练习

项目章程批准后，项目经理需要处理详细的项目需求、约束以及干系人的假设，但是非所有干系人可以在短期内立即参加会议。项目经理应该做些什么来收集所需的信息？

- (A) .分别通过电子邮件、电话或与每个干系人会面以获取他们的意见
- (B) .与可用的干系人举行会议，制定项目管理计划
- (C) .上报给项目发起人，告知并非所有利益干系人都可以参加会议
- (D) .在咨询干系人之前，与项目管理团队会面，以制定项目管理计划

干系人练习

项目发起人请求与项目有关的部分技术规格内容。项目发起人没有授权看规范，但坚持要看。在这种情况下，项目经理应该首先做什么？

- (A) .尽快与项目发起人会面，进一步讨论此事
- (B) .更新问题日志，使项目团队了解并制定策略
- (C) .制定干系人参与计划，帮助团队制定响应
- (D) .向项目发起人提供规格，并删除一些信息

干系人练习

一位项目经理正在领导一个软件开发项目。最近，团队成员抱怨说，在最近几次日常的站立会议上，一位关键干系人经常打断会议，要求解释，并提出计划外的更改。这个问题让项目团队感到沮丧，减缓了工作进度。项目经理应该怎么做？

- A. 指导团队按计划工作，忽略干系人的要求。
- B. 将情况上报给上级管理层。
- C. 增加更多的团队成员来弥补任何项目延误。
- D. 与干系人一起解决问题并解释情况。

干系人练习

项目经理认识到关键干系人没有参与项目，似乎对项目状态**不感兴趣**。项目经理担心，如果不满足干系人的期望，项目可能会偏离轨道。项目经理应该如何接近干系人？

- A.分析干系人的期望，强调可能影响项目成功的感兴趣的话题。
- B.定期向项目团队公告板发布更新，并在发布后通过电子邮件发送给干系人，以便干系人可以在方便的时候进行审查
- C.安排与干系人和项目团队的定期审查会议，以便干系人了解状态并与团队成员互动
- D.继续通过电子邮件发送状态报告，并安排与干系人进行一对一的会谈，以便定期向他们汇报项目状态

团队绩效域

- 信任（相互信任的氛围）
- 沟通与协作（促进团队的有效协作）
- 共识（共同的目标）
- 赋能（自主决策权）
- 认可（欣赏、奖励）
- 韧性与适应性（适应调整，快速恢复）

- 领导力
 - 建立愿景（项目的目的与方向）
 - 批判性思维（根本原因分析）
 - 激励（合作、内驱力、裁剪）
 - 人际关系
 - 情商（控制情绪与理解他人，**暂缓冲动的决策**）
 - 决策（群体决策，发散/汇聚，备选方案）
 - 冲突管理（合作、妥协、强迫、缓和、回避）

团队练习

得知作为项目团队的大力支持者和激励者的关键干系人即将离职，因此，团队的士气低落并且团队协作减弱。项目经理应该如何提高士气？

- A 开展团建以建立团队联系和情感纽带
- B 通过团队参与决策达成共识
- C 设定目标并推动团队实现目标
- D 确定团队的需求和愿望

团队练习

在一个多阶段项目期间，其中一位组件负责人一直未能共享测试详情并提供口头状态更新。这个问题在每周状态电话会议期间提出，并引发项目经理与该组件负责人之间对状态报告不合理的**争执**。项目经理应如何处理这种情况？

- A：记录该组件负责人的不合规情况并通过指导委员会标记该风险
- B：指导该组件负责人至项目管理办公室(PMO)以获取报告指南
- C：将该情况升级上报给项目集主管并建议更换该组件负责人
- D：与该组件负责人进行一对一会谈，就报告合规性达成一致意见

团队练习

项目经理被指派领导一个项目。项目经理希望运用**激励机制**鼓励团队在整个项目运作期间保持高绩效，项目经理该做什么？

- A：实施奖励制度，使团队保持敬业度和积极性。
- B：动用管理储备为一些团队建设活动提供资金。
- C：大幅增加项目估算，为团队活动提供缓冲资金。
- D：寻找其它方法提高团队绩效。

团队练习

一名项目经理被分配到一个技术研究项目。项目团队已经被指派，主要主题专家（SME）向项目经理发送一份执行该项目所需的技术技能清单。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将清单发送给项目团队，并要求他们接受所需技能的培训。
- B. 请职能经理审查资源库，并推荐合适的人员加入团队。
- C. 与项目发起人讨论该列表，以确认资源具有所需技能。
- D. 与项目团队会面，了解他们的技能，并确定潜在的差距和培训要求。

团队练习

为受石油和天然气勘探活动影响的社区成立了一个项目团队。团队需要与多个外部利益干系人进行交互。本地社区当局已要求与项目团队举行会议，讨论社区项目。项目负责人无法出席会议，团队对谁应该参加会议存在分歧。项目经理应该做些什么来防止这种**冲突**？

- (A) .向所有团队成员提供利益干系人参与计划的副本。
- (B) .定义了团队成员的角色和职责。
- (C) .更新了沟通管理计划。
- (D) .建立团队的基本规则。

团队练习

在开发新产品时，一个关键干系人对有关产品功能需求的信息不足表示担忧。产品团队不同意并提到已提供详细信息。项目经理应如何处理这种情况？


- (A) .组织与产品团队的讨论，以澄清缺失的信息。
- (B) .重定向利益干系人以与职能经理讨论此请求。
- (C) .记录新需求，并要求产品团队进行开发。
- (D) .进行新的风险和范围分析，识别缺失的信息。

第二部分 过程管理

确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。



开发方法与生命周期绩效域

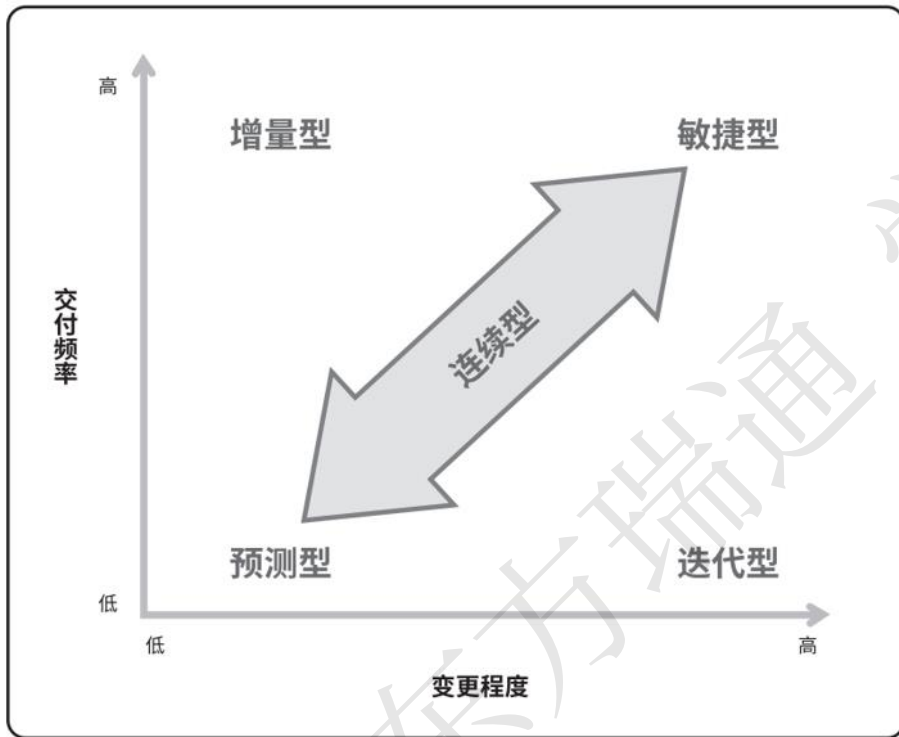

- 从需求和交付两方面来考虑生命周期的选择是最佳的方法。
- 还包括交付成果的创新程度、范围、风险
- 项目的干系人、进度、资金
- 组织结构、组织文化、组织能力、团队规模等。

规划+工作绩效域


规划

- 根据开发方法确定规划方法
- 对预测型项目进行渐进细化再汇总形成项目管理计划
- 对适应型项目根据愿景和路线图确定发布和迭代计划
- 明确计划如何批准和调整

工作

- 按项目计划开展项目工作，交付项目成果
- 维护项目基准
- 开展过程改进和审计，按测量指标检查和测试项目成果
- 不断改进团队能力
- 与干系人有效沟通，合理参与
- 开展符合采购政策的采购活动
- 对变更有效处理
- 注重知识管理
- 符合要求的项目或阶段收尾

项目生命周期的阶段划分和阶段关口以及早期的工作

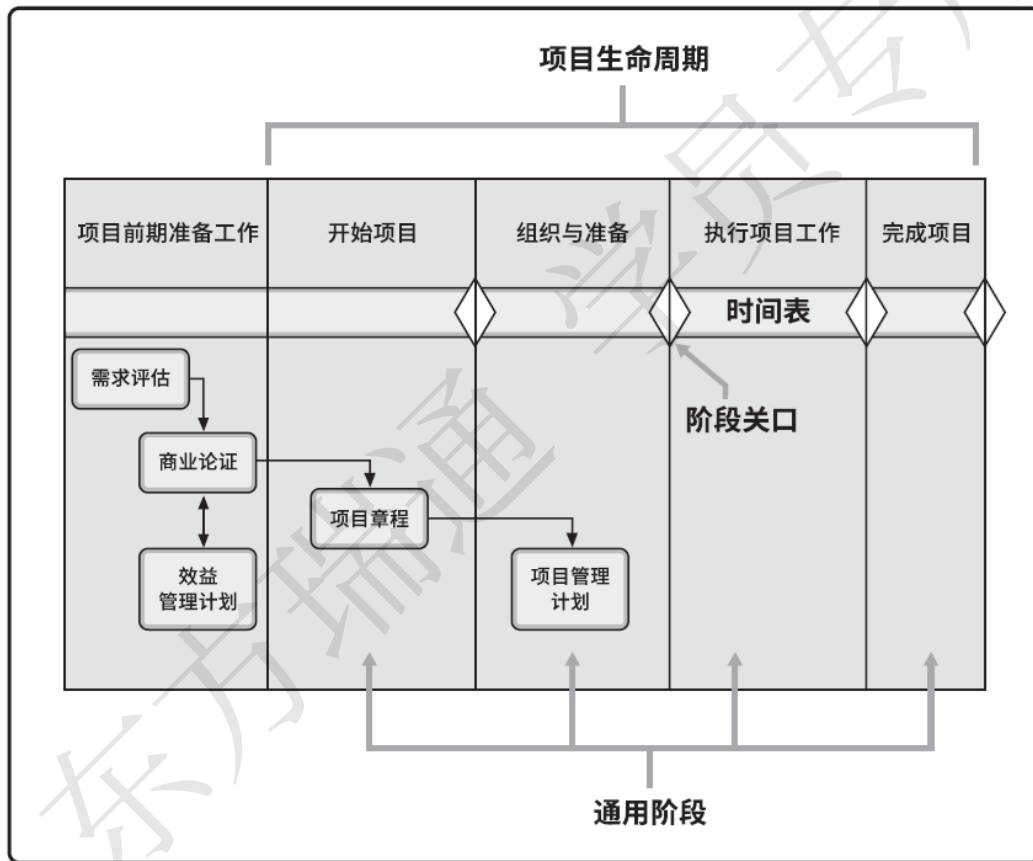

项目商业论证

商业论证是针对提议项目的价值主张，可能包含财务和非财务收益。



项目经理可以被任命参与**制定商业论证**，经调研并完成后需要得到发起人和/或客户的**审批**，以确定如何创造商业价值以及是否可合理。



如果项目或其干系人不再与商业需要保持一致，或者如果项目似乎不可能提供预期价值，则组织可以选择**终止此项投入**。



项目理由

它解释了为什么商业需要值得投资以及为什么在此时应该满足商业需要，项目理由会附有**成本效益分析**和假设条件



商业需要

商业为项目提供理由，并解释为什么开展该项目，提供了有关**商业目的和目标**的详细信息



商业战略

商业战略是开展项目的原因，所有需要都与**实现价值的战略**相关

收益实现计划

收益实现计划是对创造、提高和保持项目和项目集收益的过程进行定义的书面文件。

目标效益

项目实施可以创造的有形价值和
无形价值



战略一致性

项目效益与组织业务战略的一致程度

实现效益的时限

阶段效益、短期效益、长期效益和
持续效益



效益责任人

负责监督、记录和报告已实现效益
的负责人

测量指标

用于显示已实现效益的直接测量值
和间接测量值



风险

实现效益的风险

商业论证

客户向项目经理询问有关创造**商业价值**的机会。为了给客户一个适当的答复，项目经理应该先做什么？

- A. 检查整个项目的商业价值。
- B. 要求团队组织一个探针，以识别更多的价值。
- C. 与产品责任人会面，审查待办事项的内容。
- D. 与发起人会面，审查商业论证。

在产品开发过程中，项目经理观察到项目干系人之间的利益冲突，导致交付物和成果审批延迟。项目经理应该关注哪个领域？

- A.修订项目管理计划，以确保按时交付成果
- B.增加项目更新会议的频率，让干系人了解情况
- C.重新审视干系人参与计划，重点关注被忽视的特定干系人
- D.审查商业论证并确定范围内的差距。

效益管理计划

一个处于第二阶段的项目已经指派了一名新的项目经理。第一阶段创建的产品被转移到运营中。在一次会议上，项目发起人抱怨一些报告包含关于产品价值的冲突数据。新项目经理下一步该怎么办？


- (A) 审查效益管理计划
- (B) 参考第一阶段的经验教训
- (C) 查阅前任项目经理的项目报告
- (D) 向相关部门收集信息

效益管理计划

项目管理办公室（PMO）最近采用了一些敏捷实践。在迭代过程中，业务中的一个关键干系人关心项目文档存储库中的收益管理计划，并提到一些收益尚未更新。项目经理应该首先做什么？

- (A) 更新风险登记册以添加问题。
- (B) 查看有关问题的问题日志。
- (C) 修订收益管理计划。
- (D) 评估存储库以检查不一致性。

预测性项目-整合管理

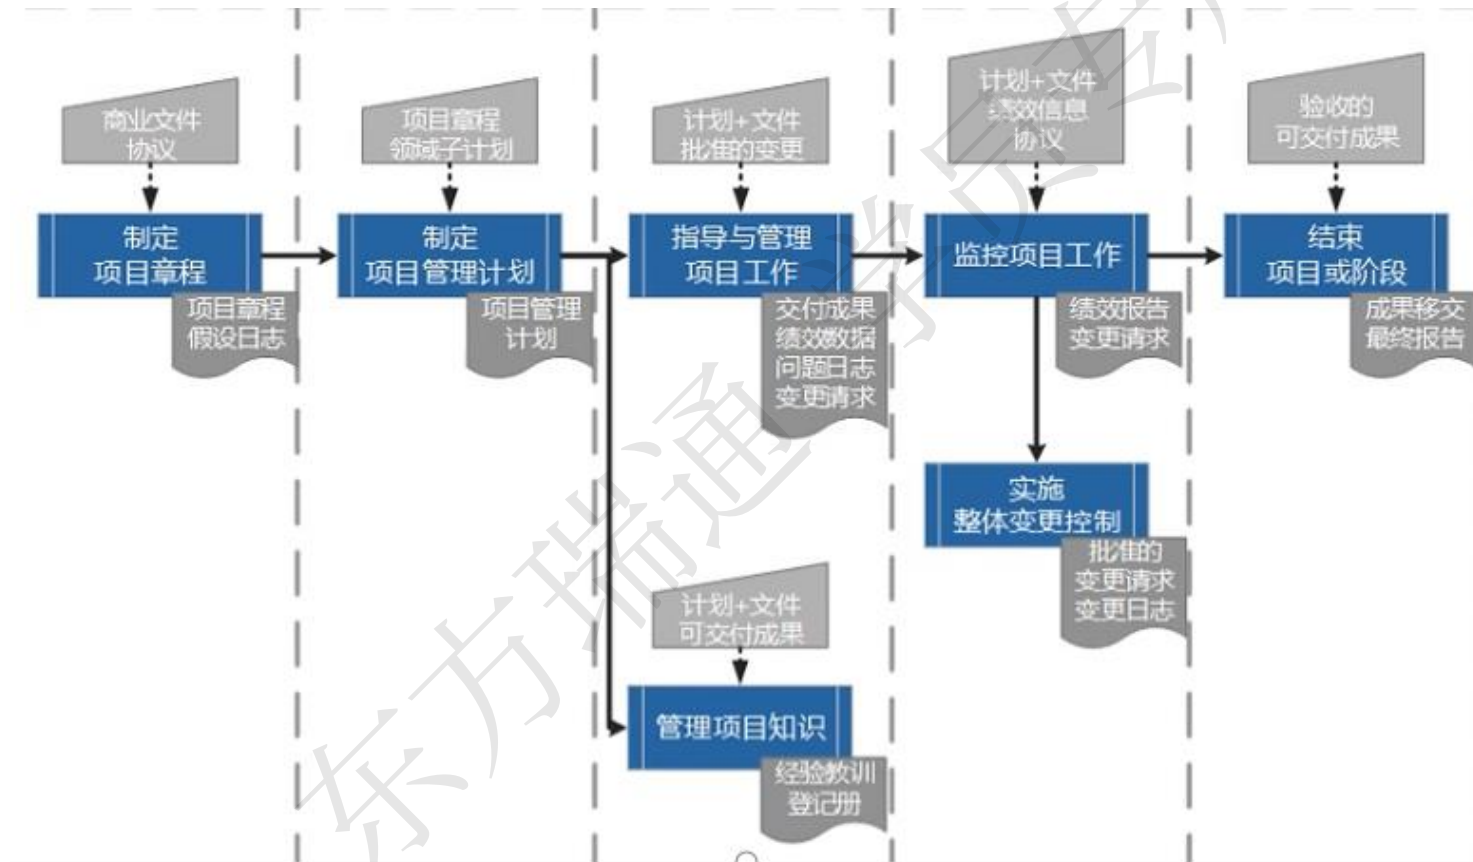

整合练习

一个新入职的高级项目经理加入到一个正在执行阶段的政府重大投标项目，该项目涉及多个分包商，团队处于不同本国的城市，发起人要求项目经理尽快熟悉项目业务范围，带领团队高绩效的开展工作，项目经理首先应该做什么？

- A：确认项目章程和项目管理计划的目标，确保遵循SMART和一致性原则
- B：和本地团队沟通，熟悉团队的工作风格
- C：因为自己不熟悉具体业务，更新风险登记册
- D：召集各分包商代表开会，传达自己未来对项目的规划

整合练习

一个全球项目的项目管理计划获批两周后，项目经理意识到，虽然计划已获批准，但对于项目经理提交审批的计划，国际相关方有**不同程度的理解**。项目经理本应采取什么措施来阻止这种情况发生？

- A：针对各个文化和时区，分别召开开工会议。
- B：在开工会议上确认各相关方的理解情况。
- C：在开工会议后将会议纪要发给各相关方。
- D：在开工会议结束后，立即审查所有批准。

整合练习

一个大型复杂项目的项目经理了解到，一位关键相关方反对在项目后期批准的一项变更，项目经理不愿冒犯这位相关方，但也不希望延迟该项目。项目经理应该做什么？

- A、与该相关方一起审查沟通管理计划
- B、取消已批准的变更，以满足相关方的要求
- C、与相关方一起参考变更日志，以解释变更的批准
- D、与相关方一起讨论相关方登记册

整合练习

一家公司已与一家水电站签订了软件开发合同。项目管理计划指定Scrum作为开发方法。在项目的几次冲刺阶段，监管机构通知执行机构，由于新的环境法，原本不包括在范围基准中的安全功能将需要被内置到软件中。项目经理的最佳行动方案是什么？

- A、发出变更请求以更新项目管理计划，一旦获得批准，确保范围基准得到更新
- B、与产品负责人进行根本原因分析，以确定安全功能包含在范围中的风险
- C、使用MoSCoW模型来梳理范围基准，并将新的安全功能分类为"应具有"
- D、在冲刺计划期间与团队讨论新功能，如果团队同意，请他们在下次冲刺中实现功能

整合练习

项目经理被分配到一个时间紧迫的项目中。由于最近的市场变化，营销团队已经确定，最初在范围内的一些功能不再需要。项目经理应该怎么做？

- A. 告知营销团队，在项目的这个阶段，不再接受对范围的更改
- B. 将问题上报给项目管理办公室（PMO），并确保他们了解变更对进度的影响
- C. 根据营销和销售部门的意见更新风险登记册，并强调讨论中功能的好处
- D. 与项目干系人一起审查变更请求，并评估范围缩减的影响

整合练习

一个项目是为了设计新的政府机构服务,其所有可交付成果均已获得验收。设计活动产生了许多**机密文件**。作为收尾过程的组成部分,项目经理应该做什么?

- A、将文件添加到公司知识库以供将来参考
- B、参阅合同中有关处理机密材料的政策
- C、从项目管理办公室(PMO)获得有关如何销毁机密材料的指示
- D、按照PMO保留政策归档项目文件



范围练习

相关方识别工作已完成，并且相关方位于许多不同国家，项目经理需要收集基于项目章程中确定的高层级需求所提出的详细需求。为了快速从这些相关方收集信息，应采用的最佳数据收集技术是哪一项？

- A：与各相关方召开单独的会议
- B：与相关方召开Web会议
- C：焦点小组会议
- D：调查

范围练习

项目经理正在领导一个敏捷软件开发项目，截止日期严格，客户抱怨上次部署不符合验收标准，开发团队负责人认为部署符合所有规范，并且具有提供客户规格的证据，项目经理应该怎么做？

- (A) .安排与所有利益相关者的会议，以了解哪里出了问题以及谁应承担
责任
- (B) .与团队负责人和客户一起审查需求跟踪矩阵，以充分解决问题
- (C) .与客户会面并讨论项目截止日期
- (D) .寻求批准，以便有更多时间进行返工并解决问题

范围练习

在某产品最终版本获批之前举行的相关方会议上，其中一位相关方抱怨称，该产品的某一特性不符合要求。项目经理应先采取哪项措施？

- A：与相关方讨论该问题，并为相关方演示特性以展示正确性
- B：估算增加该功能的成本并让相关方予以批准
- C：对已定义的产品特性进行审查
- D：根据该相关方的要求提交变更请求

范围练习

项目经理的任务是交付大量的可交付成果，这些可交付成果需要几位顶级开发人员在接下来的几周内完成。由于可交付成果的**规模和复杂性**，工作不能分配给一个人。项目经理应该先做什么？

- (A) 请求其他开发人员加入项目团队
- (B) 使用工作分解结构（WBS）流程分解可交付成果，使其更易于管理任务分配
- (C) 将整个可交付成果分配给第一个可领导的开发人员，并让他们将工作分配给其余的开发人员
- (D) 将情况作为风险纳入风险登记册，识别风险影响，以及可能的缓解措施，并密切监控。

范围练习

客户正在审查新的报告系统，并通知项目经理打印模块中的一个组件不完整。项目经理审查工作分解结构（WBS），并确认该组件已包含在内。

项目经理首先需要做什么？

- (A) 提出变更请求以立即实现打印模块组件。
- (B) 立即将此问题上报给项目发起人
- (C) 要求项目团队对打印模块组件进行质量审计。
- (D) 与项目团队会面，了解问题并确定行动。

范围练习

在项目的启动阶段，关键利益干系人要求频繁更改项目范围，项目经理应该做些什么来改善干系人的密切关系？

- (A) .与关键干系人讨论工作分解结构（WBS），并完善要求
- (B) .更新项目待办列表并与主要干系人讨论。
- (C) .更新项目章程，并与主要干系人进行讨论。
- (D) .与主要干系人讨论项目范围声明并构建原型。

范围练习

在定义项目范围的会议上，干系人告诉项目经理，合同中要求的主要特征不适用于当前项目，并将其记录在经验教训中。项目经理应该做什么？

- A、 与团队一起检查，了解哪些可以做，并咨询专家
- B、 要求发起人关闭项目并支付合同违约金。
- C、 检查此信息是否正确记录
- D、 与发起人会面，寻求他们的支持

范围练习

在设计阶段的中途，指派一名项目经理开发一台线材弯曲机。项目经理发现，该团队没有设备的任何测试用例或验收标准。项目经理开始与团队沟通，推动项目向前发展。在这个过程中，项目经理应该先做什么？

- A.与质量计划经理会面，确定尚未制定质量计划的原因
- B.与硬件设计工程师会面，确定建立机器市场所需的最低性能
- C.与销售和市场团队会面，确定在与潜在客户的访谈过程中收集到的要求
- D.与主要利益相关者会面，为开发团队确定合适的产品概念

范围练习

一家专注于使用预测方法交付项目的公司任命了一位使用**混合方法**的新项目经理。项目范围包含许多不明确的需求。项目经理应该如何计划项目的交付？


- (A) 在对项目采取任何进一步行动之前，请等待需求更加明确
- (B) 忽略不明确的需求，专注于项目的交付计划
- (C) 将不明确需求的问题上报给管理团队，等待最终授权
- (D) 分解需求并将需求划分为迭代工作包的优先级。

范围练习

项目经理正在准备项目结束报告。项目发起人对项目的成功充满信心，但客户不确定项目产出是否能满足他们的业务需求。项目经理应在结束报告中强调哪一方面，以解决干系人的担忧？

- (A) 质量是如何管理的。
- (B) 如何满足验收标准。
- (C) 范围是如何管理的。
- (D) 如何管理干系人。

预测性项目-进度管理

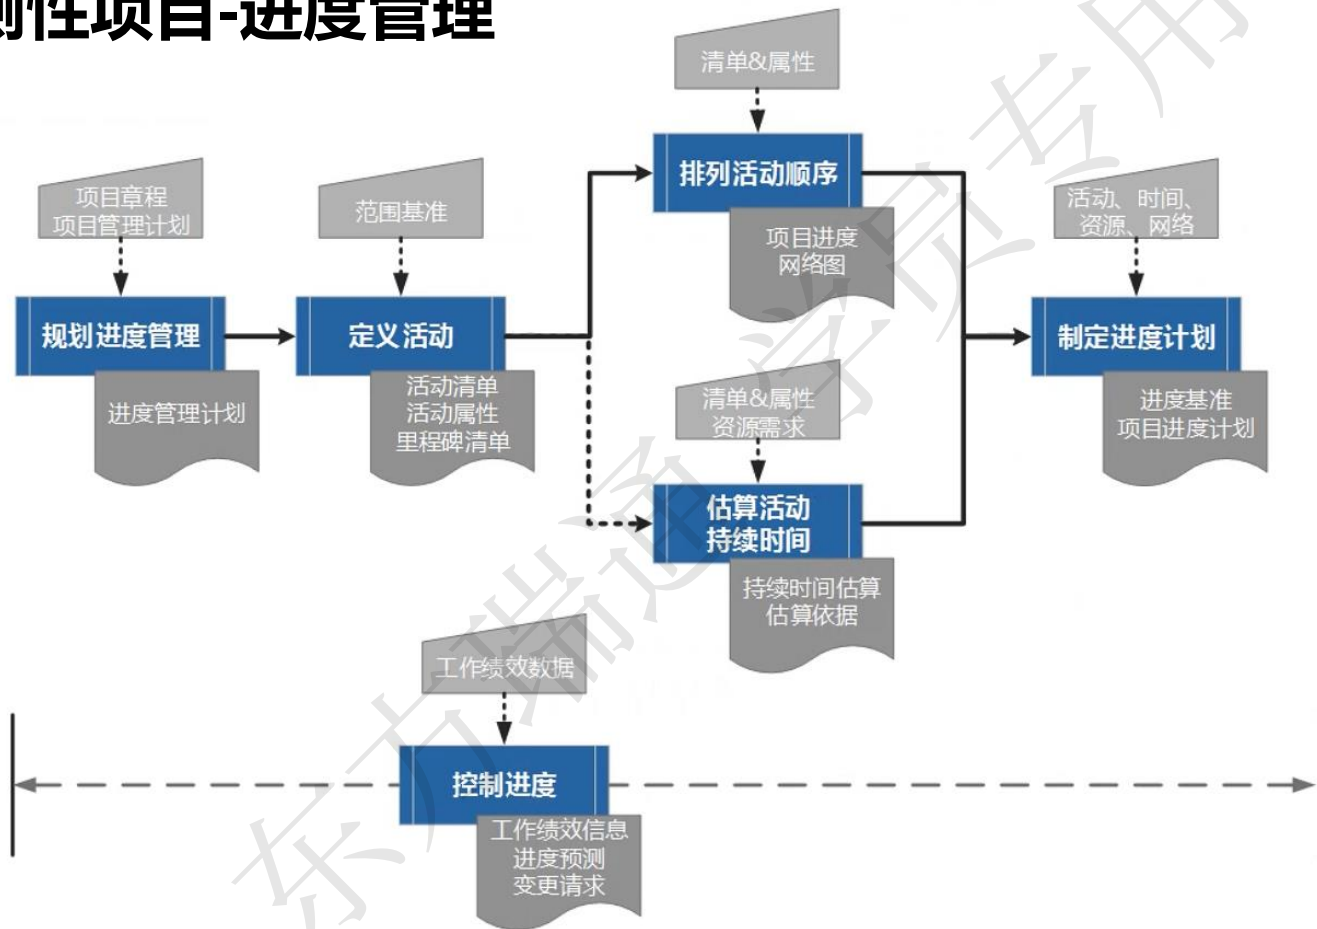

进度练习

项目发起人批准项目里程碑进度计划并任命一名项目经理。项目经理评审进度计划之后，得出日期不现实的结论，未考虑任务的依赖关系和资源制约条件。项目经理下一步应该怎么做？

- A、进行挣值分析，并通知发起人
- B、进行关键路径分析，将新的最短工期上报发起人。
- C、对批准的进度计划赶工，并获得发起人的批准。
- D、执行进度网络分析，并与发起人沟通。

进度练习

一位项目经理刚刚被分配到一个正在开发新设计产品的团队。工作分解结构（WBS）已经批准，活动已经分配给团队成员。项目经理发现有些活动可以由其他团队成员更快地完成。如果当前作业保持原样，项目可能会延迟2周。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- (A) 查看团队的工作分配并重新分配一些任务，以缩短关键路径。
- (B) 按计划维护任务分配，并压缩其他任务以使项目如期进行。
- (C) 要求团队成员加班，以便按照时间表按时完成任务。
- (D) 自项目管理计划批准以来，保持任务分配不变。

进度练习

一位项目经理向主要相关方介绍了项目进度计划，但他们要求比预定日期提早两个月完成项目，项目经理应该做什么？

- A：召开相关方会议，使他们对于项目期限和范围的期望达成一致。
- B：通过剔除某些活动和缩短期限来缩减项目范围。
- C：加快进度计划，在缩短期限的同时使项目范围保持不变。
- D：更新资源管理计划，为该项目分配更多资源，以便提早按原定范围完成项目。

进度练习

在一个项目的编程活动中，每个模块预计持续35天，但第1个模块的编程就已经用了45天。项目经理应该做什么？

- A：让团队加班加点按时完成可交付成果。
- B：向项目发起人提交变更请求，以便更改进度计划。
- C：检查范围，核实是否存在范围蔓延问题，使项目符合进度计划。
- D：评估情况，确定相关方法，以便在不影响基准的前提下压缩进度计划。

进度练习

项目经理被指派负责的一个项目正处于开发阶段，审查项目进展情况时，项目经理发现几项任务**落后于进度计划**，经过调查，项目经理发现几名团队成员被职能经理抽调开展其他任务，这使他们无法全身心地投入项目，项目经理可以采取哪两种措施来让团队重回正轨？（选择两项）


- A：与团队一起确定可加速交付项目的方案。
- B：允许他们按照现有速度开展工作。
- C：与职能部门经理讨论项目延误的风险和工作的优先级。
- D：举行每日站会，以汇报项目整体进展，并对齐工作。
- E：就进度延误问题，立即提醒业务相关方。

进度练习

分配到关键项目的经验丰富的团队成员也在支持其他几个项目，这导致了关键项目的延误。如果这个关键项目没有按时交付，该公司可能会被政府罚款。项目经理应该做什么？

- A. 与项目发起人讨论该问题。
- B. 审查关键路径上任务所需的资源。
- C. 审查和更新风险管理计划。
- D. 分配资源以培养其他团队成员的能力

预测性项目-成本管理

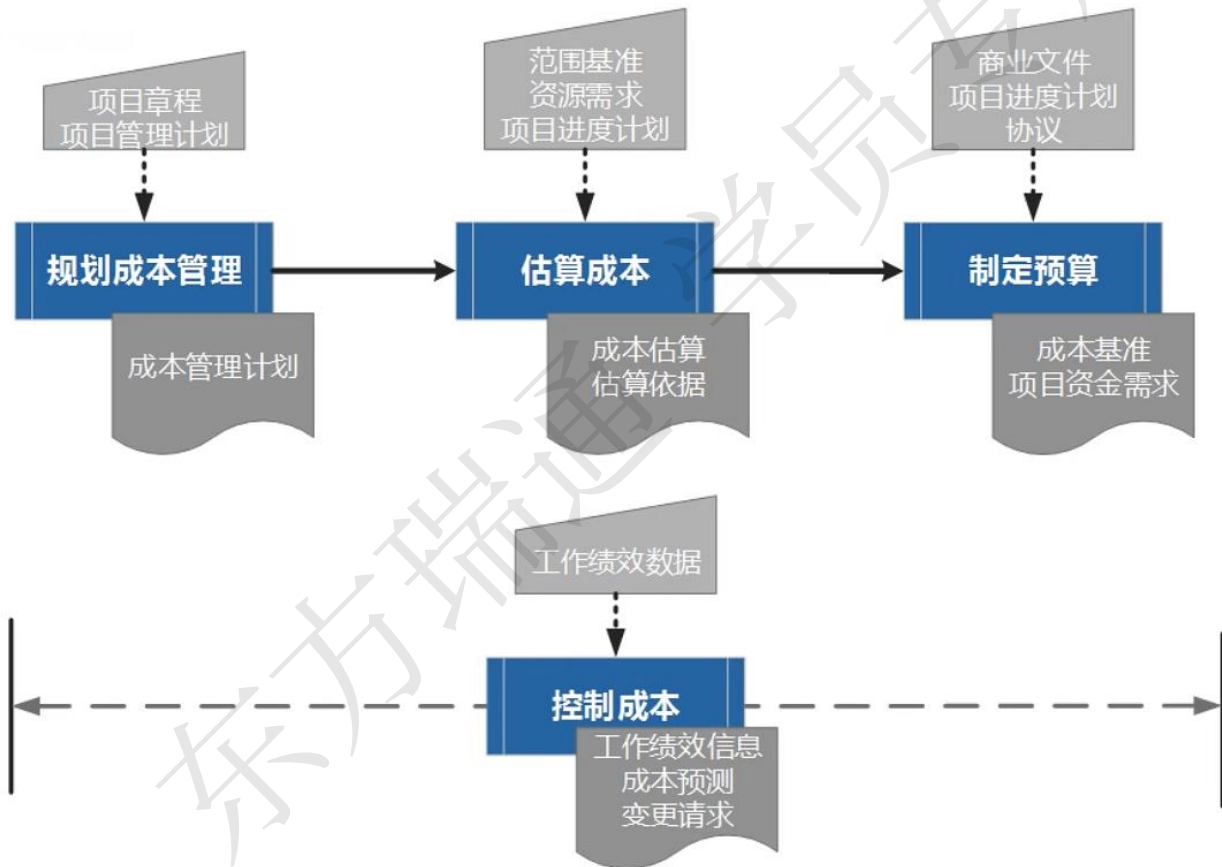

成本练习

一位项目经理邀请公司CEO、发起人、团队成员和一位外部客户代表参加会议，审查项目管理计划。项目经理开始介绍**预算**，但CEO突然要求结束会议。项目经理应该怎么做才能**避免**这种情况？

- A、与外部客户代表一起进行根本原因分析，并将分析结果记录在经验教训登记簿上。
- B、在会议之前，先将演示幻灯片发给内部参与者，然后再发给外部客户代表
- C、在邀请外部客户代表参加会议之前，与内部参与者和CEO一起审查成本管理计划。
- D、在邀请外部客户代表参加会议之前，审查了沟通管理计划

成本练习

一个施工项目的已批准成本基准包含一些已识别风险的储备。在执行阶段，发生了一次地震，但该项目并未考虑此风险，需要资金进行灾后恢复。

项目经理应该做什么？

- A、无需寻求授权即可变更项目的成本基准，并继续进行项目工作
- B、向变更控制委员会(CCB)提交申请，以获得额外资金和成本基准变更
- C、在未咨询CCB的情况下，使用已识别风险的储备来支付灾后恢复成本
- D、要求管理层授权将已识别风险的储备用于支付灾后恢复成本

成本练习

项目经理正在领导的一个项目呈现出超过成本基准的趋势。项目经理应首先做什么来管理预算？


- A：告知相关方项目完成时会超出预算。
- B：向项目发起人寻求帮助，使预算重回正轨。
- C：与项目团队开会分析实际成本，以确定偏差。
- D：提出变更请求（包括分析），以增加预算。

成本练习

项目经理正在处理一个建筑项目。公司负责人要求项目经理在4小时内为新装修项目提供成本估算。项目经理将如何完成此任务？

- (A) .告诉负责人，将提供一个粗略的数量级。
- (B) .联系主题专家（SME）寻求建议和咨询。
- (C) .召集项目团队开会，确定最合适的方法。
- (D) .告诉负责人，该任务需要更多的时间和专业知识。

预测性项目-质量管理

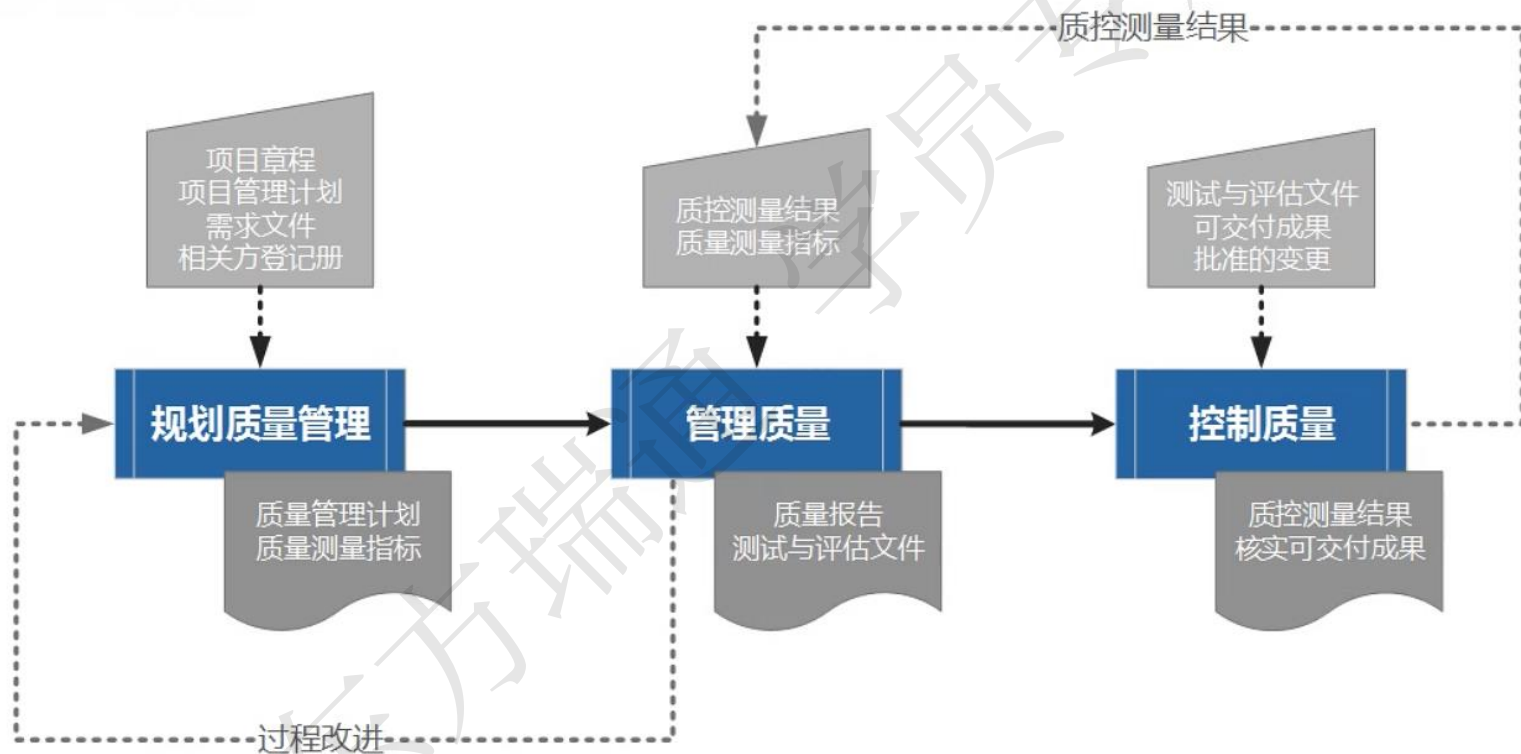

质量练习

一位项目经理正在开展一个软件开发项目。一位团队成员抱怨称，由于该项目中的任务都很简单，不需要进行质量控制。项目经理明白，将质量管理计划从项目中砍掉也有助于省钱，这对该客户非常重要。项目经理应该做什么？

A：制定质量管理计划，因为质量管理与成本和进度计划管理同等重要。

B：将没有质量管理计划就开始开展项目登记为风险，并将节省的预算分配到管理储备之中。

C：获得管理层的确认，团队成员拥有足够的经验，可在不进行质量控制的情况下开发软件。

D：让客户在接受项目可交付成果之后安排进行外部质量审计，并减少项目预算。

质量练习

一个项目正在成功交付其产品成果，客户满意度评价很高。然而，在内部审计过程中，发现某些关键的流程文件和批准缺失，项目被评估为不合规。项目经理接下来应该做什么？？

- (A) .与项目管理办公室（PMO）一起审查最新的项目管理标准并对质量管理计划进行更改。
- (B) .执行质量保证，根据质量管理计划审查流程并确定差距。
- (C) .审查并更新项目文档库中缺失的文档和批准。
- (D) .改变质量管理流程，使之与项目目标保持一致。

质量练习

一位项目经理最近被分配到一个即将开始的新项目。该组织已经与客户签署了一份固定成本合同，详细说明了范围和最终交付日期，但项目经理已经确定了几个内部约束和条件，这些约束和条件肯定会阻止项目在最初计划的迭代次数内完成。项目经理接下来应该做什么？

- (A) 创建一个问题日志，用于识别和跟踪障碍。
- (B) 制定应急计划，以防项目偏离初始计划。
- (C) 制定进度管理计划，确保项目符合交付日期。
- (D) 创建假设日志，并根据对项目价值的影响将假设映射到障碍。

质量练习

一个项目分多个阶段执行。项目团队完成了第一阶段的可交付成果。第一阶段的可交付成果在进行完整性确认，以判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准。目前正在执行下列哪一项项目过程？

- A. 确认范围过程
- B. 管理质量过程
- C. 控制范围过程
- D. 控制质量过程

质量练习

在执行阶段，为项目分配一个新的项目经理。几个关键利益干系人通知新的项目经理，该项目存在一些严重的问题。新分配的项目经理应首先做些什么来了解问题？


- (A) .将问题上报给项目发起人。
- (B) .查看问题日志以确保捕获了问题。
- (C) .检查风险管理计划，以确保有解决问题的策略。
- (D) .请关键利益相关方与项目团队讨论问题。

质量练习

在项目接近尾声时，项目经理没有得到关键利益相关者的批准，因为必要的交付成果没有按预期运行。项目经理接下来应该做什么？

- (A) .审查干系人参与计划
- (B) .审查质量管理计划
- (C) .查看需求跟踪矩阵
- (D) .审查工作分解结构 (WBS)

预测性项目-资源管理

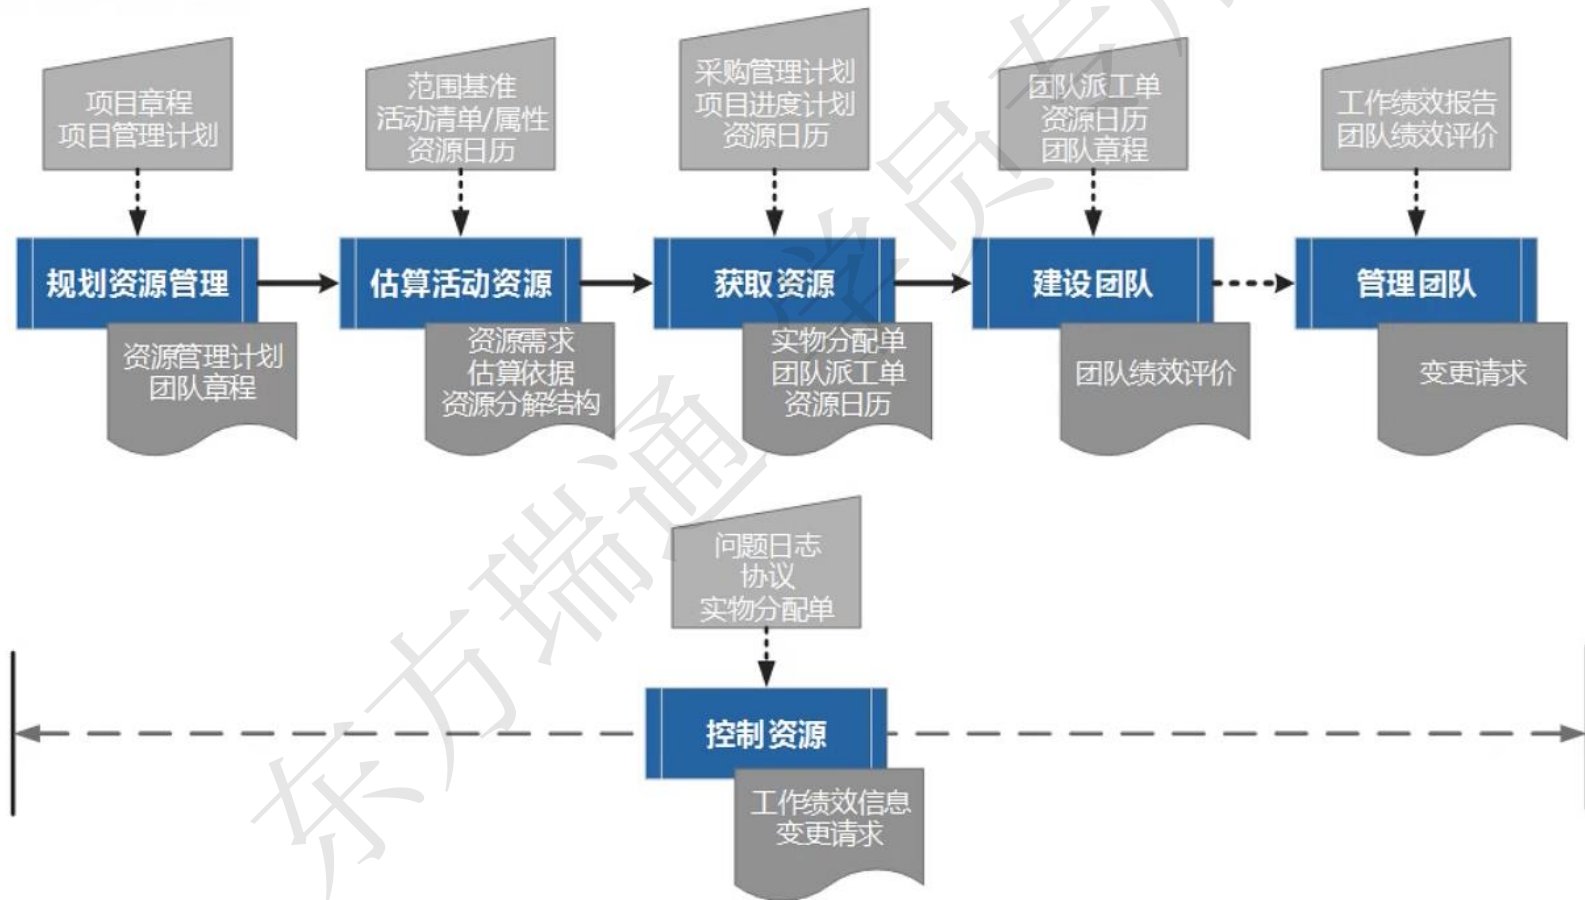

资源练习

项目经理正在管理一个项目，该项目的成员分布在世界各地不同时区。往往需要等待其他时区的成员醒来了才能回复问题，进而导致了项目工作停滞不前。项目经理本应该做些什么来避免这种情况？

- A 使用通信工具，例如视频会议，以便不同的办公室可以进行通信
- B 计划和安排能克服地理和时区挑战的任务和工作包
- C 确保项目将是所有团队成员的最高优先级
- D 更多地了解每个团队成员在分配项目工作之前喜欢如何沟通

资源练习

在项目启动期间，项目经理为一个项目整合分布在全球的团队协作，该项目的成功取决于项目成员之间的**合作和团队协作**。若要确保这些**多元文化**团队的成功，项目经理应该做什么？


- A、制订一份考虑文化差异和团队建设的沟通管理计划
- B、创建一份风险管理计划，确认与多语种团队协作的风险
- C、制定一份考虑文化差异和团队建设的资源管理计划
- D、制定干系人参与计划，以分析团队成员的需求和文化差异

资源练习

在编制资源管理计划时，项目经理发现来自职能部门的一名成员需要经过3天的培训，才能具备某种特定的技能来完成某个特定的工作包。由于专业的限制，项目团队中没有其他人可以替代该成员。项目经理应该怎么做？

- A、在项目进度计划中增加3天时间
- B、要求他利用业余时间完成这3天的培训
- C、把该培训加入计划中，并进行风险分析
- D、要求用一个不需培训的成员来替换该成员

预测性项目-沟通管理

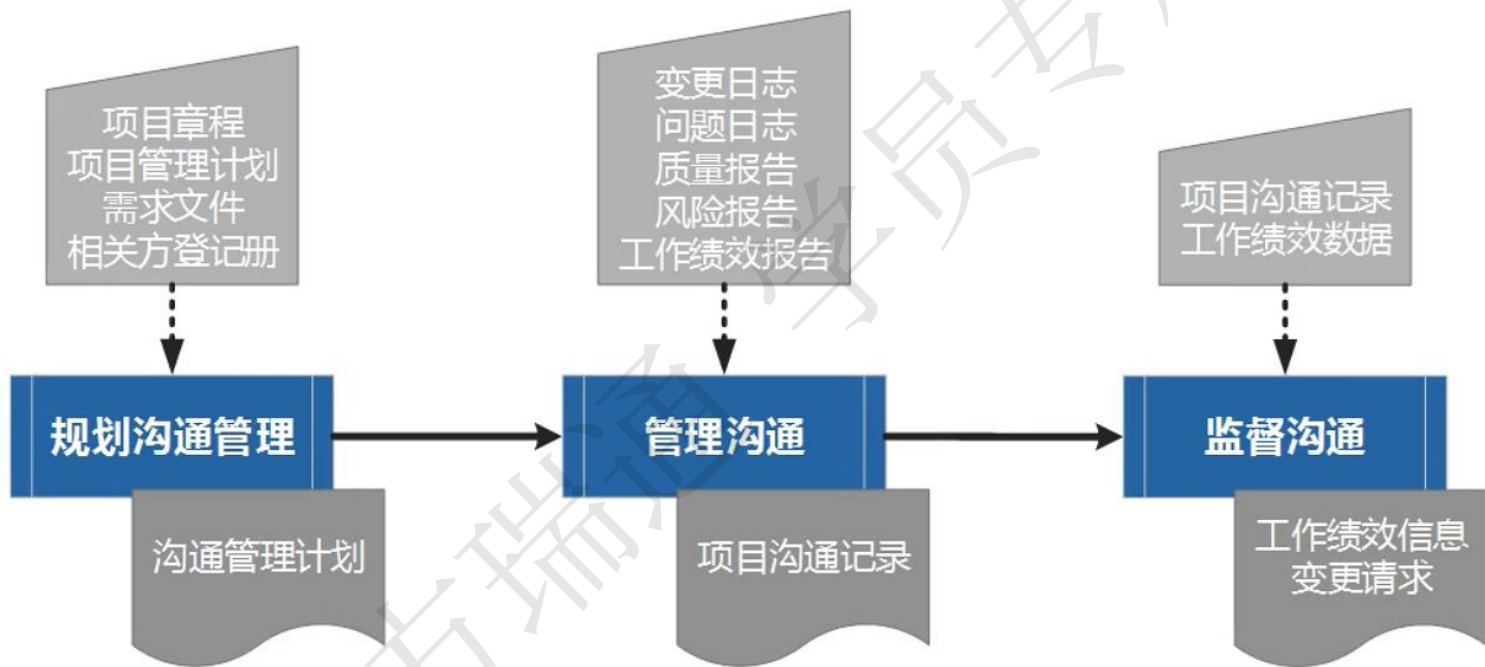

沟通练习

为了应对一些计划任务上的延误，项目经理重新安排了一些后续任务的优先级以解决这个问题。重新确定优先级并没有使项目回到正轨，现在项目经理需要将问题上报给项目相关方。为了上报问题，项目经理首先应该做什么？

- A. 查阅沟通管理计划。
- B. 审查相关方参与计划。
- C. 查阅变更管理计划。
- D. 审查风险管理计划。

沟通练习

一个混合项目在产品的敏捷交付和营销策略的预测性开发方面都遇到了几个问题。项目经理应该做些什么来接收来自不同时区的干系人的反馈？

- A. 参阅干系人参与计划。
- B. 为所有干系人安排一次电话会议。
- C. 参阅沟通管理计划。
- D. 向所有干系人发送电子邮件。

沟通练习

为了保证质量，对项目执行计划中使用的过程进行了质量审计。审计员提出的不合格问题之一是缺少项目风险审查会议的出席名单。为什么出席名单很重要？

- A.项目的标准做法是召开风险审查会议，会议应记录出席情况
- B.出席人员名单证明与适当的项目团队成员举行了风险审查会议
- C.这是一个显示会议与会者人数的记录
- D.这是一份在经验教训登记册中登记的文件

沟通练习

一个项目需要在技术部门之间进行详细信息交流，项目团队位于不同位置。一些团队成员对提议的沟通系统没有经验。项目经理应该从哪个维度来解决这个问题？

- A. 沟通管理计划
- B. 沟通技能
- C. 项目沟通渠道
- D. 沟通技术

沟通练习

项目发起人及时收到项目信息和更新，但发起人很担心，因为报告中缺少关键信息。项目经理接下来应该做什么？

- A、 审查关键干系人的沟通需求。
- B、 确认发起人理解项目信息并收到发起人反馈。
- C、 确定沟通方法、频率和详细程度。
- D、 向干系人提供所有项目信息。

沟通练习

在跨国项目中，干系人位于不同的时区。项目经理有与干系人定期召开项目更新会议。但是，一组从未参加过项目更新会议的干系人正在向项目发起人抱怨他们对这个项目知之甚少。项目经理应该怎么做？

- (A) .与所有干系人讨论该问题，并制定沟通管理计划以满足所有干系人的要求。
- (B) .确保投诉的利益干系人出席下一个项目更新会议。
- (C) .记录定期项目更新会议，并在会议结束后与所有干系人分享。
- (D) .将会议时间更改为抱怨者的工作时区。

沟通练习

为了简化项目沟通，项目经理为所有干系人建立了一个共享门户，以获取项目信息。发起人抱怨这个系统，并表示它无效。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生？

- A. 分析了发起人的沟通要求。
- B. 已确认门户网站提供了足够的信息。
- C. 已验证项目团队是否遵循了沟通管理计划。
- D. 确保发起人具备使用门户网站的必要技能。

沟通练习

当客户添加新的项目团队成员时，项目经理刚刚完成项目规划。项目经理知道新的团队成员只在远程工作，不在主办公室。此外，新团队成员在面对面的环境中快速参与决策，但在其他方面反应迟缓。项目经理应该如何在他的计划中反映这一点？

- A. 定期发送现场项目会议邀请，以确保团队成员出席。
- B. 更新项目章程，以包括此项目的新团队成员。
- C. 监控新团队成员的意见，以衡量他们对项目的价值。
- D. 将团队成员纳入干系人登记册，并更新沟通管理计划。

沟通练习

项目经理在项目进行到一半时被指派。团队成员分布在全国各地，他们无法经常见面。在状态审查会议上，一位干系人强调，他们不知道项目交付成果的状态。项目经理首先应该做什么？

- A.要求项目团队收集干系人的详细信息，并确保与干系人共享项目状态报告。
- B.安排与干系人会面，并将干系人的需求纳入项目管理计划。
- C.审查干系人参与计划，更新干系人登记册，以纳入项目管理计划。
- D.审查沟通管理计划，并验证干系人的需求是否包含在项目管理计划中。

沟通练习

一个项目团队错过了大型软件开发项目里程碑的交付日期。项目治理规定，当错过里程碑时，应向项目干系人（包括项目经理的主管）发送正式沟通。项目经理担心这会对团队产生不良影响。项目经理应该怎么做？


- A.就错过的里程碑发送正式沟通
- B.在项目团队赶上之前，推迟发送正式沟通
- C.要求与发起人会面，以决定是否发送正式通信
- D.放弃正式沟通，与主管进行对话

沟通练习

一位项目经理正在领导一个银行信息技术现代化的项目。项目经理需要确定项目干系人应该如何沟通，并与项目团队讨论了各种选择。项目经理应该如何与干系人沟通？

- A.向项目发起人提供更新，以供审查并分发给每个干系人。
- B.使用单一的通信媒介，如视频电话会议，以减少混淆。
- C.使用各种尊重文化、实践和个人偏好的沟通方式。
- D.通过电子邮件向每个干系人发送频繁的更新，因为这是一个信息技术项目。

预测性项目-风险管理

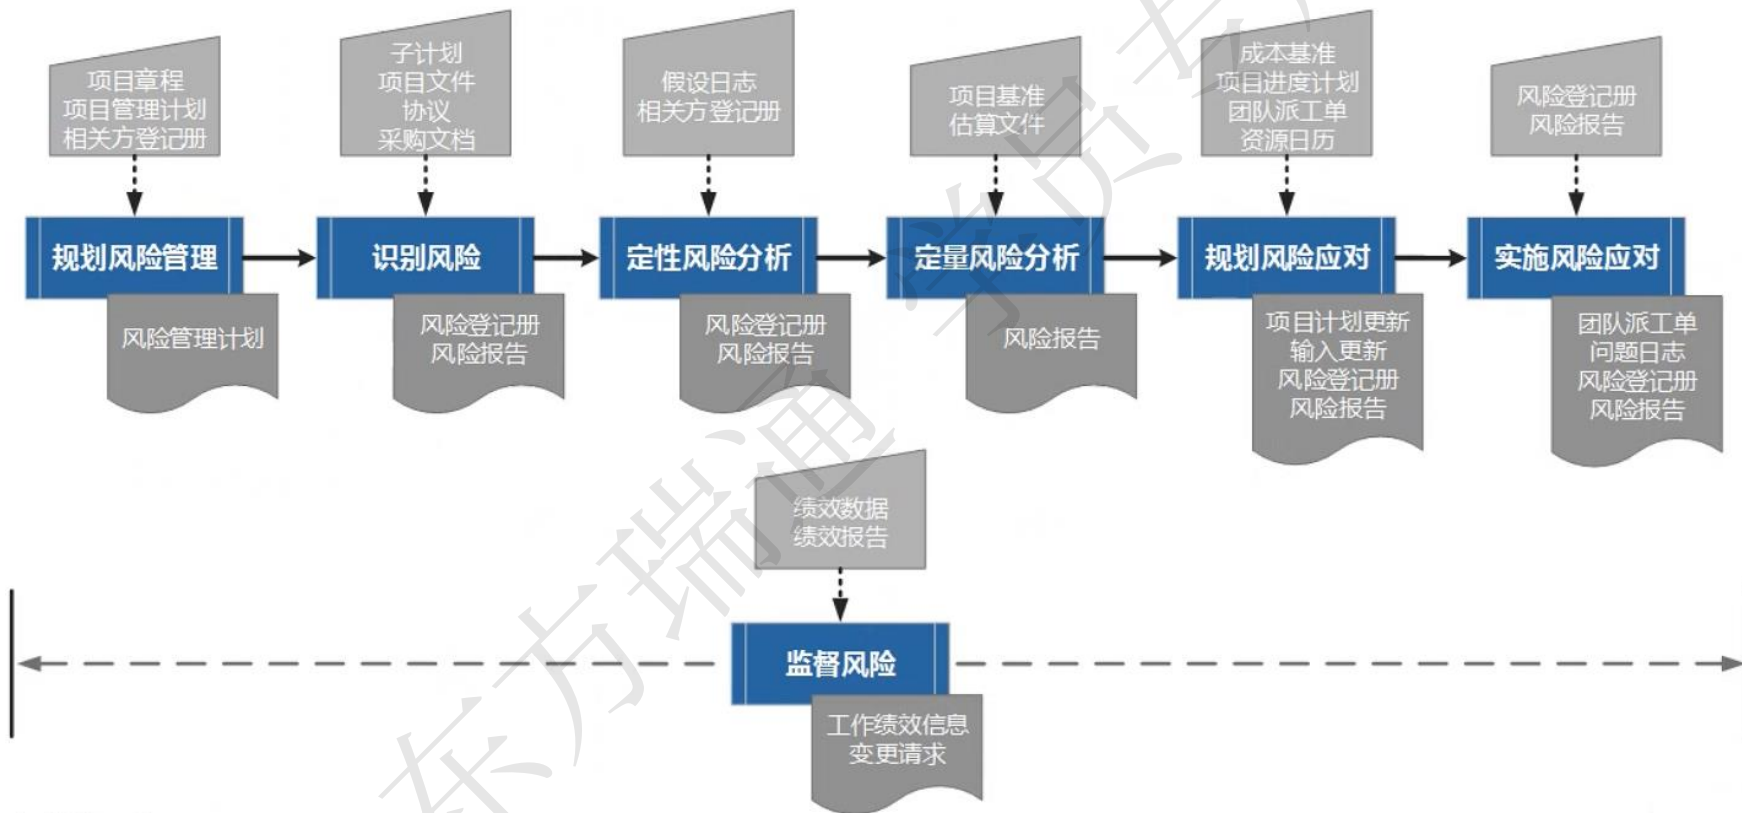

风险练习

在项目审查会议期间，确定其中一个项目可交付成果需要采取纠正措施以满足项目质量要求。项目经理应该首先做什么？

- (A) 更新风险登记册，并实施已批准的质量偏差风险应对计划。
- (B) 确定负责交付成果的资源，并要求制定团队发展计划。
- (C) 更新问题日志，确定相关干系人，并为纠正措施分配资源。
- (D) 提交变更请求，以更新相关项目可交付成果的项目质量要求。

风险练习

在开发一个新产品时，耐久性测试是关键路径上的一项重要活动。然而，测试设施被一个优先级较高的项目占用，且占用时间比原计划长。项目经理接下来应该怎么做？

- A、为延迟的项目开展根本原因分析
- B、审查风险登记册中的适当响应
- C、将延期情况通知项目相关方
- D、将问题上报给高级管理层

风险练习

一名项目经理被任命来部署新的解决方案，该解决方案将由第三方供应商集成到环境中，该供应商刚刚宣布**延迟交付关键组件**，这将影响项目进度。项目经理应该怎么做？

- (A) 要求供应商加快交付部件，以降低进度延误的风险。
- (B) 确认相关联的干系人和他们的期望，并评估组件延迟。
- (C) 对解决方案的每个组件的发布内容进行详细分析。
- (D) 提出解决方案的新设计，用内部组件替换外部组件。

风险练习

一位项目经理正在一家跨国公司管理一个重要项目。他/她正在与所有团队成员一起举行进度会议，其中一位团队成员在会上指出，他们正面临的一个关键问题将会导致他们无法完成所分配的任务。项目经理应该做什么？

- A：让团队成员提出变更请求，以便对该问题作出详细评估。
- B：安排与有顾虑的团队成员开会，共同审查并更新问题日志。
- C：让团队成员遵循获批的沟通管理计划，以便就其问题进行沟通。
- D：与团队成员一起查阅风险登记册，以找到针对该问题的适当应对措施。

风险练习

一家公司有一份维护和增强客户数据库的现有合同。该公司的法律部门通知项目经理，一项要求更严格保护客户信息的新立法可能很快就会签署成为法律。法律将要求在项目经理维护的数据库中实施额外的安全功能。这些功能不包括在当前合同的范围内。项目经理应该怎么做？

- A. 请法律部门在与客户的下一次合同谈判中提出该问题
- B. 寻求项目发起人的支持，以影响客户立即修改合同
- C. 更新风险登记册以包括此情况，并与项目发起人和客户讨论适当的风险应对计划
- D. 等到法律要求最终确定后，才能具体定义范围的变化

风险练习

在医疗保健IT项目的执行阶段，干系人就用户需求提出了变更请求。没有剩余的预算可用于支付该变更请求。项目经理接下来应该做什么？


- A.在下一次项目会议上讨论变更请求的批准。
- B.对所需的变更请求进行风险评估。
- C.根据项目范围说明评估变更请求。
- D.要求发起人提供更多资金以满足变更请求。

风险练习

全球石油危机影响了建设项目所在地区的原油分布。材料没有按时交付，这一阶段的建设已经落后于最初的计划。项目经理应该首先做些什么来防止项目进一步偏离轨道？

- A.进行风险评估并制定风险应对行动计划。
- B.使用管理储备金来弥补任何延误或损失。
- C.建议在此阶段暂停，以节省劳动力成本和资产折旧。
- D.与其他供应商建立新的合作伙伴关系，以应对任何延误。

预测性项目-采购管理

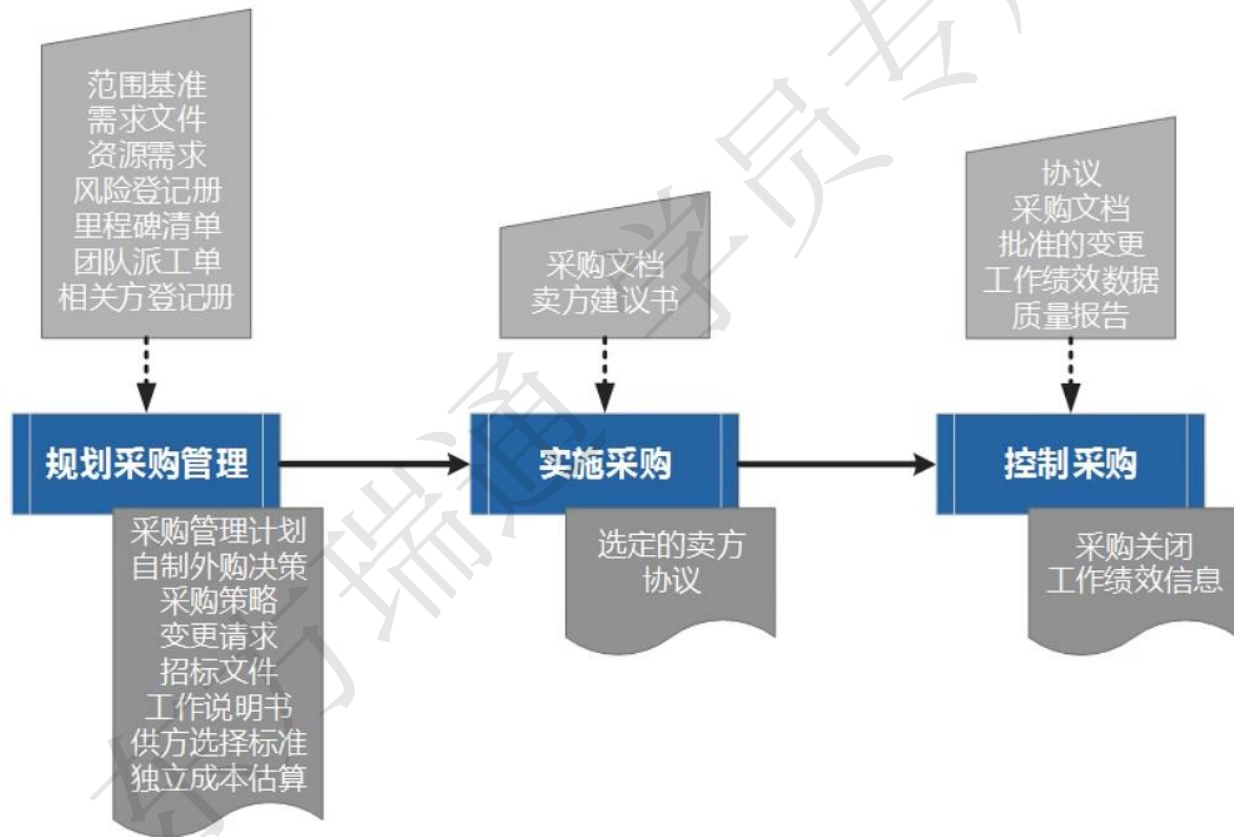

采购练习

一个项目经理在项目现场接受了一次交货，但物品的质量很差。项目经理让当地的供应商修复这些物品。该供应商接下来将交付更多的货物，项目经理应该怎么做？

- A：让供应商在下一次交货前发布质量文件。
- B：分配额外的时间来检查到达现场后的质量保障。
- C：审查合同要求，并要求提供适用于质量保证的证据。
- D：给供应商打电话，让他们口头保证下一次现场交货的质量。

采购练习

为项目供应一款特殊设备的供应商报告称，由于次级供应商遇到技术问题，交货可能会迟延。为了保持进度计划，该供应商提议弃用该次级供应商的组件，代之以与项目规格中规定的组件不同的类似部件。项目经理接下来该做什么？

- A：坚持要求使用符合项目规格的组件，并将设备空运过来，以减轻迟延风险。
- B：接受更换提议，以便使采购活动正常进行。
- C：指示供应商使用符合项目规格的部件，并更新进度计划。
- D：咨询主题专家(SME)的意见，了解该变更提议可否接受。

采购练习

新IT数据中心项目的供应商未能遵守需求规范中规定的布线标准。基础设施经理和供应商卷入了一场关于这个问题的争论。项目经理应该做些什么来解决和防止额外的争论？

- (A) 监控供应商和基础设施经理之间的互动。
- (B) 主持与供应商和基础设施经理的会议，以帮助解决他们的分歧。
- (C) 将问题上报给发起人，以便采取适当的行动。
- (D) 指示供应商在没有其他论据的情况下纠正问题。

采购练习

由于供应商和项目经理之间的沟通失误，可交付成果所需的主要输入之一丢失。由于丢失了可交付成果，项目的关键路径被扩展。项目经理下一步应该做什么？

- A.开始对供应商的流程和程序进行审计
- B.与该供应商一起回顾以往项目的经验教训
- C.对项目期间和供应商的问题进行详细分析
- D.执行应急计划，与供应商一起解决问题。

采购练习

一位项目经理正在管理一个混合项目，该项目使用承包商来完成一些关键的可交付成果。承包商已被雇佣来执行一项重要的交付，但尚未确认他们能够满足要求的进度。项目经理应该怎么做？


- (A) 将问题上报给采购团队，因为项目的最终交付日期将受到影响。
- (B) 与干系人一起审查项目范围，并从范围中删除可能延迟的项目。
- (C) 与承包商或供应商一起计划任务交付，强调当前情况的关键性。
- (D) 与采购部门核实，看看是否有其他以前使用过的承包商可以开发该任务。

采购练习

项目团队发现，供应商的最新交付缺少一个关键组件，纠正措施可能会延误项目。项目经理应该做什么来处理这一信息？

- A.要求供应商确定受影响的干系人，制定行动计划并确定实施日期
- B.起草一封致供应商的警告信，要求内部干系人发表意见，并寻求干系人的支持，以追究供应商的责任
- C.确定最坏的情况，将其纳入项目风险登记册，与所有项目干系人共享登记册，并发出警报。
- D.联系被确定为干系人的部门经理，征求他们的关注，并提供最新情况。

预测性项目-相关方管理

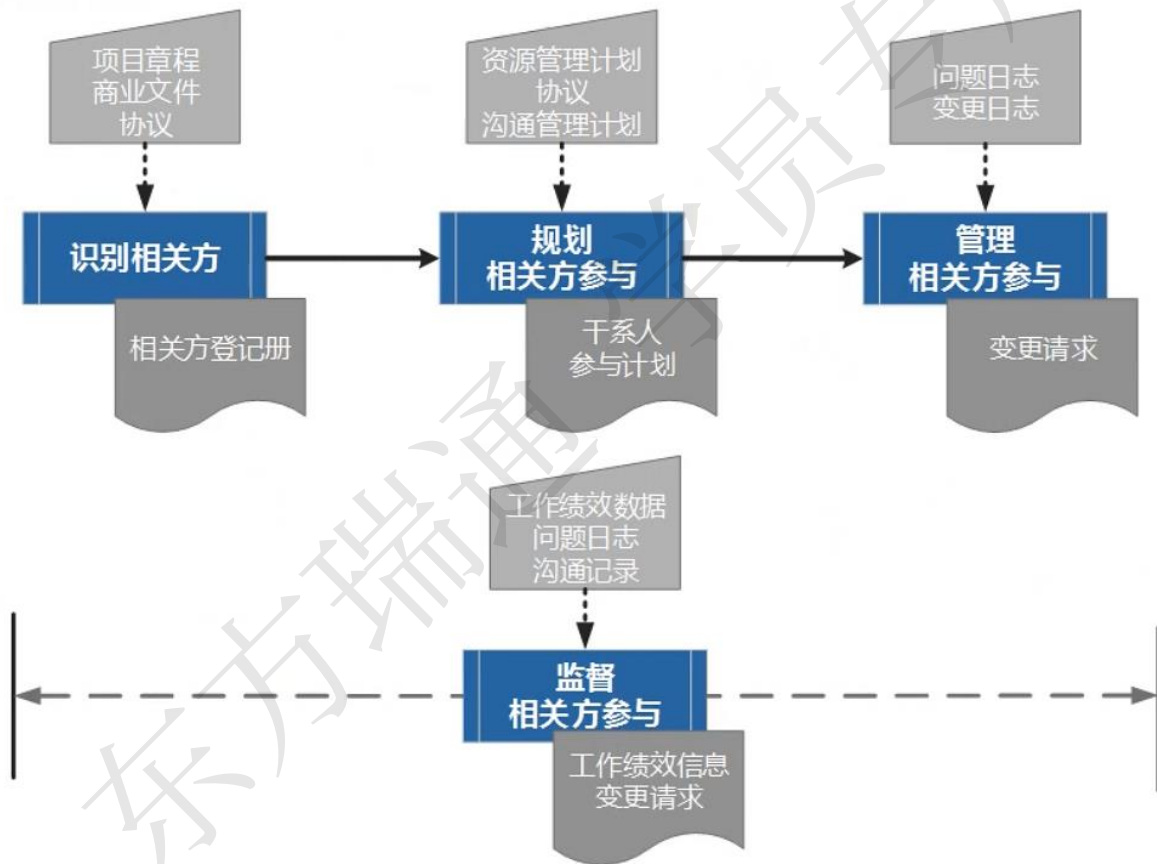

相关方练习

一位项目经理正在领导一个处于启动阶段的新项目，该项目将构建一种以前在组织中从未存在过的新型软件技术服务，并将为几个运营团队重新规划业务流程。项目经理需要确定要使用的项目管理方法，并且有许多团队成员和干系人的意见相互矛盾。项目经理应该怎么做？

- (A) 与干系人会面，确定使用项目目标和期望结果的方法。
- (B) 只有当项目与软件实现相关时，并可以分解为增量，才能利用敏捷方法。
- (C) 利用混合方法，因为项目需要引入敏捷和预测方法的混合工作。
- (D) 确定团队接受过哪些方法的培训，并将这些方法用于项目。

相关方练习

项目经理拥有一个共享资源团队，这些资源来自于在项目到期前三天处理客户项目的**其他项目**。团队通知项目经理由于某个组件未按时交付，项目将被延迟。共享资源的**优先级竞争**正在延迟组件的交付。项目经理应该采取什么措施来防止这种延迟的发生？

- A、 更新风险登记册并记录了项目的经验教训
- B、 根据工作分解结构（WBS）重组项目团队
- C、 与其他项目的干系人保持持续沟通
- D、 使用资源管理计划确定其他项目的影响

相关方练习

一位干系人请求项目经理共享项目的定期状态更新。此干系人不包括在常规通讯组列表中。项目经理应该怎么做？

- (A) .开始根据请求向此利益干系人发送状态更新。
- (B) .询问利益干系人的经理是否可以将利益干系人添加到列表中。
- (C) .审查干系人的参与和沟通管理计划。
- (D) .将利益相关方的请求上报给项目发起人。

第三部分 商业环境

- 规划和管理项目的合规性
- 评估并交付项目利益和价值
- 评估并应对外部业务环境变化对范围的影响
- 为组织变更提供支持



商业环境

一个敏捷团队最近开始为一家金融机构进行一个项目。项目发起人担心敏捷方法不能为组织的合规标准提供足够的支持。为了减轻这种风险并避免出现问题，项目经理应该做什么？

- (A) 建议使用合规性审查委员会，该委员会将负责在向公众发布所有产品功能之前批准这些功能。
- (B) 与合规小组联络，让他们负责了解需求，并在产品待办列表中优先考虑这些需求。
- (C) 与合规团队会面，确保他们的要求包含在每个故事的完成（DoD）定义中。
- (D) 确保同行评审过程也涵盖合规性要求，为项目创建第二层安全性

商业环境

一家大型组织根据行业趋势决定采用敏捷方法。该组织投入了大量资金来采用它，但几个月后，实施失败了。项目经理应该采取哪些不同的措施来避免实施失败？

- (A) 对从项目团队到中高层管理层的所有员工进行敏捷培训。
- (B) 进行了一次事后分析，并获取了组织过程资产（OPA）中的学习信息，以备将来使用。
- (C) 评估组织文化，进行适宜性分析，并确定未来状态。
- (D) 聘请了第三方敏捷交付团队来执行。

Thanks.

杨波

2024年8月

