

## 主题 1 - 单一主题

### 问题#1

话题一

项目经理在混合环境中领导软件开发项目。在项目规划期间，项目经理发现了一个风险，即关键路径项目的技术资源在需要时可能不可用。在需要资源的前一周，技术工程师遇到个人紧急情况，不得不请假。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 查阅风险登记册以获得适当的计划风险应对措施并实施。
- B. 修改项目管理计划并将任务移至技术资源可用的时间。
- C. 与利益相关者一起审查业务需求，排除分配给技术资源的任务。
- D. 更新经验教训报告和风险日志以反映该风险已经成为现实。

**正确答案：** A

社区投票分配

一个 (100%)

### 问题2

话题一

一个团队刚刚采用了敏捷方法。在每日站立会议中，团队表达了对任务延迟的担忧。项目负责人与产品负责人合作，以弄清这些功能。项目负责人要求团队快速跟踪所有产品功能以确保交付。冲刺正在完成，但功能较少或质量低下。

项目负责人应该做什么来确保成功？

- A. 要求团队创建一个障碍日志并保持更新以用于下一个冲刺计划
- B. 指导团队找到有助于消除障碍并有助于及时交付的可能解决方案
- C. 建议团队在产品待办事项列表中添加障碍作为工作项，以便在下一个冲刺中修复
- D. 授权团队改进他们的流程、工具和交互，以更有效地交付和消除障碍

**正确答案：** D

社区投票分配

丁 (100%)

团队在每次迭代中都向客户交付功能。每次迭代完成后，都会邀请客户进行审查。然而，客户经常不在，审查经常被延迟，这导致团队的返工增加。

项目经理应该做什么？

- A. 让客户参与日常项目活动以获得所需的指导
- B. 提前计划并定义与客户一起审查可交付成果的最佳方式
- C. 要求客户在每次迭代开始时澄清所有需求
- D. 要求客户根据可用性审查每次迭代中的可交付成果

正确答案： B

社区投票分配

乙 (82%)

D (18%)

项目经理是启动一系列功能以符合新法规的团队的一部分。该团队只有 6 周的时间将这些功能发布到遗留应用程序中。在站立会议期间，一位软件工程师表示，在指定的设计师完成特定任务之前，一项重要功能的开发将暂停。这种延迟是满足发布日期的严重障碍。

项目经理应该做什么？

- A. 与设计团队经理会面，告知他们当前状态并请求额外的设计师
- B. 要求软件工程师在没有完成重要特性的情况下继续前进
- C. 联系设计组经理，要求根据最新情况重新考虑优先级列表
- D. 与设计师会面，分享当前状态并制定解决方案以完成任务

正确答案： D

社区投票分配

D (87%)

13%

一位项目经理正在与客户的团队合作开展一个新项目。有些产品的定义和要求还不明确，但客户希望尽快开始活动。由于法规要求，该组织还期望在特定日期交付产品。由于项目的性质，项目经理决定使用混合方法。

为什么项目经理选择混合方法？

- A. 混合方法将使项目活动能够立即开始并允许制定需求定义计划
- B. 混合方法将允许项目经理修改产品规格
- C. 混合方法将允许管理需求不确定性以及日期限制
- D. 混合方法将确保交付日期完成并消除产品不确定性

正确答案： A

社区投票分配

丙 (74%)

一个 (26%)

一个项目团队表示担心某些远程团队成员由于他们的工作日程而无法与更大的项目团队协作。项目经理很困惑，因为整个团队都位于同一时区，并且认为还有其他因素在起作用。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 实施新的选择
- B. 检查团队的虚拟需求
- C. 纠正违反基本规则的行为
- D. 正式审查绩效

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

一家公司正在实施一个项目，团队成员位于不同的国家和时区。个人表现中规中矩，但团队整体表现偏低，尤其是在集体活动方面。

项目经理应该做什么？

- A. 审查和重新分配团队任务
- B. 促进沟通和团队建设
- C. 谈判新的团队成员
- D. 审查和更新沟通管理计划

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

在项目的第三次迭代期间，产品负责人请求另一个强制性功能。这也发生在前两次冲刺中，导致失败并在团队内部造成挫败感。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 要求 scrum 团队优先考虑产品待办事项
- B. 要求产品负责人与项目团队一起确定待办事项的优先级
- C. 召开内部会议讨论变化及其价值
- D. 在第一次发布之前的最后一个冲刺中合并变更

正确答案： C

社区投票分配

乙 (79%)

丙 (21%)

五个敏捷团队合作开发一个产品，最近执行了发布计划。在项目进行到一半时，每个团队都表明他们的进展是按计划进行的。当所有团队都在产品级别进行集成时，会发现许多集成问题。整体产品发布进度下滑，预测承诺内容无法完成。项目经理应该采取哪些不同的做法？

- A. 定期执行 Scrum of Scrums 以帮助团队消除障碍
- B. 组建了一个单独的质量保证团队，在每个冲刺结束时测试来自每个团队的所有项目
- C. 安排了一次关于集成概念的在线会议，并向团队推荐了工具
- D. 保证频繁和持续的工作整合以获得早期反馈和持续学习

正确答案： D

社区投票分配

D (79%)                      一个 (21%)

项目团队成员难以为有延迟风险的项目交付分配的任务。主要问题是团队成员不了解最近实施的新系统。项目经理应该做什么？

- A. 要求团队成员学习新系统作为在职培训。
- B. 发出变更请求以延长项目进度。
- C. 将团队成员的绩效上报给项目发起人。
- D. 分配有经验的资源来支持团队成员。

正确答案： A

社区投票分配

D (72%)                      一个 (28%)

一个由四名团队成员组成的项目团队将向一个国家的员工和承包商推出全公司范围的应用程序。为了在严格的时间范围内交付，需要与精通应用程序部署和变更管理的本地公司签约。项目经理应该如何赋能当地公司？

- A. 管理期望并就承包商将在项目经理的监督下交付的要求达成一致
- B. 通过对承包商进行微观管理开始推出应用程序
- C. 设定期望并就承包商将交付的要求与定期进度报告达成一致
- D. 在项目经理的监督下部署承包商的员工

正确答案： A

社区投票分配

丙 (60%)                      一个 (40%)



问题#12

话题一

一位项目经理正在管理一个面临挑战的建筑项目。进度超支，成本超支，客户对具体范围进度不满意。项目经理首先应该做什么？

A. 审查范围和项目目标。

B. 对供应商执行处罚条款。

C. 采取行动减少成本超支。

D. 与客户合作完成范围。

正确答案： A

社区投票分配

一个 (83%)

D (17%)

问题 #13

话题一

在地理分布的项目团队中，项目团队成员在每周会议讨论后继续通过电子邮件发送状态报告和更新时间表。但是，该团队难以跟踪所做的更改和进展。项目经理应该做什么？

A. 促进版本控制和项目工件的培训。

B. 通过区域保持单独的文档控制以避免差异。

C. 使用版本控制系统维护工件的中央存储库。

D. 开发用于版本控制的文档管理软件。

正确答案： C

社区投票分配

丙 (85%)

其他

问题#14

话题一

项目经理已被分配到一个项目，其中与业务的协作是一个关键的关键因素。项目经理不确定使用哪种方法。已指派一名高级项目经理协助项目经理。高级项目经理应该提供什么建议？

A. 与项目经理一起开发一种能给项目带来好处的新方法

B. 建议使用敏捷方法，因为客户和团队协作对于项目成功至关重要

C. 建立项目管理方法，要求客户每天向团队提供更新

D. 提供项目管理模板供项目经理遵循作为指南

正确答案： B

社区投票分配

乙 (60%)

一个 (30%)

10%

项目经理正在管理一个大型项目。利益相关者刚刚发现了早期阶段未发现的新风险。  
项目经理应该做什么？

- A. 向利益相关者确认风险登记册已完成并由所有利益相关者验证
- B. 直接与提出风险的利益相关者进行风险分析并更新风险登记册
- C. 向指导委员会传达风险并要求高级管理层制定缓解计划
- D. 将风险添加到风险登记册，并在项目团队和利益相关者的帮助下重新评估登记册


正确答案： D

社区投票分配

D (67%)

乙 (33%)

Scrum 团队正在分析 15 天冲刺的第四天的燃尽图。燃尽图如下所示。  
团队接下来应该做什么？

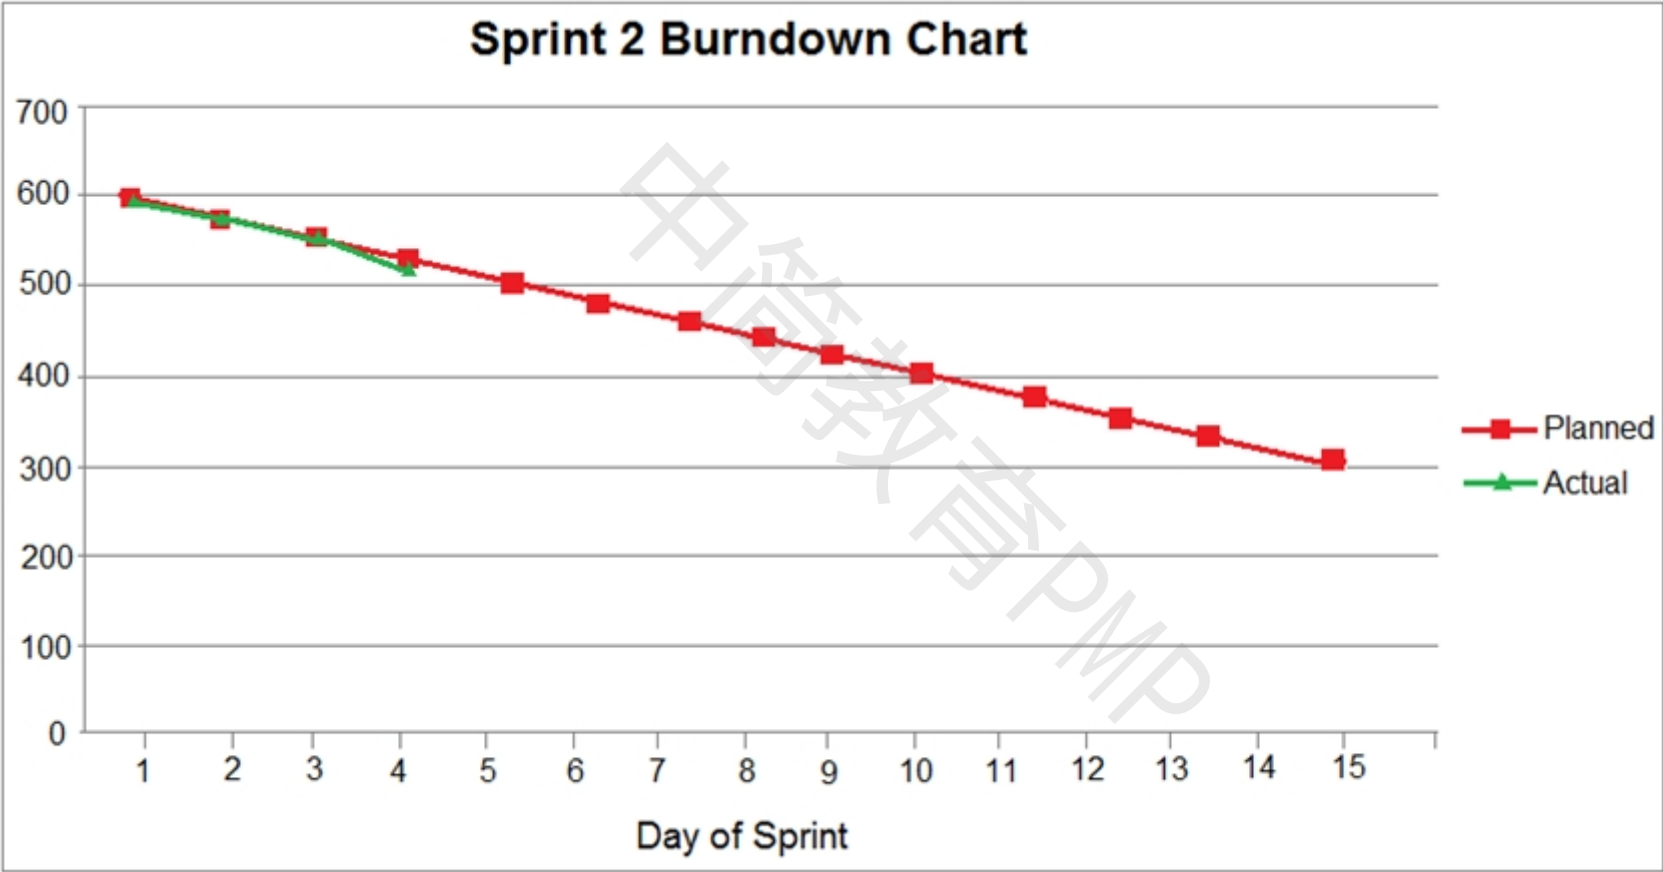

- A. 询问产品负责人是否可以从冲刺中删除一些低优先级的故事
- B. 继续冲刺，因为进度显示了潜在中断的缓冲区
- C. 要求项目团队选择任何额外的故事，因为他们的容量比计划的要多
- D. 按计划继续冲刺工作并保持监控

正确答案： D

社区投票分配

D (86%)

14%

项目经理正在关闭项目并准备将其移交给运营团队。在移交期间，提交了一份延迟的发票，其中包含高于计划的项目工作成本。因此，项目移交延迟，项目报告的完工成本增加。  
项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 通知所有供应商有关发票和未付款的截止日期
- B. 根据项目结束时开具发票的成本审查总承诺成本
- C. 让财务团队参与并与供应商讨论该问题
- D. 定期捕获并审查所有项目工作和相关成本

正确答案： D

社区投票分配

D (75%)

一个 (25%)

项目经理被分配到一个关键的软件开发项目。该团队正在使用混合方法并将开发分为四个冲刺。在第三个冲刺结束时，项目经理发现挣值 (EV) 为 500,000 美元，计划价值 (PV) 为 550,000 美元。  
项目经理应该做什么？

- A. 快速跟踪项目
- B. 调整预算
- C. 引入浮动
- D. 调整项目时间线

正确答案： A

社区投票分配

一个 (43%)

D (43%)

14%

一位项目经理正在与一个异地协作的敏捷项目团队合作，该团队合作时间足够长，处于团队开发的执行阶段。一个不可预见的事件导致团队分散，他们现在无法在同一地点工作。  
项目经理应该怎么做才能使团队尽可能高效地执行任务？

- A. 要求项目发起人和执行干系人鼓励团队保持绩效
- B. 为团队提供虚拟协作软件和软件培训，以最大限度地减少中断
- C. 将团队从敏捷方法转变为预测方法以更好地控制绩效
- D. 评估项目绩效并在绩效下降到不可接受的水平时介入

正确答案： D

社区投票分配

D (60%)

乙 (40%)

问题#20

话题一

一位项目经理正在审查一个大型项目的需求。项目团队应该优先考虑哪些要求以避免被罚款？

A. 认证可持续产品

B. 建立公司流程

C. 遵守新规定

D. 开发新产品线

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

问题#21

话题一

在经验教训研讨会上，一位利益相关者提到该项目不成功，因为它没有提供预期的商业价值。项目经理应该如何解决这个问题？

A. 与干系人一起审查项目管理计划任务。

B. 与利益相关者一起审查商业利益实现计划。

C. 与干系人一起审查项目管理计划预算。

D. 审查与利益相关者的沟通管理计划。

正确答案： B

社区投票分配

乙 (83%)

一个 (17%)

问题#22

话题一

敏捷项目在遵循组织过程方面存在冲突，其中许多过程不会为项目增加任何价值。要解决这个问题，应优先考虑以下哪一项？

A. 组织的需要

B. 客户的需求

C. 敏捷领导的需求

D. 项目经理的需求

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

一个项目团队正在使用一种可视化管理工具来识别依赖关系。确定一个团队的领域知识需要与另一个团队共享，以确保可交付成果的连续性。

项目经理应该做什么？

- A. 消除依赖性以消除知识共享的需要。
- B. 重新分配团队成员，以便两个团队都可以获得知识。
- C. 将两个团队合并为一个团队，使知识共享。
- D. 要求各自的团队计划知识共享会议。

正确答案： D

社区投票分配

丁 (80%)

C (20%)

一位正在处理关键项目可交付成果的团队成員報告說他們的計算機無法正常工作。IT 部門表示，由於工作量大，他們將在 1 周內無法提供幫助。

項目經理應該如何處理這種情況？

- A. 利用項目儲備購買新設備，避免對項目關鍵路徑造成影響
- B. 安排與項目發起人的會議，請求購買或租用新計算機的預算
- C. 與 IT 部門探討選項，以根據項目的關鍵程度加快必要的修復
- D. 要求團隊成員找到創新的解決方案或解決方法來解決問題並避免項目延誤

正确答案： C

社区投票分配

丙 (83%)

一个 (17%)

項目經理領導著一個由不同年齡段的人組成的團隊。該項目的工作時間在項目開始時就已確定，所有團隊成員都同意該時間。然而，在項目的後期，一名團隊成員通知項目經理，由於團隊成員的個人承諾，先前商定的工作時間不再有效。

項目經理應該做什麼？

- A. 改變迭代持續時間以交付更多價值
- B. 與客戶一起驗證迭代目標
- C. 邀請客戶參加日常會議
- D. 幫助團隊重新定義了MVP

正确答案： B

社区投票分配

一个 (73%)

乙 (27%)

问题#26

话题一

项目经理在分层组织中工作。项目团队成员习惯于被告知要做什么，绩效评估包括分配任务的完成百分比。在与发起人交谈后，项目经理意识到他们需要重新分配几项任务才能达到下一个里程碑。当前受让人可能会认为这种变化表现不佳。项目经理应该做什么？

A. 组织团队会议，通知团队成员，作为交付责任人，决定改变任务分配

B. 私下请更有经验的组员接下任务，并通知其他组员工作已重新分配

C. 私下要求经验不足的团队成员停止执行任务，并通知另一名团队成员工作已重新分配

D. 组织团队会议，通知团队成员方向的改变，并与他们一起改变任务分配

正确答案： D

社区投票分配

D (67%)

一个 (33%)

问题#27

话题一

项目经理刚刚受聘领导混合环境中的项目团队。该团队正在进行一组关键项目。项目经理应该怎样做才能确保适当的环境和权力到位以有效地交付项目？

A. 创建一个与现有组织结构保持一致的项目指导委员会。

B. 制定详细的项目管理计划与项目资源共享。

C. 制定详细的风险日志并与所有项目利益相关者共享。

D. 任命一个不受组织因素影响的自组织项目团队。

正确答案： A

社区投票分配

一个 (44%)

D (33%)

11%

11%

问题#28

话题一

楼宇管理系统 (BMS) 项目正处于调试阶段，即将移交给运营团队。然而，项目经理指出，项目和运营团队都无法正确操作 BMS。因此，项目进度延误的风险增加。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

A. 将两个团队召集到一个联席会议上来解决这个问题

B. 对BMS进行了一些调整，使其更适合车队

C. 在项目早期分配专门的移交团队

D. 在项目计划中为 BMS 培训分配适当的资源

正确答案： D

社区投票分配

D (87%)

7%



问题#29

话题一

进行紧密部署的团队等待接收来自客户的关键信息。客户不断推迟发送延迟部署的信息。项目经理应该做什么来防止延误？

A. 提前获得所有关键信息

B. 让客户参与部署过程

C. 使用已有的样本数据

D. 让高层管理人员参与流程

正确答案： B

社区投票分配

一个 (73%)

乙 (27%)

问题#30

话题一

项目经理被分配到一个新项目，该项目将启动当前产品的数字版本。尽管该产品众所周知，但利益相关者对其数字版本的愿景并不明确。项目经理应该做什么来增加价值交付？

A. 召集团队制定全面的产品路线图，但只承诺满足下一季度的要求

B. 创建一个包含所有相关利益相关者的可视化任务板，以支持积压工作的优先级排序

C. 与团队合作定义最小可行产品 (MVP) 并将其呈现给利益相关者

D. 利用尖峰挖掘新产品的技术挑战，降低技术风险

正确答案： C

社区投票分配

丙 (60%)

乙 (33%)

7%

问题#31

话题一

项目经理正在管理一个定义不明确的内部项目。最近，项目经理收到了组织高层管理人员提出的几项变更请求。项目经理首先应该做什么？

A. 评估时间超限，并开始实施以避免额外的延误

B. 激励团队避免在长期项目上工作的挫败感

C. 请求临时增加预算以避免任何预算超支

D. 审查与业务案例相关的拟议变更的好处

正确答案： D

社区投票分配

D (88%)

13%

问题#32

话题一

一个项目的客户非常愤怒。当客户到达项目现场时，他们发现他们的一个要求没有得到满足。项目经理应该做什么？

A. 与客户讨论并同意执行遗漏的要求

B. 参考需求追溯矩阵，分析需求

C. 与客户协商范围管理计划，了解差距

D. 分析收益管理计划并实施所需的变更

正确答案： B

社区投票分配

乙 (75%)

一个 (25%)

问题#33

话题一

项目经理正在评估项目并意识到其挣值 (EV) 显示花费的成本高于交付的价值。然后项目经理发现团队一直在添加不属于需求的小功能。项目经理应该做什么？

A. 申请额外预算，因为正在添加额外的功能

B. 要求产品负责人将附加功能添加到需求中

C. 鼓励团队继续，因为这最终会帮助客户

D. 要求团队专注于并只交付商定的功能

正确答案： D

社区投票分配

丁 (100%)

问题 #34

话题一

颁布了一项关于电信塔分区许可的新法律。这可能会导致新网络部署的成本和进度超支。项目经理应该做什么？

A. 与发起人会面，要求增加时间和预算

B. 最小化范围以捕捉成本和进度基准

C. 更新项目计划，因为法律是项目的义务

D. 评估新法律对项目计划的影响并确定优先顺序

正确答案： D

社区投票分配

D (67%)

丙 (33%)



问题#35

话题一

一位财务总监提议削减项目预算，因为大多数已实施的解决方案几乎没有带来投资回报 (ROI) 或运营改进。项目经理提出异议并提交了项目资产，显示所有解决方案均已在相关框架约束下得到证明、接受和交付。项目经理表示，问题可能源于项目评估和选择过程。

项目经理在展示什么？

A. 成员在工作形成过程中可能经历的多个发展阶段

B. 实现项目价值的根本原因分析中的因果识别

C. 未来届会确定预算优先事项的战略谈判技巧

D. 解决阻碍项目成功的障碍、障碍和障碍的风险管理

正确答案： B

社区投票分配

乙 (67%)

D (33%)

问题 #36

话题一

八位高素质的专家已经集结起来，针对组织产品开发过程的特定方面进行为期 6 个月的工作。

项目经理应该如何支持这个团队取得成功？

A. 为所有团队成员定义角色和目标，并定期跟进一对一会议以审查进度。

B. 移交他们作为专家角色的特定方面的控制权，让他们就自己的时间表和目标达成一致。

C. 与团队成员一起定义总体目标并支持他们围绕目标进行。

D. 引入一位也是专家的高级同事，以确保团队按计划实现目标。

正确答案： C

社区投票分配

C (90%)

10%

问题 #37

话题一

一位项目理想指派一名初级工程师到一个新项目中。在过去的项目中，工程师表现出主动承担复杂任务并以创新方式解决问题的能力，而无需任何鼓励。但是，工程师拒绝了项目经理加入新项目的邀请。

工程师拒绝参与该项目的最可能原因是什么？

A. 项目经理没有跟工程师的职能经理按照正常的招聘流程

B. 工程师因长时间工作和解决难题而产生“项目倦怠”

C. 工程师不欢迎或不喜欢与其他项目团队成员一起工作

D. 项目经理对工程师的专业成长没有足够的支持和认可

正确答案： A

社区投票分配

D (43%)

一个 (38%)

其他

在执行项目期间，公司决定每个人都需要在年底前休假。这可能会导致项目时间线发生变化。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 与职能管理人员和团队成员就对项目进度影响最小的休假时间表达成一致
- B. 向高级管理层提交正式请求，要求他们基于对项目的影响不要继续执行此决定
- C. 根据近期公司政策，根据到位的休假计划推出项目时间表
- D. 讨论休假计划并在更改日志数据库中包含计划更改

正确答案： D

社区投票分配

一个 (57%)

D (43%)

项目经理确定了两个团队成员之间的问题，该问题在项目的第二次迭代期间影响了其中一个可交付成果的开发。项目经理应该如何解决这个问题以避免对项目造成任何影响？

- A. 向两个团队成员发出警告，表明如果问题继续存在，他们都将从项目中移除
- B. 将两个团队成员上报给各自的职能经理，让他们采取适当的行动
- C. 联系职能经理，要求替补冲突的团队成员
- D. 安排与两个团队成员的会议以了解问题并促进双方都满意的解决方案

正确答案： D

社区投票分配

丁 (100%)

项目团队正在为第三方实施托管系统。就在上线之前，客户要求项目团队加入额外的功能。项目团队确定了交付日期的风险，并通知项目经理一些要求的功能与商定的范围有冲突。项目经理应该做什么？

- A. 与客户讨论识别出的风险和团队的担忧
- B. 与团队讨论，估算工作量，提出变更请求
- C. 要求客户上线并在积压中添加新功能
- D. 要求团队在商定的上线日期交付功能

正确答案： A

社区投票分配

一个 (50%)

乙 (40%)

10%

在项目生命周期结束时交付了最先进的产品。但是，客户声称该产品未按照规格设计。项目经理应该怎么做才能避免这个问题？

- A. 客户的要求应该已经被捕获并修改以满足供应商的标准。
- B. 应该相应地计划迭代评审计划会议。
- C. 应已捕获客户的要求，以满足客户的标准。
- D. sprint 回顾会议应该包括必要的利益相关者。

正确答案： C

社区投票分配

丙 (64%)

乙 (36%)

已要求项目经理提供有关其中一名团队成员的绩效反馈。项目经理希望从项目团队收集额外的输入，因为没有适当的衡量标准来评估员工绩效。项目经理接下来应该做什么？

- A. 确定决策权级别
- B. 评估已证明的任务问责制
- C. 确定合适的方法
- D. 分析团队成员的影响力

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

一个新的主要道路项目正在启动，承包商已根据合同承诺提交定期状态报告并参加整合会议。在项目生命周期的中途，承包商停止参加会议和提交报告，称这些项目占用了太多时间。项目经理首先应该做什么？

- A. 评估承包商不参加会议和提交项目其余部分报告的风险，并将其上报给项目发起人
- B. 提醒承包商他们承诺按照合同参加会议并提交报告
- C. 就未履行合同条款提出索赔，并按照替代性争议解决方式处理索赔
- D. 与公司律师交谈，要求他们要求承包商履行合同承诺

正确答案： B

社区投票分配

乙 (92%)

8%

在最终确定项目管理计划时，客户向项目经理提供了一套新的质量标准，最终产品必须遵守这些标准。项目经理应该怎么做才能确保产品的顺利交付？

- A. 让客户参与风险识别
- B. 与客户就新的项目章程达成一致
- C. 让客户参与绩效差距分析
- D. 与客户就验收标准达成一致

正确答案： D

社区投票分配

D (50%)

一个 (50%)

一位项目经理获得了一个关键的 5 天窗口，并分配了最多 100,000 美元作为应急储备。随后，项目经理根据可获得的最佳信息起草了行动方案。总的来说，需要完成五项行动，费用为 20,000 美元，每项持续时间为 1 天。经过 3 天的工作，项目经理完成了两个动作，花费了 80,000 美元。  
项目经理接下来应该做什么？

- A. 完成所有行动，然后通知客户完成项目所需的额外成本和进度超支
- B. 停止工作并向变更控制委员会 (CCB) 提出项目变更请求以获得额外资金和项目进度延期
- C. 由于 CPI 和 SPI 大于 1.0，重新评估并优先考虑剩余的行动
- D. 由于成本绩效指数 (CPI) 和进度绩效指数 (SPI) 小于1.0，重新评估并优先考虑剩余行动

正确答案： D

社区投票分配

D (50%)

乙 (30%)

一个 (20%)

项目经理希望确保将来类似的项目使用该项目的绩效数据作为参考。但是，项目经理不确定如何完成此操作。  
项目经理应该做什么？

- A. 使项目工件保持最新并可供所有利益相关者访问
- B. 在具有独占访问权限的存储库中共享项目文档
- C. 安排与主要利益相关者的每周知识共享会议
- D. 定期向高级管理层发送包含最新项目更新的电子邮件

正确答案： A

社区投票分配

乙 (57%)

一个 (43%)

问题#47

话题一

在系统演示期间，项目涉众拒绝从最近的用户故事中完成的功能。据利益相关者称，该产品不符合法规要求的质量标准。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

A. 确保项目发起人了解项目的范围以避免任何未来的投诉

B. 确保利益相关者的担忧在迭代中得到妥善解决以避免未来的挫折

C. 与产品负责人一起审查迭代中处理的故事是否满足所有验收标准

D. 与产品负责人一起审查迭代中处理的所有故事都在项目待办事项列表中

正确答案： C

社区投票分配

丙 (75%)

乙 (25%)

问题#48

话题一

当项目发起人请求额外的可交付成果时，项目完成 70%。项目经理首先应该做什么？

A. 与项目发起人协商可能的备选方案

B. 确定此变更对项目所有方面的可能影响

C. 拒绝请求为时已晚并导致主要范围蔓延

D. 将请求提交给变更控制委员会 (CCB) 以供决定

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

问题#49

话题一

一家公司启动了一个部门转型项目，使用预测方法改进了组织的流程。这对组织来说是一个关键项目，在项目进行到一半时，项目经理注意到由于缺少技术技能，无法生产其中一个可交付成果。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

A. 要求发起人在项目规划期间确定所有必需的技能

B. 在项目启动后确定所有必需的技能

C. 在入职过程中为团队计划所有必要的培训

D. 在项目规划期间确定了所有必需的技能

正确答案： D

社区投票分配

D (86%)

14%

一位项目经理正在开始一个新项目，团队成员非常多样化。项目经理选择使用建立共识的方式，这样团队就可以就项目的执行方式达成一致并参与其中。

项目经理应该如何进行？

- A. 营造以多数票达成协议的环境
- B. 创造通过讨论达成协议的环境
- C. 建立经常性的头脑风暴会议来讨论项目问题
- D. 允许团队成员以意识流模式贡献想法

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

软件技术项目的项目经理在具有虚拟团队的矩阵式组织中工作。不幸的是，职能经理通知项目经理可能没有任何资源可用于测试软件。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 要求与发起人召开电话会议，提交变更请求，让开发团队进行测试
- B. 与职能经理接洽讨论细节以获得所需的支持
- C. 在每周的项目会议上讨论测试需求，协商测试软件的最佳方法
- D. 发邮件给采购专员，与专门做软件测试的公司洽谈

正确答案： B

社区投票分配

乙 (75%)

丙 (25%)

项目经理领导着一个由不同年龄段的人组成的团队。该项目的工作时间在项目开始时就已确定，所有团队成员都同意该时间。然而，在项目的后期，一名团队成员通知项目经理，由于团队成员的个人承诺，先前商定的工作时间不再有效。

项目经理应该做什么？

- A. 与团队成员及其职能经理讨论缺乏奉献精神
- B. 允许最资深的团队成员决定为团队工作的时间
- C. 将团队成员从项目团队中移除以对其他成员公平
- D. 以协作方式重新评估团队的工作时间，这样团队就不会受到问题的阻碍

正确答案： D



一家公司正在通过建设一个即将进入运营阶段的新生产设施来实施增长战略。虽然治理政策已经到位，但公司必须遵守最近实施的新财务法规。遵守规定将导致项目范围发生重大变化。

项目经理应该如何应对这个要求？

- A. 进行分析以评估对项目的影响。
- B. 继续执行现有的公司治理政策。
- C. 将问题上报给高层管理人员并让他们决定。
- D. 直接遵守财务规定。

正确答案： A



项目经理已被分配到必须在接下来的几周内完成的紧急项目。项目经理意识到这将对当地社区产生影响。由于工作地点在学校附近，项目经理已与他们接触以了解他们的需求。

项目经理应如何确保工作进行？

- A. 将项目所需的工作推迟到学校假期开始
- B. 按计划继续工作，项目组到达现场后通知学校
- C. 建议学校在项目工作期间关闭
- D. 与学校联络，在学校开始和结束时间包括非工作项目时间

正确答案： D



一个周末的深夜，一名团队成员打电话给项目经理。团队成员因即将到来的截止日期的压力而哭泣。

项目经理应该做什么？

- A. 审查组织的人力资源 (HR) 政策。
- B. 同情团队成员并讨论下一步。
- C. 请团队成员以书面形式发送他们的疑虑。
- D. 安排在下一个工作日与团队成员会面。

正确答案： B



问题#56

话题一

由于需求不明确，团队很难完成工作。他们在几个月内未能成功完成一次迭代。为了帮助团队，项目负责人应该做什么？

A. 建议团队与利益相关者一起审查迭代的长度。

B. 建议产品负责人审查积压细化流程。

C. 建议限制进行中的工作以提高团队的专注度。

D. 建议对团队成员的个人表现进行审查。

正确答案： C

社区投票分配

乙 (100%)

问题#57

话题一

敏捷项目的项目经理担心团队在最近的迭代中失去了动力。项目经理应该使用哪两种工具来分析团队绩效？（选择两项。）

A. 燃尽图

B. 产品积压燃耗图

C. 已完成特征的累积流程图

D. 工作分解结构（WBS）

E. 项目进度

正确答案： AB

社区投票分配

空调 (86%)14%

问题#58

话题一

一位项目经理正在与团队合作，在一家使用不同交付方法的公司中交付一个项目。项目经理对项目管理办公室 (PMO) 目前建议的沟通渠道感到担忧，因为一些信息需要花费太多时间才能到达团队成员，从而对交付造成负面影响。项目经理以后应该如何避免这种情况？

A. 与项目团队就合适的协作达成一致，并确保始终共享信息。

B. 使用相同的方法直到当前交付结束，并在回顾期间提出新的方法。

C. 参考公司企业层面使用的政策和框架，并告知项目团队成员。

D. 告诉发起人，项目经理将使用他们自己的沟通模式来确保按时交付。

正确答案： A

社区投票分配

一个 (100%)



公司必须执行新的规定。政府已指定该法规的执行日期，但仅提供了有关该法规要求的高级信息。因此，由于不确定性，预计定义会发生变化。

项目经理应该为这个项目使用哪个生命周期？

- A. 预测执行策略
- B. 迭代执行策略
- C. 敏捷执行策略
- D. 混合执行策略

正确答案： D

社区投票分配

D (86%) 14%

一位项目经理正在管理一个项目，该项目有一位正在削减预算的新发起人。

作为仆人式领导，项目经理应该如何与团队一起处理预算削减？

- A. 通知项目发起人，预算缩减将需要进度延误和范围缩减。
- B. 与团队合作评估变更对项目的影响并推荐更新的项目计划。
- C. 通知每个团队成员，他们必须释放一部分预算，但必须按计划进行，范围没有变化。
- D. 与进度协调员和财务分析师会面，告诉他们要减少哪些预算线以及在何处释放冗余。

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

项目经理已完成对项目团队绩效的评估。一些团队成员在分配给他们的任务中表现不佳。

项目经理应该做什么？

- A. 根据项目要求创建新的标准绩效衡量标准
- B. 根据团队成员的积极性和能力制定不同的方法
- C. 制定标准方法向所有团队成员提供反馈
- D. 对表现不佳的团队成员进行集中监督

正确答案： B

社区投票分配

C (50%) 乙 (44%) 6%

问题#62

话题一

一个敏捷团队已经发布了其产品的第二个版本，但反馈是该软件存在许多影响用户体验的错误。项目经理应该做什么？

A. 聘请外部咨询公司专注于测试和质量控制，以避免将来出现问题

B. 提出一个内部计划，为发现和修复错误的团队成员提供激励

C. 密切评估团队的技能组合，寻找需要归档以提高质量的技术差距

D. 促成下一次回顾会议，集中团队分析根本原因并提出解决方案

正确答案： D

社区投票分配

丁 (100%)

问题#63

话题一

关键项目利益相关者已开始将所有问题和主要要求上报给项目发起人。项目经理担心团队没有收到来自该利益相关者的直接通信。项目经理应该采取哪两项行动来改善与干系人的关系？（选择两项。）

A. 为团队提供情商和状态报告技巧方面的培训

B. 促进适应性和透明的环境，团队可以轻松地与利益相关者沟通

C. 共享每周状态报告，其中包含有关项目和团队绩效的详细信息

D. 提交绩效报告和任务分配，让利益相关者了解情况

E. 安排与主要利益相关者的定期会议以提供更新和接收反馈

正确答案： BE

社区投票分配

是 (100%)

问题#64

话题一

项目经理正在领导一个涉及内部和外部利益相关者的多年项目。随着项目经理开始收集需求，其他业务干系人表示有兴趣参与其中。项目经理应该采取哪三项行动来确保利益相关者的适当参与？（选择三个。）

A. 根据项目阶段和需求确定利益相关者的优先级

B. 执行利益相关者评估以符合项目目标

C. 根据利益相关者在组织中的职位对利益相关者进行分类和排序

D. 将所有利益相关者纳入利益相关者参与计划并提供同等水平的沟通

E. 制定利益相关者影响/影响矩阵以确定参与程度

正确答案： 安倍

社区投票分配

安倍 (45%)

ABD (27%)

王牌 (27%)

问题 #65

话题一

在项目的启动阶段，项目经理和团队成员与产品所有者一起确定产品待办事项列表的优先级。项目经理接下来应该做什么？

A. 在项目的每个阶段为客户生产增值产品。

B. 尽可能持续地为客户生产增值产品。

C. 在项目开始时为客户生产增值产品。

D. 与支持文件一起生产增值产品。

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)

问题#66

话题一

项目经理正在监督一个项目，该项目是针对重大技术中断的计划的一部分。该团队由才华横溢的年轻专业人士组成，他们过去曾为该组织从事过不同的项目。然而，该团队抱怨说，他们之前在项目执行过程中缺乏方向，害怕在这个项目中出现同样的问题。项目经理应该采取哪两项措施来确保这个问题不会在这个项目中发生？（选择两项。）

A. 组织团队建设活动并邀请外部经理向团队讲话。

B. 为项目设定清晰的愿景并确保所有利益相关者都能看到它。

C. 关注资源管理计划并跟踪项目进度。

D. 鼓励团队进行头脑风暴会议并提供缓解计划。

E. 让团队参与并专注于项目的方向。

正确答案： BE

社区投票分配

是 (67%)

行政长官 (33%)

问题#67

话题一

由于组织的变化，一些关键利益相关者在项目中间被新的利益相关者取代。因此，提出了许多新的要求。项目经理应该做什么来确保项目的成功？

A. 与利益相关者一起审查新需求并确定其优先级，以确定需要哪些变更请求。

B. 立即寻求批准以修改项目时间表和预算，以交付所有新要求。

C. 将问题上报给项目发起人并寻求支持以保持原始要求。

D. 向新的干系人强调在项目的这个阶段不允许有新的要求。

正确答案： A

社区投票分配

一个 (100%)

问题#68

话题一

项目的一个阶段花费的时间比最初预期的要长得多。主要利益相关者表达了他们对潜在项目延迟的担忧。项目经理应该做什么？

A. 向发起人请求额外的应急资金

B. 在整个项目进度中增加更多的浮动时间

C. 加快下一阶段以减少延误

D. 组织根本原因分析 (RCA) 研讨会

正确答案： D

社区投票分配

丙 (67%)

D (33%)

问题#69

话题一

一个敏捷团队正在开展一个将在六个国家/地区启动的项目。除了基本产品之外，每个国家/地区都有特定的要求。估计表明，开发基础产品需要六个月的时间，还需要一个月的时间来完成每个国家/地区的独特要求。该产品的预期收入在每个国家/地区都是相同的。项目经理应该推荐哪种发布策略？

A. 一种基于迭代的策略，通过在产品完成并准备在该国发布时向每个国家发布产品来实现价值最大化

B. 一项基于财务的战略，通过计划同时向所有国家发布单一、捆绑的版本来减少推出工作量和成本

C. 基于风险的战略，通过向技术复杂性最低的国家推出产品来最大化产品的感知价值

D. 一种基于质量的策略，通过向报告现场问题概率最低的国家/地区发布产品来最大限度地提高上市后采用率

正确答案： A

问题 #70

话题一

主要利益相关者无法始终如一地参加项目状态会议。项目经理一直在与该利益相关者进行非正式和定期的沟通，以确保利益相关者了解项目的最新情况。但是，项目经理最近辞职了，在离职前不会与新项目经理会面。项目经理应该如何确保新项目经理继续更新这个特定的利益相关者？

A. 确保已向项目团队提供有关该利益相关者特定需求的指导

B. 根据利益相关者的特定沟通需求更新利益相关者参与计划

C. 确保项目文件包含有关利益相关者的具体说明

D. 使用有关利益相关者参与的具体信息更新沟通管理计划

正确答案： B

社区投票分配

乙 (91%)

9%

项目团队正在与供应商一起实施企业通知工具。项目经理注意到该供应商的开发人员已连续数周报告相同的状态。几天后，供应商表示由于公司内部资源限制，无法按时完成可交付成果。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 更新风险登记册以反映延迟，将影响传达给进度表，并上报给管理层寻求帮助
- B. 与项目发起人进行项目审查以解释延迟并添加开发人员与供应商合作
- C. 将延迟添加到问题日志中，并与供应商合作寻求解决方案，使进度重回正轨
- D. 审查与供应商的合同以审查适用于这种情况的经济处罚

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

一家软件开发公司的项目经理在他们的项目中面临着许多财务风险。项目经理需要经常检查风险管理过程的强度和效率。

项目经理应该使用什么来完成这个任务？

- A. 头脑风暴会议
- B. 利益相关者登记册
- C. 假设日志
- D. 审计会议

正确答案： D

社区投票分配

D (64%)

一个 (36%)

非典型的高绩效团队成员已经开始表现出绩效下降以及在会议中对其他团队成员的一些攻击性行为。项目经理在这个项目上与此人一起工作了很多个月，以前从未见过这种行为。

项目经理应该做什么？

- A. 与其他团队成员讨论此人的行为以确定他们是否注意到并知道发生了什么
- B. 参加更多的团队会议以更密切地观察团队以确定根本原因
- C. 与个人讨论项目经理的观察，以确定他们这样做的原因
- D. 与团队成员的职能经理和人力资源 (HR) 讨论他们的表现，并讨论下一步

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

在一个新组建的项目团队中，一位经验丰富的团队成员对任务的复杂性感到不知所措，对项目团队不满意。项目经理应该做什么？

- A. 解释任务是不可避免的，并要求团队成员找到克服挑战的解决方案
- B. 与项目团队成员一起开展团队建设活动以缓解紧张情绪
- C. 要求团队成员在风险登记册中输入这个潜在的进度延迟
- D. 积极倾听团队成员的意见并确定支持他们完成任务的方法

正确答案： D

社区投票分配

D (86%)

14%

由于影响关键路径的质量问题导致大量返工，项目被延迟。项目经理应该做什么？

- A. 向项目管理办公室 (PMO) 报告延迟和纠正措施。
- B. 重新设定项目进度基准以吸收延迟。
- C. 将延迟原因通知项目指导委员会。
- D. 将延迟和纠正措施报告给变更控制委员会 (CCB) 以供审查。

正确答案： D

社区投票分配

D (50%)

一个 (50%)

一位经验丰富的项目经理正在管理一个价值数百万美元的敏捷项目。项目经理将基本规则传达给团队，但在 12 次迭代后，项目经理开始注意到一些团队成员没有遵守基本规则。项目经理应该首先做什么来确保团队遵守基本规则？

- A. 要求职能经理更换不遵守基本规则的团队成员。
- B. 安排与项目团队的会议以强化基本规则。
- C. 将此行为通知项目发起人，并要求发起人采取纪律处分。
- D. 联系人力资源部，要求向不遵守基本规则的团队成员发送书面警告信。

正确答案： B

社区投票分配

乙 (100%)



项目经理被分配了一个低优先级项目，其中包括以前没有正式项目经验的新团队成员。项目团队已经两次请求延长第一个开发增量的截止日期。

项目经理应该做什么来支持团队？

- A. 使用项目绩效评估向团队提供反馈。
- B. 在时间表中包括缓冲时间以吸收未来的延误。
- C. 将对进度的影响上报给项目发起人。
- D. 创建变更请求以延长项目的持续时间和成本。

正确答案： A

社区投票分配

一个 (75%)

乙 (25%)

一位客户对该项目提供了极好的反馈。然而，一个关键的项目资源正在离开公司。

哪种措施应该减轻这一关键资源离开的影响？

- A. 制定积极主动的知识共享计划
- B. 为即将离开的资源提供一份新合同
- C. 制定替代关键资源的应急预算
- D. 更新风险登记册并通知客户

正确答案： A

社区投票分配

一个 (100%)

一位项目经理正在处理一项企业资源规划 (ERP) 计划，该计划包含跨越多个业务线的利益相关者。项目经理开始识别、评估和分类干系人与项目群的关系。

这个过程的目的是什么？

- A. 确定所有可以对项目产生积极影响的利益相关者
- B. 确定所有可能对项目产生负面影响的利益相关者。
- C. 将所有利益相关者的需求纳入沟通管理计划
- D. 仅将主要利益相关者纳入沟通管理计划

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

一家公司刚刚开始使用敏捷方法管理项目。由于这一变化，总经理对即将开展的项目的范围定义流程感到担忧。项目经理应该怎样做才能确保项目范围得到完全定义？

- A. 与总经理会面并说服他们重新使用预测方法来避免任何风险
- B. 要求总经理审查每一项要求，以确保所有项目都能交付要求的产品
- C. 要求增加预算以实施双重检查流程，以确保每个业务需求都包含在要求中
- D. 帮助发起人和利益相关者制定产品愿景，并将团队和产品所有者召集在一起以明确期望

正确答案： D

社区投票分配

一个 (100%)

要求项目经理为发电厂开发维护计划软件。组织中的另一个部门执行了一个类似的项目，但后来由于绩效不佳而关闭。项目经理关心项目的绩效，希望提前采取行动以确保项目成功。项目经理应该做什么？

- A. 继续按计划执行项目，并在需要时添加更多资源。
- B. 评估项目风险并增加外部专家来解决潜在风险。
- C. 回顾从类似项目中吸取的经验教训，以免它们重蹈覆辙。
- D. 将风险告知项目发起人并试图说服他们退出项目。

正确答案： C

社区投票分配

C (100%)

一个新组建的项目团队，既有在公司长期工作的团队成员，也有新加入公司的团队成员。项目组成员发现，这两个群体之间的沟通存在隔阂，很难相互协作。项目经理应该做什么？

- A. 请有经验的会员带领初级会员促进技能传授
- B. 组织网络会议让团队成员相互了解
- C. 鼓励团队成员专注于用他们的专业技能交付成果
- D. 要求团队自行组织并将任何问题上报给项目经理

正确答案： B

社区投票分配

乙 (80%)

一个 (20%)



一位项目经理在 A 国的一家组织工作，其任务是在 B 国开设第一家实体店。赞助商已经确定了开店的城市，并希望尽量减少与当地政府的任何潜在问题。

项目经理应该采取什么行动来满足发起人的要求？

- A. 与组织的法律部门合作，确定当地法规以确保项目合规
- B. 与组织的项目管理办公室 (PMO) 合作，建立一个位于城市的居民项目团队
- C. 与组织的房地产部门合作并联系当地政府以确定商店的最佳位置
- D. 与当地政府合作，建立将在商店工作的员工的档案

正确答案： A

设备供应商将为客户公司实施新的生产线。这个为期一年的项目将包括 2 到 4 个月的长期迭代；然而，客户的项目经理没有敏捷经验。

项目经理应如何确保客户在日常会议中得到有效代表？

- A. 推荐最适合客户项目经理日程安排的敏捷培训计划。
- B. 为客户团队提出一项重要的敏捷知识传授会议，以与日常会议目标保持一致。
- C. 将项目重新调整为预测方法，以确保团队之间的最佳协作。
- D. 向客户项目经理提供敏捷最佳实践文档和网络资源。

正确答案： B

社区投票分配

乙 (57%)

一个 (43%)

一位项目经理在一家拥有多个全球办事处的公司工作。在新项目的资源规划过程中，项目经理意识到公司需要项目包括来自不同大陆的团队成员。

项目经理应该怎么做才能确保项目的成功执行？

- A. 计划与项目发起人会面，讨论仅利用当地同事的可能性。
- B. 在项目的第一天发送包含项目可交付成果信息的电子邮件。
- C. 连接每个位置并检查他们首选的通信方式。
- D. 邀请所有资源到项目经理的位置，形成一个有凝聚力的团队，直到完成所有可交付成果。

正确答案： C

社区投票分配

丙 (67%)

D (33%)

由于之前的糟糕经历，项目的业务利益相关者不愿意接受敏捷方法，并正在推动预测方法。项目经理应该使用什么策略来说服利益相关者使用敏捷方法？

- A. 同意预测方法，但在项目管理框架下应用敏捷概念。
- B. 确保利益相关者敏捷方法将在更短的时间内交付所有预期结果。
- C. 记录请求并上报给高层管理人员以考虑修改项目章程。
- D. 提出具有多个小交互的分阶段项目方法，并通过频繁的价值交付与利益相关者建立信任。

**正确答案：** D

A 国的项目工程师抱怨从 B 国的供应商处收到的样品，因为样品的长度不正确。在一次电话会议中，供应商检查了图纸并坚持测量是准确的。项目经理接下来应该做什么？

- A. 在B国聘请一家公司在发货前进行质量检查
- B. 评估采购合同以确定商定的规格
- C. 将问题上报给采购部门审核
- D. 增加一个额外的任务，根据规格切割接收到的零件

**正确答案：** B

项目经理在世界各地的许多不同时区都有团队成员。项目工作经常停滞不前，因为一个办公室的人需要等到另一个办公室醒来才能回答问题。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 确保该项目是所有团队成员的最高优先级
- B. 为克服地理和时区挑战而计划和安排的任务和工作包
- C. 在分配项目工作之前更多地了解每个团队成员更喜欢如何交流
- D. 使用通讯工具，如视频会议，让不同的办公室可以沟通

**正确答案：** B

项目经理正在审查项目的进度，并注意到其中一个风险已成为问题。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 发起变更请求，从管理储备中获取额外资金
- B. 与项目团队和客户会面，就可能的解决方案集思广益
- C. 安排与项目利益相关者的高优先级会议来讨论这个问题
- D. 与相关利益相关者合作实施风险应对计划

**正确答案：** D

一位项目经理开始了一个复杂的炼油厂项目。尽管该项目处于启动阶段，但发起人一直要求为最重要的项目里程碑提供具体日期。项目经理什么时候能够提供所要求的信息？

- A. 在规划阶段，何时执行范围定义和活动持续时间以及排序的过程
- B. 项目接近尾声，因为预测会更加准确并且大部分风险已经得到缓解
- C. 在启动过程中，因为它与项目合同和项目章程的创建同时发生
- D. 尽快，因为尽早制定时间表可以大大避免项目延误

**正确答案：** B

在进行绩效评估后，项目经理发现仍然存在一些差距。项目经理应该确保什么？

- A. 所有团队成员都会因在项目中发挥作用并进行评估而获得奖励。
- B. 为所有接受评估的团队成员组织绩效改进计划。
- C. 所有团队成员立即轮换他们的工作时间表，使他们多才多艺。
- D. 评估结果保密，不在团队成员之间共享。

**正确答案：** D

项目处于执行阶段。客户在早期阶段积极参与，但最近参与度较低。最近要求对要求进行一些更改。项目经理接下来应该做什么？

- A. 与客户讨论变更并共同决定如何进行。
- B. 拒绝更改并保持最初与客户商定的原始路线。
- C. 查看风险登记册，看看是否已经为这种情况概述了缓解措施。
- D. 审查变更并根据项目组的建议做出决定。

**正确答案：** A

一名技术人员计划在工作时间不同的三个远程呼叫中心座席的家中安装互联网服务。他们的职能经理安排了休息时间，以便有时间进行安装和测试。承运人向项目经理发送了一封电子邮件，说明有一个约会被延迟了2天。项目经理现在需要做什么？

- A. 通知产品负责人
- B. 通知项目发起人
- C. 通知相关利益相关者
- D. 只通知项目组

**正确答案：** C

敏捷项目中的一名团队成员通知项目经理他们可能无法按时完成分配的任务，这可能会给团队的其他成员带来障碍。项目经理应该做什么？

- A. 让团队成员在下一次每日例会中提出问题
- B. 发送电子邮件向所有团队成员解释问题
- C. 将任务重新分配给另一个团队成员
- D. 将任务移至下一个冲刺

**正确答案：** A

已指派一名项目经理管理多个敏捷项目团队。项目经理想要授权团队并使他们自组织。项目经理应该怎么做才能创造一个积极的环境？

- A. 帮助团队建立和遵守他们的基本规则，并定期回顾
- B. 复制另一个项目制定的基本规则并提供给团队
- C. 建立团队基本规则并与团队分享以严格遵守
- D. 提取组织的政策和流程，进行定制，交给团队去遵守

**正确答案：** A

全球分布式敏捷团队的敏捷教练和技术作家所在的国家与敏捷团队时差 9 小时。敏捷教练和项目负责人对每日站会的时间有不同意见。项目负责人认为站立会议应该在当地时间上午 10:00 举行，但敏捷教练和技术作家认为这对他们来说是一个不方便的时间。项目负责人如何确保遵守敏捷实践？

- A. 通知敏捷教练每日站立会在当地时间上午 10:00 举行，并确保各方都能参加
- B. 向管理层报告敏捷过程行不通，并要求他们与敏捷教练交谈
- C. 与团队讨论方法并决定每日站会的时间
- D. 有两次单独的每日站会，一次针对敏捷教练和技术作家，一次针对敏捷开发团队

**正确答案：** C

项目经理收到团队成员关于在不影响进度或成本的情况下改进产品属性的建议。这将为项目和客户增加价值。项目经理应该做什么？

- A. 拒绝建议并要求团队成员专注于执行计划
- B. 要求团队成员提交正式的变更请求
- C. 接受建议，因为它对项目没有影响
- D. 请另一位团队成员验证建议的影响

**正确答案：** B

在项目的第三次迭代中，主要发起人从公司退休，并任命了新的发起人。新的发起人不熟悉项目交付的敏捷方法，这导致他们要求对项目团队有更多的控制权。

项目经理应该做什么？

- A. 安排与新发起人的会议，以解释敏捷方法以及团队应该如何自组织
- B. 在下一次日常审查会议期间与项目团队一起审查发起人的请求，以提供请求的控制
- C. 安排与项目团队的紧急会议，以便他们满足发起人的每一个要求
- D. 在下一次迭代审查会议期间与项目团队一起审查发起人的请求以获得团队决策

**正确答案：** A

一家中型公司一直在探索与推出新产品有关的新营销策略。新产品的创造不是一件小事。最后，公司承担的费用太大了。项目经理以后做新产品项目应该怎么做？

- A. 利用看板，让所有利益相关者都能清楚地了解项目并相应地提供帮助
- B. 培训团队首先找到将为客户提供价值的最小可行产品 (MVP)
- C. 增加应急储备并准备团队在估计偏离初始计划时应用快速失败技术
- D. 采用链式管理方式，开发基于相同平台和基础设施的产品

**正确答案：** B

项目经理正在管理一些具有高度不确定性的创新项目。由于项目的性质，项目经理面临着发出大量变更请求的挑战。项目经理应该做什么？

- A. 减少实施变更请求所需的审批人数量
- B. 请求发起人批准所有变更请求以减少变更数量
- C. 启动迭代次数以减少变更请求的数量
- D. 在项目基线上添加客户允许的固定数量的变更请求

**正确答案：** C

项目经理正在开始一个新项目，而项目团队位于不同的国家/地区。该团队打算使用一种特定的工具来举行虚拟会议。但是，该工具在一个团队成员所在的国家/地区不可用。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 联系项目发起人将团队成员从项目中移除
- B. 要求团队成员移动到另一个可用工具的位置
- C. 研究可供所有团队成员使用的虚拟会议替代工具
- D. 启动项目并使用电子邮件与团队成员沟通，直到工具可用

**正确答案：** C

在项目进行到一半时，项目发起人被另一个以前没有参与过该项目的同行所取代。新的项目发起人拒绝了大部分项目工件，并且团队没有获得当前迭代中批准的最新增量。利益相关者对项目结果没有信心。

项目经理应该做什么来防止这种情况发生？

- A. 当发起人加入项目时进行利益相关者分析
- B. 召开治理会议，审核项目增量
- C. 上报问题以确保增量会被批准
- D. 与新的项目发起人一起进行产品迭代评审

**正确答案：** A

近日，某环保部门的监管部门下达禁令，禁止生产特定厚度的塑料包装产品。该禁令将在 12 个月后生效。一家从事替代包装的初创公司的项目经理一直在关注该法律的进展，作为风险管理的一部分，他已经确定了可以支持不断增长的客户群的新产品。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 在 12 个月的期限结束后开始营销活动以销售替代包装
- B. 组织与所有利益相关者的会议并审查利益相关者参与计划
- C. 继续生产流程并计划在下一次年度目标审查会议上讨论变更
- D. 将新法律作为扩大市场份额和共享拟议产品的机会告知管理层

**正确答案：** D



项目经理是平衡矩阵项目组织的一部分。项目经理将直接从新的采购部门负责人那里收到所有工作绩效更新，他没有时间向项目经理提供信息。

项目经理应该做什么？

- A. 与公司项目发起人讨论情况征求意见
- B. 直接向采购部门团队成员索取信息
- C. 与采购部门负责人协商制定解决方案
- D. 向采购部门负责人的经理介绍情况

**正确答案：** C

项目经理刚刚被一家没有项目管理治理结构的公司聘用。在启动会议期间，一位主要利益相关者强调项目满足公司战略、投资和合规要求的重要性。

项目经理应该做什么？

- A. 建立符合要求的项目治理模型
- B. 将组织治理复制到项目治理
- C. 创建组织项目管理治理
- D. 要求组织创建项目组合治理

**正确答案：** A

第三方供应商要求为项目提供的服务付款。协议是在组织收到客户付款后付款。第三方供应商缺乏支付工资的资金，并已通知项目经理，如果他们不尽快收到付款，他们将从项目中撤出团队成员。

项目经理应该做什么？

- A. 向客户说明第三方供应商情况并要求付款。
- B. 通知客户项目必须延迟到收到付款为止。
- C. 从其他项目调拨资源支付给第三方供应商。
- D. 处理银行贷款以支付第三方供应商的工资。

**正确答案：** A

项目经理正在开发利益相关者登记册，但在理解某些利益相关者的动机时遇到了困难。  
项目经理应该怎么做才能获得这些信息？

- A. 从业务案例中识别每个利益相关者的动机。
- B. 要求利益相关者在启动会议上阐明他们的动机。
- C. 将项目目标通过电子邮件发送给所有利益相关者并寻求认可。
- D. 组织与每个利益相关者的一对一对话。

**正确答案：** A

在一个项目的启动阶段，与另一个项目的团队举行了经验教训分享会。低建筑生产力被讨论为项目完成的潜在延迟。  
项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目发起人讨论此问题以请求额外资金来实施缓解措施
- B. 对具有可靠业绩记录的承包商进行资格预审，以消除生产力问题
- C. 将施工生产力添加到风险登记册中并制定现场执行的缓解策略
- D. 聘请施工管理顾问制定全面的现场执行计划

**正确答案：** C

当一位经验丰富的团队成员开始错过最后期限时，项目经理正在管理一个移动应用程序开发项目。延误将影响项目实施。  
项目经理接下来应该做什么？

- A. 分配额外的资源来帮助团队成员完成任务
- B. 询问团队成员的职能经理是否有任何已知问题
- C. 召开团队会议，鼓励和激励整个团队
- D. 与团队成员会面以了解他们的担忧和/或问题

**正确答案：** D

项目经理正在领导一个混合项目。具有敏捷经验的唯一可用资源不在项目经理的位置。该项目有严格的进度和预算，项目经理很关心他们的交付能力。  
项目经理应该做什么？

- A. 每天通过视频会议调动敏捷资源
- B. 通知发起人项目将被延迟，因为需要敏捷培训
- C. 请求预算扩展以获得在敏捷方面有经验的本地资源
- D. 计划将敏捷资源临时转移到项目经理的位置

**正确答案：** A



敏捷促进者为一个新项目召集了一个团队。这个团队和协调人还没有合作过一个项目。引导者应该如何进行？

- A. 设立一个类似项目的经验教训会议。
- B. 举行团队章程讨论。
- C. 安排发布计划会议。
- D. 与团队进行产品路线图会议。

**正确答案：** B

一名项目经理被指派领导一个软件项目，以在一家重要的金融机构产生储蓄。最初，项目工期为13个月，但由于执行过程中出现各种问题，项目延长至16个月。到第 11 个月，已超出预期的节省，但并未实现为该日期计划的所有功能。项目经理应该如何将项目的进展告知利益相关者？

- A. 完成未完成的功能后通知发起人项目进度
- B. 传达未决功能的收益预期和行动计划
- C. 向所有相关利益相关者发送包含每月项目进度的电子邮件
- D. 报告项目没有实现所有预期的功能

**正确答案：** B

项目经理正在交付需要快速部署给公众的解决方案。项目团队经验丰富，利益相关者支持交付，客户合作。项目经理应该使用什么策略来确保按时交付解决方案？

- A. 与客户会面以商定解决方案的组成部分和优先级
- B. 请求发起人支持分配额外资源以按时完成
- C. 有增量交付的高层计划，尽早得到客户的反馈
- D. 制定所有里程碑、可交付成果、功能和资源分配的详细计划

**正确答案：** C

在一个项目上工作的两个项目团队成员之间经常发生冲突。这对项目造成了负面影响。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 劝告两个团队成员并用最后警告告诫他们。
- B. 将两个项目团队成员重新分配到不同的项目团队。
- C. 在出现更大的问题之前将问题上报给人力资源 (HR) 经理。
- D. 通过情商 (EI) 帮助培养两个团队成员之间的自我意识。

**正确答案：** D

一些虚拟团队成员位于通常具有良好 Internet 连接的区域。但是，他们在白天加入团队电话时经常遇到连接问题。项目经理应该做什么？

- A. 确定问题所在并制定行动计划
- B. 要求团队成员使用聊天工具代替电话
- C. 购买占用较少带宽的互联网通话工具
- D. 录制会议以分享给无法加入的团队成员

**正确答案：** A

一家公司的首席执行官抱怨项目沟通的频率。CEO 每周通过电子邮件收到五份项目报告，但没有足够的时间审阅它们。此外，CEO 收到的信息不相关，因为它没有解释项目状态。项目经理首先应该做什么？

- A. 与团队会面并决定发送给 CEO 的报告的类型和频率
- B. 每周向 CEO 发送一份执行摘要而不是每周五份报告
- C. 审查沟通管理计划
- D. 审查利益相关者参与计划。

**正确答案：** C

项目经理发现遵守知识转移的标准化流程具有挑战性。项目团队和利益相关者分散在现场、办公室和偏远地区。此外，一些团队成员对电子共享文件的访问权限有限。项目经理应该如何应对这一挑战？

- A. 研究环境和可用资源以确定使用哪种方法。
- B. 通过电子邮件发送预期信息，因为它是主要的通信工具。
- C. 向团队传达强烈的信息，解释知识转移的重要性。
- D. 要求改变流程，因为它不适合公司环境。

**正确答案：** A

在迭代计划期间，团队 A 确定一个重要的可交付成果依赖于团队 B 的可交付成果。项目经理应该做什么？

- A. 要求团队 B 专注于他们的积压工作并根据他们的优先级交付
- B. 将依赖关系通知团队 B 并确保可交付成果已计划好
- C. 让团队 A 成为团队 B 的一部分，并确保可交付成果已准备就绪
- D. 要求 B 队立即开始这项活动并交付给 A 队

**正确答案：** B

一个大型建设项目按照项目目标进展顺利。项目经理想向项目发起人报告项目的价值，并寻求下一阶段的资金收尾。项目经理应该做什么？

- A. 确保测量系统到位，如挣值分析 (EVA)，以跟踪项目发起人的项目价值
- B. 为项目发起人创建一份关于成功和挑战的详细项目报告
- C. 提交一份关于成本预算与实际成本的详细报告，因为项目发起人希望了解更多财务信息
- D. 安排实地考察，亲自向项目发起人展示施工进度

**正确答案：** A

项目经理正在计划一个包含多个工作包的项目。每个工作包都有自己定义的范围，但资金将在项目层面。项目经理应该如何确定分配的资源预算是否足以支付项目的资源成本？

- A. 估算工作包级别的成本并将这些成本相加以计算项目的总成本并将其与分配的预算进行比较。
- B. 创建预算燃尽图和范围燃尽图，然后验证项目范围是否在分配的预算用完之前完成。
- C. 将分配的预算除以工作包的数量，并验证每个工作包都能在分配的预算内完成。
- D. 按照重要性顺序为每个工作包提供资金，并将任何剩余范围从未获得资金的工作包转移到获得资金的工作包。

**正确答案：** D

项目经理正在管理一个执行阶段已过半的项目，可交付成果的质量标准已被正式接受。但是，政府机构最近推出了可能会对项目产生重大影响的新标准。必须更改可交付成果以符合新的质量标准。项目经理应该做什么？

- A. 为项目团队安排有关政府机构出台的新规定的培训
- B. 建立结构化、独立的流程以确定项目活动是否遵循标准
- C. 更新经验教训登记册并将新标准告知高级管理层
- D. 评估新法规对项目的影响并提交变更请求

**正确答案：** B

项目团队的绩效受到阻碍影响活动进度和团队自主权的内部程序的影响。项目经理应该首先做什么来解决这种情况？

- A. 在下一次 sprint 评审会议上讨论这个问题
- B. 就组织的程序对团队成员进行培训
- C. 要求组织改进内部程序
- D. 尝试消除障碍并赋予团队成员权力

**正确答案：** D

关键项目的自组织团队始终如一地根据他们的承诺交付价值。在回顾中，项目经理观察到大多数团队成员因过度承诺而感到压力。项目经理应该做什么？

- A. 在计划阶段支持团队只承诺他们能够交付的东西
- B. 申请额外资源以继续交付价值，同时减轻团队压力
- C. 要求个别团队成员计划错开休假以避免压力
- D. 通过组织定期的减压和团队建设会议来帮助团队成员

**正确答案：** A

一位项目经理收到了新产品的项目章程。该项目预计将有两个主要交付：硬件部分已经定义了详细的规格，包括一台样机，以及只有基本规格和用户体验设计方法要求的用户界面软件。项目经理应该使用哪种项目管理方法？

- A. 软件开发具有很高的不确定性，因此项目建议采用敏捷方法。
- B. 一种混合方法将起作用，使用敏捷进行软件开发，使用预测方法进行硬件交付。
- C. 可交付成果明显不同，因此应将项目拆分为两个由程序驱动的项目。
- D. 范围明确；因此，预测方法很简单，硬件和软件可以在门上同步。

**正确答案：** B

一名敏捷团队成员获得了新工具的认证；但是，该团队成员抱怨团队的其他成员由于缺乏知识而没有使用该工具。仆人式领导应如何运用情商来利用这种情况使项目受益？

- A. 申请奖励团队成员的预算，这样其他人就会有动力获得相同的认证。
- B. 将团队成员提升为产品负责人，以利用客户的新知识。
- C. 要求团队成员使用他们最近获得的知识来开发团队并为团队提供培训。
- D. 为开始在此项目中使用新工具的团队成员提供激励。

**正确答案：** C

章程获得批准后，项目经理已被分配到项目中。在与团队一起审查章程时，项目经理发现遗漏了实现项目成果所必需的一些主要预算项目。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 立即与项目发起人讨论此事并要求重新审查预算以确保其准确性
- B. 将缺失的预算项目添加到风险日志中并提交给下一个项目指导委员会
- C. 启动项目并处理在整个项目生命周期中出现的这些预算问题
- D. 降低其他可交付成果的质量和成本，以便为遗漏的项目留出额外预算

**正确答案：** A

项目进度风险已成为一个问题。项目经理预见到项目执行的延迟。

项目经理应该怎么做才能解决这个问题？

- A. 将问题上报给高层领导解决
- B. 与相关利益攸关方合作确定可能的解决方案
- C. 将进度基准更新为新的项目时间线
- D. 更新风险管理计划并发送给项目组

**正确答案：** B

项目经理被分配到一个项目，在该项目中，供应商已参与构建新系统。在安排用户验收测试 (UAT) 前一周，供应商通知项目经理他们只能在 UAT 开始日期之前交付承诺的一半功能。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与供应商和项目团队沟通并探讨解决问题的可能性
- B. 等到供应商不能交货，然后根据合同要求违约金
- C. 通过取消与该供应商的合同上报给管理层并准备项目关闭
- D. 调整项目进度以适应供应商当前的开发进度

**正确答案：** A

在一个时间紧迫的建设项目中，监理和技术人员之间发生了误会。误会变成了重大冲突，技术人员向项目经理抱怨说他们不能再在主管的领导下工作了。主管引用技术人员表现不佳作为冲突的原因。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 与技术人员和主管采用直接、协作的方法
- B. 为技术人员提供及时培训以提高他们的技能
- C. 在时间紧迫的情况下用高性能资源替换技术人员
- D. 与主管交谈以缓和他们的方法和态度

**正确答案：** A

项目由不参与并致力于项目成功的团队成员组成。

项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 联系项目发起人请求批准释放当前团队并聘请替代人员
- B. 召集每个团队成员了解他们对问题的看法，然后召集整个团队讨论解决方案
- C. 直接给每个团队成员发一封电子邮件，表明如果他们不改变态度，可能会受到纪律处分
- D. 接受这种情况，知道有可用于在必要时增量释放的进度松弛

**正确答案：** B

一位项目经理被分配了一个项目来建造一个新的太阳能发电场，为一个新的住宅区提供清洁能源。政府已决定从1月1日起降低可再生能源产品的税收。供应商已经联系并表示，12月20日交付的太阳能电池板订单

可能会推迟到1月初。另一方面，由于十二月假期，该项目将面临类似的限制。

项目经理应该如何应对这种风险？

- A. 查看供应商的合同以了解销售条款
- B. 坚持供应商在约定日期交货
- C. 更新风险登记册并利用机会
- D. 接受风险并更新风险登记册

**正确答案：** C



项目经理被指派为公司的前一个客户管理一个项目。项目经理被警告说，该客户可能会尝试在项目中增加额外的范围，而不考虑变更对时间、成本、质量和风险的影响。

项目经理应该采取什么行动来帮助规划和管理预算和资源？

- A. 拒绝让客户更改范围和检查经验教训登记册。
- B. 将可交付成果分解为工作包并审查项目章程。
- C. 创建严格的范围说明书并审查历史信息。
- D. 包括范围变更流程并审查项目章程。

**正确答案：** D

项目经理正在使用混合方法管理项目，并要求高级团队成员执行定量风险分析。团队成员回答说他们不具备执行此类分析的知识。项目经理应该做什么？

- A. 通过指导、指导和培训帮助团队成员进行定量风险分析
- B. 将问题上报给职能经理
- C. 对团队成员进行定量风险分析
- D. 联系项目管理办公室 (PMO) 并要求他们指派另一名具备执行此任务知识的团队成员到团队

**正确答案：** A

一位从事大型人工智能 (AI) 项目的高级开发人员努力工作并取得了优异的成绩。项目经理对开发者的贡献很满意，认为开发者值得奖励。

项目经理应该做什么？

- A. 为项目团队创建一个机会来认识这个开发者
- B. 打印认可证书并在开会时出示给开发商
- C. 向团队发送认可邮件并复制管理
- D. 根据开发者的动机和兴趣奖励开发者

**正确答案：** D

一项全球计划正在启动，多个分布式团队参与实施该计划。除了计划和执行计划的范围外，还必须考虑团队互动。

项目团队在会议中应该如何互动？

- A. 视频会议
- B. 加密邮件
- C. 电话交谈
- D. 聊天对话

**正确答案：** A

项目经理是全球项目团队的一部分，负责管理其所在国家/地区定义的范围。关于范围的哪些部分应该由全球和本地团队处理，有一个明确的划分。在上一个冲刺期间，项目经理一直在接收全球团队应该处理的请求。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 评估团队吸收工作量的能力
- B. 评估和理解冲突的原因
- C. 将情况上报给项目发起人
- D. 拒绝工作量返回给全球团队

**正确答案：** B

一家公司正在将项目从预测方法转变为敏捷方法。CFO 担心其中一个敏捷项目有一个对财务部门来说很重要的特性，该特性被推迟到以后的迭代中。

项目经理应该做什么来澄清情况？

- A. 请求 CEO 支持如何处理这种情况
- B. 增加团队规模以满足 CFO 之前的任何期望
- C. 创建一个执行委员会来审查产品积压并重新计划下一次迭代
- D. 向 CFO 澄清优先级排序过程是基于业务价值的

**正确答案：** D

技术复杂的项目经理定期与主要利益相关者一起审查关键项目指标。在一次会议中，项目发起人解释说，他们正在使用项目经理的风险登记册作为在执行层面就项目进行沟通的一种方式。

项目经理应如何确保在风险登记册中准确报告项目风险？

- A. 更新风险管理计划中的风险
- B. 审查整个项目执行过程中的风险
- C. 列出启动会议中识别的项目风险
- D. 计划在项目结束时更新风险

**正确答案：** B



一位项目经理最近完成了一个项目，并开始与另一位主管一起管理一个新项目。作为早期项目活动的一部分，原项目的主管被分配到团队作为非监督资源，并立即开始质疑现任主管做出的所有决定。

项目经理应该如何解决这个冲突？

- A. 确保新主管在受到挑战时带头
- B. 给项目团队时间与新主管一起解决问题
- C. 立即将资源从项目团队中移除
- D. 就此项目的角色和职责与资源进行沟通

**正确答案：** D

项目经理向团队发送了有关项目管理计划的第一份信息。第二天，两名现场工程师询问了他们的角色和项目进度。项目经理应该做什么？

- A. 发送角色和职责矩阵以及项目管理计划
- B. 确认沟通被理解并征求团队反馈
- C. 在发送项目管理计划之前向每个团队成员简要介绍他们的角色
- D. 与经理讨论角色，帮助向团队成员解释这些角色

**正确答案：** B

敏捷团队中的解决方案设计人员通常会将设计信息传递给团队成员，而无需任何文档。这导致了团队内部的误解。敏捷领导者应该做什么？

- A. 将解决方案设计者转移到另一个团队
- B. 审查导致这种情况的过程
- C. 要求团队记录设计
- D. 停止工作直到设计文件完成

**正确答案：** B

正在为公司构建软件系统。系统投入生产后，团队希望收集使用数据以评估交付价值。项目负责人应该使用哪种评估实践来获得准确的使用数据？

- A. 在系统中嵌入反馈表供用户响应
- B. 在软件中构建功能以收集操作使用数据
- C. 向所有用户发送关于最有用的功能的调查问卷
- D. 采访用户抽样以获得使用数据

**正确答案：** B

使用敏捷方法的软件项目在每次发布时都面临质量问题，从而产生许多生产问题。项目经理应该怎么做才能解决问题并提高质量？

- A. 利用回顾会议更好地了解质量问题的根本原因，并与团队一起制定解决问题的计划
- B. 聘请外部公司增加额外的测试层，确保最终产品在发布前经过良好检查
- C. 建立奖励制度，奖励能够发现更多缺陷的团队成员
- D. 寻求赞助商的额外资金批准，以用更有经验的团队成员替换初级团队成员

**正确答案：** A

一位项目经理正在管理一项创新产品在预计会发生变化的受监管环境中的全国推广。项目管理办公室 (PMO) 需要监管约束的可见性，同时保持一定程度的灵活性。项目经理可以使用哪种工具？

- A. 使用燃尽图提供透明度
- B. 使用燃尽图提供透明度
- C. 使用看板来增加问责制
- D. 使用产品积压来管理变更

**正确答案：** D

一位项目经理正在管理一个非常重要的业务转型项目。该项目的目标是使用移动应用程序模块扩展桌面应用程序。营销部门认为主要竞争对手正在开发类似产品。项目经理应该为这个项目使用哪种交付方法？

- A. 极限编程 (XP) 交付，以降低与新产品相关的高风险
- B. 传统交付，确保高质量和产品满足市场需求
- C. 增量交付，保证移动能力快速发布到用户手中
- D. 迭代交付，确保将用户反馈纳入二次迭代

**正确答案：** C

在某建设项目实施阶段，一家关键供应商破产，无法提供合同材料。此问题可能会影响项目进度。项目经理首先应该做什么？

- A. 升级到管理团队以延迟批准
- B. 将风险和延迟添加到风险登记册
- C. 更新时间表以包括延迟
- D. 更新问题日志并采取行动将影响降到最低

**正确答案：** D

小镇工厂建设项目的项目经理正在评估吸引利益相关者参与的必要行动。当地社区正在猜测该设施的影响。有关于工作机会和环境影响的传言，这些都列在项目风险矩阵中。  
在这种情况下，项目经理应该如何处理社区参与？

- A. 建立渠道，将沟通工作扩展到当地社区。
- B. 只关注侧面的利益相关者，让组织管理社区。
- C. 利用城市管理解决与社区的沟通问题。
- D. 将当地工会代表纳入高权力、高影响力的利益相关者群体。

**正确答案：** A

在新项目的早期阶段更换了项目经理。新项目经理发现业务团队不支持该项目。  
在与团队讨论这些问题后，确定该项目没有得到高级管理层的全力支持。  
新项目经理接下来应该做什么？

- A. 要求业务团队清楚地定义他们对迄今为止完成的项目工作的问题。
- B. 向利益相关者发送描述情况的状态报告并请求一般帮助。
- C. 研究利益相关者分析以了解哪个利益相关者拥有最大的影响力并寻求他们的帮助。
- D. 要求高级管理层更多地参与项目并提供全力支持。

**正确答案：** C

某公司上线最新零售管理系统，项目已移交运营。运维团队发现很多日常需求没有被系统覆盖，项目支持时间有限。项目团队已经解散，合同资源不再为该项目工作。因此，运营团队一直面临着众多客户问题。

项目负责人最初应该做什么来避免这种情况？

- A. 规划期间涉及的运营利益相关者
- B. 审查项目管理计划
- C. 增加营业时间的支持时间
- D. 创建了详细的操作手册

**正确答案：** A

项目团队正在从预测方法过渡到敏捷方法。项目经理正在尝试尽量减少产品在生产中遇到的支持问题。一个特别的痛点是向操作的过渡，问题通常出现在这个地方。

项目经理应该怎么做才能改善这种情况？

- A. 让运营团队参与回顾和演示会议，并采纳他们对项目活动的反馈
- B. 增加对涵盖支持需求的积压项目以及产品手册和操作指南的关注
- C. 通过尽早让利益相关者参与积压工作讨论来促进利益相关者的参与
- D. 要求支持/运营团队参加每日站立会议，为项目的进展做出贡献

**正确答案：** A

与供应商签署协议后，项目经理注意到供应商不断要求更改采购工作说明书(SOW)。这些变化将改善项目成果。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 查阅投标的选定供应商名单并评估可能的供应商变更。
- B. 修订采购控制流程以避免可能影响进度的意外变更。
- C. 将情况评估为改进的机会并进行风险分析。
- D. 对采购流程进行审计并将审计意见告知供应商。

**正确答案：** C

项目经理正在为跨国管道项目执行挣值管理 (EVM)。项目经理确定了项目的挣值 (EV) 与实际成本 (AC) 的比率，并发现计算结果为 0.9024。

这个值对项目意味着什么？

- A. 项目赚取的价值低于计划
- B. 项目已经开始超过计划成本
- C. 项目获得的价值超过计划
- D. 项目接近超出计划成本

**正确答案：** C

一位客户抱怨说，到目前为止发布的用户故事包含太多行话，没有反映对产品的期望。项目经理接下来应该做什么？

- A. 重写故事以包括产品的技术愿景
- B. 要求高级开发人员重写所有的故事
- C. 与客户接触并重写所有故事
- D. 请求公司董事批准对团队进行培训

**正确答案：** C

一场意外事件导致公共工程项目停工 4 周。根据项目进度，关键路径上的活动将落后。项目经理应该做什么？

- A. 将额外的 4 周添加到计划中并请求额外的资源。
- B. 要求赞助商获得特殊工作许可以继续工作。
- C. 崩溃资源管理计划以保持进度正常。
- D. 审查项目管理计划以查看可能延迟的影响。

**正确答案：** D

在例行的项目进度会议上，CEO 告知项目经理，一个主要的利益相关者并不知道该项目的最新进展。项目经理确信利益相关者已在利益相关者登记册中得到适当识别和分类。

项目经理应该审查哪个项目文件以确定此问题的原因？

- A. 需求追溯矩阵
- B. 问题日志
- C. 利益相关者登记册
- D. 利益相关者参与评估矩阵

**正确答案：** D

一家医疗保健组织聘请了一位新的合规专家，以确保满足医疗保健合规需求。团队对新合规专家的反馈一般。项目经理应该做什么来帮助新的合规专家改进？

- A. 协调与专家的一对一会议以评估情况
- B. 将这种情况上报给该地区的经理，寻求可能的解决方案
- C. 为专家提供时间以适应项目的节奏
- D. 就团队的反馈联系人力资源 (HR) 经理

**正确答案：** A

一家公司选择了一个跨职能团队来开发创新的数字产品，以推动业务的数字化转型项目。项目经理应该怎么做才能确保尽早交付业务价值？

- A. 为团队成员制定强有力的激励措施以鼓励快速交付
- B. 制定详细的项目计划并将延误上报给职能经理
- C. 将可交付成果分解为冲刺并逐步交付价值
- D. 快速跟踪项目并密切监控任务以确保及时交付

**正确答案：** C

一家使用预测方法并在高度监管的市场中运营的公司正在失去盈利能力，因为其产品生命周期比其竞争对手更长。已聘请了一位新的项目经理来改变这种情况。项目经理应该提出什么方法？

- A. 迁移到敏捷模型，主要关注迭代方法，将增量生命周期作为下一步
- B. 转变为敏捷模型，主要关注增量生命周期，将迭代方法作为下一步
- C. 保持预测方法，但更加注重更好的规划和跟踪以预测问题并避免延误
- D. 提出一种混合方法，利用敏捷方法的优势，同时尊重公司行业的某些方面

**正确答案：** D

一家公司正在使用敏捷方法推出新产品。在第二次冲刺中，团队遇到了一个他们以前从未遇到过的技术问题。项目经理应该做什么？

- A. 与团队组织早期回顾分析问题
- B. 要求产品负责人为相关用户故事编写规范
- C. 促进与团队的问题解决会议以分析问题
- D. 将团队面临的问题告知项目发起人

**正确答案：** C



项目经理指派团队成员两人一组处理大量技术报告。有时，项目经理注意到团队之间没有正确共享重要信息。这导致交付延迟，并最终导致项目无法完成。

这个问题的根本原因是什么？

- A. 实施过程中应用了错误的沟通技巧
- B. 团队成员缺乏文档规划方面的培训
- C. 对团队成员配对的任务分配不当
- D. 团队凝聚力丧失，因为团队成员成对工作

**正确答案：** A

一个关键的利益相关者最近在一家公司开始工作，并被分配到一个混合项目。尽管利益相关者在他们的领域非常有经验，但他们只接触过预测性项目方法。

项目经理应该做什么？

- A. 通知项目管理办公室 (PMO) 团队将对此项目使用预测方法
- B. 告知利益相关者他们必须与其他利益相关者分享他们的知识
- C. 分配时间在选定的项目方法中指导利益相关者
- D. 更新潜在影响的风险登记册并通知指导委员会

**正确答案：** C

一位高级经理参加了一次项目审查会议，并对项目不符合质量标准表示担忧。

项目经理应该做什么？

- A. 请高级经理批准用户验收测试 (UAT) 计划
- B. 通知高级经理有批准的质量标准
- C. 与高级经理一起评审质量管理计划
- D. 估计积压项目以预测质量

**正确答案：** B

两名团队成员最近从一个项目中解雇，因为客户减少了预算。但是，敏捷团队仍然收到与以前相同甚至更多的工作要求。敏捷项目负责人应该如何解决这种情况？

- A. 用被释放的团队成员更新项目预算。
- B. 用新的团队容量更新限制日志。
- C. 向团队解释新的项目要求。
- D. 向客户解释新的团队速度。

**正确答案：** D

完成 50% 的项目的 IT 项目经理了解到，关键团队成员计划很快搬迁到另一个国家。项目的其余部分需要该团队成员。项目经理应该如何提高团队动力？

- A. 要求所有团队成员亲自出席每周的项目审查
- B. 鼓励团队成员留下来直到项目结束
- C. 将团队成员替换为具有相似资格且位置更近的人
- D. 设立每周一次的视频会议来监控团队成员的工作进度

**正确答案：** D

产品开发团队的团队成员位于四个不同的国家/地区。高级经理的任务是招聘一名项目经理来管理该项目和虚拟团队。项目经理成功管理该团队需要哪些技能？

- A. 拥有强大的人际交往能力来推动高绩效的虚拟团队
- B. 计划和控制团队可交付成果的各个方面以避免意外
- C. 会说多种语言并在不同的国家生活过
- D. 实施组织的项目标准和过程

**正确答案：** D

一位高级项目经理在一家尚未盈利的公司工作。然而，该公司有许多创新项目正在开发中。大多数项目的时间线都推迟了，员工不堪重负。项目经理应该做什么来帮助公司实现财务目标？

- A. 优先项目，优先考虑增加利润的项目
- B. 确保所有项目都是高质量的并按时交付
- C. 要求高层管理人员雇用更多员工来支持项目
- D. 确保项目得到快速跟踪，以便恢复延误的时间线

**正确答案：** A



项目经理被分配到建筑施工项目。项目经理参加了敏捷课程，并希望在项目中使用敏捷实践。项目经理应该做什么？

- A. 选择可以在此类建设项目中实施的敏捷实践并加以应用
- B. 聘请顾问就敏捷是否可以应用于建设项目提供第二意见
- C. 审查项目阶段，为敏捷资源分配额外预算
- D. 为项目分配一名 scrum master，在项目中实施敏捷实践

**正确答案：** A

在项目执行期间，全球项目团队使用视频会议工具来支持日常会议。然而，在这些会议期间，只有少数团队成员积极参与。结果，产生了很多误会。项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 检查会议基本规则，审查与团队成员的初步协议
- B. 使用循环签到来促进会议，让所有与会者都有机会发言
- C. 与在日常会议中没有发言的团队成员进行一对一的会谈，以了解他们的最新情况
- D. 确定一名团队代表在每日会议上发言并分享团队更新

**正确答案：** A

一家公司正在进行转型项目。在规划会议期间，几个利益相关者不断发生分歧，并经常使用个人论点来支持他们的立场。团队成员对这种情况感到沮丧。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 在讨论开始前制定基本规则
- B. 强调上级管理层拥有决策权
- C. 邀请高层发起人参加会议以减少分歧程度
- D. 要求利益相关者在会议期间不要发表意见

**正确答案：** A

在工作现场监控项目时，项目经理注意到现场团队的工作休息时间每周增加几分钟。项目经理应该如何处理这个问题？

- A. 解雇一些不遵守休息政策的工人
- B. 对所有小时工的迟到发出正式书面警告
- C. 与团队开会讨论问题并提出解决方案
- D. 因延长休息时间而减少支付给工人的报酬

**正确答案：** C

一位项目经理正在处理一个建筑项目。公司业主要求项目经理在4小时内提供新装修工程的成本估算。项目经理将如何完成这项任务？

- A. 与项目团队召开会议以确定最合适的方法
- B. 告诉业主将提供一个大致数量级
- C. 联系主题专家 (SME) 寻求建议和咨询
- D. 告诉所有者这项任务需要更多的时间和专业知识

**正确答案：** A

拖放 -

一家公司创建了一个跨职能团队来推动业务的数字化转型项目。该团队有望在尽可能短的时间内交付满足市场需求的最小可行产品 (MVP)。

将左侧团队的角色与右侧相应的职责相匹配。

选择和放置：

Role

Development team

Project manager/scrum master

Product owner

Responsibility

Determine the version of the product that can be released to the market

Determine how to organize and carry out work to complete the minimum viable product (MVP)

Take responsibility for removing blockers that affect the team’s productivity

Role

Responsibility

Product owner

Development team

Project manager/scrum master

正确答案：

中国大学MOOC PMP

一个项目即将圆满完成，所有利益相关者都为取得的成果感到自豪。项目管理办公室 (PMO) 推荐项目经理领导下一个类似项目。项目经理接下来应该做什么？

- A. 让主要利益相关者参与完成并提供经验教训。
- B. 为下一个项目选择相同的利益相关者以避免进行知识转移。
- C. 向指导委员会介绍项目成果并委托知识转移。
- D. 请求 PMO 管理经验教训库。

**正确答案：** A

为了增加项目的利润率，项目经理和主题专家 (SME) 同意选择市场上可用的特定机器的最旧型号。当机器到达目的地国家时，它被海关当局封锁，限制该机型的进口。项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？

- A. 确保 SME 正确定义了项目范围和机器型号。
- B. 确保项目赞助商提供足够的资金购买最新版本的机器。
- C. 确保在质量管理计划中考虑了法规遵从性。
- D. 确保技术团队研究和选择最新型号的机器。

**正确答案：** C

由于设备安装延迟，项目进度落后。这正在影响许多其他活动。负责设备交付的经理通知项目经理，进行安装的团队存在能力问题。项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？

- A. 在范围说明书中更清楚地定义了技能要求。
- B. 要求经理遵循商定的资源管理计划。
- C. 与经理定期审查资源可用性。
- D. 定期与安装团队协商以检查是否存在冲突。

**正确答案：** C

项目范围为更换10公里半径范围内的路牌。如果半径不延长 1 公里，客户不想签署项目关闭报告，以与理事会的发展计划保持一致。

项目经理应该做什么？

- A. 延迟批准并要求项目赞助商提供额外资金。
- B. 联系理事会并请求他们批准扩大项目范围。
- C. 启动一个新项目并讨论该请求，因为它来得太晚了。
- D. 获得已完成工作的正式验收并提交变更请求。

**正确答案：** D

一家公司开始开发一种新产品。在执行过程中，项目团队注意到另一个竞争对手推出了功能非常相似且市场价格更便宜的产品。应该采取哪些不同的措施来避免这种情况？

- A. 应该发布最小可行产品 (MVP) 以获得市场反馈。
- B. 应该安排更多的积压改进会议。
- C. 应该使用看板方法来优化进行中的工作 (WIP)。
- D. 应该采用迭代生命周期方法。

**正确答案：** A

一个组织即将开始一个多阶段项目。由于严格的规定，某些阶段必须提前完全计划好。但是，其他阶段允许在范围和时间表上有更大的灵活性和实验性。发起人希望按计划实现项目目标，但也希望随着项目的进展适应新的信息和变化。

项目经理应该为这个项目选择哪种项目管理方法？

- A. 混合型
- B. 增量
- C. 敏捷
- D. 分阶段

**正确答案：** A

一位项目经理正在领导一个创新项目，由于高度不确定性，该项目面临着很多风险。项目经理应该使用什么策略来使用敏捷方法来管理这些风险？

- A. 制定敏捷风险矩阵来跟踪、评估和评估项目的不确定性。
- B. 实施 scrum 风险回顾以分析项目结束时的风险。
- C. 指派敏捷风险经理以更好地了解 and 跟踪项目风险。
- D. 不断评估风险并随着项目的进展重新确定工作的优先级。

**正确答案：** D

实验室正在推出一种新产品，定义为在固定发布日期的八次迭代中执行。在第二次迭代开始时，项目经理意识到项目积压中缺少重要的监管功能。

项目经理应该做什么？

- A. 要求产品负责人在积压工作中添加缺少的功能。
- B. 邀请利益相关者讨论添加监管功能的影响。
- C. 估算相关费用并要求项目延期。
- D. 增加团队的能力以包含遗漏的功能。

**正确答案：** B

一位高级副总裁要求创建更灵活的团队来并行运行不同长度和复杂性的项目。这将影响项目经理能够投入到每个项目的时间量。项目经理通常将 50% 的时间用于项目，无论其复杂程度如何。

作为服务型领导者，项目经理应该做什么来帮助实现这种转变？

- A. 审查组织过程资产 (OPA) 以评估类似风险的缓解计划。
- B. 创建关于项目经理能力的风险条目并制定缓解计划。
- C. 授权团队发展必要的技能以独立推进项目。
- D. 根据增加的工作量发出变更请求以聘请额外的项目经理。

**正确答案：** C

项目经理在一个跨职能的敏捷团队中。项目经理被分配了一个具有多项功能的软件项目，团队需要大约一年的时间才能完成。CEO 坚持认为该解决方案需要满足年底的业务目标，该目标将在 6 个月后到期。

项目经理应该怎么做才能使利益相关者的需求和期望保持一致？

- A. 与利益相关者合作创建优先级待办事项并发布路线图。
- B. 将要求修改为6个月内可以完成的。
- C. 实施快速跟进和速成活动，在 6 个月内完成项目。
- D. 让所有利益相关者参加每日站会，让他们了解最新情况。

**正确答案：** A



一位项目经理正在管理一个将新软件部署到 200 个最终用户的项目。在实施过程中，有一个遗漏的过程导致一些用户丢失了他们的计算机数据。

项目经理首先应该做什么？

- A. 与团队会面讨论根本原因并鼓励团队注意它并继续关注部署。
- B. 记录此案例，直到最后的经验教训会议结束，以防止在实施过程中影响团队的士气。
- C. 与团队成员会面并要求他们通过提供反馈作为经验教训来对案例进行审查。
- D. 邀请顾问审查流程以避免重复相同的问题并与团队共享结果。

**正确答案：** D

项目经理被分配到一个主要的建设项目。该项目对该市居民至关重要，尤其是对承诺按时交付该项目作为选举承诺的地方政府官员而言。已指定新的项目发起人并希望包括以前的项目发起人不支持的方面。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与新项目发起人会面，审查当前项目范围 and 要求的变更。
- B. 重新设定项目基线，因为现在有一个新的项目发起人，这提供了一个审查和重新校准项目目标的机会。
- C. 邀请项目发起人与项目团队进行简报，以展示进展并寻求进一步支持以实现项目承诺的可交付成果。
- D. 通知新的项目发起人，新的方面将不会包含在这个项目中。

**正确答案：** A

在敏捷团队中，一些团队成员挺身而出，要求在项目上获得更多的自主权。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 鼓励团队领导做出决定。
- B. 鼓励团队成员做出决定。
- C. 劝阻他们，因为可能会产生冲突。
- D. 劝阻这个请求，因为它是针对管理团队的。

**正确答案：** B

一个项目有进度延误，这迫使团队加班以达到关键的里程碑。这导致了团队成员之间的一些误解。项目发起人已分配金钱奖励。

项目经理应该如何使用奖励？

- A. 与团队成员会面并询问他们如何使用奖励。
- B. 为所有团队成员安排午餐会，包括团队建设会议。
- C. 起草积分制度，为每项资源分配一部分资金。
- D. 将奖励分配给团队领导，以在他们认为合适的情况下花在团队上。

**正确答案：** C

一家公司正在进行一个有严格截止日期的数字化转型项目。营销团队希望将此实施与新产品相结合，而新分配的项目经理并不知道所有的依赖关系。

使用混合方法，项目经理应该怎样做才能确保考虑到依赖关系？

- A. 实施项目通讯，以便不同的团队成员可以了解每个项目的进度。
- B. 确保每个单独的项目时间表都与共同的截止日期保持一致。
- C. 将所有小项目合并为一个大项目，这样团队就可以像一个大团队一样更好地协作。
- D. 促进沟通，促进 Scrum of Scrums，以便不同的团队了解依赖关系和进度。

**正确答案：** D

在敏捷项目中，项目经理失去了一种资源，同时发现了新的需求，这些需求被添加到待办事项列表中。项目经理接下来应该做什么？

- A. 由于速度受到影响，与产品负责人重新评估积压优先级。
- B. 重新评估当前迭代的范围以保持相同的速度和时间线。
- C. 重新评估速度，因为迭代持续时间将受到新需求的影响。
- D. 重新评估项目进度，因为速度会受到资源损失的影响。

**正确答案：** B

敏捷项目将根据加密货币的固定价格交付给客户。由于加密货币的波动性，双方同意在每次迭代结束时将范围调整为加密货币的价值，并在达到约定价格时停止项目。

在这种情况下应该使用哪种方法？

- A. 从最小的故事开始的基于流程的方法。
- B. 从价值最高的史诗开始的迭代方法。
- C. 具有短期阶段的预测方法。
- D. 具有最小可行产品 (MVP) 的增量方法。

**正确答案：** B

一个项目即将启动。项目经理发现客户没有合适的知识管理系统，也没有要求。

项目经理应该做什么？

- A. 根据要求向客户提供即时信息。
- B. 利用云维基收集必要的知识。
- C. 要求团队在当地收集知识并在项目结束时分享。
- D. 与团队和项目干系人协调以收集知识。

**正确答案：** D



每个团队成员都有单独的每日开始时间。有时团队成员的工作时间重叠很短。在那段时间里，团队之间的互动和工作减少且效率低下。

项目经理应该做什么？

- A. 通知迟到的组员早点加入，共同努力。
- B. 为每个团队成员分配重叠时间并要求他们遵守时间表。
- C. 要求团队制定团队章程并就核心工作时间达成一致。
- D. 要求团队同时开始，获得团队工作时数的最大值。

**正确答案：** C

一个由不同国籍的专业人士组成的项目团队正在努力实现他们的项目可交付成果。项目经理应该做什么？

- A. 为团队提供解决自身问题的支持。
- B. 通知项目发起人并对整个团队进行培训。
- C. 要求人力资源（HR）部门进行绩效培训。
- D. 请职能部门经理更换团队成员。

**正确答案：** A

一个组织正在努力启动一个重要的项目。项目经理已确定范围定义是阻碍项目启动的主要因素。虽然大多数范围项目都是在利益相关者之间定义和商定的，但在这个阶段有一些项目很难掌握并且定义起来非常复杂。

项目经理应该做什么？

- A. 建议使用预测方法交付定义明确的范围项目，并使用敏捷方法处理复杂项目。
- B. 保持利益相关者在范围定义方面的动力，直到在开始项目之前实现完整的详细范围。
- C. 建议将项目拆分为两个较小的项目，以便在不受预测方法干扰的情况下专门在敏捷环境中工作。
- D. 更新风险登记册并将问题上报给项目管理办公室 (PMO)，请求添加更多资源以帮助定义项目范围。

**正确答案：** A

一个项目即将结束六次迭代中的第五次迭代。在迭代审查期间，客户添加了超出剩余迭代容量的新监管功能。项目负责人应该做什么？

- A. 登记问题并将其上报给项目发起人。
- B. 邀请利益相关者讨论新的优先顺序。
- C. 估计影响并咨询产品负责人。
- D. 提高团队按时完成项目的能力。

**正确答案：** C

一家大公司的项目经理被指派监督客户体验项目。在项目中，客户满意度是一个大问题，每天都有许多未解决的客户查询。项目经理已获悉，客户服务团队因这些未解决的问题而不知所措。

项目经理应该采取哪两项措施来纠正这个问题？（选择两项。）

- A. 分批联系客户，告知目前正在处理中。
- B. 通过调查和其他可能发现真正问题的分析来确认问题确实存在。
- C. 部署将尽快跟踪、确定优先级和解决查询的解决方案。
- D. 要求高级管理人员更换一名更合格的客户服务经理。
- E. 要求客户服务团队优先处理本周收到的查询。

**正确答案：** BC

在项目的执行阶段，公司中创建了一个新部门。该部门的经理已要求参与定期的项目沟通和报告周期。项目经理应该做什么？

- A. 要求项目团队成员将经理包括在他们关于该项目的沟通中。
- B. 通知经理只有沟通管理计划中确定的利益相关者才能参与。
- C. 进行利益相关者分析并更新沟通管理计划以反映新情况。
- D. 建议经理联系要包括的指导委员会和项目管理办公室 (PMO)。

**正确答案：** C

在项目接近尾声时，一位客户声称某些可交付成果尚未得到满足，并开始发起变更请求。项目经理接下来应该做什么？

- A. 参考需求追溯矩阵。
- B. 将变更请求上报给项目发起人。
- C. 修订项目范围基准。
- D. 审查批准的项目章程。

**正确答案：** A

项目已满足商定的产品要求，即将结束。日程表还有剩余时间和超额预算。这些资源尚未计划转移到其他项目。一些产品拥护者希望继续为产品添加功能。

项目经理应该做什么？

- A. 在不花费项目预算的情况下，使用剩余的时间和资源为项目增加额外的范围。
- B. 通过将剩余的资源和时间用于产品的额外质量检查来确保产品质量。
- C. 确认已满足项目关闭标准并释放剩余的预算和资源。
- D. 获得发起人的批准，使用剩余预算向项目可交付成果添加额外功能。

**正确答案：** C

一家公司想成为其行业的先驱，并宣布了一项新的创新产品的发布日期。在第一次冲刺计划之后，团队意识到不可能在要求的时间

内交付所有功能。

项目经理应该怎么做才能确保成功？

- A. 要求客户减少积压以满足发布日期。
- B. 提高团队按时交付完成的积压工作的能力。
- C. 协助团队在发布日期之前定义最小可行产品 (MVP)。
- D. 安排与利益相关者的会议来审查应急计划。

**正确答案：** C

一个敏捷项目正在运行其第三次迭代，持续时间为 2 周。一位只有预测背景的新运营总监开始在公司工作。在与项目经理的第一次

会面中，主管要求每周提交一份项目状态报告。

项目经理应该做什么？

- A. 邀请主任参加每日站会。
- B. 与团队分享并要求他们为主管编写报告。
- C. 向主管介绍敏捷方面并商定解决方案。
- D. 向主管解释敏捷项目有现场报告。

**正确答案：** C

客户退回了一个昂贵的制造项目的几个组件。客户抱怨零部件质量差，担心产品因质量问题被退回。项目经理确信质量得到了保持。

项目经理应该如何与客户沟通，以帮助他们确信项目已经产生了高质量的产品？

- A. 向客户展示公差和控制限度。
- B. 显示当前批次的客户样品结果。
- C. 向客户展示质量历史样本。
- D. 向客户展示质量控制测量结果。

**正确答案：** D

一家公司正在进行一个项目，以开发其现有系统的集成。生产中存在已知问题。项目经理应该做什么？

- A. 识别并消除障碍并降低风险。
- B. 确保产品负责人与团队一起审查需求。
- C. 在完成 (DoD) 的定义中包含验收标准。
- D. 审查质量控制过程和程序。

**正确答案：** A

一家公司更换了现有项目的产品负责人。新产品负责人对产品的了解少于团队中的其他人。由于产品负责人的知识匮乏，团队没有认真考虑产品负责人的意见，主要依赖项目经理的意见。

项目经理应该做什么？

- A. 与项目管理办公室 (PMO) 经理合作，为新产品负责人制定入职计划。
- B. 安排时间与新产品负责人分享有关产品和项目信息的见解。
- C. 在产品负责人熟悉产品的同时承担产品负责人的角色。
- D. 组织团队建设活动，要求团队尊重新产品负责人的意见。

**正确答案：** A

一个中等规模的资本项目共享了公司合同部门的资源。在执行阶段，项目团队发现合同延迟。与合同部门沟通后，项目经理发现合同团队正在优先考虑其他承包工作，因为他们不是项目团队的一部分。

在这种情况下，项目经理应该首先做什么？

- A. 向上级管理层报告问题并寻求他们的直接参与以完成合同部门的工作。
- B. 安排与合同部门的会议，通过承认他们对项目的关键支持来建立信任和承诺。
- C. 安排与合同部门的几次会议，并要求他们签订项目合同，因为这对项目成功至关重要。
- D. 与合同经理沟通，为项目执行所需的资源制定预算。

**正确答案：** B

在上次 sprint 评审期间，一个团队分享了对 scrum master 的抱怨。该团队表示他们被推迟是因为 scrum master 没有消除障碍，例如安排与外部团队的一些会议和获得协作工作的房间，以及其他关键障碍。

项目经理应该做什么？

- A. 请求额外的资源来帮助解决团队列出的所有障碍。
- B. 确定并同意何时情况成为 scrum master 需要解决的障碍。
- C. 要求团队审查并确定开放障碍的优先级，以尽快解决所有障碍。
- D. 反击，解释自组织团队应该解决所有问题以完成工作。

**正确答案：** B

一位项目经理正在领导一个资源分散在不同地点的全球项目。利益相关者对需求有不同的解释。

项目经理担心范围蔓延。

项目经理应该采取什么行动来控制范围？

- A. 确保所有主要利益相关者都同意项目可交付成果，并且不需要进行更改。
- B. 只接受那些为项目提供额外价值的需求变更。
- C. 拒绝所有会增加预算或延长项目时间的变更。
- D. 只接受那些在实施前由变更控制委员会 (CCB) 批准的变更。

**正确答案：** D

在启动会议期间，项目经理注意到负责向团队提供关键信息的利益相关者之一的参与度较低。该利益相关者认为实施该项目不会带来任何好处。项目经理意识到这对项目来说可能是一个高风险。

项目经理应该采取什么行动？

- A. 促进该利益相关者的支持性参与。
- B. 向项目发起人征求意见，因为有可能与其他利益相关者合作。
- C. 使用概率和影响矩阵进行定性风险分析。
- D. 确保关键信息准确无误，并随着项目的进展监控情况。

**正确答案：** A

一位项目经理正在开展一个敏捷项目，该项目属于最近宣布的公司审计范围。项目经理被任命参加定于下周与审计员举行的第一次会议。

项目经理应该为审计做哪些准备？

- A. 如果需要，为下一次迭代保留故事点。
- B. 查看项目信息。
- C. 要求开发团队提供合规信息。
- D. 在审计期间要求豁免。

**正确答案：** B

一个开发团队正在努力为即将到来的冲刺寻找设计文档。在休假之前，产品负责人告知文档已上传到项目文件存储库。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 指派一名团队成员管理项目工件。
- B. 审计项目工件管理的有效性。
- C. 改进电子邮件通信协议以管理项目工件。
- D. 研究用于管理项目工件的新软件工具。

**正确答案：** B



在项目会议上，业务分析师需要营销顾问的意见才能继续执行任务。业务分析师试图联系顾问，但被告知顾问没有时间讨论该项目。

项目经理应该做什么来推进项目？

- A. 将有关顾问的问题上报给职能经理，以便顾问为项目投入必要的时间。
- B. 将新的项目风险纳入风险登记册并将顾问指定为风险所有者，因为他们有责任提供输入。
- C. 与顾问讨论请求并安排时间与业务分析师和顾问讨论项目要求。
- D. 敦促业务分析师继续联系顾问讨论项目，因为这是业务分析师的责任。

**正确答案：** C

一家公司正在启动一个具有严格期限的关键项目。在第一次计划会议期间，团队意识到需求列表中的项目太多，无法按时交付。项目经理首先应该做什么？

- A. 更新风险登记册并提出应急计划以满足截止日期。
- B. 建议客户减少积压以满足日期。
- C. 提高团队按时完成项目的能力。
- D. 要求团队提出满足日期的最小可行产品 (MVP)。

**正确答案：** D

项目经理正在处理一个变化很大的复杂项目。

项目经理应该使用什么策略来确保项目成功完成？

- A. 更新项目管理计划以减少范围蔓延的可能性。
- B. 与项目管理团队安排定期风险审查。
- C. 增加主要利益相关者的积极参与。
- D. 创建项目变更路线图以跟踪所有不可预见的变更。

**正确答案：** C

项目经理正在领导一个由时间和材料 (T&M) 协议资助的混合项目。项目完成，客户接受了产品的交付。一周后，客户要求项目经理修复他们在产品中发现的两个缺陷。项目经理回应了时间和金钱的估计，并要求客户确认这一点。客户不同意并坚持认为这项工作应该免费完成，因为它是产品的缺陷。

项目经理应该做什么来防止这种情况发生？

- A. 受过培训的客户工程师在交付后支持产品。
- B. 与客户一起审查项目质量控制计划。
- C. 建议以固定成本为基础，包括 1 个月的免费错误修复。
- D. 计划在交付后如何支持交付的产品。

**正确答案：** D

一个项目团队已经建立了购买车辆和施工服务的合同。在项目执行过程中，团队了解到车辆供应商无法交付车辆。没有足够的时间在不延误项目的情况下寻找新的供应商。

项目经理应该采取什么行动来采购车辆？

- A. 要求技术团队修改需求，即使这需要额外的预算。
- B. 安排与客户会面，请求额外时间寻找新的供应商。
- C. 审查现有的服务合同，找到帮助采购车辆的选项。
- D. 从另一家供应商处采购车辆，稍后将变更报告给变更控制委员会 (CCB)。

**正确答案：** C

当项目进入收尾阶段时，项目经理会要求团队准备交付验收文件。

这份文件对项目经理的重要性是什么？

- A. 需要关闭工作分解结构 (WBS)。
- B. 需要与利益相关者分享。
- C. 需要结束项目或阶段。
- D. 需要在项目结束时解散团队。

**正确答案：** C



项目经理正在领导一个项目，该项目依赖于客户的供应商管理系统来满足关键需求。供应商管理团队不会从该项目中获得任何利益。但是，该项目需要供应商管理负责人的支持。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 从发起人那里获得支持，从供应商管理团队聘请主题专家 (SME) 来处理项目。
- B. 审查指导委员会的职权范围以包括供应商管理负责人。
- C. 与发起人合作制定沟通管理计划以获得供应商管理负责人的支持。
- D. 获得赞助商的帮助，以强调供应商管理团队的任何非财务利益。

**正确答案：** C

项目团队外部的主题专家 (SME) 提供了可以节省项目交付时间的建议。该 SME 有可用时间支持该项目，但未计划参与当前的敏捷迭代。

项目经理应该做什么？

- A. 立即让 SME 参与并稍后讨论其影响。
- B. 要求现有团队成员与 SME 合作并完成活动。
- C. 要求 SME 完成所有必要的更改，这将节省时间。
- D. 指示团队成员忽略 SME 的变更，因为它们不是计划好的。

**正确答案：** B

在项目期间，项目经理找到机会通过提前完成可交付成果来降低项目成本，同时对项目资源的影响最小。然而，客户只关注下一个里程碑。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 应用额外资源实现早期交付并确保实现下一个里程碑。
- B. 按照客户的严格指示，专注于下一个项目里程碑的可交付成果。
- C. 审查变革管理计划，与客户讨论早期收益实现。
- D. 评估客户的要求是否会为项目可交付成果添加额外的功能。

**正确答案：** C

一家医疗保健公司正在全球部署创新的医疗保健解决方案。项目组已完成限量发布。利益相关者对全球医疗指南和风险提出了担忧。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 在部署之前评估从类似项目中吸取的经验教训。
- B. 对已识别的项目风险进行定性风险分析。
- C. 与利益相关者一起审查合规性和监管要求。
- D. 进行全球部署解决方案的可行性分析。

**正确答案：** C

一个项目团队正在为一个复杂的项目设计解决方案。由于客户的要求不明确，团队和客户之间同意每天举行会议。项目中有一些外部承包商不同意这个想法，因为他们认为这是浪费时间。

项目经理应该做什么？

- A. 欢迎并让承包商加入项目团队。
- B. 要求承包商独立会见客户。
- C. 要求客户制定一份包含要求的文档。
- D. 对未出席会议的承包商进行警告和处分。

**正确答案：** A

项目已准备好启动，资源已分配。开发经理随后通知项目经理，由于家庭紧急情况，关键资源不再可用。开发经理表示，所有其他开发人员都已分配到其他项目，任何开发人员都没有能力承担额外的工作。

项目经理下一步应该做什么来满足这个资源需求？

- A. 根据项目优先级确定资源分配选项。
- B. 对现有资源分配进行更改并通知开发经理。
- C. 与发起人会面以确定如何重新调整时间表。
- D. 将情况告知发起人，要求延期目标完成日期。

**正确答案：** A

在项目的冲刺计划期间，团队成员对积压项目的相对大小以及它们是否适合下一个冲刺存在分歧。考虑采用混合方法，项目经理应该做什么？

- A. 请外部技术领导提供意见并计划冲刺。
- B. 从产品积压中删除项目，因为无法估计大小。
- C. 促进讨论，使团队成员达成共识。
- D. 根据更合理的情况做出关于积压项目的决定。

**正确答案：** C

敏捷项目经理注意到其中一名团队成员在特定问题上积累了广泛的知识。其他团队成员将来可能需要这些知识。敏捷项目经理应该做什么？

- A. 要求团队成员发展更多专业知识并成为主题专家 (SME)。
- B. 要求团队成员为团队的其他成员提供培训课程。
- C. 要求团队成员制作经验教训文件并与团队分享。
- D. 让团队成员记录团队可能想知道的要点。

**正确答案：** C

在每日的团队站立会议中，团队成员不断询问他们应该首先关注哪些任务。项目经理应如何确保团队充分发挥生产力？

- A. 在团队站立会议期间审查项目积压。
- B. 鼓励项目团队成员优先处理产品待办事项。
- C. 确保团队成员按照项目计划工作。
- D. 与产品负责人合作，确保优先处理项目待办事项。

**正确答案：** D

项目经理正在领导一个自动化项目。项目团队位于同一地点，包括来自技术和业务部门的人员。项目经理发现个人差异和工作方式对项目产生负面影响。项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 制定一个时间表，确保有个人差异的人分开工作。
- B. 邀请不同单位的职能经理解决他们的个人差异。
- C. 使用不涉及托管的项目方法。
- D. 与团队会面并就团队成员的期望达成一致。

**正确答案：** D

设施扩建项目正处于执行阶段。有一个项目活动是将所有新设备的电源连接到现有设施 A 点，这需要很长的电缆。施工队发现可以把电源接到B点，省钱。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 执行成本效益分析以使用点 B 选项进行评估。
- B. 将问题添加到变更日志并通过变更控制委员会 (CCB) 申请额外预算。
- C. 在解释项目预算和进度限制后，征求施工团队的决定。
- D. 使用 B 点选项，因为它会节省项目成本和时间。

**正确答案：** A

项目经理正在使用预测项目管理方法处理多个建筑施工项目。组织内的高层领导正在推动将更多敏捷实践纳入当前项目方法。项目发起人现在希望项目使用更敏捷的方法。

在强制在项目中使用时任何敏捷方法之前，项目经理应该首先做什么？

- A. 为将成为项目团队成员的人员提供敏捷培训。
- B. 将所有现有项目转变为具有严格时间表的敏捷方法。
- C. 暂停当前项目，使它们与新的敏捷节奏保持一致。
- D. 评估组织文化和转型准备情况。

**正确答案：** D

一家本地公司正在开发一种新产品，并且首次使用远程团队来完成功能的编程任务。产品的设计来自本地团队。在第三次冲刺评审期间，产品负责人对项目的结果表示担忧。远程开发团队抱怨他们没有清楚地理解每日站立会议中传达的要求。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 确定传达信息的沟通需求、环境和工具。
- B. 在风险管理计划中记录风险，并使用应急储备金聘请当地供应商。
- C. 评估开发任务并将其重新分配给参与过以前项目的本地供应商。
- D. 审查从以前的项目和组织过程资产 (OPA) 中吸取的经验教训。

**正确答案：** A

项目团队在了解客户需求后创建了用户故事。随着项目的进展，项目经理发现有太多的变更请求。团队认为他们正在努力的结果与客户要求不一致。

项目经理应该做什么？

- A. 参考以往交付的类似项目的配置管理知识库。
- B. 安排与客户的研讨会，以了解预期从结果中获得的商业价值。
- C. 包括一名客户代表与团队协作。
- D. 承认当前团队需要改进并雇用更多合格的团队成员。

**正确答案：** B

项目经理正在管理一个项目，团队成员在全球各地工作。项目经理注意到每个团队成员的可交付成果都不符合要求。

项目经理首先应该做什么？

- A. 通过电话会议召集项目团队，告诉他们如果提交更多不合规的可交付成果，将采取纪律处分。
- B. 与项目团队讨论用于创建不合规可交付成果的过程，看看是否存在潜在的误解。
- C. 与项目发起人安排时间，通知他们由于返工可交付成果需要时间，项目进度正在推迟。
- D. 与项目团队会面，解释不合规的可交付成果必须立即返工并提交，以避免项目延误。

**正确答案：** B

一位项目经理正在领导一个为贸易公司开发会计软件的项目。随着结果的交付，政府在未来 6 个月内改变了一项间接税法规，并确定了新的风险。这种风险将对项目成果产生重大影响。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 确定风险的影响并优先考虑不影响税收模块的结果。
- B. 延迟开发间接税模块，直到税收法规生效。
- C. 与专家一起评估风险的影响，并与客户一起确定进一步结果的优先级。
- D. 分析风险的影响并与团队讨论确定如何分离税务模块。

**正确答案：** C

一个石油和天然气项目在没有获得项目全额资金的情况下就开始了。其余资金将在项目执行期间获得。剩余资金的收购被推迟了几个月，导致所有承包商的工作暂停。

项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？

- A. 确保利益相关者预见到实现剩余资金财务结算的障碍。
- B. 确保适当的利益相关者充分评估和减轻风险。
- C. 确保提供额外资金的利益相关者仍然对项目感兴趣。
- D. 确保项目团队定期监控和审查项目风险登记册。

**正确答案：** B

项目经理与供应商签订了构建新系统的合同。在验收测试阶段，项目经理注意到系统质量不尽如人意。项目经理应该如何支持他们向供应商提出的索赔？

- A. 提供失败的测试结果以及商定的验收标准。
- B. 分享以前类似范围项目的不成功结果。
- C. 在风险日志中记录系统中的问题已经确定。
- D. 表明供应商未经批准更改验收标准。

**正确答案：** A

一位项目经理同意了一位团队成员的请求，即采用替代工作时间表，他们每天中午 12:00 开始工作。这种安排对项目来说效果很好，但最近受到其他项目团队成员的审查，因为公司的核心工作时间从上午 9:00 开始，项目经理应该采取什么措施来防止这种情况发生？

- A. 分解情况以确定根本原因
- B. 确定的沟通方式和渠道
- C. 分析协议谈判的界限
- D. 管理和纠正违反基本规则的行为

**正确答案：** C



项目发起人报告说，关键利益相关者抱怨项目经理报告的指标存在绩效差异，这给人以项目失控的印象。项目经理一直根据商定的沟通管理计划提供项目的状态。然而，这个关键的利益相关者很少参加状态报告会议。

项目经理应该首先做什么来解决这种情况？

- A. 评估沟通需求，发现差距，必要时调整原计划。
- B. 利用应急储备实施快速跟踪，提高进度关键绩效指标（KPI）。
- C. 审查资源分解结构（RBS），要求主要利益相关者的经理更换利益相关者。
- D. 向项目发起人提供证据证明项目正在按计划进行并且已经发送了通信。

**正确答案：** A

一个团队在正在进行的项目中遇到了行为问题，这导致了冲突。结果，团队正在失去动力并在冲刺中落后。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 聘请辅导员调解受影响的团队成员之间的情况。
- B. 控制积压任务并减少团队成员之间的直接沟通。
- C. 重新审视基本规则和团队沟通协议，并讨论正在发生的事情。
- D. 要求遇到冲突的团队成員请假一天。

**正确答案：** C

变更控制委员会 (CCB) 已批准在产品中添加新组件的变更请求。运营经理在批准后发现了变更，并抱怨说变更的实施会对生产线造成重大干扰。

项目经理首先应该做什么？

- A. 正式承认运营经理的担忧并提出新的风险，即项目可能由于制造困难而延迟交付并超出预算。
- B. 将问题上报给项目发起人，因为添加组件的决定会带来很多好处，即使它会破坏生产线。
- C. 与设计团队一起领导一个根本原因分析研讨会，以确定导致决定添加与生产线不兼容的组件的故障。
- D. 与运营经理会面，解释变革的背景，了解运营经理对变革的担忧。

**正确答案：** D

一位项目经理正在领导一个快速发展的项目，有严格的截止日期和最短的时间来交付每个里程碑。项目经理发现，一位为交付项目付出了大量努力的远程团队成员向现场团队成员吐露了心声。远程团队成员觉得他们的工作没有得到足够的回报和认可。项目经理应该做什么？

- A. 与资源的职能经理作出安排，将团队成员重新安置到另一个现有项目。
- B. 将聘用合同的副本发送给远程团队成员，并表明该团队成员有权获得合同中包含的内容。
- C. 将此情况通知人力资源 (HR) 经理并确保此消息不会传播开来。
- D. 让远程团队成员参与进来，同情他们，让他们知道无论他们的远程工作状态如何，他们的贡献都会受到赞赏。

**正确答案：** D

在一家金融公司中，一个战略项目已计划使用预测方法。在项目计划期间，产品负责人要求提交里程碑以供审查。有明确的范围和确定的截止日期来完成项目。项目经理应该首先做什么来满足产品负责人的期望？

- A. 更改项目章程以表明方法会有所不同。
- B. 通知产品负责人他们必须等到项目结束。
- C. 与软件团队会面，审查每月里程碑审查的可能性。
- D. 修改项目管理计划以使用敏捷框架来合并里程碑。

**正确答案：** C

项目团队正在为利益相关者准备一份报告。团队收集并整理大量数据以包含在状态报告中。项目经理接下来应该做什么？

- A. 确保团队遵循标准操作程序 (SOP) 来创建利益相关者报告。
- B. 指示团队仅对报告的所有数据进行图形表示。
- C. 指示团队在完成报告之前与利益相关者举行会议。
- D. 指导团队在将数据包含在报告中之前对其进行分析和解释。

**正确答案：** A

在确定范围后，项目经理收到了向项目添加特性和功能的请求。项目经理应该做什么？

- A. 遵循需求管理流程。
- B. 遵循利益相关者参与流程。
- C. 遵循风险管理流程。
- D. 遵循变更管理流程。

**正确答案：** D



项目经理具有技术领域的专业知识。项目经理经常对其他团队成员表现出不可接受的行为；然而，当质问时，项目经理否认了这种行为。

项目经理行为的原因是什么？

- A. 项目经理缺乏必要的同理心。
- B. 项目经理缺乏情商（EI）。
- C. 项目经理没有得到适当的培训。
- D. 项目经理在错误的项目角色中。

**正确答案：** C

一个在系统开发工作中缺乏经验的项目团队成员表现不佳。目前，没有其他工作人员有资格完成这项工作。项目经理应该做什么？

- A. 评估团队成员的发展需求，安排团队成员接受培训。
- B. 寻求项目发起人的批准，使用部分项目预算储备来雇用新资源。
- C. 与职能经理一起确定团队成员完成项目的激励措施。
- D. 请求一名在系统开发工作方面更熟练的具有新资源的团队成员的替代者。

**正确答案：** A

一个新委托的项目，因为人员流失率高，招不到团队成员。人力资源 (HR) 经理进行了几次离职面谈。许多团队成员表示，项目经理的关系管理能力不足。项目理解释说，退出的团队成员很懒惰。项目经理应该怎么做才能防止这种高离职率持续下去？

- A. 避免对团队进行微观管理，执行更严格的规则并监督员工。
- B. 向招聘经理解释项目本质上是临时的，因此不同于运营环境。
- C. 培养作为领导者的关系技巧，同时培养团队的情商技巧。
- D. 更多地参与团队成员招聘过程，以确保选择合格的团队成员。

**正确答案：** C

一位热情的新聘副总裁被任命为数字化转型项目的产品负责人。项目经理建议产品所有者，某些功能需求与首席信息技术官 (CTO) 的战略不一致。产品负责人告诉项目经理，CTO 不是项目的一部分，此时不应聘用。

项目经理应该做什么？

- A. 向 CTO 告知项目可能造成的影响。
- B. 影响产品所有者审查其他利益相关者所需的参与。
- C. 继续构建积压，因为它们是功能需求。
- D. 审查组织过程资产 (OPA) 以获取类似项目的历史信息。

**正确答案：** B

一家初创公司刚刚任命了一位没有项目经验的 CEO。CEO 希望利用自己的资源执行项目，并任命了一名项目经理。

项目经理应该建议 CEO 首先做什么？

- A. 创建一个框架来证明项目执行的合理性。
- B. 对所有即将进行的项目采用敏捷方法。
- C. 创建支持项目成功的框架。
- D. 对所有即将进行的项目采用预测方法。

**正确答案：** C

业务转型项目有一个四阶段交付计划。项目团队已成功交付项目的一个阶段。

为了进一步提高团队绩效和授权团队成员，项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 鼓励团队成员与项目经理交叉检查决策。
- B. 在执行前审核所有决定。
- C. 允许团队成员做出有限的决定。
- D. 组织和分配团队成员执行他们擅长的任务。
- E. 支持团队成员在他们的优势领域做出决定。

**正确答案：** DE

聘请了一个项目团队执行现场职责，但出现意外情况需要整个团队远程工作。部分队员返乡，目前正在申请报销运营费用。

项目经理应该做什么？

- A. 审查预算并为报销分配资金。
- B. 用发生的成本更新项目管理计划。
- C. 要求团队成员在处理报销前起草一份理由。
- D. 遵循执行综合变更控制流程并提交变更请求。

**正确答案：** D

组织正在采用敏捷思维。在第一个敏捷项目中，项目经理遇到了一个问题，因为团队无法按时做出决策。项目经理应该做什么来解决这个问题？

- A. 评估情况以了解组织的文化如何影响决策过程，并指导团队采用新模式。
- B. 采用专制的领导风格，指挥所有的决定，以加快团队的速度。
- C. 邀请高层领导参加团队建设研讨会，并重申在公司新方向下问责制和领导力的重要性。
- D. 就如何在新的组织政策下做出决策制定明确的指导方针，并在任何情况下与团队一起强化这些指导方针。

**正确答案：** A

一位项目经理正在为一家政府公司从事财务系统实施项目。使用预测方法的主要利益相关者之一不喜欢聊天、任务跟踪器等虚拟工具。他们更喜欢电子邮件、电话和面对面的会议。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 使用定期的屏幕共享会议向利益相关者展示进度。
- B. 在沟通方法上与利益相关者保持一致并达成一致。
- C. 要求经理使用虚拟通讯工具和在线仪表板。
- D. 创建数字仪表板以满足经理的信息需求。

**正确答案：** B

一名团队成员在过去的项目中经历过个人冲突，使他们对从事当前项目感到紧张。项目经理知道这个团队成员可以为项目增加价值。项目经理应该怎么做才能从该团队成员那里获得最大价值？

- A. 建议团队成员不要与整个团队分享过去项目的个人信息。
- B. 咨询项目发起人，了解是否允许与整个团队共享个人信息。
- C. 建议团队成员专注于当前项目并将过去的冲突作为经验教训。
- D. 咨询人力资源 (HR) 并检查公司政策，了解允许向团队成员提供什么建议。

**正确答案：** C

在项目启动会议期间，一个为期 9 个月的项目的项目经理表示，一项特定任务将超出计划。在项目启动会上，一个关键的项目干系人强烈反对，表示这个任务是项目的关键价值，应该按时完成。

项目经理应该怎么做才能减少在项目启动阶段遭到利益相关者强烈拒绝的机会？

- A. 制定一个利益相关者对利益相关者的参与评估矩阵。
- B. 向利益相关者发送一封信，告知他们项目范围和开始日期。
- C. 提前安排与主要利益相关者的会议，以收集对项目范围的反馈。
- D. 在项目风险登记册中将干系人拒绝识别为风险。

**正确答案：** A

在一个拥有多个国际地点的项目中，出现了延误的趋势。在调查这个问题时，项目经理意识到一些关键活动被安排在海外办事处的假期期间。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 更新时间表以反映假期并通知项目发起人延迟完成。
- B. 临时雇用额外人员以应对假期期间的额外工作量。
- C. 要求海外办事处加班以减少进度延误。
- D. 更新时间表以反映假期并在办公室之间分担工作量以减少进度延误。

**正确答案：** D

自组织团队中的一名新团队成员发现由于项目中使用的新技术而难以交付。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 委派其他团队成员完成该团队成员的任务。
- B. 指导团队成员并提供必要的培训。
- C. 要求团队成员转移到另一个团队。
- D. 通过人力资源 (HR) 请求将团队成员纳入改进计划。

**正确答案：** B

项目经理正在管理一个需要专业架构服务的项目。该项目被确定为组织的高风险。项目经理与高度专业化的外部架构师合作。然而，建筑师很快就会辞职，因为他们接受了另一家公司的报价。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目团队讨论这个问题，评估影响，并决定采取适当的行动。
- B. 向建筑师询问他们新雇主的详细联系方式并致电他们的客户经理。
- C. 打电话给客户经理，要求他们通过提供奖励来留住专家。
- D. 将问题上报给采购部门并要求他们与供应商公司讨论此事。

**正确答案：** A

一位项目经理正在从事一个拥有 100 多个利益相关者的跨国项目。项目经理关心的是项目成功交付所需的适当利益相关者参与和参与程度。

项目经理应该做什么？

- A. 与利益相关者沟通以找到解决方案。
- B. 与项目干系人一起审查问题日志。
- C. 评估利益相关者参与评估矩阵。
- D. 执行利益相关者假设和约束分析。

**正确答案：** C

一名新工程师被分配到一个项目。尽管工程师有足够的技能胜任这项工作，但他们总是要等待项目经理的授权才能行动。

项目经理应该做什么？

- A. 为新团队成员进行相关培训。
- B. 确定适当的决策权限级别并授权给工程师。
- C. 为工程师做出所有决定，以保持工作流程正常进行。
- D. 用有经验的工程师替换资源。

**正确答案：** B

高级项目经理已将初级项目经理纳入项目团队。在一次辅导会议中，初级项目经理询问高级项目经理如何提高效率并减少返工。

高级项目经理应该如何应对？

- A. 使用工作分解结构 (WBS) 根据项目和资源需求创建项目进度表。
- B. 监控资源分配，确保团队成员每天工作 8 小时。
- C. 将项目任务分配给团队，无论他们的技能如何以完成项目进度。
- D. 安排与主要利益相关者的日常会议，以评估项目管理计划的有效性。

**正确答案：** A

敏捷团队正在进行为期 2 周的冲刺，以交付业务价值。冲刺开始后大约 1 周，团队成员对他们正在构建的产品增量没有信心。他们不想等到冲刺结束，而是想现在就与产品负责人一起验证产品增量。

项目经理应该做什么来减轻这种风险？

- A. 预期产品所有者的反馈需要额外工作，因此延长 sprint 结束日期。
- B. 与产品负责人安排一次额外的临时演示。
- C. 将问题作为回顾的一部分加以解决。
- D. 要求团队在冲刺快结束时加班，以满足最初的冲刺结束日期。

**正确答案：** C

一个敏捷团队已经完成了五个冲刺。最终产品预计将在另外三个冲刺中交付。项目经理接到技术资源经理的电话，其中一位开发人员必须在接下来的 4 周内休假，没有可用的临时替代人选。这将对可交付成果产生重大影响。

项目经理应该做什么？

- A. 向赞助商申请额外资金以获得新资源来填补空白。
- B. 立即将影响告知客户并准备升级。
- C. 要求产品负责人进一步扩展交付团队，以在原定时间表内完成最终产品。
- D. 执行影响分析，根据需要重新调整进度，并将更改传达给客户。

**正确答案：** D

项目负责人正在从事一个敏捷项目，以建立团队的愿景，包括决策过程。决定团队将对项目进行投票，如果团队中 90% 的人同意一项决定，那么该决定将被推进。在第一次技术设计会议上，团队做出了项目负责人强烈反对的决定。

项目负责人应该如何进行？

- A. 拒绝让团队根据他们的决定继续工作。
- B. 将技术团队领导放在一边，并尝试说服他们改变投票。
- C. 记下分歧的原因，让团队继续进行。
- D. 安排与项目负责人的会面并请他们介入。

**正确答案：** C



新任命了一位项目经理来领导一个将远程工作的项目团队。项目经理决定使用一组在以前的项目中运行良好的工具。然而，一些团队成员对这个计划并不满意。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 将选择协作工具的责任委托给项目的技术主管。
- B. 与项目团队会面以确定他们的协作需求并确定最有效的工具。
- C. 允许项目团队成员在这个项目中使用最适合他们的工具。
- D. 请求项目发起人批准购买市场上最新的协作工具。

**正确答案：** B

在每日签到会议上，一名团队成员通知项目团队，将要使用的其中一个组件的许可证将在几个月后到期。许可成本很高。项目经理接下来应该做什么？

- A. 评估不更新许可证的影响。
- B. 将许可问题上报给产品所有者。
- C. 为备选设计在待办事项列表中添加尖峰。
- D. 提出变更请求以确保续订。

**正确答案：** A

项目经理领导移动聊天应用程序的开发项目。一位经验丰富的开发人员经常与其他团队成员发生冲突。结果，其他团队成员拒绝与开发商合作。由于开发人员是高绩效人员，如果他们离开团队，项目目标可能会受到负面影响。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 与开发人员会面并要求他们尊重其他团队成员并作为一个团队一起工作。
- B. 分别与团队成员和开发人员会面，了解情况并制定相应的行动计划。
- C. 收集团队的反馈并将其发送给人力资源 (HR) 以解决冲突。
- D. 安排一次团队建设培训，要求所有团队成员参加。

**正确答案：** B

项目经理正在领导一个处于测试阶段的医疗保健组织的战略和竞争优势项目。团队在这个项目上已经工作了 6 个月，由于时间安排，团队士气低落。

项目经理可以做什么来激励团队？

- A. 继续与项目团队一起执行项目的最后阶段，因为这将使组织受益并提供竞争优势。
- B. 与业务团队讨论项目阶段和团队的承诺，并要求对团队进行货币奖励。
- C. 与项目管理办公室 (PMO) 交谈并请求将时间表延长 2 周，以便团队可以轮休。
- D. 与横向团队经理会面，对团队成员进行表彰，并在项目完成后给予奖励和晋升。

**正确答案：** D

项目经理开始收到来自不同利益相关者的电子邮件，要求提供有关项目状态的信息。

项目经理应该怎么做才能避免将来出现这种情况？

- A. 安排与包括客户和内部资源在内的所有利益相关者的每周项目状态会议。
- B. 在规划项目沟通策略时包括项目干系人的需求。
- C. 指定一名团队成员回复这些利益相关者的电子邮件。
- D. 在所有项目状态通信中包括利益相关者的电子邮件。

**正确答案：** B

项目经理正在作为试点项目的仆人领导者工作，以采用敏捷实践。三个冲刺之后，团队向主要利益相关者演示了产品，但收到了有关产品功能的负面反馈。团队认为所有功能都满足产品所有者定义的验收标准，但不明白哪里出了问题。

项目经理应该如何减少产品拒绝？

- A. 共享产品待办列表，供主要利益相关者提前审查。
- B. 让主要利益相关者参与即将到来的冲刺评审会议。
- C. 创建专门的冲刺来为被拒绝的冲刺实施功能修复。
- D. 请项目发起人评估新产品负责人的分配。

**正确答案：** B



一个项目团队已经为客户安装了软件，将知识传递给了运营，发送了最终报告，并进行了庆祝。然后 1 周后，客户发送了一份未满足的要求列表。客户要求初始预算范围内快速解决问题。

项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？

- A. 审查验收标准并获得客户批准。
- B. 为任何发布后的改进分配风险预算。
- C. 进行试点以了解客户的性能参数。
- D. 在整个项目阶段与客户召开会议。

**正确答案：** A

使用增量方法的项目将团队成员放在同一地点，并使用看板来可视化正在进行的工作 (WIP)。一个关键的外部利益相关者要求在分发状态报告之前暂停所有项目活动。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 将项目文档存储在共享文件夹中。
- B. 组织与外部利益相关者的月度会议。
- C. 邀请所有利益相关者参加每日站立会议。
- D. 每周向所有利益相关者发送状态更新报告。

**正确答案：** A

一个高绩效团队参与了一个新领域的项目。团队无法按预期交付。

项目经理应该做什么？

- A. 支持团队确定发展领域并解决差距。
- B. 解散团队，将团队成员纳入其他现有团队。
- C. 确定陷入困境的团队成员并将他们移出团队。
- D. 建立一个明确的期望，即团队将像在他们以前的项目中一样交付。

**正确答案：** A

在一次项目会议上，项目经理表达了按时提交报告的重要性。这些单独的报告将合并为一份报告。其中一份团队成员的报告没有按时交付，因此无法与其他报告整合。这表明缺乏团队合作并影响项目成功。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 将任务分配给团队中的其他人。
- B. 与团队成员私下讨论。
- C. 在项目会议上讨论这个问题。
- D. 将此项目包含在风险登记册中。

**正确答案：** C

一个项目正在开始其六个迭代中的第二个迭代。在日常会议中，一名团队成员寻求帮助。为了完成可交付成果，需要设计部门的批准。

项目经理应该做什么？

- A. 与设计经理会面以获得必要的批准。
- B. 邀请一名设计团队成员参加下一次日常会议。
- C. 更新问题日志并将其上报给项目发起人。
- D. 将此迭代可交付成果替换为没有任何阻碍的迭代交付成果。

**正确答案：** A

项目经理已被指派领导一个 IT 项目来存储已售出彩票的信息。在项目执行过程中，系统出现故障导致 10 个号码被二次卖出。这发生在需求最大的月份，因为奖金是一年中最高的。项目团队担心其中一张彩票可能成为赢家。项目经理首先应该做什么？

- A. 通过解释这种风险实现的可能性极低来让赞助商放心。
- B. 进行测试以验证系统不会由于事件的高发生率而再次失败。
- C. 查看风险列表以验证是否已考虑此问题并执行详细的行动计划。
- D. 将此问题通知赞助商并要求提供足够的资金。

**正确答案：** C

项目经理正在不断变化的业务环境中开展敏捷项目。项目发起人担心收益实现并要求项目经理注意可能影响项目的变化。项目经理应该采取什么行动来识别可能影响产品的变更？

- A. 在团队和产品负责人之间实施面对面的沟通，以根据需要更改迭代目标。
- B. 尽快停止迭代，以防发现使产品变得无价的外部变化。
- C. 在每次迭代后采取行动重新排列积压工作的优先级，以评估用户故事是否对业务仍然有价值。
- D. 应用结对编程技术立即对变化做出反应，即使在交互过程中也是如此。

**正确答案：** C

一位项目经理正在从事一项重大建设项目。商定的计划的一部分是使用基于云的系统和在高速互联网服务上运行的服务器，因为大多数团队成员都是虚拟工作的。公司需要尽可能降低运营成本，管理层坚持认为该项目现在将使用运行在传统拨号服务上的系统。项目经理接下来应该做什么？

- A. 同意管理层的意见并继续执行项目管理计划。
- B. 评估该决定的影响并与管理层沟通。
- C. 更换一些虚拟工作的团队成员以帮助公司节省资金。
- D. 就他们的决定与管理层会面，并要求他们再找一个项目经理。

**正确答案：** B

在地理位置分散的团队中，开发人员继续延迟编码活动。此活动位于关键路径上。项目经理发现延迟是由于开发人员对异地团队共享的客户需求缺乏了解。项目经理应该做什么？

- A. 用熟练的资源替换开发人员。
- B. 与团队成员一起进行根本原因分析 (RCA)。
- C. 促进沟通以确保明确要求。
- D. 经常进行绩效评估。

**正确答案：** C

项目范围说明书已获批准，项目经理和核心团队已分配给该项目。突然，项目经理因医疗紧急情况暂时休假。在项目经理休假期间，团队制定项目进度表。当项目经理回来时，一份详细的进度表就快完成了。

项目经理应该做什么？

- A. 确保时间表与愿景和目标保持一致。
- B. 将合规问题上报给项目管理办公室 (PMO)。
- C. 祝贺团队并进入执行阶段。
- D. 与团队和项目发起人一起制定新的详细时间表。

**正确答案：** A

项目经理管理桥梁建设项目。项目经理已收到监管利益相关者的重大变更请求，要求将桥梁的一个分支添加到工程设计中。项目经理准备了变更请求，变更控制委员会 (CCB) 对其进行了审查和接受。

。项目经理现在应该做什么？

- A. 通知项目团队变更请求的批准。
- B. 在设计中包括桥梁的新分支。
- C. 将决定传达给请求变更的利益相关者。
- D. 评估项目管理计划的调整。

**正确答案：** D

一个项目即将完成，但进度落后了。应急预算已经用完，但剩余的预算应该足以完成项目。分配给该项目的唯一主题专家 (SME) 已被其经理要求解决运营部门的问题。

项目经理应该做什么？

- A. 将情况上报给项目发起人。
- B. 释放资源来处理操作优先级。
- C. 要求经理提交变更请求。
- D. 针对这种情况设计谈判策略。

**正确答案：** D

供应商制造了一种复杂的产品。在工厂验收测试中，发现了几个缺陷。产品交付处于关键路径，任何延迟都会影响项目完成。项目经理应该做什么？

- A. 启动与供应商的定期电话会议以获取状态更新，以关注此项目。
- B. 保留货物直到返工在供应商的工厂完成，以消除现场的额外工作。
- C. 评估进度影响并评估最可行的解决方案以保持项目正常进行。
- D. 按原样运送包裹，在现场完成结转工作，并向供应商收取返工费用。

**正确答案：** C

分配到教育项目的项目经理需要培训员工进行应用程序开发。客户负责提供培训中心，开始第一次培训的截止日期为2周。客户打电话说由于某些不可预见的问题，该中心将在 2 周内无法使用。项目经理接下来应该做什么？

- A. 应用带有处罚的合同条款和条件。
- B. 发出变更请求以反映预期的培训日期。
- C. 帮助客户寻找替代地点开始培训。
- D. 用新的培训日期更新项目进度表。

**正确答案：** B

知识共享一直是具有大量团队成员的复杂技术项目的关键优先事项。在项目执行阶段，项目经理收到来自所有团队成员的大量投诉，他们收到了过多的知识共享电子邮件，这些电子邮件包含有用的信息，但由于数量过多而难以管理。项目经理应该怎么做才能解决这个问题？

- A. 为团队建立一种非正式的沟通方式来分享知识和经验教训。
- B. 建立一种拉式通信方法来访问知识库和经验教训。
- C. 建立利益相关者之间的互动交流方式，分享知识和经验教训。
- D. 建立团队分享知识和经验教训的推送沟通方式。

**正确答案：** B

项目经理被分配到一个技术研究项目。项目团队已经分配完毕，主要主题专家 (SME) 向项目经理发送了执行该项目所需的技术技能列表。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目发起人讨论列表以确认资源具有所需的技能。
- B. 请职能经理审核资源库，推荐合适的人加入团队。
- C. 与项目团队会面以了解他们的技能并确定潜在的差距和培训要求。
- D. 将清单发送给项目团队并要求他们接受所需技能的培训。

正确答案： C


客户希望使用敏捷方法为旅游业创建创新软件。该公司的一名项目经理被指派根据客户的要求处理细节和估算。

在将信息发送给客户之前，项目经理应该做什么？

- A. 将有估算的任务放入待办事项列表中，并明确该项目不需要任何储备。
- B. 根据估计对任务进行排序，并添加标准风险准备金以用于软件开发。
- C. 分析任务，提供估算，包括原型演示，并直接发送给客户。
- D. 与团队合作以了解他们的观点并添加适当的依赖项和风险。

正确答案： C

根据这个过去 7 天冲刺的燃耗图，项目负责人应该与产品负责人和团队一起解决什么问题？

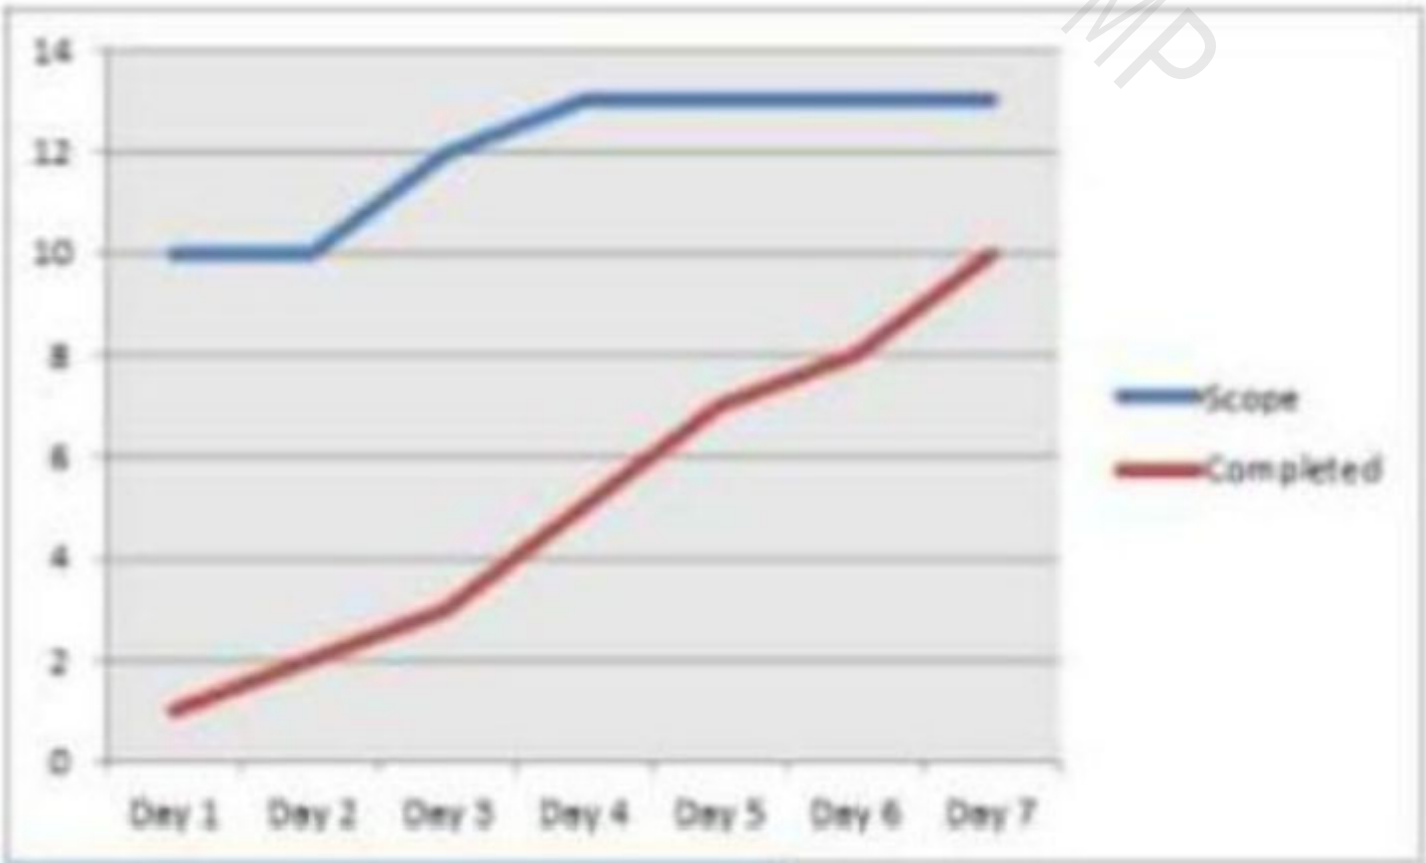

- A. 产品负责人不应该要求团队改变他们的冲刺承诺。
- B. 团队在冲刺开始后接受了太多的工作。
- C. 团队没有达到产品负责人的期望。
- D. 团队应该在第 4 天停止并开始新的冲刺。

正确答案： B



两家大公司合并后，一个项目分配一个项目经理。公司聘请了一名顾问，以确保在信息安全方面采用最佳实践。在迭代期间，顾问要求更改软件组件，声称它不满足市场需求。

项目经理应该做什么？

- A. 继续迭代并添加请求的更改。
- B. 继续迭代并与客户一起审查变更。
- C. 取消迭代并与产品负责人会面。
- D. 取消迭代并添加请求的更改。

**正确答案：** B

项目经理负责管理项目范围并与团队成员一起创建工作分解结构 (WBS)。

项目经理应该如何组织WBS？

- A、 以客户为导向
- B、 以团队为导向
- C. 成本导向
- D. 以可交付成果为导向

**正确答案：** A

新项目团队的两名成员对解决问题的最佳方法意见不一。冲突已持续 1 周。这两个成员彼此都很紧张，并且把一切都看在眼里。

项目经理应该做什么？

- A. 帮助团队成员以产生最佳团队绩效的方式解决冲突。
- B. 提供双方都可以接受的折衷方案，即使这可能不是最好的解决方案。
- C. 了解每个团队成员的论点并选择对项目风险较小的论点。
- D. 将两名团队成员都派往人力资源 (HR) 部门寻求可接受的解决方案。

**正确答案：** A

一个建造发电厂的项目正在自然保护区附近进行。一个环保活动家团体质疑该项目的必要性。客户已通知项目经理忽略该组，因为他们不支持该项目。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 要求客户联系活动家团体，让他们知道项目状态和完成日期。
- B. 将活动家团体添加到利益相关者列表中，并分析他们可能对项目交付产生的影响。
- C. 服从客户的指示，因为他们为项目提供资金并且是最重要的利益相关者。
- D. 要求项目团队忽略激进组织的所有沟通并继续他们的项目工作。

**正确答案：** B

项目经理正在领导一个处于执行阶段的项目。由于公司重组，一些关键的项目团队成员可能会离开该项目。项目经理接下来应该做什么？

- A. 与受影响的团队成员讨论这个问题并在过渡期间支持他们。
- B. 尽快开始寻找替代者，以帮助防止任何进度延误。
- C. 与项目发起人接洽以确保此变更不会影响项目执行。
- D. 确定对项目的影响并根据项目管理计划实施缓解措施。

**正确答案：** D

去年，一家公司为一个正在进行的项目向外部分包商支付了 60,000 美元。已要求项目经理评估今年是否可以通过使用内部劳动力以更具成本效益的方式交付项目。项目经理使用了 4 个月的乐观期限、6 个月的悲观期限和 5 个月的最预期期限，并得出以下资源可以交付服务的结论：

☞ 两名工程师（月薪 700 美元each）

☞ 一名项目经理（月薪 1,600 美元）

☞ 额外预计每月开支 2,000 美元

项目经理使用项目评估和审查技术 (PERT) 来计算项目使用内部资源交付时的节省。

项目经理估计公司可以节省多少钱？

- A. 35,000 美元
- B. 20,000 美元
- C. 40,000 美元
- D. 30,000 美元

**正确答案：** B

当质量控制检查拒绝产品不适合交付时，项目已准备好交付第一批产品。根本原因分析 (RCA) 显示作为最新变更请求的一部分添加的组件在整个开发周期中都没有经过测试。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查变更控制流程以确保质量管理工件作为变更的一部分得到更新。
- B. 审查质量管理流程并执行流程审核，作为持续质量保证的一部分。
- C. 审查沟通管理计划以确保将变更请求传达给受影响的团队成员。
- D. 与项目管理办公室 (PMO) 一起审查质量管理流程，以确保符合最佳实践。

**正确答案：** B



一名项目经理被指派启动一个交付复杂设备的大型项目。项目的一部分将是长期研究过程的结果，但一旦完成，项目的另一部分必须逐步交付给客户。

项目经理应该为这个项目选择哪种方法？

- A. 自适应
- B. 混合型
- C. 预测性
- D. 敏捷

**正确答案：** A

项目团队强烈建议项目经理购买可显着减少工作时间的应用程序。如果没有申请，可能会错过截止日期。但是，购买会影响项目成本。发起人希望探索一种能够节省团队时间的更便宜的应用程序。

项目经理应该做什么？

- A. 提出变更请求。
- B. 创建决策树。
- C. 购买应用程序。
- D. 分析假设和约束。

**正确答案：** D

项目经理正在领导一个工程项目。项目经理必须在量产前获得一些认证，计划在 3 个月内量产。认证过程至少需要 6 个月。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目发起人讨论将量产时间延长 3 个月。
- B. 评估和评估认证过程并了解最好和最坏的情况。
- C. 聘请顾问缩短认证过程以满足进度要求。
- D. 与高级管理层会面，讨论延长项目时间表的可能性。

**正确答案：** B

在一个大项目的执行阶段，一个不熟悉该项目的新利益相关者加入了董事会，并影响了项目的决策。此更改正在影响项目的进度。项目经理首先应该做什么？

- A. 将变更通知客户。
- B. 用新风险更新风险登记册。
- C. 向利益相关者介绍项目。
- D. 修改项目进度表。

**正确答案：** C

在迭代评审会议期间，当产品发布到生产环境中时，某些产品功能可能会因高昂的运营成本而被取消。项目负责人应该进行什么样的分析才能避免这种情况？

- A. 效益分析
- B. 风险分析
- C. 能力分析
- D. 差距分析

**正确答案：** A

一个建造新能源工厂的项目刚刚完成。然而，在工厂运营前几天，当地社区提出抗议并关闭了进入工厂的通道。他们争辩说，一个重要的自然保护区受到了影响，并且项目团队没有进行事先咨询。项目经理应该首先验证什么？

- A. 利益相关者参与计划
- B. 成本效益分析
- C. 商业案例
- D. 风险管理计划

**正确答案：** A

项目经理正在使用分包商进行移动应用程序开发。当项目团队测试该应用程序时，他们意识到它不符合新的公司用户界面标准。即使这些新标准未包含在工作说明书 (SOW) 中，只要立即支付额外工作的费用，分包商也同意额外的范围。项目经理应该做什么？

- A. 根据反映新工作的分包商修改后的估计协商新定价。
- B. 在响应之前发起变更请求并审查合同以评估付款选项。
- C. 拒绝分包商的付款要求，因为产品不符合项目需要而关闭项目。
- D. 根据分包商的要求，发起变更以在合同中纳入即时付款里程碑。

**正确答案：** B

一位项目经理正在领导一个大型公共项目，该项目将对该镇市民产生重大影响。项目经理应该如何定义不同的需求？

- A. 分析利益相关者的利益和影响并评估他们的要求。
- B. 仅包括关键需求并让利益相关者了解范围决策。
- C. 只添加团队的意见，因为他们知道项目的目标。
- D. 在项目目标中只包括每个利益相关者群体的共同要求。

**正确答案：** A

项目经理被分配到他们国家的监管项目。交付符合新法律的结果的期限非常紧迫，项目组成员尚未分配。项目经理的一位同事告诉项目经理，针对不同国家/地区的相同范围的项目已于 1 年前完成。项目经理首先应该做什么？

- A. 在风险管理计划中登记新风险。
- B. 审查组织过程资产 (OPA) 并执行类似的估算。
- C. 要求额外资源并审查项目估算。
- D. 完成项目活动的自下而上的估算。

**正确答案：** B

项目的团队负责人离开了组织，管理层希望将工程师 A 提升到这个职位。项目经理确信选择工程师 A 会给项目增加问题，并认为工程师 B 更适合这个角色。项目经理与管理层讨论了所有争论，但他们的决定保持不变。项目经理应该做什么？

- A. 提拔工程师 B，因为项目经理有权做出此决定。
- B. 帮助工程师 A 熟悉这个新角色，并确保工程师 B 保持积极性。
- C. 指导工程师 B 准备好在工程师 A 失败时担任此角色。
- D. 请求管理层批准，如果工程师 A 未能胜任此角色，工程师 B 将得到晋升。

**正确答案：** B

项目经理已被分配到一个将使用敏捷框架交付的新项目。发起人要求进行成本估算以构建业务案例。项目经理应该做什么？

- A. 确保客户代表参与估算。
- B. 确保估算中包含 20% 的意外费用。
- C. 审查类似项目的完工成本。
- D. 回顾从类似项目中吸取的教训。

**正确答案：** D

一家公司有兴趣降低其中一条生产线的生产成本。当项目章程即将获得批准时，其中一位主要利益相关者质疑项目的价值，导致批准延迟。

项目经理应该怎么做才能避免这种挫折？

- A. 制定基准
- B. 评估的可行性和影响
- C. 详细的项目章程
- D. 分析的利益相关者

**正确答案：** D

项目经理刚刚开始领导一个项目团队，而前任项目经理已从该团队中辞职。在对该项目进行快速评估后，很明显，由于对如何完成任务的持续分歧，团队士气低落。任务花费的时间比预测的要长，并且项目未按计划进行。

项目经理应该做什么？

- A. 与项目团队召开会议，讨论并解决分歧的根源。
- B. 缩短项目时间表以确保项目按计划进行。
- C. 告知利益相关者，由于之前的团队管理，项目将被延迟。
- D. 根据已识别的延误发出变更请求以延长项目进度。

**正确答案：** A

项目的可交付成果已经完成。但是，利益相关者并未批准可交付成果，因为它们没有涵盖业务需求。

项目经理应该采取哪些措施来避免这种情况？

- A. 定义项目管理计划并确保其满足项目目标和业务需求。
- B. 确保利益相关者参加日常会议，以确认项目正在正确发展。
- C. 在项目开始时向利益相关者和项目团队提供并解释冲刺积压。
- D. 要求团队在开发阶段改变可交付成果的频率以获得更早的反馈。

**正确答案：** A

A 公司和 B 公司正在共同开发一种尖端技术产品。根据客户反馈，市场部紧急要求 2 周内推出新功能。A 公司的前端已准备就绪，但 B 公司需要 4 周时间才能交付完整的后端，并且正忙于当前版本。

项目经理应该怎么做才能获得双方公司的同意并获得市场部的认可？

- A. 计划在 2 周内交付最低限度的可行功能，以便及早展示业务价值。
- B. 停止当前的发布工作 4 周，以便完全工作并交付新功能。
- C. 在当前版本发布 4 周后创建一个特殊版本以提供完整的新功能。
- D. 将新功能添加到下一个版本的列表中，并继续在当前版本上工作。

**正确答案：** A

项目经理已被指派按时并在预算范围内交付具有挑战性的项目。项目经理需要通过消除组织障碍和促进协作来授权团队成员。项目经理应该做什么来领导项目？

- A. 使用仆人式领导方法。
- B. 作为项目所有者。
- C. 执行项目发起人活动。
- D. 担任职能经理角色。

**正确答案：** A

一些正在开发新软件工具的团队成员在公共场所争论正在编码的新功能，而不是完成编码。项目经理应该如何处理这种情况并让团队完成任务？

- A. 联系人力资源 (HR) 部门，告诉他们在公共场所发生争吵，他们需要立即介入。
- B. 通过告诉他们对该功能的期望并建议他们返回他们的工作空间来参与公共场所的对话。
- C. 聆听附近的争论以了解情况，然后在团队平静时提供对特征的洞察。
- D. 将团队成员带到会议室讨论新功能并对必要的编码达成共识。

**正确答案：** D

一位项目经理正在管理一个以偏远城镇小企业发展为目标的政府项目。项目组在一些目标乡镇开展创业培训存在困难，因为当地市政府不授权培训。由于延误，项目实施面临风险。这可能是什么原因？

- A. 项目应在偏远乡镇建设培训中心。
- B. 该项目没有识别和吸引正确的利益相关者。
- C. 该项目没有充分参与项目发起人。
- D. 该项目应在所有偏远城镇都有代表。

**正确答案：** B

一个项目正在与一个对敏捷方法不熟悉的团队一起进行。在第一次冲刺审查之后，团队绩效开始下滑，结论是团队没有足够的工作流程。

项目经理应该做什么？

- A. 为产品负责人提供培训。
- B. 提交变更请求以重新设定项目基线。
- C. 将项目方法更改为混合。
- D. 与利益相关者讨论问题。

**正确答案：** D

在具有两个团队（A 和 B）的项目的第二次迭代期间，项目经理担心团队 A 有两个关键活动必须在第四次迭代中开始。此外，这两项活动依赖于尚未确定优先级的团队 B 的一项活动。

项目经理应该做什么？

- A. 取消当前迭代并使用相关活动重新安排它。
- B. 在团队 B 的当前迭代中包含相关活动。
- C. 确保团队 B 在第三次迭代中优先考虑相关活动。
- D. 在第二次迭代中将两项关键活动分配给团队 B。

**正确答案：** B

项目经理被分配到一个新的项目团队，该团队有多个利益相关者，他们可以对项目结果产生重大影响。项目经理将利益相关者分为四个不同的组，并希望定义沟通策略。

项目经理应该如何处理沟通？

- A. 定义并直接与有影响力的利益相关者进行沟通。
- B. 为利益相关者制定和定义沟通策略。
- C. 在所有组中使用统一的沟通结构。
- D. 描述项目利益相关者矩阵中的四个组。

**正确答案：** B



6 个月前开始了一个敏捷项目。自项目开始以来，由于部分团队成员无法在同一时间有空，团队成员之间就日常会议存在分歧。项目经理确信敏捷团队应该是自组织的，会议时间应该由团队制定。

项目经理应该做什么？

- A. 建立团队章程。
- B. 认可团队的贡献。
- C. 指派一名团队负责人。
- D. 制定项目进度表。

**正确答案：** A

一个团队已经在增量交付的项目上工作了一段时间。项目经理注意到其中一名团队成员较少参与团队会议，但交付迅速。在讨论消极情绪的来源时，该团队成员告诉项目经理，这是因为感觉缺乏处理新任务的技能。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 用来自另一个已经具备必要培训和技能的团队资源替换该团队成员。
- B. 查看团队成员会更有动力去完成哪些任务，然后将这些任务分配给团队成员。
- C. 与团队成员讨论成长和发展需求，并相应地提供学习机会。
- D. 在工作时间与团队成员一起制定自定进度的学习计划，并在学习进度上设置检查点。

**正确答案：** C

在混合项目中，客户签发了一份合同，其中指定了每个季度的可交付成果。客户希望在第一季度向其利益相关者展示切实的成果，并希望将第二个里程碑移至第一季度。项目经理向客户解释说，除非更改第二个里程碑的要求，否则这是不可行的。

项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 询问客户关于第二个里程碑要求的优先级。
- B. 将问题上报给高层管理人员以解决问题，并提出计划。
- C. 说服客户保留第二个里程碑而不更改它。
- D. 告诉客户移动里程碑对项目成本有非常大的影响。
- E. 回到开发组，讨论哪些第二个里程碑需求可以在第一季度完成。

**正确答案：** AC

项目团队正在进行冲刺计划。在冲刺结束时，产品增量必须部署在客户的站点上。产品所有者收到客户经理发来的电子邮件，称客户可能还没有准备好安装新版本的产品。

项目经理应该做什么？

- A. 要求销售团队通知客户。
- B. 联系客户的项目经理。
- C. 要求产品负责人通知客户。
- D. 联系客户的技术负责人。

**正确答案：** B

项目开发团队分布在全球不同地区。上周，一个非常重要的版本被推迟了，因为其中一位开发人员没有及时回复发送给所有人的电子邮件。开发人员似乎没有阅读电子邮件。

项目经理应该怎么做才能避免这些情况？

- A. 审查利益相关者参与计划。
- B. 审查资源管理计划。
- C. 审查风险管理计划。
- D. 审查沟通管理计划。

**正确答案：** D

在冲刺期间，一名团队成员发现了一个问题。根据团队成员和产品负责人的说法，该问题比冲刺的其他功能具有更高的重要性，但并不是完成冲刺的障碍。

项目负责人应该要求项目团队做什么？

- A. 避免做出任何更改并在下一个冲刺中解决问题的诱惑。
- B. 将问题提交给变更控制委员会 (CCB) 以评估并正式批准解决该问题的计划。
- C. 仅解决此问题，因为它比同一冲刺的其余功能具有更高的优先级。
- D. 通过交付为冲刺确定的功能来遵循冲刺计划，并在积压工作中确定问题的优先级。

**正确答案：** D



一位外部项目经理正在管理一家大公司新公司办公室的建设。项目管理计划指出，有必要聘请训练有素的外部资源来修改和验证重要的项目组成部分。客户拒绝聘请外部资源，因为成本高，即使它在项目预算之内。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 尝试通过调配其他项目的资源来在内部完成任务。
- B. 约客户会面，说明任务不会执行。
- C. 评估后果并与客户会面以解释可能的情况。
- D. 雇用资源以实现项目目标。

**正确答案：** C

由于与供应商有关的问题，项目团队正在经历进度延误。一些任务在关键路径上。  
在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 与采购部门讨论关键路径问题。
- B. 与利益相关者一起审查关键路径以定义后续步骤。
- C. 与供应商一起审查工作分解结构 (WBS)。
- D. 将与供应商相关的问题上报给发起人以供解决。

**正确答案：** B

在每日站立会议中，项目经理注意到团队成员的报告包括未完成任务，没有任何障碍。一位同事通知项目经理，该团队成员遇到了个人问题。

项目经理应该做什么？

- A. 请人力资源 (HR) 经理与该团队成员交谈。
- B. 指导团队成员如何将工作和个人问题分开。
- C. 将此团队成员的近期任务重新分配给其他人。
- D. 了解团队成员的个人问题并为他们提供支持。

**正确答案：** B

在冲刺计划期间，产品负责人希望优先考虑具有高商业价值的项目。但是，项目团队担心技术债务和基础设施依赖性无法交付预期价值。

项目经理应该如何处理这个问题？

- A. 支持投票活动，这样所有团队成员都可以表达他们的意见和投票背后的原因。
- B. 支持项目发起人，使决策自上而下，团队遵循提供的方向。
- C. 支持产品负责人，以便在下一个冲刺中只包含具有高商业价值的项目。
- D. 支持项目团队，以便在下一个冲刺中包含技术债务和基础设施依赖性。

**正确答案：** C

在一个项目中，一位团队成员一直在询问方向以及对许多任务采取的行动。结果，该团队成员在项目交付中表现缓慢。项目经理应该做什么来帮助这个团队成员？

- A. 指派另一名高级团队成员指导该团队成员。
- B. 相应地处理团队成员的表现。
- C. 授权团队成员做决定。
- D. 定期指导团队成员。

**正确答案：** C

一位项目经理注意到一位关键的团队成员一直在与客户争论。这已经开始对会议产生负面影响。项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 与客户私下交谈以强调情况。
- B. 向项目团队成员解释场景的影响。
- C. 从所有未来会议中删除项目团队成员。
- D. 向项目团队成员推荐绩效改进计划。

**正确答案：** B

一家公司计划启动一个涉及新技术的项目。需要批准该项目。项目经理应该做什么？

- A. 审查执行的成本和进度基准。
- B. 为新技术定义变更管理。
- C. 识别实施新技术的风险。
- D. 分析成本并确定项目收益。

**正确答案：** D

项目经理正在为一组开发人员执行 scrum master 的角色。由于功能交付方式的差异，开发人员之间存在冲突。项目经理组织了几次秒杀来解决这个冲突。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 组织一次多人投票活动以达成整个团队的共识。
- B. 允许团队自行决定应该实施哪个选项。
- C. 组织更多的秒杀活动，直到团队达成共识。
- D. 请项目发起人决定应该实施哪个选项。

**正确答案：** B

在软件开发项目进行到一半时，首席设计程序员接受了竞争对手的邀请。项目经理需要找到替代者来迎接即将到来的里程碑。项目经理应该做什么？

- A. 查阅风险应对计划。
- B. 更新资源日历。
- C. 向变更控制委员会 (CCB) 发出请求。
- D. 将任务分配给另一个团队成员。

**正确答案：** A

在项目的执行阶段，项目经理注意到团队在技术和人际层面上存在冲突。项目经理应该做什么？

- A. 召开团队会议以了解和解决冲突。
- B. 安排每月一次的会议来处理所有的项目冲突。
- C. 在经验教训会议期间解决冲突。
- D. 聘请外部顾问来领导组织干预。

**正确答案：** A

在一个敏捷项目中，团队决定为每日 Scrum 安排一组轮换的协调员。总的来说，大多数协调员都在这个角色中成长并做得很好；然而，他们中的一些人往往会运行低效的日常例会。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 表扬团队的自我组织和成长，然后根据需要与协调人进行一对一的合作。
- B. 试用期结束后，恢复使用 scrum master 作为每日 scrum 的主持人。
- C. 要求做得好的辅导员继续，并建议其他人停止辅导。
- D. 对所有团队成员进行每日 scrum 引导的再培训，以确保方法的一致性。

**正确答案：** A

项目经理发现项目团队花费大量时间向多个利益相关者交付同一项目更新的多种报告格式。项目经理应该怎样做才能减少花在这些活动上的时间？

- A. 更新沟通管理计划以移除影响较小的利益相关者。
- B. 将所有利益相关者沟通活动委托给项目团队成员。
- C. 细分要交付给不同利益相关者的沟通类型。
- D. 每两周举行一次状态会议，立即向所有利益相关者传递信息。

**正确答案：** C

一位项目经理被调往另一个国家从事一个重点项目。项目经理成功完成了计划阶段并开始了执行阶段，报告进展顺利。在与项目发起人的最后一次会议中，项目经理被告知一些利益相关者抱怨项目经理的电子邮件非常苛刻。项目经理应该怎么做才能解决这种情况？

- A. 确定抱怨的利益相关者的影响程度。
- B. 将沟通方式从电子邮件改为会议，减少利益相关方的投诉。
- C. 调整沟通管理计划以获得利益相关者的信任。
- D. 向发起人解释所使用的沟通模式来自公司总部。

**正确答案：** C

在尝试跟踪项目收益时，项目经理意识到一些关键绩效指标 (KPI) 尚未定义。项目经理应该做什么？

- A. 将问题转发给利益所有者并要求他们收集缺失的数据并构建 KPI。
- B. 与利益所有者协调以跟踪和收集缺失的数据并构建 KPI。
- C. 与业务分析师合作跟踪和收集缺失的数据并构建 KPI。
- D. 要求项目经理跟踪和收集缺失的数据并努力构建 KPI。

**正确答案：** B

一名项目经理被指派从事复杂且创新的项目。正在使用和技术是新的和复杂的，大多数利益相关者都不熟悉它。作为服务型领导，项目经理应该使用哪种方法？

- A. 将问题上报给高层管理人员，为这种情况找到新的解决方案。
- B. 联系项目发起人，将这些利益相关者从项目中移除。
- C. 分配资源为利益相关者提供有关新技术的培训。
- D. 要求利益相关者寻找并自筹资金进行有关这项新技术的教育。

**正确答案：** C

项目处于项目生命周期的启动阶段。项目团队由来自五个不同国家的20人组成。项目团队计划每季度举行一次面对面会议。但是，由于不可预见的情况，无法进行面对面的会议。项目经理担心如果没有面对面的会议，团队可能无法履行各自的职责。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 利用虚拟团队召开会议和交付成果。
- B. 动用应急储备，分包工作。
- C. 审查这种不可预见情况的风险登记册。
- D. 要求延长项目可交付成果的时间。

**正确答案：** C

关键项目利益相关者不参加任何项目会议，并提供项目团队未按时交付的虚假信息。项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 将最新状态报告通过电子邮件发送给主要利益相关者。
- B. 与主要利益相关者讨论沟通需求。
- C. 为关键利益相关者创建一个新的沟通工具。
- D. 与主要利益相关者分享会议记录。

**正确答案：** B

一位客户审查了一个具有高度不确定性的项目的计划。客户对需要如此多迭代的工作表示担心无法达到强制交付日期的风险。在这种情况下，项目经理应该使用哪种方法？

- A. 预测方法
- B. 看板方法
- C. 混合方法
- D. 敏捷方法

**正确答案：** D

项目经理在项目执行阶段遇到治理问题。其中一名团队成员抱怨收到多人分配的任务，并表示他们无法有效地工作。项目经理应该首先在项目治理结构中建立什么？

- A. 清晰的项目工作分解结构 (WBS) 和时间表
- B. 资源管理和冲突解决计划
- C. 风险管理和问题解决计划
- D. 清晰的责任、问责、咨询和通知 (RACI) 矩阵

**正确答案：** D

一位项目经理被要求参与一个允许客户购买在线电子学习课程的软件应用程序的采购流程。一旦找到供应商，项目经理将接管项目。项目开始前项目经理应该做什么？

- A. 要求项目发起人让法律部门参与项目协议的谈判。
- B. 通知项目发起人项目经理不能参与协议谈判过程。
- C. 通知项目发起人，协议一经签署，项目范围不得有任何变更。
- D. 确保项目要求得到理解，目标在批准协议前得到验证。

**正确答案：** D

一家公司即将启动一项复杂的研究项目。由于不确定性程度，项目经理建议使用混合方法；但是，该组织只有预测项目的经验。项目经理如何为组织制定混合方法的使用策略？

- A. 向项目团队提交通知，确认他们将在项目中使用混合方法。
- B. 向项目管理办公室 (PMO) 发送一封信，请求使用混合方法。
- C. 创建项目变更请求以使用混合方法执行项目。
- D. 向主要利益相关者展示混合方法的好处以获得他们的支持。

**正确答案：** D

在项目实施期间，一个团队发现关键项目可交付成果没有编入预算。项目经理首先应该做什么？

- A. 将问题上报给项目发起人以供解决。
- B. 让团队负责并要求立即解决。
- C. 与团队会面讨论备选方案。
- D. 从项目范围中删除可交付成果。

**正确答案：** C



在新设计发布的最后阶段，团队成员对设计的某些功能发生了冲突。  
项目经理应该做什么？

- A. 与团队成员一起召开利益相关者会议并寻求共识。
- B. 要求利益相关者缩小范围以满足项目截止日期。
- C. 请项目发起人就设计特点做出决定。
- D. 与团队成员一起审查设计并提出新的发布日期。

**正确答案：** A

一个敏捷团队正在开发一个新的内容管理系统。一些团队成员正在努力交付某些功能，因为他们从未使用过此类解决方案。  
项目经理应该做什么？

- A. 要求团队通读所有可用的系统文档。
- B. 鼓励团队在每次迭代中举行知识共享会议。
- C. 鼓励团队成员直接在系统中进行更改。
- D. 用了解系统的新成员替换成员。

**正确答案：** B

主要决策者正在开会定义新数据库迁移项目的目标。公司各部门负责人对范围和时间线存在很多分歧。  
项目经理应该如何公正地确定要集成的需求的优先级？

- A. 只保留导致盈利性收入增长的需求。
- B. 确保 CEO 从所有部门领导那里选择要求。
- C. 给每个部门一个能满足十项要求的固定预算。
- D. 将效益成本比最高的要求列为更重要的要求。

**正确答案：** D

需要一个敏捷团队来解决没有可视化交付物来向客户展示的技术性复杂需求。  
产品经理应该提供什么指导来改进需求开发？

- A. 通过降低复杂活动的优先级来重新确定产品待办事项的优先级，以便在项目后期进行处理。
- B. 让团队集中精力完成复杂的工作，因为这会降低在项目后期发现问题的风险。
- C. 与团队讨论这个问题并重新确定积压工作的优先级，以通过包括一部分复杂工作来实现最大价值。
- D. 告知客户由于要求复杂，将无法交付任何产品。

**正确答案：** C

一位项目经理正在领导一个跨越五个城镇的电气项目。团队通知项目经理，其中一个城镇不允许团队在那里工作，即使该城镇在项目开始前已被纳入利益相关者参与。

项目经理应该做什么？

- A. 与镇当局接洽，讨论承诺变更的原因并商定解决方案。
- B. 指示团队转移到下一个城镇并继续该项目以避免进一步延误。
- C. 改变项目范围并申请批准将本镇排除在整体项目之外。
- D. 检索利益相关者参与的所有会议记录，并发送给该镇，以提醒他们对项目的承诺。

**正确答案：** A

一个政府机构正在制定一项新的连通性政策。指定的项目经理是具有国际知名度的著名经济学家。团队渴望与项目经理合作，但又感到害怕。项目经理意识到，一位工作进度落后的初级经济师尤其害怕这种情况。

项目经理首先应该做什么？

- A. 考虑为初级和高级经济学家组织配对工作会议。
- B. 将初级经济学家的一些任务重新分配给其他经济学家。
- C. 评估初级经济学家在未来几个月的表现。
- D. 要求用更有经验的经济学家代替初级经济学家。

**正确答案：** A

一个项目的执行阶段已经过半。正式接受项目可交付成果的质量规范。然而，一位主要利益相关者并不满意，称交付成果不符合质量规格。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 将利益相关者的不满告知项目发起人。
- B. 审查需求追溯矩阵并进行检查。
- C. 在问题日志中记录问题并向管理层发送报告。
- D. 通知利益相关者将遵循仲裁程序。

**正确答案：** B



一个团队正在完成第三个版本以作为演示的一部分呈现给利益相关者。分包开发商的公司表示存在现金流问题，公司将无法为下一次迭代提供相同的资源。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 分析如果阻碍因素未被解决对发布计划的影响。
- B. 创建风险登记册以跟踪风险并申请额外预算。
- C. 将情况上报给项目发起人以获得可能的解决方案。
- D. 与项目所有者合作确定产品积压的优先级。

**正确答案：** A

组织正在从预测方法过渡到敏捷方法。

项目经理应该怎么做才能确保敏捷方法会带来重大变化？

- A. 获得全面的管理支持
- B. 确定组织的主要客户
- C. 尽可能多地了解组织
- D. 对团队成员进行敏捷培训

**正确答案：** D

一位客户的技术主管与项目经理讨论了一项新功能。项目经理认为新功能将显着提高性能，并将其作为高优先级项目添加到 sprint backlog 中。在冲刺结束时，所有计划的故事都没有完成，因为新功能花费了更多时间。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 同意项目组修改和删除当前sprint backlog中的部分故事
- B. 获得项目团队的批准并将新故事添加到产品待办事项列表中
- C. 收到产品负责人的同意并将新故事添加到产品待办事项列表中
- D. 在将新故事添加到 sprint backlog 之前与 scrum master 协商

**正确答案：** A

拖放 -

一家汽车公司的项目经理正在为一个复杂的项目安排活动。有些项目要求是固定的，有些是灵活的。  
将左侧的项目与项目经理正在使用的右侧的方法相匹配。

选择和放置：

Item

Estimate "tire compound mixing" duration and include it in the project schedule

Assign story points to the stories in the backlog

Get team members' support to estimate duration or complexity

Make sure each project phase ends when an iteration ends and vice versa

Methodology

Agile

Traditional

Hybrid

All Methodologies

正确答案：

Item

Estimate "tire compound mixing" duration and include it in the project schedule

Assign story points to the stories in the backlog

Get team members' support to estimate duration or complexity

Make sure each project phase ends when an iteration ends and vice versa

Methodology

Assign story points to the stories in the backlog

Estimate "tire compound mixing" duration and include it in the project schedule

Make sure each project phase ends when an iteration ends and vice versa

Get team members' support to estimate duration or complexity

一个项目团队正在从事一个敏捷软件开发项目。项目经理担心虚拟团队可能不如总部的同地团队有效。项目经理应该利用哪两项行动来确保团队达到绩效预期？（选择两项。）

- A. 需要每月的个人状态报告
- B. 举行每日虚拟会议以审查进展
- C. 利用基于网络的看板
- D. 任务职能经理推动问责制
- E. 为团队成员实施计时软件

**正确答案：** DE

组织正在过渡到敏捷交付方法。只有一个项目被用作新方法的试点。项目管理办公室 (PMO) 经理询问项目负责人如何管理与项目团队和利益相关者的沟通。项目负责人应该推荐什么？

- A. 每周向 PMO 发送报告，并为产品负责人和项目团队使用看板
- B. 将每周报告发送给 PMO 和产品负责人，并为项目团队使用看板
- C. 邀请 PMO 经理参与与项目团队和产品负责人的每日站会
- D. 每周向所有利益相关者发送报告，包括项目团队和产品负责人

**正确答案：** A

已与项目团队召开紧急会议，讨论导致无法向客户交付的一些质量问题的原因。产品负责人建议进行根本原因分析 (RCA)。项目负责人应该做什么？

- A. 与团队讨论产品负责人的建议并实施商定的解决方案
- B. 允许团队自组织，这样一种资源可以带领团队达成共识
- C. 与测试经理讨论建议并要求更好的质量控制
- D. 促进会议，以便任何人都可以分享他们的想法并在会议期间被听到

**正确答案：** C

拖放 -

为了使项目的技术现代化，项目经理一直在与项目团队讨论风险优先级。项目经理确定需要额外的参数来迭代评估项目风险并确定其优先级。

将左侧的项目经理目标与右侧的相关风险参数相匹配。

选择和放置：

Goals

Assess the amount of time before the risk can impact one or more project objectives.

Assess if the risk is related to other individual project risks.

Assess how quickly the risk response needs to be implemented in order to be effective.

Assess how long after a risk has occurred before its impact is discovered.

Risk Parameters

Dormancy

Urgency

Connectivity

Proximity

正确答案：

Goals

Assess the amount of time before the risk can impact one or more project objectives.

Assess if the risk is related to other individual project risks.

Assess how quickly the risk response needs to be implemented in order to be effective.

Assess how long after a risk has occurred before its impact is discovered.

Risk Parameters

Assess how long after a risk has occurred before its impact is discovered.

Assess how quickly the risk response needs to be implemented in order to be effective.

Assess if the risk is related to other individual project risks.

Assess the amount of time before the risk can impact one or more project objectives.

一项重大计划的项目发起人一直在改变模块化工作包的优先顺序。该团队已经习惯了三周的冲刺，并且对范围的日常变化越来越感到沮丧。

项目经理应该做什么？

- A. 与发起人召开会议，解释保持严格的冲刺周期的重要性。
- B. 通过以天为单位计算，将冲刺周期减少到平均重新优先化请求。
- C. 安排与项目团队的会议，征求他们对做什么的意见。
- D. 转向看板策略，以便更轻松地重新分配工作。

**正确答案：** A

一名项目经理被分配到一个教育项目，其目标是培训应用程序开发人员。其中一项可交付成果是为客户的活跃项目中的最优秀学生提供实习机会。但是，客户目前没有足够的正在进行的项目。项目经理决定创建几个内部项目以确保实习机会。

在不增加客户成本的情况下，项目经理应该采取哪三项行动来完成这个场景？（选择三个。）

- A. 使用内部项目创建新范围的工作分解结构 (WBS)。
- B. 创建新内部项目范围的变更请求。
- C. 使用项目的应急预算。
- D. 影响客户启动一个新项目。
- E. 管理交付质量。

**正确答案：** ADE

一个项目正处于知识转移阶段，一些主题专家 (SME) 前往客户现场进行知识转移。SME 在没有与项目团队共享的情况下捕获了各种过程偏差。

项目经理如何确保整个团队的知识转移？

- A. 要求项目团队与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法按计划上线。
- B. 要求项目团队在项目收尾阶段召开经验教训会议以纳入此问题。
- C. 要求项目管理办公室 (PMO) 为团队成员提供偏差的实时可见性，并促进团队成员解决问题。
- D. 通过将文件放入项目管理信息系统 (PMIS)，要求 SME 与所有其他成员共享知识转移文件。

**正确答案：** D

项目经理被分配到一个新的营销活动。发起人向项目经理提供经批准的项目管理计划以供审查，并解释范围、业务要求、可交付成果和利益相关者。项目经理要求查看项目章程以更好地了解项目。发起人说该项目小而简单，因此不需要项目章程。

项目经理应该做什么？

- A. 制定项目章程并送交批准。
- B. 解释项目章程对于确保就范围和可交付成果达成一致并定义项目经理的职责是必要的。
- C. 与同行讨论项目章程的必要性。
- D. 同意项目不需要项目章程，特别是因为可交付成果和里程碑包含在项目管理计划中。

**正确答案：** B

一个大型的多年项目需要高技能的员工才能成功部署。管理团队和项目发起人分析了资源需求，并同意为项目聘用长期员工以避免潜在的预算超支。但项目过程中存在人员流失风险，可能对交付产生影响。

项目经理应该采取哪两项行动来减轻这种风险？（选择两项。）

- A. 与管理层会面，讨论将项目分成更小的项目。
- B. 说服高级管理层聘请第三方员工。
- C. 通过培训、指导和辅导增强项目团队的能力。
- D. 增加训练有素的员工以创建资源后备。
- E. 引入表彰计划来激励和奖励资源绩效。

**正确答案：** CE

一个由来自许多不同国家的成员组成的项目团队正在努力合作。项目经理在团队发展的风暴阶段接受了这些困难，但团队还没有进入下一阶段。该项目开始落后于计划。

项目经理可以做些什么来使团队进入规范化阶段？

- A. 计划社交活动以帮助培养更牢固的人际关系并确定共同目标。
- B. 找出问题的幕后黑手并应用渐进的纪律技巧。
- C. 与项目发起人讨论改变团队组成。
- D. 向团队展示沟通问题对进度的影响，并鼓励他们搁置分歧。

**正确答案：** A



在软件开发项目中，产品负责人和开发团队就 sprint backlog 达成一致。backlog 中优先级最高的是构建支付模块。该团队在 sprint 的前半部分致力于该模块，但现在两名开发人员希望在 sprint 的剩余时间里专注于重构另一个可能在未来产生问题的功能。项目经理应该做什么？

- A. 让开发人员专注于重构工作，并在回顾中进行讨论。
- B. 向开发人员重申关注和实现冲刺目标的重要性。
- C. 将问题上报给开发人员的职能经理。
- D. 称赞开发人员的主动性和对质量的关注。

**正确答案：** B

从之前与客户合作的经验教训中，一位项目经理指出，客户对发送以供批准的文件的周转时间非常缓慢，远远超出了商定的时间表。在与同一客户的初始启动会议上，项目经理应该如何处理新项目的这个问题？

- A. 更新项目风险登记册中的延迟可能性。
- B. 通知客户将增加额外的资源，让客户有更多时间进行审核。
- C. 在可接受的时间内与客户一起完成文件审批。
- D. 告知客户他们在文件批准方面的责任。

**正确答案：** D

在正在进行的项目中，关键资源会向项目经理询问项目目的以及它是否与组织的战略保持一致。项目经理应该与关键资源分享什么？

- A. 更新后的项目管理计划
- B. 更新后的福利管理计划
- C. 更新的沟通管理计划
- D. 更新的范围管理计划

**正确答案：** B

在与不同国家的特定用户一起完成项目后，项目经理的主管会询问项目用户是否对项目的运行方式感到满意。项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 向项目参与者发送问卷并寻求他们的反馈。
- B. 参考沟通管理计划。
- C. 获得各国对新工艺的正式批准。
- D. 准备从项目阶段吸取的经验教训。
- E. 将项目资料交给用户，看他们有什么意见。

**正确答案：** AB

项目经理加入了一个团队，该团队正在为客户提供定制的企业资源规划 (ERP) 系统。开发团队确定了一个潜在的设计问题。在与项目所有者和团队成员审查此问题后，所有人都同意修改设计以避免部署时出现系统缺陷。设计已经获得批准。项目经理的下一步应该是什么？

- A. 提出变更请求并获得项目所有者的正式批准。
- B. 将问题告知客户并遵循变更请求流程。
- C. 进行概念验证以确保修改后的设计没有问题。
- D. 修改设计规范并传递给开发团队重新编程。

**正确答案：** C

在项目执行期间，财务团队发现他们没有参与构建项目的业务案例，因此不会批准估计的投资回报率 (ROI)。项目经理应该做什么？

- A. 重新审视沟通管理计划并进行必要的调整。
- B. 重新审视范围管理计划并将其记为风险。
- C. 根据项目管理计划继续开发并解决交付后的问题。
- D. 安排与产品负责人和财务团队的会议，就课程修正达成一致。

**正确答案：** D



项目章程获得批准后，项目经理需要与利益相关者一起研究详细的项目需求、约束和假设。但是，并非所有利益相关者都可以在短期内立即参加会议。项目经理应该怎么做才能从利益相关者那里收集所需的信息？

- A. 召开会议，与可用的利益相关者一起制定项目管理计划。
- B. 分别通过电子邮件、电话或会见每个利益相关者来获取他们的意见。
- C. 向项目发起人报告并非所有利益相关者都可以参加会议。
- D. 在咨询利益相关者之前，与项目管理团队会面以制定项目管理计划。

**正确答案：** B

项目经理已被选中交付组织的关键旗舰解决方案之一。关键的成功因素包括敏捷性、市场适应性和对市场产品的快速反应。为确保公司成功，项目经理应开展的关键活动之一是什么？

- A. 向项目发起人申请更多资金以雇用更多技术人员并在项目交付方法和结果中纳入更多质量。
- B. 与项目发起人一起审查项目目标，以商定更现实和可实现的项目计划和可交付成果。
- C. 在执行市场审查后创建业务案例，然后将其提交给发起人以修改项目可交付成果以满足新定义的目标。
- D. 定期审查项目计划、目标和可交付成果，以确保捕获所有相关数据以继续做出明智的项目决策。

**正确答案：** D

在一个项目的实施过程中，项目组发现了一个新的机会。经过内部审查后，项目团队同意该机会不在项目范围内。项目经理决定更新风险登记册并将机会升级到更高级别。项目经理接下来应该如何利用这个机会？

- A. 无需采取更多行动。
- B. 与另一个项目分享这个机会。
- C. 进一步监控机会。
- D. 建立应急储备以支持机会。

**正确答案：** A

在项目的第三次迭代期间，两名现有团队成员被替换。随着项目进入下一个迭代，团队速度下降，绩效开始下滑。项目经理应该做什么？

- A. 引导团队回到形成和风暴阶段。
- B. 讨论人力资源 (HR) 生产力的下降。
- C. 召开团队建设活动以解决关键绩效指标 (KPI)。
- D. 将问题上报给项目发起人。

**正确答案：** A

在管理一个项目时，项目经理刚刚注意到，最近几张月度发票明明已经被客户质疑了。收到的实际发票付款也已延迟，并且超出了合同付款时间表。最近的发票仅部分支付。

项目经理应该做什么？

- A. 审查过去的项目以获取与支付相关的经验教训。
- B. 将未付款添加到问题日志中并继续跟踪付款。
- C. 与项目团队召开会议，更新采购管理计划。
- D. 与客户开会解决问题。

**正确答案：** D

在回顾性审查期间，许多项目团队成员表示，由于中断和向其他团队寻求帮助，他们在迭代期间没有完成任务。作为团队促进者，项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 与受影响的项目团队成员重新会面，并告诉他们不要降低团队的能力。
- B. 聘请教练帮助所有项目团队提高独立解决问题的能力。
- C. 向项目团队成员建议他们应该改进他们的计划并缩小他们的故事。
- D. 确定问题的根本原因，并与所有项目团队成员一起定义基本规则，以尽量减少干扰。

**正确答案：** D

在实施期间，一个新的项目经理被分配到一个项目。项目经理意识到新的税收政策正在产生成本超支 25% 的风险。项目经理更新了风险登记册并保持项目正常运行。首席执行官宣布该项目可以取消，因为可接受的成本超支仅为 20%。项目经理非常惊讶，因为这是新信息。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 正确实施沟通管理计划。
- B. 正确实施利益相关者参与计划。
- C. 提供适当的风险应对措施。
- D. 确保公司的风险承受能力得到适当更新。

**正确答案：** C

一家专注于使用预测方法交付项目的公司聘请了一位使用混合方法的新项目经理。该项目的范围包含许多不明确的要求。项目经理应该如何计划项目的交付？

- A. 忽略不明确的需求，专注于项目的交付计划。
- B. 在对项目采取任何进一步行动之前，等待需求更加明确。
- C. 分解需求并将需求优先化为迭代工作包。
- D. 将需求不明确的问题上报给管理团队，等待最终授权。

**正确答案：** C

一家公司正在改变他们目前的商业模式。这种变化需要使用多个敏捷团队来实施一个复杂的项目。项目经理应该让测试团队采用哪三个选项作为测试机制？（选择三个。）

- A. 故事测试
- B. 基于行为的测试和测试驱动开发
- C. 独立个人测试
- D. 安全和性能测试
- E. 涵盖所有可能选择的实验方法

**正确答案：** ABC

新资源已加入迭代项目团队。项目经理注意到资源无法按时完成可交付成果。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 与资源经理讨论改进性能的选项。
- B. 作为回顾仪式的一部分提供绩效反馈。
- C. 通过指导新团队成员解决绩效不足的问题。
- D. 向项目发起人请求更有效的替代资源。

**正确答案：** C

一家大公司正在将自己从预测方法转变为敏捷方法。具有敏捷实践知识的项目团队正在与高管就要遵循的流程发生重大冲突。这些矛盾应该如何解决？

- A. 对高管进行敏捷实践培训。
- B. 让高管参与团队回顾。
- C. 与高管协商并商定流程。
- D. 要求高管使用敏捷实践。

**正确答案：** A

一家运输公司正在转变其运营流程和该公司用来运输货物的主要系统。范围声明已经到位。所有利益相关者都同意采用迭代交付方法。

项目经理下一步需要做什么来帮助团队了解需要完成的工作？

- A. 创建需求管理计划以概述如何收集、分析和记录项目需求，然后将需求分配给团队成员。
- B. 与团队合作将范围分解为 WBS 和工作包，以创建所需的可交付成果和时间表。
- C. 开始制定项目管理计划，包括工作包、详细的时间表和团队成员的工作分配。
- D. 直接与利益相关者就工作分解结构 (WBS) 进行合作，并为每个团队成员分配任务并按要求的时间表开始工作。

**正确答案：** A

项目获得批准后，关键利益相关者告诉项目经理当前的项目管理策略没有明确定义。项目经理还被告知关键利益相关者不想召开工作会议。

项目经理首先应该做什么？

- A. 共享项目文件并邀请主要利益相关者讨论任何疑虑。
- B. 邀请关键利益相关者加入项目的变更控制委员会 (CCB)，讨论项目战略的调整。
- C. 要求项目发起人对关键利益相关者施加权力，以维持批准的时间表。
- D. 为不属于该关键利益相关者的团队召开工作会议。

**正确答案：** A

一位拥有多年经验的高级业务利益相关者正在向敏捷团队施压，要求其在未来 18 个月内向客户交付大部分承诺的功能，而不是在 18 个月的过程中进行多次增量交付。

项目负责人接下来应该做什么？

- A. 与敏捷团队合作安排增量交付，以便更快地向客户交付业务价值。
- B. 与利益相关者一起了解关注点，同时传达增量交付的好处。
- C. 安排与客户的会议以确定他们支持多次增量交付的能力。
- D. 向敏捷团队提供关注的细节并调整他们的目标和发布计划以符合利益相关者的要求。

**正确答案：** B

分配了一个新的项目经理来领导一个敏捷项目。项目经理希望通过激励来鼓励团队在整个项目中表现出色。项目经理应该做什么？

- A. 实施旨在保持团队参与和积极性的奖励制度。
- B. 寻找另一种提高团队绩效的方法。
- C. 使用管理储备金来资助一些团队建设活动。
- D. 增加项目估算以为团队活动提供财务缓冲。

**正确答案：** A

项目经理正在领导一个处于后期阶段的项目。风险管理计划中识别的所有高级别风险都已解决或不再是项目的风险。只剩下低级风险。项目经理现在应该做什么？

- A. 将低级别风险重新分类为高级别风险。
- B. 通知利益相关者所有高级别风险都已解决。
- C. 降低项目风险的优先级，因为所有剩余风险都是低级的。
- D. 重新评估已识别的风险并更新风险登记册。

**正确答案：** D

项目经理正在管理一个混合项目。在参加迭代评审后，利益相关者告诉项目经理他们很忙，并询问为什么要如此频繁地进行这些评审。项目经理应该如何应对？

- A. 在问题日志中记录问题并将冲突升级到项目发起人以寻求帮助。
- B. 向利益相关者解释利益相关者参与计划要求他们参加所有审查。
- C. 与利益相关者讨论混合项目的好处以及频繁的审查如何带来更大的价值和更少的返工。
- D. 与利益相关者协商减少审查出席人数，并更新利益相关者参与计划以反映这种减少的出席人数。

**正确答案：** C

产品团队正在采用原型制作方法来交付一项多年的业务计划。一些用户故事需要更长的时间才能交付。项目经理应该做什么？

- A. 在回顾会议期间确定风险并确定解决方案。
- B. 将项目更新期间的延迟通知利益相关者。
- C. 发现沟通管理计划中的差距并相应地加以解决。
- D. 确定交叉依赖并计划下一个冲刺中的峰值。

**正确答案：** A

一位项目经理已经管理了几个月的项目，这时出现了一个未被登记为风险的问题。这个问题可能会对项目产生很大的影响。项目经理应该做什么？

- A. 避免管理问题，因为它没有被记录为项目的风险，也没有计划的应对措施。
- B. 与项目团队和相关利益相关者召开会议，就管理问题的最佳方式达成一致。
- C. 延迟项目，直到问题得到解决并且不再对项目构成风险。
- D. 通知赞助商问题已经出现并且项目的成功可能是不确定的。

**正确答案：** B

一个研发团队正在完成一项为期两年的计划。项目经理专注于项目的收尾活动。哪项活动应被视为优先事项？

- A. 释放资源并计划项目完工庆典。
- B. 确保知识转移活动按计划执行。
- C. 召开指导委员会会议，通知他们项目完成。
- D. 标记产品积压完成状态并更新沟通管理计划。

**正确答案：** B

敏捷项目团队正在寻求为项目制定质量标准。项目经理应该如何指导团队？

- A. 确定适合项目的工具和技术，并确保尽早和持续地进行测试。
- B. 当产品负责人同意用户故事满足所有验收标准时，确保提供完成 (DoD) 的定义。
- C. 坚持测试驱动开发与自动化测试一起实施。
- D. 通知团队需要进行用户验收测试，以确保产品所有者接受解决方案。

**正确答案：** C

由于某些活动的延误，项目团队的一名成员未经批准就扩大了范围。项目经理接下来应该做什么？

- A. 删除更改以匹配原始要求。
- B. 将团队成员添加到项目中以避免更多的进度延迟。
- C. 使用新范围更新项目文档。
- D. 评估对项目所做的更改的影响。

**正确答案：** D



一家零售连锁店正在评估一个项目，以更换其位于多个地点的所有商店的支付系统。该项目没有通过财务门槛，但也有望增加市场份额、改善客户服务并留住更多客户。该项目计划分阶段实施，以从每个阶段的回顾中吸取教训为基础。企业应该如何增加项目的价值？

- A. 要求福利所有人重新评估影响经济福利结果的已识别风险。
- B. 使用鱼骨图找出收益所有者经济收益较低的根本原因。
- C. 就降低成本和增加项目财务价值的方法咨询专家。
- D. 在每个阶段的收益管理计划中量化预期的有形和无形收益。

**正确答案：** D

在建设项目的实施阶段，客户要求主要分包商提前交付工作包。分包商没有为此做好准备，并要求项目经理追加预算。项目经理首先应该做什么？

- A. 更新风险登记册和项目日志，密切管理预算。
- B. 相应地修改项目范围以应对预算变化。
- C. 按要求提交变更请求以加速项目。
- D. 向上级申请更多资金，更新项目预算。

**正确答案：** C

填空 -

下表显示了创造的商业价值以及在产品中实现各种功能所需的开发工作。

| Feature Name: | Business Value (units): | Development Effort (weeks): |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| A             | 6                       | 2                           |
| B             | 10                      | 4                           |
| C             | 4                       | 4                           |
| D             | 8                       | 8                           |

团队应该首先优先考虑哪个功能？ 在下面的框中输入功能名称。

\_\_\_\_\_

**正确答案：** A

敏捷项目正在运行定义最小可行产品 (MVP) 的活动。在会议期间，项目经理确定了一些强制性规定，但没有就将这些规定纳入 MVP 达成共识，因为这可能会延长项目的持续时间。

项目经理应该做什么？

- A. 要求项目发起人为项目增加更多时间。
- B. 获得团队的承诺，包括所有必需的规定。
- C. 与参与者分享只关注产品功能的需求。
- D. 按照管理层的要求对团队进行新规章制度方面的培训。

**正确答案：** B

一个项目团队最近完成了为一家公司开发自动化薪资系统的初始冲刺。项目经理安排了与产品所有者和团队成员的冲刺计划会议，讨论下一步应该处理哪些特性。

项目经理需要哪两条信息才能使会议富有成效？（选择两项。）

- A. 公司使命和愿景
- B. 冲刺目标
- C. 冲刺章程
- D. 产品积压
- E. 燃尽图

**正确答案：** BD

项目经理负责建造一座桥梁。使用预测方法处理项目的高级元素。负责收回桥梁的软件是根据敏捷原则开发的。在软件开发过程中，由于缺乏信息，工作流经常被各种延迟或障碍打断。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 增加回顾以快速交付结果。
- B. 使用看板让工作可见。
- C. 将小批量工作纳入项目。
- D. 应用精益制造来限制团队的工作。

**正确答案：** B



一位新加入组织的项目经理发现，由于缺乏资源，项目出现了一些延误，因此很可能会错过即将到来的最后期限。项目经理接下来应该做什么？

- A. 审查风险管理计划以确定响应策略。
- B. 将问题上报给发起人并向他们汇报情况。
- C. 查看里程碑列表以确定哪些任务可以快速跟踪。
- D. 组织一次团队会议讨论下一步的行动方案。

**正确答案：** A

项目经理正在跟踪项目，但关键利益相关者不会接受项目的关键绩效指标 (KPI) 结果。项目经理应该使用哪种工具或技术？

- A. 变更控制工具
- B. 专家判断
- C. 专制决策
- D. 上下文图

**正确答案：** D

敏捷团队一直在努力跟上计划的步伐，这经常导致冲刺失败。项目经理应该怎么做才能避免将来出现这种情况？

- A. 切换到看板方法，以先到先得的方式实施功能，培养可持续发展的步伐。
- B. 用更有经验的团队成员替换初级团队成员，协商项目范围以弥补预算缺口。
- C. 要求项目发起人批准加班以弥补绩效的不足，同时调整计划。
- D. 审查团队在过去几个冲刺中的速度并相应地调整计划。

**正确答案：** D

项目经理正在管理一个具有高度不确定性的复杂研究项目。要求实施一种机制来衡量可交付成果的质量。使用混合方法，可以使用哪些技术来实现此目标？

- A. Scrum master 评审和质量看板方法。
- B. 每日 Scrum 和产品负责人质量评估。
- C. 结对工作和客户角色法。
- D. 限时迭代和站立审查会议。

**正确答案：** C

项目团队遵循混合框架进行交付。在项目执行期间，团队了解到必须在任何其他要求之前交付的新合规性要求。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 与合规团队成员合作审查需求的交付并确定其优先级。
- B. 由于技术团队没有任何能力，将新的合规性要求添加到积压中。
- C. 将合规负责人纳入利益相关者列表并等待下一次状态会议。
- D. 要求团队在当前冲刺中包含合规性要求并交付。

**正确答案：** A

一位新的项目经理了解到分配给团队的工作已经分解到最低级别。项目经理审查了工作，并感到缺少一些额外的、有用的信息。项目经理应该审查什么？

- A. WBS 词典
- B. 需求追溯矩阵
- C. 项目章程和范围说明书
- D. 业务需求文件（BRD）

**正确答案：** A

一个项目的编程活动计划每个模块持续 35 天，但第一个模块的编程花费了 45 天。项目经理应该做什么？

- A. 评估情况并确定在不影响基线的情况下压缩进度的方法。
- B. 要求团队加班加点按时完成可交付成果。
- C. 向项目发起人提交变更请求以更改时间表。
- D. 检查范围以验证是否存在范围蔓延并按时完成项目。

**正确答案：** A

营销团队正在过渡到对他们的项目使用混合方法。营销总监不了解混合方法，项目经理需要总监的支持，因为营销总监是关键的利益相关者。

项目经理应该怎么做才能获得支持？

- A. 培训营销团队并让主管了解情况。
- B. 就混合方法指导营销总监。
- C. 请营销组成员辅导总监。
- D. 要求营销总监参加日常会议。

**正确答案：** B

指定项目经理同时为位于不同国家的分支机构部署新的解决方案。每个国家的部署团队将集成和部署该解决方案。项目经理发现每个部署团队都会遇到类似的问题。但是，每个团队分别解决这些问题。

项目经理应该做什么来帮助确保团队之间的更多协作？

- A. 要求项目发起人为部署团队任命新的经理。
- B. 建议一些团队推迟在他们国家的部署。
- C. 要求每个部署团队提供非常详细的时间表和行动计划。
- D. 组织所有部署团队的定期会议，分享问题和解决方案。

**正确答案：** D

一家公司在预测项目方面拥有丰富的经验。项目管理办公室 (PMO) 一直在尝试在项目管理框架内实施迭代工具，并且要求项目经理在他们当前的项目中使用这些工具。迭代工具成功实施后，PMO 要求项目经理确定这些工具给项目带来的收益。

项目经理应该做什么？

- A. 确定项目期间要监控的数据以及预期的绩效和目标。
- B. 更新沟通管理计划以考虑与项目利益相关者举行绩效审查会议。
- C. 准备并向指导委员会提交状态报告以更新绩效监控。
- D. 与利益相关者进行审查，讨论该方法可能对项目带来的潜在好处。

**正确答案：** D

项目经理收到来自项目团队业务分析师的语音邮件。业务分析师表示，内部利益相关者对他们在项目开始前没有被包括在内感到不安。涉众要求增加需求可追溯性矩阵。

项目经理应该如何改善利益相关者关系？

- A. 更新利益相关者参与计划以确保利益相关者包含在项目利益相关者列表中。
- B. 查阅项目范围文件以确保新增内容在范围内。
- C. 让利益相关者在响应请求之前征求更多信息。
- D. 发起项目变更请求，以便变更控制委员会 (CCB) 可以决定它是否在范围内。

**正确答案：** C

开发团队成员位于三个不同的时区。很难找到合适的时间为所有团队成员举行每日站会。项目经理应该做什么？

- A. 放弃每日站会，代之以每日报告。
- B. 让团队成员自己决定是否要参加会议。
- C. 鼓励两到三名团队成员经常举行小型团队会议。
- D. 要求所有团队成员参加每日站立会议，无论会议时间如何。

**正确答案：** D

在项目过程中，一名初级团队成员向项目经理寻求有关风险缓解的指导和建议。项目经理应该如何应对？

- A. 为初级团队成员提供指导并跟进一些发展活动。
- B. 将初级团队成员推荐给制定风险缓解策略的高级团队成员。
- C. 通知初级团队成员降低风险不是他们工作的一部分。
- D. 告诉初级团队成员在经验教训中可以获得这些信息。

**正确答案：** B

一家公司正在实施一个新系统。项目经理已确定最好结合使用 Scrum 和看板方法来完成该项目。产品所有者对如何开始交付所需的功能感到困惑。项目经理应该如何协助产品负责人？

- A. 指导产品负责人如何创建产品待办事项列表。
- B. 讨论项目团队中产品所有者的职责。
- C. 鼓励团队对项目任务进行细分。
- D. 创建工作分解结构 (WBS) 并向产品负责人解释可交付成果。

**正确答案：** A

一个敏捷项目正在进行 16 个迭代中的第 8 个迭代。在最后一次迭代审查之后，团队成员会收到安全部门关于项目必须遵守的法规的反馈。

项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 要求产品负责人将需求包括在产品待办事项列表中。
- B. 向保卫部门询问有关规定的详细信息。
- C. 向利益相关者询问该法规的优先级。
- D. 要求团队成员在下一次迭代中包含需求。
- E. 要求团队成员分析包含此法规的影响。

**正确答案：** *BE*

战略计划的项目经理意识到新的利益相关者对项目感兴趣，并希望确保利益相关者充分了解项目的目的、目的、收益和风险。项目经理应该做什么来提高项目的成功率？

- A. 安排与新利益相关者的会议。
- B. 与新利益相关者共享项目状态报告。
- C. 更新利益相关者参与计划。
- D. 将新的干系人添加到沟通管理计划中。

**正确答案：** *D*

在项目进行过程中，发现了一些阻碍项目前进的障碍。

项目经理应该做什么来消除障碍？

- A. 让项目团队从事其他活动
- B. 实施消除障碍的计划
- C. 上报给项目指导委员会
- D. 优先解决障碍

**正确答案：** *D*

由于不同利益相关者在项目的不同阶段要求进行大量重大变更，因此项目被推迟。如果项目继续沿同一条路径进行，它将花费两倍于计划的时间和预算。

项目经理可以采取哪两项行动来提高成本效益？（选择两项。）

- A. 进行利益相关者分析
- B. 加强团队沟通。
- C. 用新的时间表更新项目管理计划
- D. 采用渐进的方法
- E. 利用团队成员之间的工作

**正确答案：** AD

一位项目经理正在与一个不断错过最后期限的 Scrum 团队合作。指导委员会对该项目表示担忧，因为尚不清楚它能否实现预期价值。经过一些分析，项目经理发现其中一个团队的能力不匹配。

项目经理应该做什么？

- A. 向团队强调在商定的最后期限前完成任务的重要性
- B. 提供适当的培训以弥补不匹配
- C. 更新项目进度以反映延迟
- D. 接受项目因不匹配而错过最后期限的风险

**正确答案：** C

指导委员会已要求一位在敏捷方面经验丰富的项目经理提供中型项目剩余时间的指示。

可以使用哪些工具来提供此信息？

- A. 发布燃尽图
- B. 业务需求文档分析
- C. 剩余用户故事的故事点
- D. 替代测量

**正确答案：** A



一个团队准备开始与一个客户合作的项目，这个客户在过去很难与之合作，因为客户无法准确描述他们想要什么。项目经理应该采取什么方法来消除这个障碍？

- A. 遵循预测方法以获得对每个可交付成果的正式接受
- B. 与产品负责人一起定义最小可行产品
- C. 通过培训加强团队的谈判能力和软技能
- D. 制定和监控一个有截止日期的计划，以减少完成产品的时间

**正确答案：** B

一家为项目供应专用设备的供应商报告说，由于次级供应商的技术问题，可能会延迟交货。为了按时完成，供应商建议用与项目规范中规定的部件不同的类似部件替换次级供应商的部件。项目经理接下来应该做什么？

- A. 接受拟议的更换以保持采购活动正常进行
- B. 坚持按照项目规范使用组件并空运设备以减少延误
- C. 指示供应商使用符合项目规范的零件并更新进度表
- D. 咨询主题专家 (SME) 以查看提议的更改是否可以接受

**正确答案：** D

在会议结束时，职能经理将项目经理拉到一边，代表不清楚自己在项目中的角色和责任的项目团队成员提出一些问题。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 在资源经理的帮助下为项目团队成员制定工作计划
- B. 建议职能经理和项目组成员审查资源管理计划
- C. 告诉职能经理和项目组成员审查项目章程
- D. 要求职能经理为团队成员创建一个具体的负责、问责、咨询和通知 (RACI) 图表

**正确答案：** B

项目经理正在努力了解项目团队在敏捷环境中的绩效。对于相同的工作范围，A 队计算了 100 个故事点，B 队计算了 125 个故事点。哪个团队表现更好？

- A. A 队计算的故事点数比 B 队少
- B. B 队计算的故事点数比 A 队多
- C. 从sprint backlog中选出完成最多石头的队伍
- D. 可交付成果中缺陷最少的团队

**正确答案：** D

在项目实施阶段，新任命的团队负责人与项目经理接洽，核实团队的任务和进度。由于组长缺乏管理经验，工作没有按计划进行。这可能会导致项目延误。

项目经理应该做什么？

- A. 要求人力资源总监任命一名高级团队负责人
- B. 通知项目发起人可能的延迟
- C. 直接管理项目团队，避免项目延误
- D. 为新任命的团队领导提供指导

**正确答案：** D

到上一次迭代结束时，公司 A 的项目已在范围、进度和预算内成功交付。然而，在项目庆祝仪式上，一位业务利益相关者表示，他们认为该项目失败，因为它没有增加任何业务价值。

项目经理应该怎么做才能避免这种看法？

- A. 让业务干系人参与冲刺评审
- B. 与发起人和主要利益相关者一起定义产品待办事项优先级以实现业务利益
- C. 对主要利益相关者进行了结束调查
- D. 确认已制定沟通管理计划，让业务利益相关者了解成功

**正确答案：** B

项目经理与外部利益相关者会面，解释目标并概述对新项目的期望。一个关键的利益相关者似乎支持该项目，条件是其他不相关的项目将获得资金支持。由于文化敏感性，项目经理不愿意就此问题直接与主要利益相关者沟通。没有该利益相关者的支持，项目无法进行。

项目经理应该做什么？

- A. 在不允许发生范围蔓延的情况下继续项目
- B. 使用应急资金为请求的项目提供支持
- C. 由于利益相关者的请求超出范围而取消项目
- D. 通知发起人并将请求记录在利益相关者参与计划中

**正确答案：** D



建筑项目的主要利益相关者一直在现场花费大量时间并打断了团队的工作。  
在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 努力了解主要利益相关者的担忧并在定期项目状态报告中提供反馈
- B. 安排一次临时会议，解决关键利益相关者对团队成员的担忧
- C. 与关键利益相关者一起强调项目正在按计划执行
- D. 将情况上报给项目发起人，因为关键利益相关者的行为正在影响进度

**正确答案：** A

项目的利益相关者以容易激怒和对项目不合理的困难而闻名。项目经理希望将利益相关者的行为对开发团队的影响降至最低。  
项目经理应该为他们的团队选择什么样的培训来帮助解决这种情况？

- A. 沟通训练
- B. 谈判训练
- C. 情商训练
- D. 敏捷训练

**正确答案：** C

一家公司正在使用预测方法来开发范围管理计划中定义的特定组件。由于监管要求经常变化，开发团队要求使用敏捷方法。  
项目经理应该如何处理开发团队的要求？

- A. 升级额外财政资源的请求
- B. 将请求转发给项目管理办公室 (PMO) 以修改组织过程资产
- C. 要求项目发起人批准实施新方法
- D. 分析要求的方法下需要解决的要求

**正确答案：** B

在每日站立会议期间，提出了一个阻碍一名团队成员继续工作的障碍。项目经理发现这是由于技术问题。  
项目经理应该做什么来确定这个关键障碍的优先级？

- A. 为团队成员解决问题。
- B. 进行头脑风暴会议以解决问题并将解决方案添加到冲刺中。
- C. 将问题上报给软件供应商以寻求技术解决方案。
- D. 指导团队提出自己的解决方案并将其添加到下一个冲刺中。

**正确答案：** D

正在执行一个项目。项目的生命周期被定义为可预见的；但是，主要的可交付成果将逐步移交给客户。分配的资源经验丰富且可靠，并且愿意做出项目经理过去在其他项目的每次增量交付后做出的决定。

项目经理应该做什么？

- A. 安排指导委员会会议并获得他们对请求的批准
- B. 支持团队的决策，将决策责任转移给他们
- C. 通知团队，虽然这是一个混合环境，但项目经理仍然必须负责决策
- D. 咨询产品负责人关于让资源做决定

**正确答案：** D

在与主要利益相关者一起审查项目管理计划后，项目经理被告知 18 个月的发布计划是不可接受的，产品应在六个月内推出。基于新的时间表，项目经理应该做什么？

- A. 计划加班，应用崩溃和快速跟踪，并与项目利益相关者分担失败风险
- B. 审查项目积压工作以寻找高优先级项目并提出符合预期时间表的最小可行产品 (MVP)
- C. 寻求发起人批准将项目预算增加三倍，雇用更多人员以补偿压缩的进度
- D. 与利益相关者一起回顾关键路径，解释为什么不可能在预期的时间表内交付所有范围

**正确答案：** B

研发部门正计划开发一种产品，为组织引入新的业务线。项目经理应该怎样做才能增加项目成功的机会？

- A. 计划一次工作会议，重点关注倡议的范围、愿景和使命
- B. 根据项目管理办公室 (PMO) 提供的先前项目模板开始制定项目管理计划
- C. 进行基准测试以确定该计划的商业可行性
- D. 对新计划进行影响分析以确定项目应如何展开

**正确答案：** A

产品所有者决定在几次发布后推出产品，因为他知道最小可行产品 (MVP) 缺少某些功能。主要利益相关者之一，即营销副总裁，对结果不满意并质疑发布决定。

项目经理应该做什么？

- A. 支持产品负责人的决定，并寻求与利益相关者更好地保持一致，以避免将来出现此类问题
- B. 在决策过程中指导团队，假设产品发布采用风险规避策略
- C. 承担产品发布的责任，最后决定何时为客户发布做好准备
- D. 将问题上报给赞助商，质疑关键利益相关者对产品发布决策的权威

**正确答案：** D

在项目执行之初，项目经理发现关键资源将在两周内不可用，这可能会导致进度延误。项目经理首先应该做什么？

- A. 将任务分配给另一个资源，并要求该资源双班工作
- B. 更新时间表以反映项目持续时间的变化
- C. 要求人力资源 (HR) 更换，并更新风险登记册
- D. 相应地更新资源管理计划和资源分配表

**正确答案：** D

变更控制委员会 (CCB) 拒绝主题专家 (SME) 提交的变更请求。SME 拒绝接受此拒绝，并且不想在没有更改的情况下继续该项目。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 要求申办者先批准变更请求
- B. 提交前评估变更对项目的整体影响
- C. 确保变更请求与项目范围保持一致
- D. 直接向建行提交变更请求

**正确答案：** B

一家食品公司正在使用预测方法开发新产品，该产品目前正处于测试阶段。鉴于测试反馈的性质，项目经理决定使用迭代方法。在其中一次迭代结束时，将制定与产品相关的新法规。项目经理接下来应该做什么？

- A. 提出关于项目范围的变更请求以确保合规
- B. 包括评估以在下一次迭代中验证合规性
- C. 进行迭代审查以应对新法规
- D. 重新开始测试，使试验适应新法规

**正确答案：** C

一位项目经理正在为一家大公司管理一个创新项目。项目经理计划使用电子邮件作为主要沟通渠道；但是，产品所有者更喜欢使用另一种认可的通信工具而不是电子邮件。项目经理应该做什么？

- A. 联系发起人，请求有关项目团队使用的沟通工具的指导
- B. 根据产品负责人的喜好更新沟通管理计划并分发给团队
- C. 建议团队开始使用产品负责人建议的沟通工具
- D. 要求产品负责人使用电子邮件，因为使用其他工具会增加工作量

**正确答案：** B

客户的项目经理在项目的最后阶段发生变化。  
项目经理如何避免项目关闭延迟？

- A. 更新利益相关者参与计划
- B. 审查最新的项目状态报告并更新利益相关者
- C. 将案例上报给客户的管理团队
- D. 提前向客户开具工程款发票

**正确答案：** A

在一家工业厂房中，所有者决定通过安装新机器和更新生产中使用的软件来增加工厂的产能。这种产能扩大将在工厂仍在运转和生产时发生。软件更新将使用敏捷方法完成，以将风险降至最低。机器采购、安装和集成将使用预测方法完成。  
项目经理必须将哪些类型的沟通设计到进度管理计划中以确保项目如期进行？

- A. 每周与相关利益攸关方在同一地点举行会议
- B. 与相关利益攸关方的双周电话会议
- C. 每周与每个相关利益相关者进行一对一的会议
- D. 相关利益攸关方的双周书面状态报告

**正确答案：** B

在审查项目的可交付成果清单期间，一位利益相关者表示担心其中一项要求不会得到满足。  
项目经理应该做什么？

- A. 检查批准的需求清单，看是否有遗漏的项目
- B. 与利益相关者一起改进需求的验收标准
- C. 与相关干系人一起审查需求可追溯性矩阵
- D. 与利益相关者讨论应添加哪些附加要求

**正确答案：** C

在项目执行期间，在每次项目团队会议上，项目经理和一名团队成员之间都会发生冲突。持续的冲突阻碍了任务和可交付成果的完成。项目经理考虑改变他们的领导风格。  
项目经理应该做什么？

- A. 与团队成员一起审查职责集
- B. 避开团队成员以防止进一步的冲突
- C. 将情况上报给项目发起人
- D. 审查人员技能文件

**正确答案：** C

一个新组建的团队已经习惯了敏捷实践。项目负责人注意到，虽然他们的表现符合预期，但许多团队成员对日常团队实践感到厌烦。

在这种情况下，项目负责人应该怎么做？

- A. 挑战团队寻找新的方法来实现更高水平的绩效以改善情况
- B. 与个别团队成员交谈，确定他们想做什么来改善团队的情况
- C. 让团队将情况告知高级管理层并征求建议
- D. 允许团队自我组织，让他们在回顾会议中分析情况并自我纠正

**正确答案：** D

一家公司开始实施 Scrum。大约在第一个冲刺进行到一半时，出现了沟通问题。一些项目团队成员与其他团队成员不同步。造成这种沟通差距的原因是什么？

- A. 项目冲刺板还没有更新
- B. 没有举行或强制执行每日站会
- C. 项目状态仪表盘没有更新
- D. 沟通管理计划尚未制定

**正确答案：** A

在项目过程中，项目经理的直属主管在项目经理不知情的情况下直接与客户沟通以批准变更。这在项目团队中造成了混乱，因为范围在后台发生变化，但只在项目会议中被提及。

项目经理应该如何处理这个问题？

- A. 直接与主管沟通并告知他们沟通管理计划
- B. 直接与客户沟通，说明任何范围变更都必须通过项目经理
- C. 审查利益相关者参与计划并相应地采取任何现有行动
- D. 与项目团队讨论问题，让他们知道项目经理将处理范围变更

**正确答案：** A

由于时间限制，项目发起人通常会要求项目经理跳过项目回顾。然而，项目经理坚持通过减少准备和讨论的时间来举办这个关键的仪式。

项目经理的这些行为可能导致哪两个问题？（选择两项。）

- A. 大量讨论没有结果或可能产生太多结果
- B. 车间团队缺乏方向和动力
- C. 不考虑从其他团队吸取的教训
- D. 回顾研讨会的时间管理计划不更新
- E. 关注负面因素，对进一步改进不感兴趣

**正确答案：** AC

客户被构造为敏捷项目的矩阵组织。项目经理在现场与来自组织不同部门的主要利益相关者一起工作。项目经理应该如何处理不同的利益相关者？

- A. 所有利益相关者都很重要，因此项目经理应遵循管理层和主要利益相关者提供的指示
- B. 因为有不同的观点，进行利益相关者分析并根据结果采取行动
- C. 项目经理在客户的场所工作，因此请遵循所有主要利益相关者的指示
- D. 这是一个敏捷项目，所以只听项目经理的主管和组织职能经理的指示

**正确答案：** B

一位项目经理正在领导一个处于早期阶段的内部公司项目。当前的这个项目类似于一年前结束的另一个项目。项目经理应该如何分析相关利益相关者？

- A. 降低利益相关者参与的优先级，因为利益相关者已经了解此类项目
- B. 将以前项目的经验教训作为当前项目利益相关者登记册的指南
- C. 参考之前项目的利益相关者登记册，因为它与当前项目相似
- D. 在风险登记册中记录当前项目可能有与先前项目不同的利益相关者

**正确答案：** B

一位产品负责人向团队提交了积压工作，由于各种障碍，团队对实现某些功能提出了担忧。项目经理应该建议产品负责人下一步做什么？

- A. 确保根据最高价值的特征捕获障碍并确定障碍的优先级
- B. 估计障碍的财务影响并申请额外资金
- C. 开始消除障碍，从最简单的开始，培养团队素养
- D. 捕捉障碍并通知管理层需要他们的帮助来解决障碍

**正确答案：** A



一家公司获得了一个位于危险地点的项目，该项目给员工带来了多项高风险。需要帮助培训员工了解主要的安全和健康因素。该项目正在进行中，并使用混合方法。该项目将在多个站点进行，同时进行多个开发迭代。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 分配和使用部分项目应急储备用于培训目的
- B. 就医疗和安全支持服务与地方当局谈判合同并建立合作伙伴关系
- C. 回顾并更新有关培训必要预算的风险登记册和资源管理计划
- D. 只雇用了解该地区危险的当地资源，为当地社区提供就业机会

**正确答案：** C

供应商通知项目经理，关键资源将长期休假。项目团队审查了待定的供应商可交付成果并确定了替代解决方案，但该解决方案将产生额外成本。该项目目前按计划进行，略低于预算。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 请求替换资源
- B. 进行成本效益分析
- C. 实施风险应对
- D. 执行综合变更控制

**正确答案：** D

项目经理刚刚开始管理敏捷项目。项目经理意识到，由于缺乏明确的项目目标定义和完成定义 (DoD)，他们同事的项目遇到了很多困难。赞助商不断要求更多功能，但项目尚未完成。

项目经理应该怎么做才能避免这些问题？

- A. 安排会议以确保完成项目的每一项必要任务都包含在项目管理计划中
- B. 说服项目发起人聘请质量专家，以便对产品进行测试并在完成时验收
- C. 说服产品负责人接近团队并寻找解决问题的方案
- D. 安排与主要利益相关者的会议以建立敏捷项目章程并为项目设定明确的期望

**正确答案：** D

董事会成员是对组织很重要的项目的发起人。该利益相关者有许多其他优先事项，目前未参与项目活动。利益相关者应该如何参与项目？

- A. 让利益相关者了解情况并根据他们的需要与他们协商
- B. 让利益相关者参与治理和决策制定
- C. 与利益相关者协商并提高他们的兴趣水平
- D. 利益相关者需要了解项目进展

**正确答案：** D

一个营销团队正在计划一项多年计划，其中将包括许多跨职能的利益相关者。项目经理已被指派，现在正处于项目规划阶段。项目经理应该首先开发什么项目？

- A. 产品待办事项列表和要交付的功能的标识
- B. 商业案例和范围文件
- C. 满足团队需求的沟通管理计划
- D. 纳入已知风险的风险管理计划

**正确答案：** C

一个关键的项目利益相关者对复杂敏捷项目的开始表现出兴趣，但由于额外的责任，随着冲刺的进展，参与度降低了。几个冲刺之后，关键利益相关者拒绝了一个可交付的功能。团队正在为下一个 sprint 重新处理被拒绝的可交付成果。项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 让主要利益相关者参与决策过程
- B. 基于利益相关者需求的定制利益相关者沟通
- C. 分析利益相关者属性的变化
- D. 记录项目远景和目标

**正确答案：** A

作为组织变更管理团队的成员，项目经理必须将任何变更传递给项目团队。项目经理需要避免任何误解或阻力，以帮助确保项目团队支持任何组织变革。项目经理应该做什么？

- A. 与抵制成员召开会议，促进项目顺利实施
- B. 定期与团队会面以确保他们了解变化
- C. 影响团队沟通任何变化
- D. 检查团队成员是否愿意改变

**正确答案：** B



项目经理正在从事软件开发项目。一位团队成员抱怨说，由于项目任务非常简单，因此没有理由进行质量控制。项目经理明白，从项目中删除质量管理计划也有助于节省资金，这对客户来说很重要。

项目经理应该做什么？

- A. 将在没有质量管理计划的情况下启动项目注册为风险，并将预算节余分配到管理储备中
- B. 制定质量管理计划，因为质量与成本和进度管理同等重要
- C. 从管理层确认团队成员有足够的经验来构建没有质量控制的软件
- D. 要求客户在接受项目可交付成果后进行外部质量审核，降低项目预算

**正确答案：** B

营销团队正在构想以改造现有产品。营销主管与项目经理联系，以确保已采取必要措施以成功启动。

项目经理应该关注什么？

- A. 确保团队也关注整体变革管理计划
- B. 确定和调整有助于评估成功交付的绩效指标
- C. 规划定期项目更新以涵盖关键可交付成果的状态
- D. 确保范围管理计划到位以涵盖所有相关目标

**正确答案：** B

在收尾过程中，项目经理了解到一项可交付成果没有满足客户的期望。

项目经理应该如何进行？

- A. 要求客户随信息发出变更请求，分析并提供解决方案
- B. 审查可交付成果要求，检查客户批准标准，并据此进行
- C. 与客户会面，就双方都满意的可交付成果范围达成一致
- D. 联系项目发起人并寻求帮助与客户协商项目结束

**正确答案：** B

一家产品公司正在转变其在市场上开发和发布产品的方式。高管们认为这是一个高风险的举措，而且这个举措必须要成功。

在这种情况下，项目经理应该做什么？

- A. 为新模型开发一个包含假设的商业案例
- B. 制定沟通管理计划，让员工了解新的商业模式
- C. 采用迭代推出方法，尽早交付最高业务价值
- D. 制定具有明确可交付成果的详细冲刺计划

**正确答案：** C

全球项目的项目管理计划获得批准两周后，项目经理注意到它是基于国际利益相关者不同层次的理解而获得批准的，而不是项目经理提交批准的内容。

项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？

- A. 启动会议后将会议纪要发送给利益相关者
- B. 启动会结束后立即审核所有批文
- C. 为每种文化和时区召开单独的启动会议
- D. 在启动会议期间验证每个利益相关者的理解

**正确答案：** D

新财务系统的推出正处于执行阶段。上个月出现的一些问题正在减慢项目的速度。一个新的项目发起人最近开始在公司工作，但还没有时间与项目经理会面。该项目正处于问题严重影响项目交付的地步。

项目经理应该如何提醒新项目发起人这些问题？

- A. 向项目发起人发送电子邮件邀请参加所有项目团队的每周会议，并希望发起人抽空参加
- B. 向项目发起人发送电子邮件，总结项目状态和关键问题，并要求立即召开面对面会议进行讨论
- C. 继续通过电子邮件发送突出关键风险和问题的更新项目状态报告，并等待项目发起人要求会面
- D. 完成概述延误和影响的风险分析，并通过电子邮件发送风险登记册的副本，敦促项目发起人做出回应

**正确答案：** B

项目经理在混合项目中充当 scrum master，并处理团队成员之间的冲突。

应该使用什么策略来处理这种冲突？

- A. 将冲突分为两类：积极的和消极的
- B. 将冲突分为两类：结构性冲突和人际冲突
- C. 将冲突放在共享冲突列表中并确保它可见
- D. 在日常 Scrum 中审查冲突，以便及时处理

**正确答案：** A

一个新的敏捷团队正在组建，项目经理注意到该团队在许多领域都举步维艰。团队正在经历无法满足迭代承诺和团队成员冲突的问题。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 在回顾中提出问题并提出解决方案
- B. 通知管理层承诺不会兑现
- C. 让管理层参与以帮助解决冲突
- D. 对整个团队和个人进行指导

**正确答案：** D

资源管理计划已经完成，团队分布在全球不同的国家。团队成员身处多个时区，他们使用不同的语言进行交流。项目经理需要使团队保持井井有条，避免可能对项目产生负面影响的误解和沟通不畅。

项目经理应该怎样做才能减少对项目的负面影响？

- A. 修改沟通管理计划以考虑地区差异
- B. 举办文化意识研讨会
- C. 举行虚拟会议讨论政治环境
- D. 进行多代管理培训课程

**正确答案：** A

在设计阶段，项目经理意识到项目将受益于使用自适应工具。这种方法的有效性已在组织内过去的项目中得到证明。

项目经理首先应该做什么？

- A. 更新项目文档以包括自适应工具和工件并计划第一次迭代会议
- B. 联系项目发起人并请求熟悉适应性项目的新团队成员
- C. 在向项目引入自适应工具和工件之前确认团队能力
- D. 冻结设计阶段并寻找外部资源以额外成本运行迭代设计

**正确答案：** C

项目经理领导的项目显示出超过成本基准的趋势。

项目经理应该首先做什么来管理预算？

- A. 请求项目发起人帮助使预算回到正轨
- B. 与项目团队会面，分析实际成本以确定偏差
- C. 通知利益相关者项目将超出预算完成
- D. 发出变更请求，包括增加预算的分析

**正确答案：** B

在项目规划期间，两位职能经理对一项可交付成果的关键特征意见不一。项目经理发现每位经理都包含了相互矛盾的要求。职能经理不想为了寻找解决方案而见面。这种情况已上报给要求与他们会面的发起人。

项目经理应该在会议中使用什么策略来解决这个冲突？

- A. 向经理解释项目中正在考虑实施相互矛盾的要求
- B. 向经理说明两个需求只能实现其中一个，并提交变更请求
- C. 确保两位经理都了解需求并寻找最能满足此可交付成果的解决方案
- D. 要求经理解释每项要求必须实施的原因，并综合考虑成本和收益来决定

**正确答案：** C

项目经理接近项目尾声，几项任务现已基本完成并准备移交给客户。

项目经理应该如何进行？

- A. 更新整体项目的质量管理计划
- B. 要求客户对已经完成的任务进行验证和验收
- C. 关闭已完成的项目任务
- D. 更新整个项目的沟通管理计划

**正确答案：** B

在对一家国际公司进行文档审核期间，发现项目进度表的最新版本是一个月前的，尽管项目经理知道它是最近更新的。

项目经理应该如何处理项目文档？

- A. 定期更新项目管理计划并与所有利益相关者安全共享
- B. 指派一名项目团队成员以确保更新所有项目文档
- C. 审查风险登记册以确定审计响应计划
- D. 在项目管理信息系统 (PMIS) 中保存文档，并与适当的利益相关者共享

**正确答案：** A

已批准一项新法规，该法规将影响项目第四阶段的可交付成果。交付采用迭代方法，目前正在完成第二阶段。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 与项目发起人协商讨论成本增加
- B. 获得新规例外实施的批准
- C. 从指导委员会获得额外预算的批准
- D. 与主题专家 (SME) 会面以了解对目标的影响

**正确答案：** D

这些表格显示了敏捷项目的要求，具有预期的投资回报 (ROI) 和已识别的项目风险，以及分析细节。

| Item          | Priority | ROI (\$) |
|---------------|----------|----------|
| Requirement 1 | 1        | 10,000   |
| Requirement 2 | 1        | 8,000    |
| Requirement 3 | 1        | 25,000   |

| Risk   | Risk Impact (\$) | Risk Probability |
|--------|------------------|------------------|
| Risk 1 | 5,000            | 75               |
| Risk 2 | 4,000            | 50               |
| Risk 3 | 20,000           | 45               |

产品待办事项列表中的优先顺序应该是什么？

- A. 风险 3、风险 1、风险 2、要求 3、要求 1、要求 2
- B. 要求 3, 风险 3, 要求 1, 要求 2, 风险 2
- C. 要求 3、要求 1、要求 2
- D. 要求 3、要求 1、风险 3、要求 2、风险 1、风险 2

正确答案： D

由于供应商和项目经理之间的沟通不畅，缺少可交付成果所需的主要输入之一。由于错过了可交付成果，项目的关键路径被延长了。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 开始审核供应商的流程和程序
- B. 回顾从以前与该供应商的项目中吸取的教训
- C. 对项目过程中的供应商问题进行详细分析
- D. 执行应急计划来解决供应商的问题

正确答案： C

在项目的设计阶段，项目经理注意到进度绩效指数 (SPI) 为 1,8，成本绩效指数 (CPI) 为 0,1。在与最高管理层的每周例会中，项目经理报告了对这些指标的担忧。然而，最关心的是项目发起人，他表示，如果这种趋势持续下去，他们将被迫提前关闭该项目。

项目经理应该做什么？

- A. 监督项目发起人，但明白在项目的设计阶段花更多的钱是正常的
- B. 停止破坏时间表
- C. 密切管理项目发起人并修订项目的资源管理计划以改进指标
- D. 使用资源均衡技术

正确答案： B

一位新的项目经理正在为一家位于不同国家的公司规划一个信息安全项目。  
项目经理在收集客户需求时应该采取的第一步是什么？

- A. 进行利益相关者分析以确定区域政策如何影响需求
- B. 要求利益相关方独立分析并达成共识
- C. 与相关利益相关者举办项目范围审查研讨会
- D. 与相关利益相关者在一个地点举行项目规划会议

**正确答案：** A

一家公司的项目管理办公室 (PMO) 一直在尝试在项目管理框架中实施自适应方法，项目经理被要求在他们的下一个项目中使用自适应工具。这不是第一次提出请求，之前的项目在实施自适应工具时失败了。  
项目经理应该做什么？

- A. 准备变更请求并寻求指导委员会对新项目框架的批准
- B. 与主要利益相关者进行单独访谈以了解所有问题，然后准备沟通管理计划
- C. 引入第三方公司为此特定项目开发和实施混合框架
- D. 向 PMO 建议现在不是开始在项目中实施自适应工具的合适时间

**正确答案：** C

为了估算与去年实施的项目类似的新项目的成本，项目经理会见了前一个项目的专家组。该小组使用三点估计技术。项目经理将估算的预算提交给项目发起人批准。新来公司的项目发起人很担心，因为预算超出了他们的预期。  
项目经理应该做什么？

- A. 审查组织过程评估以确定预算估计中是否考虑了应急储备
- B. 回顾去年项目的历史信息和经验教训，以证明新概算的合理性
- C. 将预算编制技术改为更准确、自下而上的成本估算
- D. 使用软技能来说服项目发起人批准新的预算估算

**正确答案：** B

项目经理难以获得项目需求的批准，因为项目干系人之间存在分歧。这个问题使项目进度面临风险。  
项目经理应该首先做什么来促进项目需求的批准？

- A. 审查项目章程
- B. 进行利益相关者分析
- C. 确定分歧的根源
- D. 举办团队建设活动

**正确答案：** C



项目经理已分配给项目并从项目管理办公室 (PMO) 收到项目章程。该文档非常清楚客户的要求。在项目范围管理期间，一些要求似乎与项目章程中指定的要求不同。

项目经理应该做什么？

- A. 为项目范围的微小影响变更修改项目基线
- B. 使用焦点小组和头脑风暴会议来收集有关项目范围的更多详细信息
- C. 在配置管理计划中登记变更并将其发送给变更控制委员会 (CCB)
- D. 向发起人解释这些请求可能危及项目的进度和成本

**正确答案：** D

敏捷项目经理希望将需求文档转换为史诗、功能、特性和故事。

项目经理应该在多少次迭代中估计故事的持续时间？

- A. 四次迭代
- B. 一次迭代
- C. 两次迭代
- D. 三次迭代

**正确答案：** B

一个敏捷项目正在运行八个迭代中的第五个迭代。在最后一次迭代计划之后，团队被告知市场上有一个新的竞争对手，必须加快行动以确保不错过市场份额。

项目经理应该做什么？

- A. 将竞争对手的功能添加到产品积压中以改进产品
- B. 要求发起人增加团队成员
- C. 帮助团队尽快找到新的上线方式
- D. 要求团队加快速度，尽快推出产品

**正确答案：** C

在产品开发期间，项目经理观察到项目利益相关者之间的冲突，导致可交付成果和输出批准延迟。

项目经理应该关注哪个领域？

- A. 重新审视项目管理计划以确保按时交付
- B. 增加项目更新会议的频率，让利益相关者了解情况
- C. 重新审视利益相关者参与计划，关注特定被忽视的利益相关者
- D. 审查业务案例并确定范围内的差距

**正确答案：** C

在运营职能部门执行项目期间，项目经理会遇到范围变更和关键任务交付延迟的情况。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 在每周项目报告中将问题传达给项目管理办公室 (PMO)
- B. 召开团队会议来决定是否应该包括变更
- C. 发起变更请求修改范围和调整时间线
- D. 进行影响分析并将结果提交指导委员会批准

**正确答案：** D

项目速度最近有所下滑，因此决定跳过测试以增加动力并使项目重回正轨。作为这个决定的结果，项目经理需要关注什么？

- A. 燃烧率增加
- B. 成本增加
- C. 技术债务增加
- D. 效率降低

**正确答案：** C

在项目执行过程中，项目经理注意到工作绩效报告在不到两周的时间内急剧恶化。A 国的项目团队抱怨 B 国的假期造成的延误影响了他们的项目团队。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 实施速成压缩进度，提高进度绩效指数（SRI）。
- B. 实施快速跟进，压缩进度，提高SPI
- C. 使用项目的资源管理计划执行冲突管理。
- D. 审查风险管理计划以评估这些延误的可能性和影响

**正确答案：** C



在日常通话中，团队成员共享任务进度。一个团队成员通常不会传达很多细节，并且有关键任务要完成。所有团队成员都位于不同的国家，关键工作即将开始。

在这种情况下，哪两个选项对项目经理有帮助？（选择两项。）

- A. 鼓励所有团队成员使用虚拟工作空间
- B. 要求团队发送包含详细任务进度的电子邮件
- C. 与团队成员讨论他们的参与度并采取适当的行动。
- D. 将工作重新分配给参与日常通话的资源
- E. 向职能经理报告团队成员表现不佳

**正确答案：** CE

项目经理正在实施一个新的软件系统。一些部门工作人员质疑变革的必要性，并认为新系统会阻碍他们当前的流程。项目经理在项目开始时应该做什么来防止这种阻力？

- A. 创建了一个沟通管理计划，概述了与利益相关者沟通的方法
- B. 确保公司文化在接受项目之前鼓励改变
- C. 鼓励领导与通常抵制变革的部门讨论变革
- D. 让公司各级利益相关者参与进来，让每个人都了解变革

**正确答案：** D

项目经理的团队成员之一正在不断改进。该团队成员一直是组织中其他人的榜样和导师。项目经理应该如何认可该团队成员的承诺？

- A. 派这个人去开会与客户协商范围
- B. 欣赏该团队成员在整个项目生命周期中的表现
- C. 在这个项目完成后将这个团队成员提升为教练角色
- D. 将其记录在团队成员的年终绩效评估中

**正确答案：** D

在项目的规划阶段，项目经理意识到标准的利益相关者参与方法是不够的。一位不是关键决策者的客户代表非常固执己见。该客户代表可能会因为他们在会议期间被认为的权威级别而成为进步的障碍。

项目经理应该如何处理这一进展？

- A. 要求只有关键决策者参加项目会议。
- B. 更新项目进度表以迎合这个特定的利益相关者。
- C. 在关键决策会议之前分配时间以获得利益相关者的支持。
- D. 更新风险登记册以考虑可能的项目影响。

**正确答案：** C

该市已决定建造一个新的电车站。该项目将包括各种方法。建设和基础设施工作将使用预测生命周期完成，而软件将使用迭代生命周期开发。一些抵制该项目的邻居一直要求市长停止该项目，并威胁要采取法律行动。

项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 与施工团队讨论将新火车站搬迁至其他地点的备选方案
- B. 在城市网站上发布有关新电车站带来的好处的信息
- C. 与市长会面并解释新火车站对城市的重要性
- D. 与邻居定期会面以获得他们对项目的支持
- E. 将这种情况登记为风险并制定缓解计划

**正确答案：** BD

在启动新的虚拟团队时，项目经理应该考虑哪两项行动？（选择两项。）

- A. 招募组织内最好的资源成为虚拟团队的一部分
- B. 评估项目经理作为虚拟团队领导者自身的优势和劣势，以确定可避免的陷阱
- C. 确定每个工作包或活动所需资源的类型和数量
- D. 从一开始就确定如何监控进度以及沟通进度的最佳方式
- E. 验证团队成员是否在一个以上的团队中并且不能为这个团队投入足够的时间

**正确答案：** DE

需要交付投资组合积压中的重要项目。需要预算估算来确定项目的优先级。  
应该如何估算项目预算？

- A. 项目被分解为特征，并根据特征值和团队的速度，团队提供估算
- B. 预算估算是根据发起人、产品负责人和团队协调人的经验提供的
- C. 团队协调员使用历史数据并根据项目的性质得出估算。
- D. 产品负责人获得所有项目细节，并根据团队的经验和速度提供预算估算

**正确答案：** B

在一个有多个供应商的项目结束时，项目经理正在审查关闭过程并发现未预料到的财务余额。  
什么可以帮助项目经理理解为什么会发生这种情况？

- A. 项目审核
- B. 经验教训
- C. 组织过程资产
- D. 采购审计

**正确答案：** A

一个新的项目经理被分配到项目实施的中途。在第一次风险审查会议期间，项目经理注意到项目团队成员使用的风险登记册版本与项目经理使用的版本不同。  
项目经理应该怎么做才能避免这个问题？

- A. 参考沟通管理计划
- B. 验证问题日志
- C. 验证项目工件
- D. 进行专家判断

**正确答案：** C

在项目执行期间，项目经理发现工作范围中缺少一个关键的可交付成果。经过调查，项目经理和团队发现，缺失的可交付成果会影响关键路径。  
项目经理应该怎么做才能避免未来的延误？

- A. 提交变更请求。
- B. 向项目添加额外资源
- C. 更新工作范围
- D. 审查风险管理计划

**正确答案：** C

在上一次 sprint 评审期间，mam 利益相关者抱怨产品缺少他们一直期待的许多功能项目团队认为每个增量都符合验收标准并得到 mam 利益相关者的批准项目的成本绩效指数 (CPI) 是1 15 进度绩效指数 (SPI) 为 1.43 项目经理应该做什么？

- A. 要求项目团队进行修改，因为项目预算和进度可以支持他们。
- B. 要求利益相关者提交变更请求以增加所请求修改的预算和时间。
- C. 向利益相关者解释，由于满足每个增量的验收标准，项目可以关闭。
- D. 分析与双方理解存在差距的原因，协商解决办法。

**正确答案：** D

项目团队的一些成员对以前在 Scrum 环境中工作的新团队成员感到沮丧。这位新的团队成员每天都与项目团队的成员接触，这似乎是为了参加个人站立会议。  
项目经理应该做什么？

- A. 为项目团队安排一次会议来审查沟通管理计划。
- B. 告诉项目团队的其他成员继续与新团队成员讨论。
- C. 向项目团队发送电子邮件，概述沟通策略。
- D. 指导新团队成员了解项目团队正在使用的方法。

**正确答案：** A

一个组织正在向敏捷过渡，并且已选择一个项目作为试点。指定的项目经理只有使用预测方法的经验，但项目经理现在需要在敏捷教练的帮助下使用敏捷方法。在第五次冲刺的回顾中，项目团队抱怨组织存在许多障碍，导致项目延迟和返工。  
在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 在每日站立会议中包括障碍解决方案
- B. 在站立会议期间进行根本原因分析
- C. 创建一个专门的冲刺来解决与团队的障碍
- D. 促进协作以帮助消除团队障碍

**正确答案：** D

组织历来使用预测方法执行大多数项目。该组织现在希望转变为敏捷方法。  
哪种策略将有助于有效地帮助组织为这一变革做好准备？

- A. 建立一个每天监控敏捷项目的高管工作组。
- B. 添加多层负责敏捷执行的经理。
- C. 通过解决组织中敏捷的障碍来提高组织准备。
- D. 采取大爆炸式方法，立即将整个组织转向敏捷。

**正确答案：** C

集成项目涉及硬件和软件的交互，发起人已批准进度管理计划。项目团队评估了产品的功能可行性和加速测试。作为服务型领导，项目经理应该做什么？

- A. 必要时支持团队寻找最小可行产品 (MVP)。
- B. 修改项目预算以包括 MVP 测试。
- C. 向项目发起人提交变更请求以进行加速测试。
- D. 按进度开发产品，进行集成和测试。

**正确答案：** C

项目章程刚刚获得批准，项目发起人已准许继续进行该项目。项目经理已确认另一个项目同时也需要所请求的关键资源之一。这将影响项目交付。项目经理应该做什么？

- A. 向关键资源支付加班费以在工作时间以外完成工作
- B. 与另一个项目的项目经理会面，找到对两个项目都适用的资源优化解决方案
- C. 与客户交谈，看看项目交付截止日期是否可以因资源可用性而延迟
- D. 与项目经理讨论将这个项目优先于其他项目，以便关键资源可用

**正确答案：** B

项目经理了解到项目发起人对项目需求的开发不满意。为了使项目符合发起人的期望，项目经理应该做什么？

- A. 与团队一起审查项目目标图
- B. 进行利益相关者评估
- C. 确认团队应该使用哪些模板
- D. 审查风险管理计划

**正确答案：** A

在回顾仪式上，敏捷团队正在谈论产品所有者的期望没有得到满足。项目经理在项目开始时应该做什么？

- A. 定义了在建待办事项列表中预期的敏捷团队贡献
- B. 评估敏捷团队的能力并计划所需的培训
- C. 定义团队基本规则和共享项目愿景
- D. 向团队清楚地传达了项目愿景和冲刺目标

**正确答案：** D

一个项目的交付时间非常紧迫。项目临近交付日期，项目发起人经常向项目经理发送警报以避免任何进度延误。到目前为止，项目团队的绩效一直处于可接受的水平，但项目经理希望确保团队的绩效水平一直保持到最后。项目经理应该采取什么行动来激励项目团队的绩效？

- A. 向团队成员发送正式通知，指示他们保持绩效
- B. 雇用一些临时团队成员来帮助完成额外的工作
- C. 颁发感谢状以鼓励团队
- D. 告知团队来自项目发起人的交付压力

**正确答案：** C

项目进度落后，项目经理观察到项目团队似乎将大部分时间用于编写文档而不是执行项目任务。项目经理应该做什么来帮助确保团队专注于项目任务？

- A. 指派一名团队成员处理文档活动
- B. 指导项目团队完成项目文档化活动
- C. 审查并调整适当的项目工件
- D. 保存所有文档活动直到项目结束

**正确答案：** C

一个高绩效团队成员的绩效在过去一年中一直在不断提高，将其他同龄人甩在后面。项目经理一直不愿公开承认团队成员的贡献，因为担心会影响其他人。项目经理还担心，如果团队成员的贡献得不到回报，他们可能会离开。项目经理应该做什么？

- A. 将表现较好的团队成员提拔到更高的职位
- B. 要求高绩效团队成员指导其他团队成员
- C. 提醒高绩效团队成员关注共享奖励而不是个人奖励
- D. 私下奖励表现出色的团队成员以避免团队中断

**正确答案：** C



一个大型项目正在影响其所在的社区。邻居对项目不满意，他们对项目的抵制可能会影响项目期限。项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 写信给邻居，请他们不要打扰项目
- B. 与街道代表召开会议以赢得他们的合作
- C. 分析情况，找出导致邻里消极态度的原因
- D. 要求客户延长项目期限，以便有时间解决冲突
- E. 要求市长行使职权制止邻里抵抗

**正确答案：** BC

一家公司决定实施新的归档系统。在项目实施过程中发生了数据泄露事件。项目经理首先应该做什么？

- A. 实施计划的风险应对措施来处理问题
- B. 与团队一起审查可能的替代文档方法
- C. 用风险和建议的影响更新风险登记册
- D. 要求团队修复系统以解决问题

**正确答案：** D

在收集了依赖于外部利益相关者的项目的所有需求后，项目团队正在完成第二次迭代。此时，项目经理了解到可能会阻止产品发布的法规变更。项目经理应该怎么做才能实现收益？

- A. 在风险日志中添加一个条目
- B. 实施改变
- C. 审查目标收益
- D. 提高团队的速度

**正确答案：** C

经过几次迭代后，项目经理决定将产品展示给关键利益相关者。利益相关者的反馈是团队在许多功能上都没有达到目标。项目经理应该怎么做才能避免将来出现这种情况？

- A. 与所有主要利益相关者召开需求收集会议，再次评估范围并根据会议重新确定积压工作的优先级
- B. 安排足够的冲刺演示以收集利益相关者的早期反馈并相应地调整计划
- C. 将设计思维实践融入项目生命周期，以更好地理解产品的角色并更有效地满足他们的需求
- D. 评估团队的技能，寻找具有产品设计经验的人，并分配给该人重建产品界面的任务

**正确答案：** C

一个新的团队成员被添加到一个自组织团队中。新团队成员不愿发言和参与团队讨论或决策。团队应该采取哪两项行动来吸引这个新团队成员？（选择两项。）

- A. 重新审视团队对团队行为和规范的讨论
- B. 向项目经理报告新团队成员的行为
- C. 指导新团队成员提高团队参与度
- D. 强迫新团队成员参加被认为容易的活动
- E. 促进对所有想法和观点的公开讨论

**正确答案：** AC

一家公司希望在竞争激烈的市场中提高其产品之一的商业价值。为此，公司委托了一个项目来创建原型。团队逐步构建原型。项目经理应该优先采取哪项行动？

- A. 强调使用看板方法
- B. 确保项目发起人了解上市日期
- C. 尽快交付商业价值
- D. 实施计划-执行-检查-行动 (PDCA) 循环

**正确答案：** C

在与团队的日常会议中，项目经理注意到新团队成员在分配的任务上没有取得预期的进展。项目经理应该做什么？

- A. 要求新团队成员遵守团队基本规则
- B. 请有经验的团队成员确定替代者
- C. 要求新团队成员重新评估自己的能力
- D. 请有经验的团队成员指导新团队成员

**正确答案：** C

一家公司的项目管理办公室 (PMO) 已开始实施迭代工具。项目经理正在开始一个新项目，并确定了使用迭代工具的机会。一位高级管理人员担心这个修改后的框架，因为它对公司来说是相当新的。项目经理首先应该做什么？

- A. 与利益相关者组织个别会议，以建立对新框架的认识和信任
- B. 寻求有关新框架的外部培训，以消除利益相关者参与度低的风险
- C. 向高级经理发送有关新框架优势的文档
- D. 将高级经理的关注上报给项目发起人并将状态分配给团队

**正确答案：** A



执行阶段的项目进度落后，缺少一些材料。由于内部采购过程会造成更多延误，因此承包商提交了供应缺失材料并偿还费用的报价。项目经理不同意承包商提交的材料缺失费用。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 要求项目发起人分配更多预算来支付费用
- B. 更新采购管理计划并与承包商协商。
- C. 要求承包商审查报价并降低成本。
- D. 更新采购策略并与承包商谈判

**正确答案：** D

项目经理向主要利益相关者展示了项目进度表。他们要求该项目比预定日期提前两个月完成。项目经理应该做什么？

- A. 召开利益相关者会议以调整时间表和范围预期
- B. crash schedule 缩短时间线，同时保持范围不变
- C. 更新成本管理计划，为项目分配更多资源，尽早完成范围
- D. 通过删除活动和缩短时间表来缩小项目范围

**正确答案：** A

在项目执行期间，项目经理注意到只有一名团队成员拥有构建产品所需的一项技术技能。项目经理担心这可能会对未来的质量和进度产生影响，因为大多数即将进行的活动将需要至少三个具有此特定技能的人。

项目经理应该采取哪两项措施来防止团队不合格？（选择两项。）

- A. 从路线图中排除活动
- B. 鼓励结对工作和知识共享
- C. 向整个团队传授新技能
- D. 使用外部示踪剂促进培训活动
- E. 增加对需要此类能力的活动的时间估计

**正确答案：** BD

团队正在处理一个关键的项目可交付成果，而项目经理担心能否按时完成。一些利益相关者对一些团队成员的表现提出了抱怨。项目经理希望了解情况并尽快向团队提供反馈。

项目经理应该采取哪三项措施来解决这种情况？（选择三个。）

- A. 定义团队基本规则
- B. 进行回顾会议
- C. 实施每日团队会议
- D. 请求经理绩效评估
- E. 进行年度审查

**正确答案：** ABC

一家组织正在着手部署新的数字解决方案，该解决方案将彻底改变采购服务。项目经理制定了所有必要的计划和活动，以确保成功集成和启动解决方案。存在合作伙伴系统不可用的风险，这可能会对项目产生负面影响。

需要哪些关键活动来确保项目的成功？

- A. 与项目利益相关者沟通，完全整合可能是不可能的，因此项目可能会被延迟
- B. 通过强制合作伙伴更改系统设置以促进与新解决方案的更轻松集成来消除风险
- C. 持续监控合作伙伴系统不可用的风险，并制定适当的解决方案，以防风险具体化为实际问题
- D. 通过制定替代计划来降低风险，使解决方案在没有完整集成功能的情况下准备就绪并可用

**正确答案：** C

首席执行官已授权为公司开发复杂的金融产品，以提供更大的未来收益。该预算是通过与希望尽快识别所有风险的全球投资者融资获得的。

项目经理应该使用什么来识别风险？

- A. 对各方共同风险的分析
- B. 优势、劣势、机会和威胁 (SWOT) 分析
- C. 专家判断
- D. 风险价值评估

**正确答案：** B

发起人支持利用敏捷方法。项目经理正在考虑如何推出敏捷方法并获得项目团队成员和利益相关者的支持。项目经理首先应该做什么？

- A. 确定需要哪些敏捷软件工具来支持组织内的敏捷交付
- B. 选择一个当前的预测项目，定义方法，并提供敏捷培训以执行项目的剩余部分
- C. 从一个适当复杂的试点项目开始，为受影响的人提供敏捷培训
- D. 确定如何使用敏捷技术改造组织，包括组织培训和沟通

**正确答案：** C

客户新任命的技术经理到项目现场核实项目可交付成果。技术经理认为项目经理没有提供足够的信息。项目经理应该首先做什么来解决这种情况？

- A. 更新问题日志并上报给项目发起人
- B. 将缺乏信息确定为风险并更新风险登记册
- C. 与技术经理安排更频繁的会议
- D. 审查和更新利益相关者参与计划

**正确答案：** D

在启动新产品改进项目期间，项目经理发现历史数据显示，与以前的产品版本相比，类似的项目导致客户抱怨用户体验更差。项目经理如何在新项目中防止出现这种结果？

- A. 雇用一组外部用户对产品进行验收测试
- B. 将用户焦点小组定义为对结果有很大影响的外部利益相关者
- C. 聘请顾问进行收益分析作为项目章程的输入
- D. 在完成工作分解结构 (WBS) 后定义高级别风险并计划缓解措施

**正确答案：** B

在分析每月状态报告的项目时，项目经理注意到进度绩效指数 (SPI) 为 0.75，成本绩效指数 (CPI) 为 1.25。项目经理必须尽快提供第一个项目状态审查，并想强调项目处于受控状态。项目经理应该如何向关键利益相关者报告项目状态？

- A. 为利益相关者准备一份关于挣值的详细介绍，包括挣值的计算方式和项目当前的挣值结果
- B. 报告项目落后于进度，但可以添加额外的有经验的资源以保持进度并维持预算
- C. 使用帕累托图和鱼骨图进行详细的根本原因分析，以证明项目处于受控状态
- D. 报告项目未按预期进行跟踪，但仍处于受控状态，因为距离下一个项目里程碑还有一个多月

**正确答案：** B

在与客户会面后，项目经理得到了特别的认可，因为项目总是按计划进行。当天早些时候，项目经理参加了定期的项目团队会议，以跟进可交付成果的状态。

项目经理在项目组会议上应该做什么？

- A. 与项目团队分享客户反馈
- B. 遵循会议议程并列出下一个可交付成果
- C. 在会议记录中记录此反馈
- D. 开始计划如何改进下一个可交付成果的日期

**正确答案：** A

团队成员正在与项目经理进行讨论。在上一次回顾会议上，团队意识到陈旧的设备可能会影响项目的下一次迭代。该团队建议购买新设备，因为它对最终交付成果的成功至关重要。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 检查项目预算，确认是否有足够的应急储备
- B. 审查成本管理计划以确定如何解决这个问题
- C. 告诉团队成员更多设备不在项目范围内
- D. 提交变更请求以增加预算和购买新设备

**正确答案：** B

一家公司的 CEO 刚从一个关于使用人工智能 (AI) 的会议回来，希望项目经理在组织中实施这项技术。

项目经理首先应该做什么？

- A. 开始制定商业案例
- B. 启动优势、劣势、机会和威胁 (SWOT)
- C. 让利益相关者参与并分配资源
- D. 从利益相关者那里收集需求

**正确答案：** A

项目经理与公司其他职能领域的多个利益相关者一起领导一个项目。这些利益相关者中的一个刚刚被提升为领导另一个职能领域，并且仍然是该项目的利益相关者。

项目经理应该让项目团队更新什么以确保与利益相关者进行适当的沟通？

- A. 项目管理计划
- B. 利益相关者参与计划
- C. 利益相关者登记册
- D. 沟通管理计划

**正确答案：** B

口头宣布加入 Scrum 团队的新团队成员行动不便。scrum master 意识到一些团队成员不确定团队的动态将如何变化。scrum master 应该做什么？

- A. 制定利益相关者参与计划
- B. 设计沟通管理计划
- C. 相应地更新团队章程
- D. 召开会议讨论团队必须做出的调整

**正确答案：** D

一些行业的利益相关者更喜欢绕过项目经理直接与程序员和系统分析师打交道。这使项目资源管理变得复杂。项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 建议实施新的项目管理信息系统 (PMIS)。
- B. 要求与高级管理层会面以升级情况
- C. 促进项目团队采用沟通管理计划。
- D. 举办团队建设活动以培养团队凝聚力并改善沟通

**正确答案：** A

在检查期间，由于检查员声称缺少监管标签，生产阶段停止了。项目经理应该做什么？

- A. 进行专家判断评估。
- B. 评审质量管理计划
- C. 更新经验教训登记册
- D. 审查风险管理计划

**正确答案：** B

项目团队难以理解有关需求的技术细节。该信息最初不是由客户提供的，但该信息在当前迭代中对于阐明需要如何完成任务非常重要。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 要求客户审查并澄清当前冲刺的功能定义
- B. 向客户发送当前冲刺的燃尽图并寻求澄清。
- C. 教育客户并让他们参加每日站立会议。
- D. 安排与客户的每周会议和产品审查以明确要求

**正确答案：** A

项目经理收到更新的挣值分析报告。以下是报告的主要发现：

\* 完工预算 = 100 万美元

\* 挣值 = 70 万美元

\* 实际成本 = 75 万美元

\* 成本绩效指数 = 0,933

根据这些信息，项目经理总结项目绩效？

- A. 项目将完全按计划完成
- B. 项目比计划更容易完成
- C. 项目将难以按计划完成
- D. 项目不会按计划完成

**正确答案：** C

项目经理已被任命为一个价值数百万美元的项目。该项目被认为是高风险的，因为之前没有进行过类似的项目，也没有历史数据。一些外部利益相关者不愿提供支持。

项目经理应该采取什么方法？

- A. 检查特定于承担项目的组织的计划、过程、政策和知识
- B. 与利益相关者就项目限制、假设和关键输入建立对话
- C. 说服高级管理层关闭该项目，因为该项目缺乏赞助并且被认为是高风险的
- D. 召开项目团队会议，更新风险登记册和项目管理计划

**正确答案：** B



一名项目经理被分配到一家正在向敏捷转型的公司中的项目。并非所有利益相关者都相信该项目，一些利益相关者希望在项目早期定义和计划整个项目。然而，项目发起人需要速战速决以确保项目的继续进行。

项目经理应该使用什么方法？

- A. 一种敏捷方法，因为这会更早地提供工作功能
- B. 一种预测方法，因为这会让高级利益相关者满意
- C. 一个混合项目，因为这将减轻利益相关者的担忧
- D. 一种预测方法，因为这将所有利益相关者带来好处

**正确答案：** A

一个团队目前正在研究移动应用程序解决方案。在 sprint 执行期间，其中一位开发人员要求澄清特定任务的验收标准。

项目经理应该怎样做才能获得开发商需要的信息？

- A. 请求项目发起人的指导
- B. 给客户写邮件要求澄清
- C. 寻求开发经理的支持
- D. 与产品负责人一起澄清需求

**正确答案：** D

项目经理与全球虚拟团队合作。团队之间面临沟通困难，经常错过重要信息。这种困难导致错过最后期限。

项目经理应该怎样做才能提高项目团队的效率？

- A. 实施团队托管以改善沟通
- B. 确定沟通问题的根本原因
- C. 发起项目进展的日常沟通
- D. 安排一次通信控制委员会会议

**正确答案：** B

一名团队成员在未经批准的情况下错过了项目会议，并根据基本规则受到了处罚。该团队成员以及其他团队成员坚称，这是他们第一次看到有关该项目的规则，他们不同意处罚。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 确保团队章程是由团队成员制定的
- B. 确保团队成员完全支持所有决定
- C. 将项目章程分发给所有团队成员
- D. 采用魅力型领导风格

**正确答案：** C

当客户说他们正在考虑关闭项目时，一个团队正在努力实施通信系统。项目经理安排了与客户的紧急会议，以了解项目存在风险的原因。

项目经理可以使用哪两种工具或技术来影响客户保持项目活跃的决定？（选择两项。）

- A. 备选方案分析
- B. 投票
- C. 成本效益分析
- D. 多标准决策
- E. 专制决策

**正确答案：** 光盘

项目经理有两个同时执行的项目。必须缩短关键项目的工期，但项目经理没有足够的资源来实现这一目标。此外，时间表中没有可以重叠的活动。

项目经理应该做什么？

- A. 分析两个项目以确定公共资源的最有效使用
- B. 使用资源优化来证明为关键项目请求更多资源的合理性
- C. 对项目团队进行进度优化培训，提高技能
- D. 应用快速跟踪技术压缩关键项目的进度

**正确答案：** A

维护项目的项目经理有一份每年更新的合同。该项目于 6 年前启动。今年续签合同后，审计员报告说，该版本的合同违反了去年通过的一项新法律。

在这种情况下发生了什么？

- A. 合同没有经过项目组的适当审查
- B. 利益相关者参与计划没有得到正确实施
- C. 法律部门没有向所有员工正确宣传法律
- D. 项目经理对这个法律问题没有足够的了解

**正确答案：** A



项目经理意识到项目正在延迟，因为一些关键决策受到组织高级管理层和外部利益相关者之间矛盾观点的影响。项目经理应该做什么？

- A. 审查利益相关者登记册并确保按照沟通管理计划进行沟通。
- B. 将项目团队与高级管理层和利益相关者等外部因素隔离开来，以便更快地做出决策
- C. 审查剩余范围并重新设定项目进度基准以考虑决策制定中的延迟
- D. 审查项目治理的充分性并确保适当的结构到位

**正确答案：** D

一名团队成员与他们的职能经理分享了在回顾期间讨论的另一名团队成员的一些负面表现细节。项目经理发现了这个讨论。项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 联系团队成员的职能经理，邀请他们参加下一次回顾
- B. 与整个团队会面，审查有关安全环境的基本规则
- C. 与产品负责人见面讨论情况
- D. 联系团队成员，说明哪些信息可以在团队外共享
- E. 与发起人会面审查情况

**正确答案：** BD

一个刚刚启动的项目，管理层的期望是确保第一次迭代的可交付成果帮助营销团队将产品原型展示给潜在客户。项目经理应该做什么？

- A. 增加工作分解结构（WBS）的细节以尽量减少错误和延误
- B. 将积压工作分成几个阶段以确保首先交付关键功能
- C. 要求赞助商优先考虑产品的某些功能
- D. 确定产品所需的最低功能

**正确答案：** D

项目经理在联合应用程序开发模块上处于快速开发模式。公司希望在两周内交货。该模块需要在类似的时间表上与其他模块集成，但发布管理有三周的积压工作。项目经理应该做什么？

- A. 推动团队交付更多，以便根据管理层的要求开发和推出模块
- B. 与利益相关者交谈以解决瓶颈并了解如何简化整个流程
- C. 让团队在更紧迫的期限内努力，这样整合会更容易
- D. 与团队沟通并放慢当前节奏以确保团队与发布日期保持一致

**正确答案：** B

组织正在将敏捷引入其项目。在一次非正式讨论中，项目经理了解到，目前在不同团队工作的团队成员正在讨论他们希望如何在同一个团队中工作。

项目经理应该做什么？

- A. 项目经理不应允许资源选择团队，因为项目经理根据项目需要分配资源
- B. 项目经理不应该允许资源选择他们想在哪个团队工作，因为他们总是会选择他们最喜欢的团队
- C. 项目经理应该允许资源定期选择他们愿意在哪个团队工作
- D. 项目经理应该指出团队成员已经通过劳动力优化分配到一个团队

**正确答案：** D

在回顾会议期间，项目经理听说涉众一直在迭代演示中不断抱怨产品功能未按要求交付。

项目经理应该给产品负责人什么建议，以确保产品功能始终按要求交付？

- A. 让利益相关者参加每日站立会议以监督进展
- B. 在积压细化之前与利益相关者一起验证验收标准
- C. 避免让干系人参与迭代评审
- D. 创建需求追溯矩阵并进行相应分配

**正确答案：** B

新产品发布项目处于非常初始的阶段，需求也在不断变化。由于市场竞争激烈，客户希望推出保持范围灵活的产品。项目组打算根据去年交付的类似项目的预测开始工作。

哪种项目方法适合该场景？

- A. 将其作为 Scrum 项目执行
- B. 将其作为预测项目执行
- C. 使用与参考项目相同的方法执行它
- D. 将其作为一个带有阶段关口的项目来执行

**正确答案：** A

一个项目团队在完成一项比最初估计的要复杂的任务时遇到延误。这是一项可能影响当前迭代目标的关键任务。哪两个选项可以帮助团队初步解决这个障碍？（选择两项。）

- A. 将问题上报给项目发起人
- B. 查看和更新依赖项
- C. 安排回顾
- D. 进行根本原因分析
- E. 制定风险管理计划

**正确答案：** *BD*

敏捷项目的项目经理被要求将预算减少 30%。由于这是一个小型项目团队，因此预算主要分配给资源。项目经理应该使用什么策略才能在受限环境中持续交付价值？

- A. 减少项目人员并相应调整范围和时间表以支持预算减少
- B. 平衡项目团队以应对预算挑战，并提供培训以降低绩效低下的风险
- C. 优先考虑高商业价值和低工作量的产品待办事项，并调整项目预算和人员配置以解决这些问题
- D. 将项目范围限制在基本的关键特征上，并以当前的人员配置水平运行项目，直到所有预算都用完

**正确答案：** *C*

在项目实施阶段，新法规影响项目，需要召开关键状态会议讨论范围变更。项目经理发现关键利益相关者无法参加预定的会议。项目经理应该做什么？

- A. 召开变更控制委员会 (CCB) 会议，并将结果通知利益相关者
- B. 更新沟通管理计划并实施变更
- C. 与项目发起人会面，讨论如何解决这种情况
- D. 会前会见利益相关者以获取他们的意见

**正确答案：** *D*

在规划会议之后，一个新项目已经启动。该项目由组织中的一位高管直接监督。在审查会议之后，项目经理无意中听到一位高管要求其中一名团队成员提供仪表板以显示总体项目状态。项目经理应该做什么？

- A. 更新利益相关者参与评估矩阵
- B. 更新沟通管理计划以包括非正式请求
- C. 要求团队成员开发仪表板来满足请求
- D. 告诉团队成员通过项目经理传递请求

**正确答案：** *D*

项目经理正在管理一个非常复杂且执行周期长的项目。尽管该项目主要是预测性的，但该团队能够使用混合框架将设计和执行分解为更小的包。企业希望跟踪该框架应用程序交付的价值，但该框架没有定义的可衡量项目集。

项目经理首先应该做什么？

- A. 与利益相关者合作，确定可以跟踪哪些可衡量的收益，并指派一名负责人对其进行监控和报告
- B. 根据工作分解结构 (WBS) 创建报告并定期更新。
- C. 使用与上一个预测项目相同的收益跟踪流程并将其添加到月度状态报告中
- D. 研究哪些报告模板在该框架中使用最多，并将其纳入项目

**正确答案：** A

在执行阶段的早期，项目经理发现企业环境因素 (EEF) 的近期变化将大大降低实施成本并缩短项目进度。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 与项目团队会面，决定如何使用剩余预算
- B. 保留额外预算作为管理储备直到项目收尾
- C. 给团队额外的时间在规定时间内完成任务
- D. 遵循项目升级政策和沟通管理计划

**正确答案：** D

一个小组已经一起工作了一个月。在日常会议中，团队成员继续表达完成任务的问题。项目经理应该做什么？

- A. 等待团队独立识别并解决问题
- B. 将团队成员转移到另一项技能更合适的任务
- C. 与团队成员进行秘密讨论以确定根本原因
- D. 开始与所有团队成员讨论以帮助解决问题

**正确答案：** D

一个团队对如何解决正在构建的产品的特性有不同的想法；虽然冲刺在两天前就开始了，但他们仍然没有达成共识。项目经理应该做什么？

- A. 让作为关键利益相关者的产品负责人在不同的想法中做出选择
- B. 向小组提出想法，请大家投票，然后选出最受欢迎的想法
- C. 安排一个会议，让每个人都有机会表达他们对每个想法的看法，然后投票决定
- D. 就每个想法的利弊发表意见，并在引导会议上达成共识

**正确答案：** C

最近，一名初级工作人员被分配到该团队。新团队成员告诉项目经理他们很困惑，因为他们不熟悉项目对他们的期望。项目经理应该做什么来协助新的团队成员？

- A. 建议新团队成员参加项目管理培训
- B. 指导新团队成员在寻求帮助之前查看负责的咨询和通知 (RACI) 矩阵
- C. 建议新团队成员审查项目章程和利益相关者参与计划
- D. 审查资源管理计划并在必要时为新团队成员提供指导

**正确答案：** *B*

以下哪三种情况是 scrum master 应该注意的障碍？（选择三个。）

- A. 团队成员谈论 Scrum 看板上没有的用户故事
- B. 一名团队成员谈论 Scrum 板上的用户故事
- C. 阻碍敏捷能力的技术
- D. 缺乏团队授权和无法自组织
- E. 在每日站立会议上审查积压工作

**正确答案：** *ACD*

一个项目团队正在聘请另一个国家的开发团队来开发软件。在进度审查期间，项目经理发现由于对客户需求的解释而导致返工导致的完工日期延迟。项目经理应该做什么？

- A. Set up a meeting with key stakeholders to clarify requirements
- B. Escalate to the project steering committee and request additional time
- C. Travel to the development team's office to push the schedule
- D. Create prototypes with the development team to confirm requirements

**Correct Answer:** *D*

一个团队已经在一个项目上工作了几个月，但完成日期尚不清楚，因为随着新知识的获得，范围经常发生变化。一些可交付成果已经完成，但是当新的利益相关者加入团队时，他们抱怨项目成果没有达到业务目标。

项目经理如何防止这种情况在未来发生？

- A. 创建优先级待办事项并定义与利益相关者的迭代审查会议
- B. 创建所有利益相关者批准的详细工作分解结构 (WBS) 和里程碑时间表
- C. 安排每日会议以审查团队绩效和障碍
- D. 为每个项目阶段安排启动会议，与所有利益相关者分享项目管理计划

**正确答案：** A

一家公司最近使用案头研究进行可行性研究，结果表明该项目落后于进度。项目团队还担心范围变更对项目进度的影响。项目经理应该怎样做才能使项目如期进行，同时仍能达到项目目标？

- A. 与变更控制委员会 (CCB) 合作审查范围并提交任何变更请求
- B. 向 CCB 提交变更请求并更新时间表
- C. 更新范围并向项目添加更多资源
- D. 更新范围并进入下一个项目里程碑

**正确答案：** A

一位项目经理已经使用预测方法 10 多年，现在正在转向敏捷项目。团队成员以前没有一起工作过。经过两次工作冲刺，团队没有取得任何成果，完成工作的压力很大。

项目经理在这个阶段应该采用什么样的领导风格？

- A. 为团队做出决策以取得早期成果的指导风格
- B. 指导需要帮助的人并促进更好的团队协作的领导风格
- C. 一种被动的领导风格，允许团队自组织直到达到规范阶段
- D. 民主风格，使用多数意见占上风的技术

**正确答案：** B



项目经理已被指派领导一个项目来部署一个新系统。利益相关者不同意项目目标和方法。  
项目经理应该做什么？

- A. 根据项目章程创建角色和职责矩阵，并要求发起人与所有利益相关者共享，以提供可信的权威
- B. 与项目团队开展范围界定研讨会，创建工作分解结构 (WBS)，将任务分配给各个实体，与所有利益相关者共享，并要求团队按计划完成任务
- C. 与所有利益相关者召开全体会议，审查并处理每个利益相关者的活动清单
- D. 分解情况以确定分歧的根本原因，然后与每个利益相关者和参与实体一起确定他们的确切角色和责任

**正确答案：** D

项目经理开始一个新项目，必须确保团队成员和利益相关者得到充分培训。在与团队面谈后，项目经理发现所有资源都具有不同敏捷方法的经验。  
项目经理应该做什么？

- A. 确保项目团队了解所有敏捷技术
- B. 跳过培训因为团队已经了解敏捷
- C. 确保团队对敏捷有共同的理解
- D. 全面完整地教授一种敏捷方法

**正确答案：** C

项目经理邀请公司 CEO、发起人、团队成员和外部客户代表参加会议，审查项目管理计划。  
项目经理开始介绍预算，但 CEO 突然要求结束会议。  
项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 在邀请外部客户代表参加会议之前审查沟通管理计划
- B. 在邀请外部客户代表参加会议之前，与内部参与者和首席执行官一起审查成本管理计划
- C. 与外部客户代表进行根本原因分析，并将调查结果记录在经验教训登记册中
- D. 在会议之前先将演示幻灯片发送给内部参与者，然后再发送给外部客户代表

**正确答案：** B

项目经理被分配到一个新项目，以在年底交付产品。供应商通知项目经理，核心组件无法按时发货，这将影响进度。项目经理接下来应该怎么做才能将对项目的影响降到最低？

- A. 安排与所有利益相关者的会议以延长项目截止日期
- B. 用可以按时提供组件的新供应商替换供应商
- C. 在下一次状态审查中添加一个项目，让利益相关者了解供应商问题
- D. 查看并更新问题日志并确定是否可以提供任何替代组件

**正确答案：** D

在混合项目中，客户决定对项目设计进行重大更改。此更改已获批准，并且对进度和预算的影响是已知的。应该开发软件的软件团队负责人拒绝承诺交付日期，声称他们使用敏捷方法工作并且无法承诺最终交付日期。硬件团队依靠这个软件来开发他们的产品部分。项目经理应该做什么？

- A. 将此风险加入风险登记册并根据风险管理计划进行监控
- B. 将此问题上报给更高层并寻求帮助解决问题
- C. 将交付日期强加给软件团队负责人，并将情况通知职能经理
- D. 要求软件团队负责人使用预测方法并承诺交付日期

**正确答案：** D

由于似乎超出项目验收标准的原因，项目经理难以从利益相关者那里获得对某些可交付成果的最终验收。项目经理应该做什么？

- A. 使用情商技巧说服该利益相关者以获得接受。
- B. 获得同样熟悉该项目的另一利益相关者的最终验收。
- C. 将此问题上报给项目发起人并寻求支持以获得最终利益相关者的接受。
- D. 创建一个项目验收弃权书，注明利益相关者的顾虑，以便日后解决。

**正确答案：** C

项目经理应如何制定项目管理计划以确保项目持续交付预期收益？

- A. 与发起人阐明项目收益
- B. 确定每个工作产品的目标
- C. 执行每个版本的集成测试
- D. 让整个项目团队参与测试

**正确答案：** B



在项目执行期间，项目经理获悉大多数项目团队成员已注册新实施的在家工作公司政策。项目经理应该如何在项目中反映这种变化？

- A. 更新沟通管理计划中已注册团队成员的沟通方式。
- B. 更新责任分配矩阵 (RAM) 中注册团队成员的角色和责任。
- C. 更新利益相关者参与计划以包括已登记团队成员的紧急联系信息。
- D. 更新资源管理计划中注册团队成员的资源日历。

**正确答案：** A

一个多年期大型工业项目的项目经理有一个项目涉及来自不同地理区域的多元化利益相关者。最近，项目经理遇到了利益相关者参与的问题。项目经理应该使用哪两种工具来确定参与没有达到计划效果的根本原因？（选择两项。）

- A. 五个为什么
- B. 沟通管理计划
- C. 石川图
- D. 问题日志
- E. 开放空间会议

**正确答案：** AC

项目经理被分配到程序中的项目。项目的高级要求是已知的，但某些要求的优先级不确定，因为它们与程序中的其他一些管道项目相互依赖。项目经理应该如何为项目的后续步骤做准备？

- A. 根据项目的复杂性升级到管理团队以增加时间表
- B. 等待其他项目估算后再计划进度
- C. 根据历史数据对高层需求的里程碑进行优先级排序和估算
- D. 要求项目管理办公室 (PMO) 估算所有项目的任务并共享项目管理计划

**正确答案：** C

一名新的团队成员加入了一个敏捷项目，取代了最近离开的一名团队成员。项目团队需要新的团队成员加快他们有效地为项目做出贡献的能力。

在这种情况下，项目经理应该做什么来提供帮助？

- A. 为新团队成员分配与他们所取代的前任团队成员相同的任务
- B. 安排知识传授会议并将不太复杂的任务分配给新的团队成员
- C. 将技术文档发送给新的团队成员并安排下一次迭代的培训
- D. 让新团队成员完成公司的所有强制性培训

**正确答案：** D

一个团队正在对迄今为止在一个中型项目上构建的软件进行首次演示。产品负责人发现了一些他们希望在批准之前解决的问题。项目经理应该如何处理这个问题？

- A. 计划通过 backlog 梳理解决问题并将它们纳入下一个 sprint
- B. 将变更管理计划推荐给产品负责人，然后上报给指导委员会
- C. 请产品负责人参考已签署的业务需求文档，并说明当前计划无法促进这些变更
- D. 告诉产品负责人这些问题将在软件的第二个版本中解决

**正确答案：** A

项目经理刚刚启动了一个项目。在计划时，项目经理注意到几个重要的团队成员不具备项目后期关键任务所需的技能。项目经理首先应该做什么？

- A. 制定资源管理计划并确保充分培训
- B. 更换现有项目组成员
- C. 外包任务由专业供应商完成
- D. 更新问题日志以说明团队成员资格的缺乏

**正确答案：** A

一个开发大型水电站的项目正处于实施阶段，并使用混合方法进行管理。项目经理应该怎么做才能确保在执行阶段完全符合质量要求？

- A. 分析质量要求。
- B. 计划质量管理
- C. 持续调查可交付成果的质量
- D. 制定质量政策和程序

**正确答案：** C

项目经理完成了与客户一起审查当前迭代的项目可交付成果。一位刚刚加入客户团队的新的关键利益相关者抱怨说结果没有提供业务预期的功能。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 创建变更请求并更新范围管理计划
- B. 进行利益相关者识别和项目目标审查会议
- C. 更新利益相关者名单并确定可交付成果
- D. 更新项目管理计划和经验教训

**正确答案：** B

作为战略计划的一部分，一家公司决定实施一个新的软件平台来管理一个集中的文档存储库。有些要求很明确，有些则需要更多细节。

项目经理应该首先做什么来决定如何管理这个项目？

- A. 根据团队经验选择可预测的开发生命周期
- B. 为项目确定最合适的生命周期方法
- C. 将所有需求登记到积压清单中以供进一步详细分析
- D. 拆分需求，将它们放入两个独立的项目中，并应用不同的方法

**正确答案：** C

在头脑风暴会议期间，一名团队成员不如团队其他成员活跃。项目经理与团队成员单独交谈，得知该团队成员有轻微听力障碍。团队成员感谢项目经理的关心。项目经理随后决定更改会议时间和地点，以确保每个人都能参与。

项目经理使用了哪些人际交往技巧？

- A. 网络
- B. 情商
- C. 冲突管理
- D. 影响

**正确答案：** B

为保证质量，对项目执行计划中使用的流程进行了质量审计。审计员提出的不符合项问题之一是无法获得项目风险审查会议的出席名单。

为什么出席名单很重要？

- A. 项目的标准做法是召开风险审查会议，会议应有出席记录
- B. 出席名单是与适当的项目团队成员举行风险审查会议的证据
- C. 显示会议参加人数的记录
- D. 这是在经验教训登记册中登记的文件

**正确答案：** B

一家公司正在启动一个项目来增强其现有产品之一。它的所有产品都是内部开发的。项目经理应该做什么？

- A. 确保利益相关者参与计划准确无误并妥善记录
- B. 回顾从以前的项目中吸取的教训
- C. 识别实施新解决方案的风险并评估对项目的影响
- D. 为启动阶段创建经验教训文件

**正确答案：** B

客户不同意关闭，声称项目团队没有执行开发合同中规定的代码检查。项目组进行了代码检查，但记录不完整。项目经理应该做什么？

- A. 就合同条款的解释寻求专家法律意见
- B. 与项目团队项目发起人和客户举行会议，同意结束项目所需的进一步工作并增加经验教训
- C. 关闭项目并将可交付成果移交给客户
- D. 与项目团队和项目发起人举办经验教训研讨会，以避免未来项目中出现合同合规问题

**正确答案：** B

项目经理拥有一组来自其他项目的共享资源，这些资源正在处理客户项目。项目到期前三天。团队通知项目经理项目将被延迟，因为组件没有按时交付。共享资源的竞争优先级正在延迟组件的交付。

项目经理应该怎么做才能防止这种延误的发生？

- A. 更新了风险管理计划并记录了项目的经验教训
- B. 根据工作分解结构（WBS）重组项目团队
- C. 与其他项目的利益相关者保持持续沟通
- D. 使用资源管理计划来识别其他项目的影响

**正确答案：** C

一位项目经理一直在管理一个高度复杂的项目。项目经理已确保已完成所有必需的任务。在最近的一次外部审计中。项目经理被告知，该项目因实施的最新模块而受到重罚。

项目经理应该怎样做才能确保最近的实施没有产生负债？

- A. 确保在测试期间发现的所有缺陷在实施前得到解决
- B. 确保范围内确定的所有必需任务均已成功完成
- C. 确保在结束项目之前完成所有文档
- D. 确保按照组织程序收到所有必需的批准

**正确答案：** D

一家公司的项目经理正在考虑让组织中表现出色的初级成员担任当前项目的新项目经理。

项目经理应该如何准备向高级管理层推荐？

- A. 汇编会议纪要中团队成员的主要亮点
- B. 要求团队成员写一份简短的传记，列出他们的资历
- C. 收集展示团队成员高绩效的项目工件
- D. 计算团队成员所从事的项目的健康状况

**正确答案：** C

项目经理被分配到一个正在开发的项目。当项目经理审查项目进度时，他们发现一些任务落后于计划。经过调查，项目经理发现一些团队成员被拉去处理其他任务，这影响了他们专注于项目经理项目的能力。

项目经理可以采取哪两项行动使团队重回正轨？（选择两项。）

- A. 建立每日例会以审查项目进度并跟踪可交付成果的完成情况
- B. 允许团队成员按照自己的节奏跟上
- C. 立即提醒业务利益相关者进度延迟
- D. 与各自的职能经理讨论项目延迟的风险和工作重点
- E. 与团队合作确定加速项目交付的选项。

**正确答案：** DE

项目经理在项目现场验收货物，但货物质量不佳。项目经理让当地供应商修复这些项目，但预计该供应商会交付更多货物。项目经理下一步应该做什么？

- A. 分配额外的时间来检查货物到达现场后的质量保证
- B. 审查合同要求并要求提供质量保证的适用证据
- C. 让供应商在下一次交货前出具质量文件
- D. 打电话给供应商，让他们口头保证下次工地交货的质量

**正确答案：** B

在项目执行期间，风险负责人正在监控动力发动机的临界转速，以最终触发定义的风险应对策略。在风险评估和管理过程阶段，定义动力引擎具有以下特征：

1,600 rpm（每分钟速率）-> 停止工作并使系统崩溃

1,500 rpm（每分钟速率）-> 警告允许的最大速率

1,400 rpm（每分钟速率）-> 降低功率并制动发动机

以下哪项陈述是正确的？

- A. 1,600 rpm 是项目风险，1,500 rpm 是触发响应策略的事件，1,400 rpm 是项目问题。
- B. 1600rpm是项目问题，1500rpm是触发响应策略的事件，1400rpm是项目风险。
- C. 1,600 rpm 是项目问题，1,500 rpm 是项目风险，1,400 rpm 是触发响应策略的事件。
- D. 1,600 rpm 是触发响应策略的事件，1,500 rpm 是项目问题，1,400 rpm 是项目风险。

**正确答案：** C

项目 A 对公司至关重要，必须在九个月内完成。项目章程已经签署，但项目范围说明书尚未准备好。管理层要求项目经理在没有批准的项目范围说明书的情况下推进项目。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将问题上报给项目发起人并将其添加到风险登记册
- B. 拒绝在项目上工作，因为管理层没有遵循标准的项目管理实践
- C. 与管理层会面，解释在没有项目范围说明书的情况下运行项目的潜在问题
- D. 从项目章程中输入信息开始项目以节省时间

**正确答案：** C



一位项目经理正在使用混合方法开始一个项目，并注意到一些团队成员只了解预测方法。项目经理首先需要做什么才能有好的项目绩效？

- A. 指导那些缺乏混合知识的团队成员在工作中学习。
- B. 改变团队以包括混合专家。
- C. 评估每个团队成员所需的培训。
- D. 向所有团队成员提供混合培训。

**正确答案：** C

在审查原型时，质量团队发现了一些不影响主要功能但有可能在未来成为问题的偏差。为避免将来出现重大问题，团队建议采取需要额外资金的纠正措施。该项目已经在努力保持预算，甚至动用了一些应急储备。项目经理应该做什么？

- A. 询问产品设计者为什么在设计阶段没有考虑偏差
- B. 向项目发起人报告产品正在运行并且项目正在与预算作斗争
- C. 与利益相关者一起评估和启动变更请求流程
- D. 要求质量组丢弃样品并用新样品重新测试

**正确答案：** C

在迭代过程中，团队一直在与各种问题作斗争。项目负责人促进对问题的讨论，并且团队形成新的团队协议。在下一次迭代中，一些相同的问题再次出现。项目负责人接下来应该做什么？

- A. 将问题通知高级管理层，并让他们审查与团队达成协议的重要性
- B. 挑战团队以确定问题是否因为未遵守协议而再次出现
- C. 将协议张贴在所有团队成员都能看到的显眼位置
- D. 让团队自行组织并确定防止问题再次发生的最佳方法

**正确答案：** C

技术主题专家 (SME) 确定应在项目的经验教训中捕获的事件。SME 要求项目经理编写、记录并将其包含在经验教训登记册中。项目经理应该做什么？

- A. 将记录任务分配给项目团队成员。
- B. 要求 SME 记录并记录事件的发生。
- C. 要求中小企业等到项目收尾阶段。
- D. 负责记录此信息。

**正确答案：** D

在项目过程中，项目经理希望确保所执行的工作和所创建的产品不会偏离规定的商业价值。为了实现这个目标，项目经理应该特别注意什么？

- A. 审查和更新需求管理计划
- B. 进行质量审核和故障分析
- C. 监控工作分解结构（WBS）
- D. 监测和更新效益实现计划

**正确答案：** D

项目经理观察到两名团队成员一直在会议上公开争论。为了推动他们的想法，每个团队成员都直接与发起人单独交谈，并在不通知项目经理或其他团队成员的情况下做出决定。项目经理应该采取哪两项行动？（选择两项。）

- A. 让团队成员自己解决
- B. 与其他项目经理讨论这种情况并征求意见
- C. 在下次会议上重申基本规则并确保所有团队成员都清楚这些规则
- D. 解决每个团队成员的行为问题
- E. 直接与他们的经理讨论该行为并要求他们纠正该行为

**正确答案：** 光盘

敏捷项目的项目发起人通知项目负责人，一位高管希望了解项目进展的最新情况。项目负责人应该做什么？

- A. 提供项目共享驱动器的链接，供主管搜索任何感兴趣的工件
- B. 邀请高管到项目的会议空间，以确定项目信息辐射器是否满足他们的需求
- C. 联系项目管理办公室 (PMO) 获取状态报告模板并以该格式提供项目更新
- D. 要求项目发起人或产品所有者提供更新，因为项目负责人应该努力让团队摆脱障碍

**正确答案：** B



项目经理正在主持与主要利益相关者、项目发起人和产品所有者的会议，以定义将在下一次迭代后发布的功能。会议的目的是审查产品待办事项的优先级，考虑到在过去的迭代中一些可交付成果没有完成。

在会议期间应首先考虑哪两项来审查和更新产品待办列表的优先级？（选择两项。）

- A. 复杂性和开发成本
- B. 行业趋势和技术途径
- C. 延迟某些功能对商业价值的成本
- D. 重用其他产品的组件
- E. 每个功能积压的时间长度

**正确答案：** AC

项目经理领导实施了一个刚刚完成的电子发票项目。财务经理表示，该团队发现了三张有误的发票。项目经理应该尽快更新哪两个文件？（选择两项。）

- A. 问题日志
- B. 风险登记册
- C. 利益相关者登记册
- D. 变更日志
- E. 积压登记

**正确答案：** DE

在项目迭代期间，计划的活动变得更加复杂。工作应在尽可能短的时间内完成。在这种情况下应该使用什么方法？

- A. 团队协调员得到外部团队成员的支持。
- B. 团队成员请来一位专家来帮助他们
- C. 产品负责人将其移至产品待办事项列表。
- D. 跨职能团队成员共同完成活动

**正确答案：** B

一家跨国公司计划将他们的业务扩展到他们目前没有业务的新国家/地区。项目经理被指派来启动这个项目。审查业务案例后，在制定适当的实施策略时应首先考虑什么？

- A. 从新国家获取项目资源以降低不确定性风险
- B. 评估环境和监管因素并识别高级别风险和假设
- C. 密切识别和监控风险，因为公司没有从这个国家吸取教训
- D. 确保项目发起人在项目期间就项目可交付成果和时间表达成一致

**正确答案：** B

项目经理被指派领导一个新成立的敏捷团队。职能经理已将任务分配给团队成员，但团队成员却没有被授权的感觉。项目经理如何在团队中促进授权和问责制？

- A. 根据团队成员的角色单独分配任务，以确保对该主题的专业知识。
- B. 鼓励并指派团队与客户一起演示他们的产品或软件
- C. 给团队自主权，让他们自己决定如何执行任务
- D. 鼓励团队在选择解决给定任务的方法时让产品负责人参与

**正确答案：** C

在一家跨国公司管理关键项目的项目经理正在与所有团队成员召开进度会议。在会议期间，其中一名团队成员表示他们面临着一个严重的问题，这将阻止他们完成分配给他们的任务。项目经理应该做什么？

- A. 要求团队成员按照批准的沟通管理计划来沟通他们的问题
- B. 安排与相关团队成员的会议，一起审查和更新问题日志
- C. 与团队成员一起审查风险登记册，找到针对此问题的适当响应措施
- D. 要求团队成员提出变更请求以详细评估问题

**正确答案：** B

在上一次冲刺评审期间，产品负责人表示该产品没有交付任何价值。项目经理认为产品符合所有提供的规范。团队对产品负责人的陈述感到困惑。使用混合方法时，项目经理应该做什么？

- A. 将此事上报给执行委员会，以便他们决定下一步
- B. 优先考虑项目积压并要求开发团队解决问题
- C. 与产品负责人一起评审项目的收益管理计划
- D. 要求产品负责人终止项目，因为它不再符合预期收益

**正确答案：** C

地理分布的项目团队在并置团队和虚拟团队之间存在开发问题，导致生产力下降。  
项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 强迫团队成员在同一个地方工作
- B. 制定解决团队成员之间冲突的协议
- C. 获得特殊的专业知识来为团队成员提供建议
- D. 安排与项目团队成员的面对面会议

**正确答案：** B

Scrum 团队已承诺在其第一个版本中提供特定功能。多个操作问题阻止了开发人员提供关键功能。技术负责人也已通知他们将从公司辞职。  
项目经理应该如何让 Scrum 团队从这些问题中恢复过来？

- A. 审查正在进行的冲刺计划中的约束并评估发布计划的选项
- B. 停止冲刺并重新计划并优先处理积压工作以降低资源水平
- C. 查阅资源管理计划以获得适当的响应
- D. 继续现有的冲刺计划以确保交付部分范围

**正确答案：** A

一位项目经理正在领导一个涉及 70 个利益相关者的大型项目。项目经理从客户那里听到了各种各样的意见和期望，其中有些是相互矛盾的。因此，一些要求并不明确。  
项目经理应该怎样做才能就需求达成共识？

- A. 将问题上报给管理团队以供他们审查和指导
- B. 创建调查模板以收集利益相关者的反馈以达成协议
- C. 组织一次与所有利益相关者的面对面会议，了解他们的利益和关切
- D. 利用专家判断来确定应考虑的要求

**正确答案：** C

一位项目经理被要求领导一个项目。执行组织没有项目管理办公室 (PMO) 或正式的治理政策程序，以及此类项目的指南。  
项目经理应该首先做什么来确定项目的治理方法？

- A. 就项目要使用的最佳治理政策、程序和指南咨询主题专家 (SME)
- B. 咨询团队成员和利益相关者以确定组织是否有任何非正式的治理政策程序和指南
- C. 选择最适合项目性质的预测或敏捷框架，并将此框架用作项目治理政策、程序和指南的基础
- D. 指导自我管理团队为项目制定量身定制的治理政策、程序和指南

**正确答案：** A

作为项目团队的大力支持者和激励者的关键项目利益相关者即将离开组织。项目团队士气低落，团队合作不力。项目经理应该怎么做才能提高士气？

- A. 确定团队的需求和愿望
- B. 建立团队联系和情感纽带
- C. 通过团队参与凝聚共识
- D. 设定目标并推动团队实现目标

**正确答案：** A

中简教育PMP

DRAG DROP -

将左侧舞台的特征拖到右侧正确的 Tuckman Ladder 舞台上。

选择和放置：

| Characteristics                                     | Stages     |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Team members argue and are not openly collaborative | Forming    |
| Members are reassigned to other projects            | Storming   |
| Team members are independent and work in silos      | Norming    |
| Members adjust their work habits with trust         | Performing |
| Members are independent and work effectively        | Adjourning |

|       | Characteristics                                     | Stages                                              |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 正确答案： | Team members argue and are not openly collaborative | Team members are independent and work in silos      |
|       | Members are reassigned to other projects            | Team members argue and are not openly collaborative |
|       | Team members are independent and work in silos      | Members adjust their work habits with trust         |
|       | Members adjust their work habits with trust         | Members are independent and work effectively        |
|       | Members are independent and work effectively        | Members are reassigned to other projects            |

项目经理被任命负责部署新的解决方案。该解决方案将由第三方供应商集成到环境中。该供应商刚刚宣布延迟交付关键组件，这将影响项目进度。

项目经理应该做什么？

- A. 要求加快交付组件以降低进度延误的风险
- B. 确保确定相关利益相关者和期望并评估组件延迟
- C. 对解决方案的每个组件的发布内容进行详细分析
- D. 提出一种新的解决方案设计，将外部组件与内部组件结合起来

正确答案： A

拖放 -

将左侧的通信事件拖到右侧事件期间讨论的主要主题。

选择和放置：

Communication event

Daily meeting

Iteration retrospective

Iteration planning

Iteration review

Main subject

Goal for this iteration

Development flow

Backlog items completed or not

Continue, stop, or start actions

正确答案：

Communication event

Daily meeting

Iteration retrospective

Iteration planning

Iteration review

Main subject

Iteration planning

Iteration review

Daily meeting

Iteration retrospective



## DRAG DROP -

一家医院正在为其内部关键系统之一运行一个项目，以管理账单、患者数据和记录管理以及咨询报告和医生的输入。项目经理现在需要对已识别的风险进行分类。

将左侧的每种风险类型拖到右侧的正确示例中。

选择和放置：

| Type of Risk    | Example                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technical risk  | Availability of resources for the documentation and user manual preparation needs as this was not originally planned to be taken up by the project team             |
| Commercial risk | Availability of the output formats of the files to interface with the data and record management systems on time as they are not available with the project manager |
| Management risk | The interfaces to medical devices require support from vendors                                                                                                      |
| External risk   | Needs regulatory compliance and clearance standards for incorporation into the system                                                                               |

正确答案：

| Type of Risk    | Example         |
|-----------------|-----------------|
| Technical risk  | Management risk |
| Commercial risk | Technical risk  |
| Management risk | External risk   |
| External risk   | Commercial risk |

拖放 -

项目经理难以与其中一名团队成员沟通。该团队成员最近参加了一个培训课程，并一直在用一种新的敏捷技术培训其他团队成员。然而，有时即使其他团队成员感到不自在，该团队成员也会大力推动想法。在确定与该团队成员使用何种沟通方式时，项目经理应考虑哪些性格指标？  
选择和放置：

Drag The Personality Indicator #1 To The Team Member

Introverted (I)

Team Member

Extroverted (E)

Drag The Personality Indicator #2 To The Team Member

Judging (J)

Team Member

Perceiving (P)

正确答案：

Drag The Personality Indicator #1 To The Team Member

Introverted (I)

Extroverted (E)

Extroverted (E)

Drag The Personality Indicator #2 To The Team Member

Judging (J)

Judging (J)

Perceiving (P)



拖放 -

一位经验丰富的项目经理正在监督并购项目。项目经理对项目中的不同威胁做出不同的反应。

将左侧的缓解策略拖到项目经理当晚的行动中。

选择和放置：

Mitigation Strategies

Mitigate

Accept

Avoid

Escalate

Transfer

Project Manager's Actions

The project manager studied the threat and found it is out of their authority and scope.


The project manager analyzed the threat, took action to reduce the probability of occurrence, and conducted some additional tests.

The project manager identified the threat and decided to review it periodically rather than take action.

The project manager identified the threat, discussed it with the sponsor, and bought an insurance plan to handle it.

The project manager determined the threat was severe and acted promptly to handle this risk by changing project strategies and reducing project scope.

正确答案:

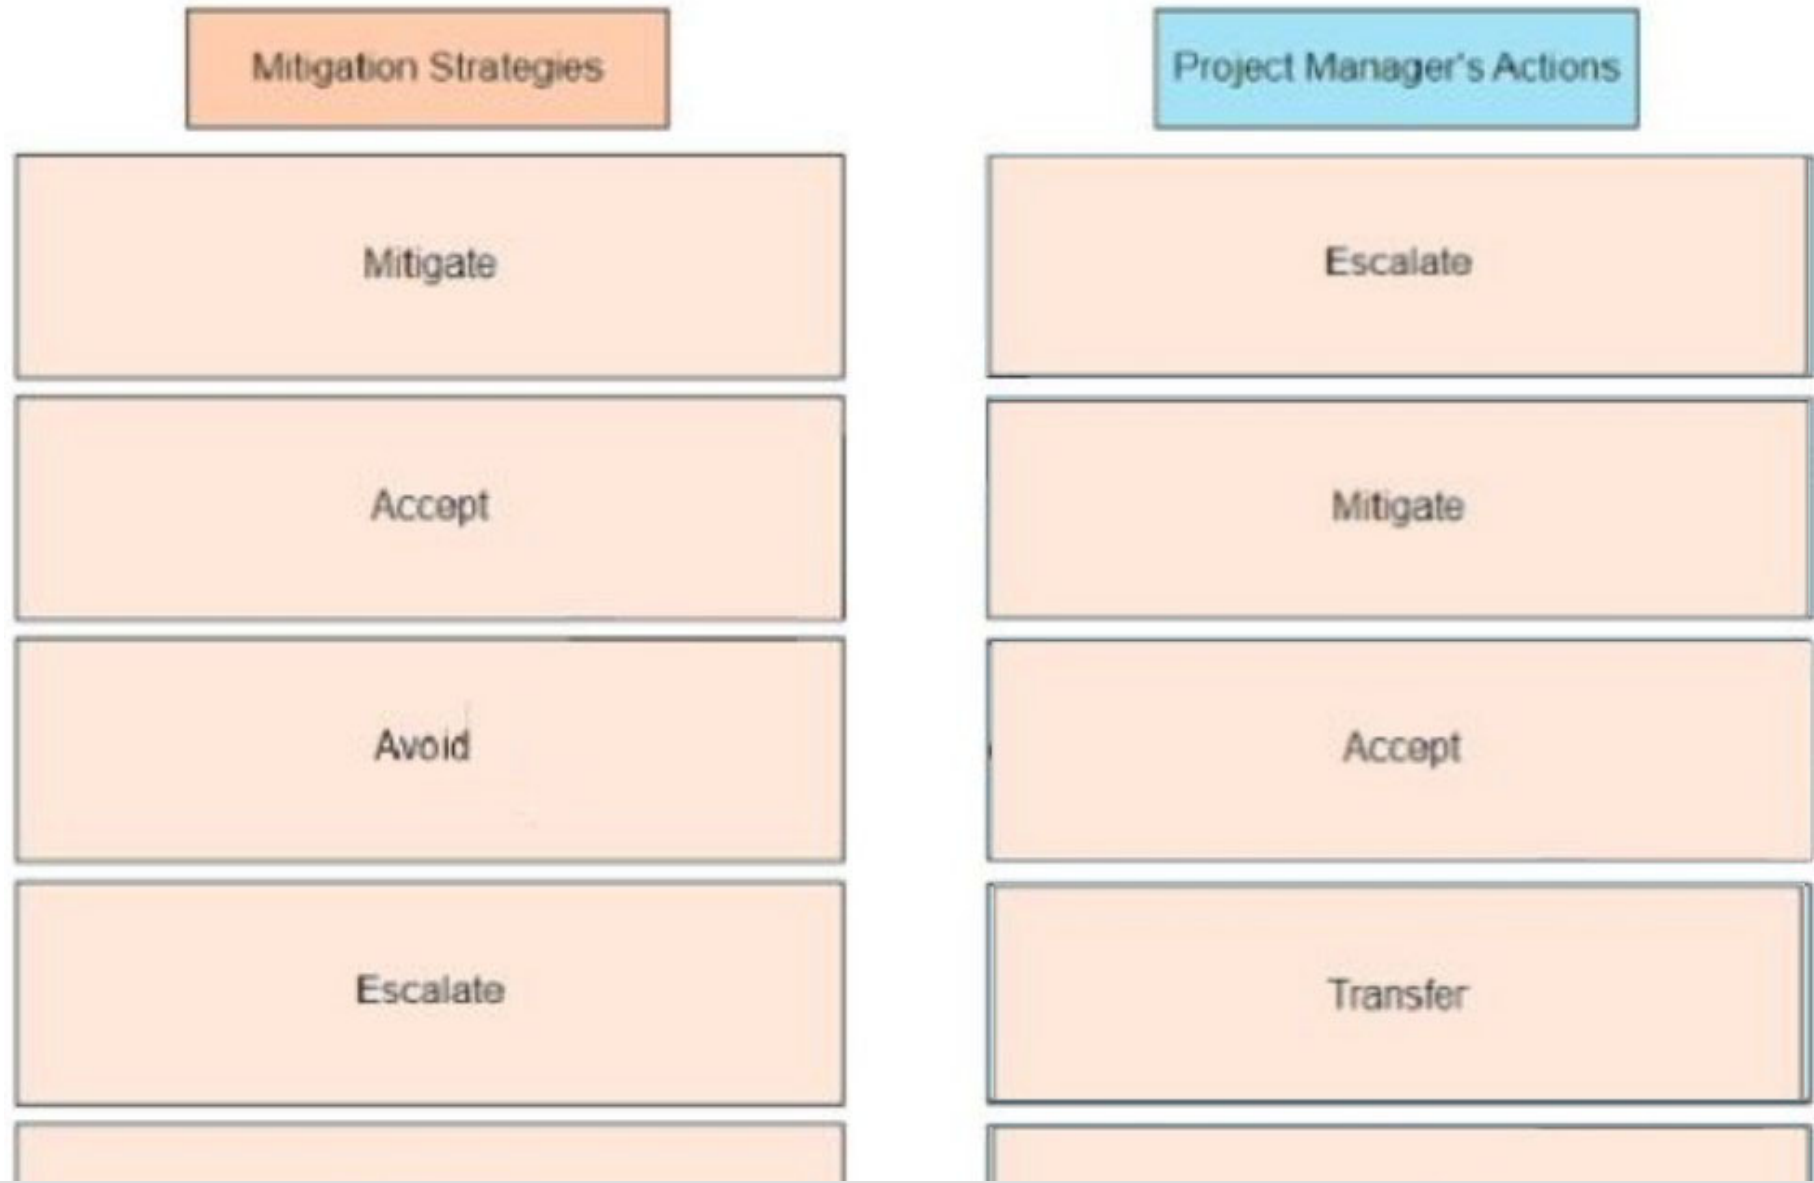

问题 #612

话题一

项目经理和保护团队正在制定一种战略方法来吸引内部和外部利益相关者。应该遵循哪种方法？

- A. 分析内部和外部利益相关者并为每个利益相关者制定定制的参与策略
- B. 安排与所有利益相关者的状态会议，让他们参与所有项目讨论和报告
- C. 对所有高风险利益相关者进行分类，并要求保护发起人直接与他们沟通
- D. 只让内部利益相关者参与，因为外部利益相关者不应访问机密信息

正确答案: B

问题 #613

话题一

分布式保护团队希望使用共同点原则来确保他们对范围有共同的理解。该团队要求保护领导建立一个研讨会。项目负责人应该做什么？

- A. 请开发组资深成员详细阐述范围
- B. 邀请参与者参加研讨会，并留出足够的准备时间
- C. 减少参与人数，确保更容易达成共识
- D. 向参与者提供具体的指示和期望

正确答案: A

拖放 -

政府组织的项目经理经常处理利益相关者参与问题。将左侧项目经理应该使用的人际交往能力拖到右侧的正确情况。  
选择和放置：

Interpersonal Skills

Decision making

Negotiation

Political awareness

Cultural awareness

Situations

Site workers often come up with complaints about working conditions, but the project manager cannot improve the conditions.

The project manager wants to stay updated on instability in the government and the possibility that the current government leader may resign.

The project manager is assigned to work in a rural area where people have different customs.

A new government has been formed, and the project manager has been awarded a chair position to reform government policies.

正确答案：

Interpersonal Skills

Decision making

Negotiation

Political awareness

Cultural awareness

Situations

Negotiation

Political awareness

Cultural awareness

Decision making

DRAG DROP--

一个敏捷团队在地理上分散在多个大洲，项目经理正在确定管理虚拟团队之间通信的工具。  
将左侧的适当工具拖到右侧的每个保护任务中。  
选择和放置：

Tool

Online bulletin boards

Chat rooms

Video conferencing

Version control system

Project Task

Negotiation

Routine information

Project deliverables

Team discussion

正确答案：

Tool

Online bulletin boards

Chat rooms

Video conferencing

Version control system

Project Task

Video conferencing

Online bulletin boards

Version control system

Chat rooms

一位客户提到，在过去 2 个月中，他们没有收到已完成工作的发票。客户已表示，如果未发送发票，他们将释放资金用于其他活动。  
项目经理接下来应该做什么？

- A. 与客户合作并商定向他们提供发票的时间表
- B. 联系计费团队并指示他们立即开具发票
- C. 审查以前的账单信息并准备纠正措施计划
- D. 沟通并通知客户继续放款

正确答案： C





在执行敏捷保护的中途，组织层面的战略目标发生了转变，以促进数字化转型。  
项目经理接下来应该做什么？

- A. 安排与团队的会议以评估变更的影响
- B. 升级给产品负责人并取消即将到来的迭代
- C. 准备一个用户故事来处理变更并将其分配给下一个迭代
- D. 用战略变化更新风险优先的积压

**正确答案：** A

中简教育PMP

拖放 -

将左侧的项目拖到右侧正确项目方法中的匹配术语。

选择和放置：

are controlled as requirements and constraints emerge

are elaborated frequently during delivery

are continuously involved

are controlled by detailed planning

are defined up-front before development team begins

are constrained as much as possible

are incorporated in real-time during delivery

are involved at specific milestones

### Predictive

Requirements

Changes

Risk and Cost

Key Stakeholders

### Agile


Requirements

Changes

Risk and Cost

Key Stakeholders

正确答案：

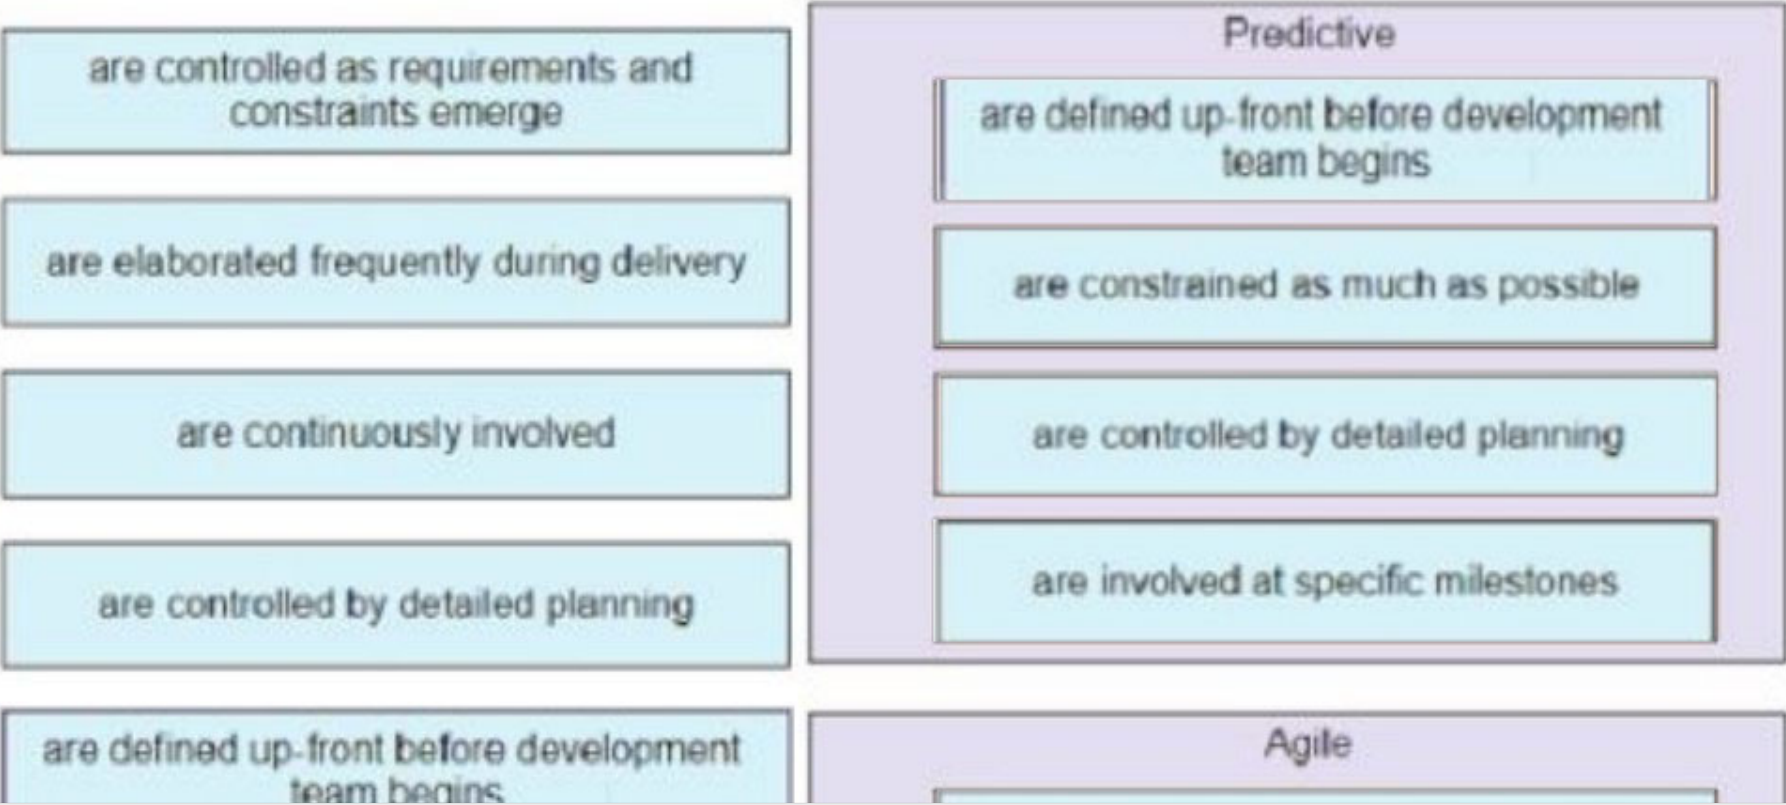

问题#620

话题一

项目经理被分配到一个项目，该项目将改善贸易公司的业务运营。项目组刚刚完成发现阶段，需要在4周内向业务团队做一个 Presentation，展示解决方案的可行性。  
项目经理应该如何建议团队继续进行？

- A. 制定一个概念框架。
- B. 制定提案请求 (RFP)。
- C. 开发原型。
- D. 开发最小可行产品 (MVP)。

正确答案： C

问题 #621

话题一

项目评审在项目中定期进行。该团队遇到了一个关键技术问题，将在下一次项目审查中讨论。  
项目经理应该邀请谁参与审查，以便对前进的方向做出有效的决定？

- A、 内部团队
- B、 项目组
- C、 管理团队
- D. 最终用户团队

正确答案： A



项目经理正在启动一个敏捷项目，供应商将为其交付一些外部组件。然而，其中一家供应商将无法以增量、协作的方式交付其组件。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 向项目发起人提交请求，要求将供应商替换为可以按照敏捷方法工作的供应商。
- B. 要求项目管理办公室 (PMO) 放弃在项目中使用敏捷方法以适应供应商。
- C. 让供应商使用另一种方法交付组件，然后在不改变整体敏捷方法的情况下将其集成到项目中。
- D. 在使用敏捷方法完成工作后，要求产品所有者将组件移至产品待办事项列表中进行处理。

**正确答案：** B

项目经理领导着一个地理位置分散的团队。该团队需要协作并最终确定月度报告。由于时差的原因，偶尔会在周末举行会议。团队成员表示他们不想在周末加班。

项目经理应该做什么？

- A. 接管活动并在周末需要工作时交付报告。
- B. 避免在团队成员需要在周末工作的月份进行报告。
- C. 提醒团队成员他们在团队章程中规定的治理责任。
- D. 与项目利益相关者沟通，报告将在一年中的某些月份延迟。

**正确答案：** C

当前迭代的一个关键可交付成果给团队带来了困难。功能和质量问题不断出现，拖延迭代进度。

项目经理听取了团队的担忧，发现团队成员之间的工作没有得到很好的协调。

项目经理应该采取哪两项措施来处理这种情况？（选择两项。）

- A. 制定团队绩效报告以在下一次回顾会议上讨论。
- B. 明确说明团队成员之间的工作流程。
- C. 安排一次迭代积压改进会议以了解问题。
- D. 安排一对一的会议，向团队成员提供反馈。
- E. 确定问题的优先级，关注那些影响迭代目标的问题。

**正确答案：** 光盘

项目经理正在管理一个大型项目。在审查会议期间，项目经理发现曾经表现出色的团队成员之一无法按时完成工作。

项目经理应该做什么？

- A. 与团队成员交谈以确定他们的表现发生变化的原因。
- B. 与团队成员的经理交谈以提供更多培训。
- C. 与团队成员和人力资源 (HR) 代表交谈。
- D. 与项目负责人交谈并要求他们分配要求较低的任务。

**正确答案：** A

一个组织正在启动一个将使用新技术的项目。项目的复杂性需要出色的技术技能。在审查了拟议的项目管理计划后，项目发起人要求在不给项目交付带来风险的情况下降低劳动力成本。

项目经理首先应该做什么？

- A. 审查风险登记册并将职能经理分配为资源。
- B. 对关键成本驱动因素进行分析并提出备选方案。
- C. 分析资源库并分配参与过往项目的内部资源。
- D. 审查工作分解结构 (WBS) 以确保有足够的资源。

**正确答案：** B

项目经理正在使用敏捷方法。在冲刺计划会议期间，产品负责人将积压项目标记为高商业价值且易于实施。但是，其他团队成员发现该项目与另一个被标记为低业务价值和高复杂性的项目之间存在高度依赖性。

项目经理应该如何支持积压工作的优先级排序？

- A. 支持团队将这两个项目移至下一个冲刺，届时团队将了解更多信息。
- B. 在此冲刺中优先考虑标记为高商业价值和低复杂性的项目。
- C. 促进讨论，直到团队就这两个项目达成一致。
- D. 优先考虑被标记为具有低商业价值和高复杂性的依赖项。

**正确答案：** C

项目经理与开发团队会面，估计完成软件应用程序所需的时间。软件开发人员是公司的新人，他们从未开发过类似的应用程序。

项目经理应该推荐哪种估算技术？

- A. 类比估计
- B. 参数估计
- C. 计划扑克
- D. 三点估计

**正确答案：** D

项目发起人坚持新产品发布的项目范围应包括两个地理位置。然而，在项目范围界定会议结束后，项目章程完成并仅批准了一个地点。

项目经理应该做什么？

- A. 要求发起人增加项目的预算和进度以适应额外的范围。
- B. 评估对范围的影响，并在将这两个位置纳入项目范围之前提交变更请求以供批准。
- C. 与发起人讨论项目范围已获批准，不可能包括两个地点，因为这会影响预算。
- D. 鼓励发起人为额外的地点启动另一个项目，以免当前项目受到影响。

**正确答案：** B

一个项目正在进行六个迭代中的第五个迭代。团队中的一名成员意外离开了公司。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 进行一些必要的工作以尽量减少影响。
- B. 邀请利益相关者讨论缓解计划。
- C. 在状态报告中详细说明项目延迟的原因。
- D. 登记问题并将其上报给项目发起人。

**正确答案：** B

一家建筑公司正在执行一份建筑合同，其中包括用于更换建筑物某些组件的确定里程碑。在执行过程中，客户抱怨新组件不符合要求。

项目经理应该怎么做才能防止这种情况发生？


- A. 不断与客户沟通工作计划和协议的变更
- B. 在开始构建阶段之前商定的质量检查表中定义的验收标准
- C. 对因约定要求差异引起的问题提供补偿
- D. 在开始构建阶段之前批准了详细的变更管理流程

正确答案： B


DRAG DROP -

生产团队将很快开始他们的第一个敏捷项目。团队或管理层中没有人具备敏捷知识。培训经理只能资助三个注册。

将左侧的团队角色与右侧的正确培训课程相匹配。

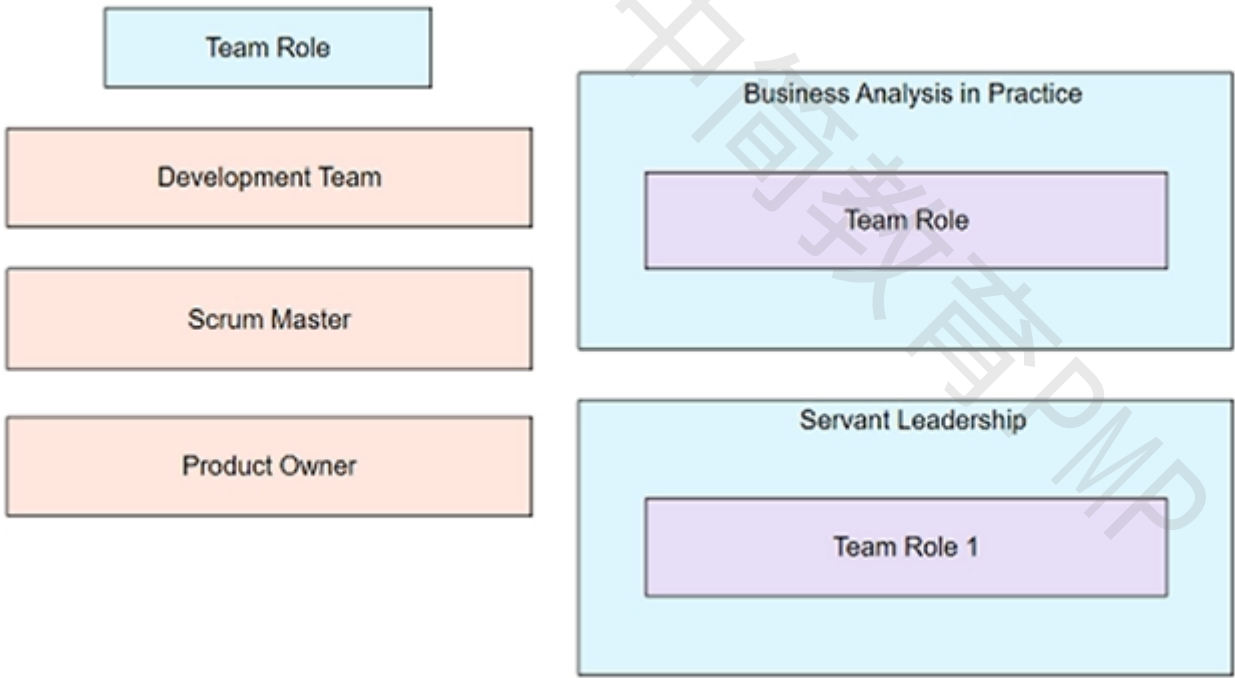

正确答案：

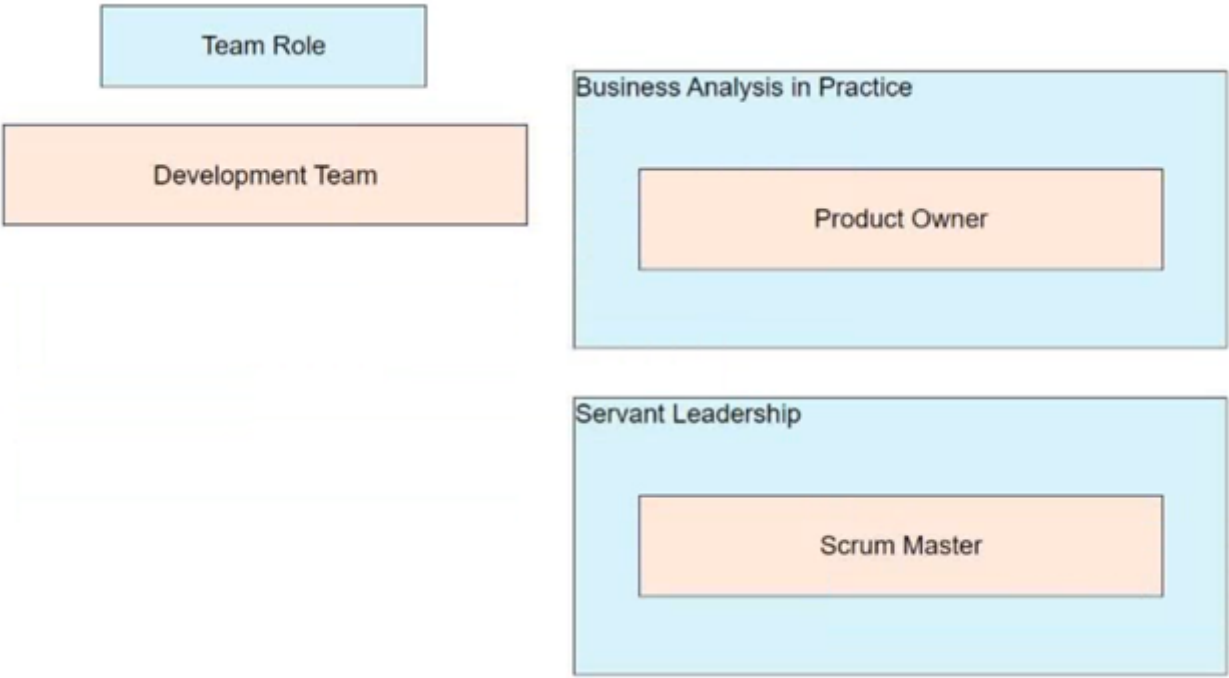

敏捷团队处于项目开发周期的早期阶段；但是，他们已经开始向客户提供功能。该团队已确定该项目的风险，并正在制定缓解策略。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将风险上报给项目发起人和指导委员会。
- B. 根据最高影响实施风险缓解策略。
- C. 根据影响将风险纳入风险登记册并确定风险的优先级。
- D. 确定任何新风险是否有任何财务影响。

**正确答案：** C

项目利益相关者抱怨他们没有收到进度表中规定的重要交付。负责该可交付成果的团队成员解释说，他们向利益相关者发送了一封电子邮件，通知他们该可交付成果将无法按时交付。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 确认利益相关者已了解交付延迟。
- B. 直接与利益相关者就交货延迟进行沟通。
- C. 告诉团队成员将未完成的可交付成果发送给涉众并稍后完成。
- D. 确保团队成员不直接与项目利益相关者沟通。

**正确答案：** A

在向七个人发送了项目启动会议的现场会议邀请后，一位关键利益相关者拒绝了，因为他们将在本月剩下的时间里在另一个地点。

项目经理应该做什么？

- A. 将启动会议改为虚拟会议，这样所有人都可以同时参加。
- B. 与其他利益相关者举行启动会议以避免项目延误。
- C. 重新安排下个月的启动会议，以便所有人都可以现场参加。
- D. 安排利益相关者以虚拟方式参加启动会议。

**正确答案：** D

在项目结束时，项目经理被要求提供项目团队成员的绩效评级。

项目经理主要参考什么？

- A. 项目利益相关者的投入
- B. 项目发起人的反馈
- C. 商定的关键绩效指标 (KPI)
- D. 团队成员的能力

**正确答案：** C

项目经理准备了项目收益管理计划。

该文件应包含以下哪些内容？

- A. 战略调整、利益所有者、风险登记册
- B. 目标利益、利益所有者、经验教训
- C. 项目要求、目标收益、问题日志、指标
- D. 目标效益、战略调整、实现效益的时间框架

**正确答案：** D

在一个全球项目中，主要定义在 A 国制定，项目交付将在 B、C 和 D 国分阶段完成。B 国发现其中一项法律要求未得到满足。

项目经理应该怎么做才能避免这种情况？

- A. 针对每个国家/地区的管理风险缓解策略。
- B. 要求采购分配位于每个国家的资源。
- C. 选定的具有类似监管要求的国家。
- D. 确定了各国之间的监管差异。

**正确答案：** D



在一个频繁变化的项目中，项目经理在日常会议中发现了客户需求的变化。项目经理应该做什么？

- A. 由于变更未包含在原始要求中，因此上报给管理层批准。
- B. 告诉客户，如果管理层批准，需求变更将进入下一个项目阶段。
- C. 将变更交给 scrum master 以调查变更需要多少额外的努力。
- D. 在重新定义范围之前，与产品所有者和开发团队一起验证需求变更。

**正确答案：** D

随着生产部署的临近，客户关心产品交付的质量。项目经理接下来应该做什么以确保验收可交付成果？

- A. 在推进产品之前核实生产预算。
- B. 评估产品合规性的质量检查表。
- C. 审查批准的产品出口标准。
- D. 按照要求测试产品集成。

**正确答案：** B

刚刚部署了一个混合项目，项目经理正在计划通过经验教训研讨会结束项目。一位关键利益相关者告诉项目经理，让 Scrum 团队参加研讨会是在浪费时间，因为项目已成功交付。

项目经理应该做什么？

- A. 邀请 Scrum 团队成员作为可选参与者。
- B. 让 Scrum 团队成员分享回顾。
- C. 邀请 Scrum 团队成员作为强制参与者。
- D. 请 scrum master 参加研讨会。

**正确答案：** B

一个敏捷的数据库迁移项目会影响公司几乎所有的业务部门。已尽一切努力在数据库平台的支持终止日期之前完成迁移。现在的一个新障碍意味着需要以更高的支持价格继续使用旧平台一年。

对于这种情况，产品负责人应该怎么办？

- A. 根据延迟的价值和成本除以持续时间来重新确定积压的优先级。
- B. 切换到预测方法以防止进一步延迟完成。
- C. 根据故事规模和能力可用性重新确定积压工作的优先级。
- D. 从积压订单中移除低价值项目以补偿较高的成本。

**正确答案：** D

一位项目经理正在领导一项产品功能的推出，该产品功能将为视频流应用程序赢得更多订阅者。在积压的梳理阶段。业务利益相关者无法理解与产品的功能集成并提出了担忧。

项目经理可以做什么来演示功能集成？

- A. 在迭代评审中包括业务干系人。
- B. 让业务干系人参与迭代回顾。
- C. 为迭代评审创建任务并将其添加到待办事项列表中。
- D. 与业务利益相关者一起详细审查积压工作。

**正确答案：** A

一家公司正在推出一种新产品，该产品必须在夏季开始前准备就绪。在发现过程之后，团队意识到需求非常不确定。

项目经理应该做什么？

- A. 要求在团队中包括一些业务主题专家 (SME)。
- B. 记录风险并制定应急计划以按时完成项目。
- C. 协助团队提出最小可行产品（MVP）。
- D. 邀请利益相关者讨论项目需求的优先次序。

**正确答案：** C

一个项目团队已经完成了六个迭代中的第一个迭代。迭代的交付性能（速度）为 50%。在迭代回顾中，团队意识到工作的复杂性被低估了。

项目经理应该做什么？

- A. 更新问题日志并将其上报给项目发起人。
- B. 请技术经理帮助团队解决问题。
- C. 与团队会面，审查解决问题的内部行动。
- D. 要求用更有经验的人替换一些团队成员。

**正确答案：** C



项目经理正在与主要利益相关者一起审查项目章程草案。会议期间，发起人和产品负责人之间发生了冲突。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 继续开会，让项目发起人和产品负责人离线进行讨论。
- B. 继续会议并使用引导技巧来改善团队内部的沟通。
- C. 推迟会议并邀请主题专家 (SME) 参加下次会议。
- D. 推迟会议并要求项目发起人和产品负责人将他们的讨论转移到线下。

**正确答案：** B

在每日站立会议中，开发人员表示将不会交付积压项目，因为他们需要在接下来的几天内意外休假。积压项是用户在下一个冲刺评审中期望的功能的先决条件。

项目负责人应该做什么？

- A. 与产品负责人一起改变 sprint backlog 中的优先级。
- B. 与产品负责人合作，通知用户该功能已延迟。
- C. 要求开发经理提供几天的替代品。
- D. 要求开发商推迟休假，直到积压项目交付。

**正确答案：** B

一个组织正在向敏捷交付过渡，并且已经组建了一个新团队。项目进展不顺利，因为团队速度的变化非常大，而且每个冲刺交付的成果都低于承诺。已为该项目分配了一位具有强大技术背景的新项目负责人。

项目负责人应该做什么？

- A. 要求仅由高级开发人员提供估算。
- B. 在回顾中推荐不同的估计方法。
- C. 在冲刺计划中分配更多的时间进行评估。
- D. 审查并更新每日站会中的估算。

**正确答案：** C

项目团队成员刚刚通知项目经理，团队用于执行计算的软件许可证刚刚过期。结果，团队无法继续执行他们的项目任务。

项目经理首先应该做什么？

- A. 向项目发起人发出正式投诉，声称缺少合适的工具。
- B. 要求团队成员找到执行计算的替代方法。
- C. 要求团队快速跟踪项目并执行不需要计算的任务。
- D. 与 IT 团队会面，评估软件许可证的更新速度。

**正确答案：** D

在月度审查会议上，一位表现出色的团队成员提出了对质量反馈机制的担忧。团队成员表示他们无法提供高质量的输出。

项目经理首先应该做什么？

- A. 要求利益相关者提供有关质量交付的反馈。
- B. 与职能经理协商分配工作。
- C. 与团队讨论并审查质量过程。
- D. 根据团队成员的技能组合分配工作。

**正确答案：** D

项目团队的成员总是扩展讨论主题，在项目团队会议期间花费比必要更多的时间。其他团队成员认为该成员没有善待他们的时间。

项目经理应该做什么？

- A. 向团队解释需要进行公开讨论，但提醒团队遵守基本规则。
- B. 要求该成员只讨论当前话题以实现团队效率。
- C. 要求团队接受来自该特定成员的输入，因为他们的输入可能有用。
- D. 允许自组织团队内部讨论情况并达成解决方案。

**正确答案：** A

项目经理正在使用敏捷方法为石油和天然气客户开发软件项目。项目经理在准备进度表时遇到困难，因为项目有各种未知数。

项目经理应该使用哪种进度安排方法来制定进度表？

- A. 类比调度
- B. 三点调度
- C. 迭代调度
- D. 参数调度

**正确答案：** C

一家公司最近采用敏捷开发创新项目。项目经理遇到了一些团队成员的问题，他们认为一些敏捷仪式是不必要的。

项目经理在项目开始前应该做什么？

- A. 准备了一个启动平台并清楚地解释了敏捷仪式的目的及其对项目的好处。
- B. 与项目发起人讨论如何说服团队将敏捷仪式作为日常工作的一部分。
- C. 与产品负责人讨论并通过要求采用敏捷仪式来请求帮助。
- D. 进行了一项调查以确定团队是否愿意在当前项目中采用敏捷仪式。

**正确答案：** A

公司通常会为特定的核心活动外包资源。由于突发的、不可预见的风险，所有团队成员都需要远程工作，包括外包人员。

项目经理如何应对这一挑战以确保外包供应商交付？

- A. 制定新的资源沟通和管理战略。
- B. 审查缓解活动的风险管理计划。
- C. 审查与供应商的协调和沟通成本。
- D. 提交变更请求以增加应急预算。

**正确答案：** A

一个项目正在进行六个中的第二次迭代。该团队意识到关键的可交付成果将取决于新设备的采购。

项目经理应该做什么？

- A. 邀请利益相关者讨论新可交付成果的优先级。
- B. 在状态报告中详细说明交付延迟的原因。
- C. 登记风险并将其上报给项目发起人。
- D. 包括核心团队的收购责任。

**正确答案：** A

项目经理在矩阵组织中工作，负责管理旨在减少公司内部跟踪系统中的冲突的内部软件开发项目。在开发过程中，项目经理被告知该软件必须考虑政府会计要求的意外变化。开发团队能够在没有额外成本的情况下进行更改；然而，项目经理注意到测试成本开始超过测试预算。

项目经理应该做什么？

- A. 要求项目发起人从应急储备中拨款用于额外检测。
- B. 进行成本效益分析以确定是否可以从开发团队重新分配资金。
- C. 通过治理流程向成本基线提交变更请求，以资助额外的测试。
- D. 更新估算基础和成本管理计划以跟踪测试所需的额外资金。

**正确答案：** C

项目经理为项目安排虚拟每日站立会议，但一半的团队成员经常迟到或一起错过会议。项目经理应该做什么？

- A. 与团队讨论基本规则，包括每日会议。
- B. 商定新时间并重新安排每日站会。
- C. 使用一对一的虚拟会议，因为它们更有效率。
- D. 就这种情况向高级管理层寻求指导。

**正确答案：** A

项目经理非常了解组织的行业标准，并认为这些标准没有反映在项目可交付成果中。项目经理接下来应该审查什么？

- A. 组织过程资产 (OPA)
- B. 质量过程
- C. 项目章程
- D. 质量管理计划

**正确答案：** A

项目经理被分配到一个多年期项目。在项目执行期间，客户委派了一位新代表，该代表直接联系项目经理，关心他们是否参加状态会议。代表想直接联系团队成员。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 向新代表发送经批准的项目管理和沟通管理计划。
- B. 直接联系客户寻求帮助，将新代表纳入项目管理计划。
- C. 与新代表会面以确定他们对项目的理解并解决他们的顾虑。
- D. 与项目发起人会面，讨论如何将新代表纳入项目。

**正确答案：** C

一个团队正在准备收尾阶段并为下一阶段制定计划。项目发起人之一抱怨最后阶段存在一些质量可交付问题。但是签了质量验收文件。

项目经理应该做什么？

- A. 推迟下一项目阶段，直到评估质量问题的影响。
- B. 重开质量验收文件增加申办者投诉。
- C. 安排质量审查会议并包括发起人的投诉。
- D. 审查最佳实践和经验教训并将其应用到项目计划中。

**正确答案：** C

项目经理的任务是开发一种辅导模型，以支持和认可团队成员的成长。

项目经理在定义他们的辅导策略时应该考虑什么？

- A. 个人和个人目标
- B. 组织的战略目标
- C. 既定的沟通模式
- D. 项目团队的目标

**正确答案：** D

团队意识到无法访问项目完成当前迭代所依赖的数据。这种依赖性众所周知；但是，该团队不确定消除此障碍的可用选项。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将相关任务移至下一次迭代。
- B. 指导团队确定备选方案。
- C. 将问题上报给公司的 IT 经理。
- D. 将问题上报给项目发起人。

**正确答案：** B

内部虚拟团队每天开会审查迭代进度，并与主要利益相关者进行其他技术和后续电话会议。团队似乎脱离了。

项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 减少内部和外部会议的次数。
- B. 安排一对一会议和团队建设会议。
- C. 审查团队分配并减少工作量。
- D. 给团队成员几天假以减轻压力。

**正确答案：** B

一个主要的公共交通建设项目旨在显着减少排放。由于不遵守环境法规和规章制度，该项目已被严重拖延。

项目经理应该做什么来防止这种情况发生？

- A. 任命一名高级环境合规官直接向项目经理汇报。
- B. 鉴于项目的环境重要性，向监管机构申请部分豁免。
- C. 根据过去项目的类似延误纳入足够的进度储备。
- D. 绘制环境合规要求，确定实现这些要求的风险，并准备缓解措施。

**正确答案：** D



项目验收标准包括对系统新用户的现场培训。由于不可预见的情况，所有团队成员都必须无限期地远程工作。

项目经理应该做什么？

- A. 将现场培训重新安排为在线课程。
- B. 记录项目问题并提供选项。
- C. 创建风险并分配补救措施。
- D. 取消所有现场培训课程。

**正确答案：** B

一位项目经理正在领导一个软件开发项目，该项目将协助发电厂的维护管理。项目经理正在分析项目绩效数据，并试图预测项目未来是否会出现任何延误。

项目经理应该做什么？

- A. 进行进度分析。
- B. 进行质量控制分析。
- C. 进行趋势分析。
- D. 执行根本原因分析 (RCA)。

**正确答案：** C

在过去的四次审查中，一个项目报告的进度绩效指数 (SPI) 一直在下降。没有正在制定的纠正措施，项目团队似乎并不担心。

项目经理应该首先做什么来应对 SPI 趋势？

- A. 通知项目干系人需要缩小范围以将成本控制在预算范围内。
- B. 与项目团队合作制定一个计划，该计划将在定义和增量的基础上交付收益。
- C. 联系项目发起人，让他们知道您需要更多资源来满足进度。
- D. 与项目调度员会面，使用更现实的时间表重新设定项目基线。

**正确答案：** D

由于缺少专业资源，一个非常关键的项目处于危险之中。

新上任的项目经理首先应该做什么？

- A. 在组织内寻找可用的专业人员来填补空白。
- B. 确定团队成员拆分所需任务的可能性。
- C. 分配资金寻找外部专业人员来填补空白。
- D. 为缺少的专业知识申请额外的团队培训预算。

**正确答案：** A

在项目执行期间突然实施旅行限制。团队成员居住在不同的地理位置。

项目经理接下来应该做什么来解决这个问题？

- A. 获取并实施赞助商的解决方案建议。
- B. 要求团队成员在检查需求和备选方案时独立进行。
- C. 暂停活动，直到团队可以在现场恢复工作。
- D. 停止所有流程，直到解决方案的采购和实施完成。

**正确答案：** B

项目团队正在对产品进行发布后评估，需要来自七个利益相关者的详细反馈。六位利益相关者及时提供了反馈。尽管团队多次提出要求，其中一位仍未提供任何反馈。

在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A. 向发起人解释为什么不情愿的利益相关者需要提供反馈。
- B. 主持与不情愿的利益相关者和项目团队的会议，以解决任何冲突。
- C. 会见所有七个项目利益相关者并请求他们的所有反馈。
- D. 安排与不情愿的项目利益相关者会面以获得他们的反馈。

**正确答案：** B



压力大的情况给团队带来了一些挑战。项目经理注意到一些团队成员的压力行为，并且它开始在整个团队中蔓延。项目经理需要指导团队改变他们的心态，以提高效率。

项目经理应该做什么？

- A. 通过有效的团队管理，确保人们互相关心并有效地合作。
- B. 营造尊重和公平的环境，使团队能够在压力大的情况下提高项目绩效。
- C. 建立一个高效的环境，所有团队成员都可以在工作量上互相帮助。
- D. 与团队会面，讨论压力情况下正确的、预期的行为并开始练习。

**正确答案：** B

一个项目七次开始第六次迭代。在日常会议中，一名团队成员解释说，完成一项关键职能所需的时间比原先预期的要长。

项目经理应该做什么？

- A. 寻求帮助以提高团队按时交付的能力。
- B. 要求项目延期以交付承诺的范围。
- C. 更新问题日志并将问题上报给项目发起人。
- D. 与项目团队一起审查选项和可能的解决方案。

**正确答案：** D

拖放 -

项目团队使用网络图方法制定了初始进度表，并得出了整个项目的持续时间。在检查进度时，项目经理发现有几个活动可能需要缓冲以减轻或消除潜在的进度冲突。

将以下常用术语与其评估缓冲区或约束的解释相匹配。

Terms

Parkinson's Law

Self-Protection

Student Syndrome

Dropped Baton

Explanation

Workers are reluctant to finish tasks early so as not to communicate their efficiency and set precedents for future tasks.

An activity is not ready to start and the preceding activity finishes early, resulting in lost time between activities.

Procrastination in starting activities can use up valuable slack built into the activity duration.

Workers use all the time allocated for an activity regardless of how long it actually takes to complete the task.

正确答案:

Terms

Explanation

Self-Protection

Student Syndrome

Dropped Baton

Parkinson's Law

项目章程已获批准，项目经理已分配给该项目。项目经理目前正在与项目团队一起细分项目工作包。

项目经理在做什么？

- A. 资源均衡
- B. 工作分解结构（WBS）
- C. 分解
- D. 网络图

**正确答案：** C

一家大型矩阵组织正在采用一种新的沟通方式。这是必要的，因为他们的项目通常需要来自各个部门和部门的专家形式的专家知识资源。

项目经理应该怎样做才能建立有效的沟通？

- A. 关注收件人的需求而不是信息本身。
- B. 使用尽可能高的技术语言，避免使用隐喻。
- C. 确保发送给收件人的消息已送达。
- D. 计划以易于理解的方式传递信息。

**正确答案：** A

项目经理正在从事一个与组织的项目性质不同的独特项目。项目经理正在为这个新项目裁剪工件。

谁应该决定项目中应该使用哪些工件？

- A. 项目干系人应开会并确定项目经理和项目管理团队要使用的项目工件。
- B. 项目经理和项目管理团队应该使用数据库中的标准项目工件。
- C. 项目发起人应该选择项目经理和项目管理团队应该在项目中使用的项目工件。
- D. 项目经理和项目管理团队应该选择合适的工件用于特定项目。

**正确答案：** D

组织正在为业务项目使用混合交付方法。产品负责人，也就是管理项目的人，被提升到更高的职位。一个新的项目负责人加入了该项目。

项目负责人应该使用哪个工件来确保项目收益已被识别？

- A. 工作说明书 (SOW)
- B. 商业案例
- C. 产品积压
- D. 解决方案架构

**正确答案：** B

一个多年期资源限制项目正处于执行阶段的中途。在进度更新会议期间，已确定交付项目可能存在进度延迟。项目经理观察到所有团队成员都在努力工作，并且已经完成了许多可交付成果。

对于这种情况，项目经理应该立即做什么？

- A. 记录进度风险并将新的资源需求提交给变更管理委员会以进行进度恢复。
- B. 通过突出显示已完成的可交付成果并向管理层传达延误来准备月度报告。
- C. 要求项目计划者确定关键路径和各自延迟的活动，然后调查延迟的原因。
- D. 要求调度员根据在制品 (WIP) 的百分比更新进度表，并将结果传达给团队。

**正确答案：** D

一个正在进行重大转型的组织启动了一个项目来改进和记录业务流程。该项目的目标之一是实施敏捷项目交付。

采用敏捷的主要原因是什么？

- A. 项目将更快完成，节省时间和金钱。
- B. 项目交付时对组织的风险非常低。
- C. 项目将根据优先级尽早交付和使用价值。
- D. 交付的项目将节省大量成本。

**正确答案：** C

一家公司指定了一家供应商来交付软件，并指派了一名内部项目经理。供应商声明不需要客户进行技术开发或测试。项目经理想与所有利益相关者确认这一点。

内部项目经理首先应该做什么？

- A. 主持与利益相关者的协调会议，以正式确定项目要求。
- B. 制定用户验收测试计划以确保可交付成果的质量。
- C. 告知供应商需要进行客户测试。
- D. 将项目计划分发给所有相关方。

**正确答案：** A

由于协作工具，分布式项目团队存在沟通问题。团队认为可以通过更改协作平台来提高效率。

项目经理应该做什么？

- A. 实施其他项目团队使用的沟通工具。
- B. 将问题上报给发起人并要求他们做出决定。
- C. 通知项目团队继续使用当前工具。
- D. 与项目团队讨论并选择合适的工具。

**正确答案：** D

一些开发人员在每日站会上确定了障碍列表，并请求项目负责人协助确定它们的优先级。有一些复杂的积压项目，新的初级测试人员发现了一些合规性缺陷。产品负责人和几个开发人员将离开项目团队，与测试和生产支持合作伙伴的合同将不会续签。

项目负责人应该首先关注哪个问题？

- A. 招聘、入职和培训新的开发人员。
- B. 寻找新的产品负责人来优先处理产品待办事项。
- C. 制定新的生产支持合同。
- D. 会议讨论的监管合规问题。

**正确答案：** A

当关键利益相关者请求不在范围内的额外工作时，项目经理正在领导一个项目。利益相关者还担心项目发起人可能不会批准和资助额外的范围变更。

项目经理首先应该做什么？

- A. 与发起人讨论请求的变更。
- B. 评估额外请求工作的成本。
- C. 与团队讨论请求的变更。
- D. 评估影响并提交变更请求。

**正确答案：** D

项目经理刚刚收到运营职能经理的来信，要求完成几周前正式关闭的项目的附加范围项目。作为日常运营活动的一部分，范围看起来相对较小且易于处理。

项目经理应该如何处理这个请求？

- A. 检查组织中可用于请求的替代资源。
- B. 确认预算和资源可用于执行工作请求。
- C. 评估请求的性质并相应地计划沟通。
- D. 提交变更请求并分配执行所需的预算和资源。

**正确答案：** A

项目经理计划与客户会面，召开每周风险管理会议。项目经理观察到其中一项具有外部依赖性的任务延迟了一周。项目经理知道这会产生影响，但不知道具体细节。

项目经理应该做哪两件事？（选择两项。）

- A. 与外部供应商的权威讨论这个问题。
- B. 收集更多信息并估计影响。
- C. 等待客户提出疑虑并收集更多信息。
- D. 回顾从过去类似项目中吸取的教训。
- E. 更新风险日志并在与客户的会议上提出。

**正确答案：** BE



一位新的团队成员加入了项目团队。在第一个冲刺期间，新团队成员找到项目经理并要求实施新的测试方式。该团队一直抵制提议的变更。

项目经理应该做什么？

- A. 要求新团队成员只专注于开发而不是进行测试。
- B. 指导新团队成员按照该项目一贯的方式进行测试。
- C. 安排与新团队成员的会面以了解新的测试方法。
- D. 要求新团队成员按照该项目一贯的方式进行测试。

**正确答案：** B

指导委员会成员抱怨每周报告。他们表示报告太长，有不必要的细节。结果，他们无法获得主要信息并采取行动。

项目经理应该怎么做才能避免类似的投诉？

- A. 向该指导委员会成员发送一份较短的每日报告。
- B. 在指导委员会成员的演示中展示每周报告。
- C. 验证指导委员会成员所需的信息。
- D. 在与指导委员会的每周会议上介绍状态。

**正确答案：** C

所有项目团队成员都参考项目经理做出各种决定。这会导致某些任务的延迟。因为项目经理通常整天都在忙于开会。

项目经理应该做什么来防止这些延误？

- A. 在 2 周内与团队会面以回应所有未完成任务。
- B. 查看帕累托图以确定延迟的来源。
- C. 将部分任务的决策权委托给团队。
- D. 巩固决策权，保留在项目经理手中。

**正确答案：** C

客户关心完成项目所需的时间，并要求项目团队减少完成产品所需的迭代次数。

项目经理应该采用哪种方法？

- A. 要求团队在日常会议中提出障碍或障碍。
- B. 优先处理高风险的任务以减少所需的迭代次数。
- C. 要求团队质疑项目估算以加快交付速度。
- D. 根据业务价值确定可交付成果的优先级并定义频繁发布。

**正确答案：** D

大型项目的人力资源 (HR) 招聘流程最近发生了变化。一项主要的流程变更包括财务经理和招聘经理的批准。对流程的这种更改意味着更长的处理时间。该项目迫切需要新的资源。

项目经理应该做什么？

- A. 要求财务经理因潜在的项目延误和处罚而推迟实施。
- B. 评估变更的影响并审查后续步骤的项目管理计划。
- C. 调整资源管理计划并在发送给客户之前请求财务批准。
- D. 审查项目进度表以确定哪种技术将减少对项目持续时间的影响。

**正确答案：** B

在项目启动阶段结束时，制定预算并将其发送给审批委员会。在批准会议期间，一位主要利益相关者询问如何针对未来的不确定性制定预算。

项目经理应该怎么回复？

- A. 概率分析用于制定预算以应对未来的不确定性。
- B. 预算是根据从以前的项目数据中吸取的经验教训制定的。
- C. 计划定期举行团队会议以控制预算以应对未来的不确定性。
- D. 利益相关者的反馈将在每次董事会会议上得到解决，以调整预算。

**正确答案：** C



项目团队成员生病了，几周内无法返回项目。在日常会议中，团队分享了他们的担忧，因为生病的团队成員是他们正在开发的组件中唯一熟练的人。

项目经理应该做什么来防止这种情况发生？

- A. 促进项目期间的跨职能知识转移。
- B. 在每个组件中获得了不止一种熟练的资源。
- C. 将特定组件的开发外包给另一个团队。
- D. 为组件的构建请求了可靠的文档。

**正确答案：** A

高度参与项目的关键利益相关者声称项目团队发送的报告不充分。项目经理首先应该做什么？

- A. 向利益相关者解释这些是经批准的报告模板。
- B. 要求项目团队审查和修改所有这些报告。
- C. 确保报告符合沟通管理计划。
- D. 要求发起人与利益相关者会面，通过报告传播情况。

**正确答案：** D

公司的关键产品不断发展，需要使用新技术。团队中没有人熟悉这项技术；然而，团队中经验丰富的开发人员自愿研究概念和应用，并相信他们将能够对新技术承担全部责任。

项目经理应该做什么？

- A. 将技术工作外包给第三方，以免耽误工作。
- B. 由于开发人员有更重要的任务，因此取消此要求。
- C. 外部聘用，因为内部开发人员已经分配了工作。
- D. 支持开发人员学习新技术的意愿。

**正确答案：** D

新发电设施招标阶段使用的合同条款必须在与中标者签署之前进行修改，因为招标条款已经修改以适应公司税的新财务规定。

项目经理应采用哪种方法来实施此修订？

- A. 按原条款签订合同，但允许中标人提交新的合同价格。
- B. 与中标人讨论新条款以评估其对合同价格的影响。
- C. 重新招标整个范围，因为合同条款发生了重大变化。
- D. 修改合同条款，与中标人签订修改后的合同。

**正确答案：** B

项目经理是第一次管理敏捷项目。早期，项目经理发现团队在冲刺期间很难就功能的范围达成一致。

项目经理应该如何帮助团队解决问题？

- A. 指示最高级别的成员代表团队确定范围。
- B. 鼓励团队合作解决他们对功能的理解。
- C. 要求团队将故事记录在产品待办列表中，然后继续下一个功能。
- D. 与团队讨论并决定该功能的范围

**正确答案：** B

项目经理正在领导一个混合项目，并与客户合作制定项目合同。由于不可预见的技术困难和新的依赖性，出现了一些延迟。但是，项目经理对在即将到来的冲刺中恢复延迟持乐观态度。一位关键利益相关者询问项目经理是否可以在合同期限内完成。

项目经理首先应该做什么？

- A. 明确目前的工作进展、延误原因、存在的风险和拟采取的整改措施。
- B. 要求利益相关者保持冷静并确认他们参加了所有团队会议。
- C. 研究合同条款和截止日期以确保它们没有风险并与利益相关者确认。
- D. 提交与依赖项和技术困难相关的额外时间和预算请求。

**正确答案：** A

一家大型全球组织开发了一种需要遵守当地政府法规的新型医疗植入物。一个国家/地区的批准过程很漫长，并且会影响预定的启动日期。

项目经理应该做什么？

- A. 组织来自另一个国家的在线分销渠道。
- B. 请赞助商授权启动，然后等待批准。
- C. 要求董事会利用他们的影响力加快审批速度。
- D. 与团队合作寻找绕过规定的方法。

**正确答案：** B

项目经理注意到新的初级团队成员的建议经常被高级团队成员拒绝。高级团队成员认为这些建议有效且具有创新性，但不切实际。在分配了几个项目后，高级成员要求将初级团队成员撤职。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 消除未来项目分配中可能存在的冲突。
- B. 接受要求并移除初级团队成员。
- C. 将新团队成员分组进行培训。
- D. 鼓励团队成员之间进行更深入的讨论。

**正确答案：** D

项目经理正在领导一个具有严格时间限制的项目。在团队会议中，其中一名团队成员始终保持沉默。项目经理确定该团队成员不了解技术解决方案。项目经理担心这个问题会影响生产力。

项目经理应该做什么？

- A. 为该成员安排正式培训以获得足够的知识以减少对团队绩效的影响。
- B. 指派一名经验丰富的团队成员每天与该成员一起工作，以了解该技术。
- C. 让团队主导会议讨论，让每个成员都有机会准备和发言。
- D. 让这名团队成员了解紧迫性，并鼓励他们花额外的时间来了解这项技术。

**正确答案：** A

项目经理被分配到一个新项目。该项目适用于公司希望尽快推出以测试市场准备情况的新产品。该项目是大型业务转型的一部分，目标是为新产品打开交付渠道。

项目经理应该推荐哪种交付方式？

- A. 经验丰富的项目团队的预测方法。
- B. 具有明确定义的用户故事的适应性方法。
- C. 具有松散定义的大型史诗的自适应方法。
- D. 具有明确验收标准的预测方法。

**正确答案：** B

一位项目管理办公室 (PMO) 主管发现，领导软件开发项目的项目经理在将代码部署到生产环境之前，并没有始终如一地寻求网络安全和运营方面其他部门领导的批准。PMO 主管要求项目经理针对此问题制定解决方案。

项目经理应该怎么做才能解决这个问题？

- A. 制定一项新政策，要求项目经理在将代码部署到生产环境之前向部门领导发送电子邮件。
- B. 建立每日 scrum 会议并邀请部门领导参加，以便他们了解即将发布的代码。
- C. 为部门领导提供一个电话会议电话号码，如果他们在代码部署到生产中后有疑虑，可以拨打电话。
- D. 启动由部门领导组成的企业治理结构，以制定代码发布政策。

**正确答案：** B

项目经理是评估敏捷交付方法使用情况的组织的一部分。一位对 Scrum 方法有过糟糕体验的新项目管理办公室 (PMO) 经理建议项目委员会用预测方法取代 Scrum。

项目经理应该做什么？

- A. 审查沟通管理计划以确定新的利益相关者。
- B. 根据需要为新方法制定风险管理计划。
- C. 根据需要为新方法制定项目管理计划。
- D. 审查收益实现计划以包括变更成本。

**正确答案：** D

一个项目团队正在努力完成里程碑目标日期，以便获得项目发起人承诺的奖金。团队成员之间不可预见的挑战和沟通不畅导致了错误和延误。压力很大，发起人很担心。

项目经理应该做什么？

- A. 安排一次团队建设活动来提高团队的士气。
- B. 与团队讨论如何实现项目目标。
- C. 要求发起人增加对高绩效者的奖金。
- D. 组织一次团队会议，提醒团队遵守基本规则。

**正确答案：** A

项目经理定期召开进度审查会议来讨论问题。

项目经理应该在议程上首先做什么？

- A. 制定风险缓解策略和风险登记册。
- B. 更新解决方法和行动分配。
- C. 制定项目管理计划整合。
- D. 制作经验教训文件。

**正确答案：** B

项目经理最近被分配到一个新项目。当项目经理第一次与项目团队会面时，团队告诉项目经理，项目的管理计划和文件都丢失了。

项目经理应该做什么？

- A. 继续执行计划任务以避免延迟项目并将项目工件的开发留到以后。
- B. 要求利益相关者开发所有项目工件，以便项目团队可以继续他们预定的活动。
- C. 调整以前执行项目的管理计划和文件以节省时间。
- D. 与项目团队一起制定管理计划，并与利益相关者共享文件。

**正确答案：** D

在项目的早期阶段，需求文档没有得到批准。确定用户方的领导不包括在任何需求收集通信中。

哪些文件可能遗漏或已过时？

- A. 利益相关者登记册
- B. 风险登记册
- C. 项目章程
- D. 商业文件

**正确答案：** A

项目经理正在管理向运营的过渡。项目发起人希望确保为最终用户提供良好的支持。

项目经理应该做什么？

- A. 确保移交全面的文件。
- B. 要求项目组提供1年的运营支持。
- B. 确保将知识传递给运营团队。
- C. 确保用户指南详细且说明清晰。

**正确答案：** C

一个具有严格时间表的项目正在开始其六个迭代中的第一个迭代。项目团队缺乏必要的执行技能。

项目经理应该做什么？

- A. 向项目团队添加主题专家 (SME)。
- B. 亲自填补技能差距以执行项目。
- C. 允许团队在他们试图满足时间表时继续进行。
- D. 邀请利益相关者讨论按时完成的缓解计划。

**正确答案：** C



项目涉众正在讨论如何在新应用程序的设计中实现最佳用户体验。敏捷团队在方法上存在分歧。冲突更多的是集体分歧而不是直接冲突。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 应用适当的冲突解决技术来解决问题。
- B. 与每个团队成员进行单独对话。
- C. 召集团队会议对问题进行正式讨论。
- D. 除非需要帮助，否则允许团队自己完成。

**正确答案：** A

一个项目团队已经一起工作了大约 2 年。其中一位团队成员在项目执行过程中一直表现出色，在同行中脱颖而出。

项目经理应该如何识别高绩效？

- A. 在下一次团队会议上表彰表现出色的团队成员。
- B. 私下感谢团队成员，避免团队成员之间发生冲突。
- C. 要求发起人批准对表现出色的团队成员的奖金。
- D. 为团队成员选择符合他们个人目标的奖励。

**正确答案：** D

在迭代过程中，一个从事新产品开发的敏捷团队接到通知，一名重要的团队成员将因一些紧急的个人问题离开该项目数周。对于该团队成员负责的活动，项目经理应该做什么？

- A. 与团队就如何处理这种情况达成一致。
- B. 允许高级管理层决定如何进行项目。
- C. 联系采购团队为该团队成员聘请替补。
- D. 说服团队成员在项目完成之前不要离开。

**正确答案：** A

在执行复杂项目期间，项目经理会遇到来自不同团队的大量变更请求。这些变化可能导致项目无法实现其目标。

项目经理应该如何确保这些变更得到有效管理？

- A. 使用风险登记册记录变化并继续监控。
- B. 将变更包括在积压工作中，并与产品负责人一起审查优先级。
- C. 拒绝变更请求并继续按计划交付项目。
- D. 与主要利益相关者一起审查项目和沟通管理计划。

**正确答案：** B

项目经理正在结束项目，项目管理办公室 (PMO) 已要求其确认已成功完成向运营团队的知识转移以支持运营。

项目经理应该应用哪种技术来验证知识转移？

- A. 回归分析
- B. 会议
- C. 专家判断
- D. 头脑风暴

**正确答案：** B

当项目经理试图为项目构建第一个基线时，其中一位职能经理正在发送变更请求。

项目经理应该做什么？

- A. 申请正式的变更控制委员会 (CCB) 批准。
- B. 与职能经理和相关方讨论此事。
- C. 立即拒绝职能经理的变更请求。
- D. 分析变更请求对项目的影响。

**正确答案：** A



由于其中一名团队成员没有按时完成任务，因此错过了一个关键的项目里程碑。这在为最终用户演示期间引起了激烈的讨论。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 在一对一的会议中与团队成员讨论这个问题。
- B. 将绩效问题上报给团队成员的职能经理。
- C. 要求团队成员在团队会议期间说明延误的理由。
- D. 审查相关纠正措施的人力资源 (HR) 政策。

**正确答案：** A

项目团队成员确定了采购风险，并向项目发起人发送了一封电子邮件，强调了该风险。发起人将电子邮件转发给项目经理，要求提供更多详细信息。与发起人交谈后，项目经理决定采取预防措施。

项目经理应该与他们的团队一起审查哪些文件？

- A. 质量管理计划
- B. 沟通管理计划
- C. 风险管理计划
- D. 采购管理计划

**正确答案：** C

项目经理正在领导一个涉及许多利益相关者的跨部门项目。在项目期间，项目经理观察到利益相关者是多种多样的，并且对项目应该如何处理有不同的期望。这导致利益相关者之间经常出现混淆和误解。

项目经理应该如何整合不同的利益相关者群体？

- A. 为项目制定联合质量政策并寻求所有部门的承诺。
- B. 分析与形势相关的风险的概率和影响，并实施适当的应对计划。
- C. 与各个利益相关者举行单独的会议，并将他们的担忧上报给项目发起人。
- D. 建议团队成员专注于项目工作，避免因利益相关者的分歧而分心。

**正确答案：** B

一位项目经理从他们的供应商那里得知，由于监管变化，即将出现原材料短缺。

项目经理应该做什么？

- A. 征求法律部门的意见并实施处罚。
- B. 寻找可以按时交付相同材料的新供应商。
- C. 告诉供应商他们有供应原材料的义务。
- D. 评估原材料短缺对项目可能造成的影响。

**正确答案：** D

关键利益相关者拒绝参与关键项目阶段并且不同意项目团队的方法。这种情况正在影响项目团队的士气。

项目经理应该做什么？

- A. 要求项目团队开会并记录干系人方法不正确的原因。
- B. 尽快安排与项目团队和主要利益相关者的会议，讨论并商定方法。
- C. 在项目状态会议期间与项目团队讨论问题并要求他们改变方法。
- D. 要求项目发起人与项目团队和主要利益相关者会面，讨论该方法。

**正确答案：** B

项目经理在具有职能结构的组织中领导项目。团队通知项目经理，与采购服务相关的任务耗时过长，因为采购部门有其他优先事项。

项目经理应该做什么？

- A. 要求项目组继续开发其他不依赖购买服务的任务。
- B. 与采购经理会面以找出延误的根源并商定采购时间表。
- C. 请求通过现有的采购供应商外包采购任务。
- D. 修改项目进度表以适应服务购买的延迟。

**正确答案：** B

一个项目正在进行六个迭代中的第四个迭代。在迭代计划期间，团队成员通知项目经理他们的计算机不工作。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 建议团队成员联系 IT 部门。
- B. 更新问题日志并将问题上报给产品负责人。
- C. 请其他团队成员介入并完成工作。
- D. 促进 IT 部门优先解决问题。

**正确答案：** D

一名项目经理最近被指派去抢救奥林匹克设施的一个高优先级项目。该项目落后于计划。带有沉重的合同罚款。前项目经理与项目团队成员和少数利益相关者有过多次冲突。

项目经理首先应该做什么？

- A. 在私人会议中与前项目经理一起回顾经验教训。
- B. 与项目团队会面以维护权力并重新分配项目任务以便及时交付。
- C. 审查项目进度表并申请应急储备以应对项目崩溃。
- D. 会见项目团队和利益相关者以确定问题的根本原因并制定解决方案。

**正确答案：** D

一个新项目需要提交紧急资金批准。该项目将使用新技术，对组织至关重要。整个 Scrum 团队在多个项目上合作了 3 年多，并在批准的预算下交付了上一个项目。

在这种情况下，项目经理应该实施哪种估算技术？

- A. 最终估计
- B. 数量级
- C. 概算
- D. 故事点

**正确答案：** B

一个项目需要采购大量设备，这些设备需要在任何其他活动开始之前到达现场。采购部门的审批流程很长。

项目经理应该做什么？

- A. 联系为以前的项目提供类似设备的供应商。
- B. 使用现有设备，稍后更换新设备。
- C. 要求项目发起人加快供应商选择过程。
- D. 与采购团队合作寻找备选方案。

**正确答案：** D

几年前采用敏捷的组织正在寻找一种更有效的方法来确保每个冲刺中产生的增量满足最终用户的质量要求。

项目负责人应该推荐什么？

- A. 为完成 (DoD) 的定义开发一个更全面的模板。
- B. 建立独立于开发团队的质量保证 (QA) 团队。
- C. 与更广泛的受众组织更频繁的冲刺评审。
- D. 增加分配给测试每个积压项目的百分比。

**正确答案：** A

一位项目经理刚刚被任命为一个有两个主要可交付成果的项目。两个可交付成果具有相同的优先级，并且将同时交付。团队成员抱怨缺乏关于需要首先完成哪个可交付成果的信息。

项目经理应该做什么？

- A. 与项目发起人和主要利益相关者会面，评估每个可交付成果对组织的价值并设定执行优先级。
- B. 由于难以同时执行两个可交付成果，要求主要利益相关者取消项目。
- C. 要求团队首先开始处理最简单的可交付成果，以便他们获得执行第二个可交付成果的经验。
- D. 要求项目团队同时执行两个可交付成果，因为这是在项目章程中要求和批准的。

**正确答案：** A

在项目执行过程中，一位经验丰富的团队成员通知项目经理，由于运营计划存在冲突，他们无法参与所有计划的项目活动。

项目经理应该做什么？

- A. 鼓励团队成员优先安排计划的项目活动。
- B. 用团队中的另一个可用资源替换该团队成员。
- C. 与团队成员的职能经理讨论情况，看看是否可以调整时间表。
- D. 与项目管理办公室 (PMO) 核对可用资源以完成活动。

**正确答案：** C

一位项目经理正在处理一个大型 IT 项目。在审查其中一项可交付成果期间。利益相关者对最终产品提出了担忧。

项目经理首先应该做什么？

- A. 与团队讨论这个问题并将利益相关者的担忧记录在问题日志中。
- B. 与发起人召开会议，讨论可交付成果的细节。
- C. 与团队讨论并审查项目需求文档。
- D. 与产品负责人召开会议，讨论利益相关者关注的问题。

**正确答案：** D

大型项目需要新设备来支持项目的执行。采购经理与项目经理沟通，新采购的设备将延迟交货。项目经理担心这会直接影响项目进度。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 更新潜在问题的发起人并征求任何建议。
- B. 验证信息并更新风险管理计划。
- C. 采购二手设备，为任何交货延误做好准备。
- D. 更新风险登记册并与项目利益相关者讨论。

**正确答案：** D

项目经理领导着一个由具有不同知识和经验的成员组成的项目团队。有些是专家，有些只有不到 1 年的经验。项目进度表得到了指导委员会的批准。

项目经理应该做什么？

- A. 请经验不足的成员完全按照经验丰富的成员的指示执行任务。
- B. 请每位有经验的成员担任一位经验不足的成员的导师。
- C. 让经验丰富的成员回顾经验不足的成员完成的所有任务。
- D. 要求资源经理用经验丰富的团队成员替换经验不足的成员。

**正确答案：** B

一个项目目前正处于执行阶段。由于项目的复杂性和涉及的大量法规要求，项目经理决定与高级管理人员一起进行管理评审，以确保项目可交付成果的成功实施。

项目经理在管理评审中应该评审哪些内容以确保会议有效？

- A. 根据项目发起人的指示专门为会议创建的专业报告。
- B. 项目战略的潜在变化和高级管理人员的反馈。
- C. 表现良好的可交付成果和需要更多工作的成果。
- D. 客观反映可交付成果状态的指标和关键绩效指标 (KPI)。

**正确答案：** D

在战略项目的服务采购过程中，只有一个投标人提交了投标。报价的价格非常高，项目发起人不相信可以实现投资回报 (ROI)。

项目经理应该如何解决这个问题？

- A. 分析项目协议的谈判范围。
- B. 重新审视项目章程并寻求其他替代方案。
- C. 与 CEO 交谈并寻求他们的支持以批准提议。
- D. 由于该项目很重要，因此继续并发出采购订单。

**正确答案：** B



项目经理领导一个在整个组织中实施新流程的项目。部署是分阶段进行的，项目经理计划为试点业务部门进行演示。来自计划在稍后日期的业务部门的经理要求被邀请参加冲刺审查。

项目经理应该做什么？

- A. 将冲刺评审请求提交给项目发起人。
- B. 要求经理获得产品负责人的批准。
- C. 邀请经理参加预定的冲刺回顾。
- D. 只为经理组织一次特别演示。

**正确答案：** C

一个多元文化团队正在开展一个项目。经过几个月的观察，项目经理意识到两名团队成员没有正确回应施工经理。项目经理单独与团队成员交谈，发现他们与施工经理存在文化差异。

项目经理应该怎么做才能改善这种情况？

- A. 请施工经理与两名团队成员会面以解决问题。
- B. 与施工经理讨论团队成员的担忧并寻求解决方案。
- C. 要求团队成员容忍文化差异，因为他们有不同的文化背景。
- D. 向施工经理提供有关如何解决该情况的说明。

**正确答案：** B

在迭代项目的执行阶段引入了将影响项目软件的强制性合规性要求。该团队了解合规性要求。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将项目影响问题上报给产品负责人。
- B. 用这个新要求更新产品积压项目。
- C. 将项目影响问题上报给项目发起人。
- D. 更新利益相关者登记册以包括需求所有者。

**正确答案：** A

项目经理分析累积流程图并从自组织团队中识别出测试活动中的瓶颈。在与团队讨论后，确定了与测试技能相关的差距。

项目经理应该做什么来解决这个问题？

- A. 支持团队确定解决问题的方法。
- B. 要求开发团队放慢速度，以便测试人员可以跟上。
- C. 为整个团队提供培训，以便他们都能够执行测试。
- D. 招募一名具有测试技能的新项目团队成员。

**正确答案：** A

在项目执行阶段，两名团队成员在技术和人际关系层面与团队内的其他团队成员发生冲突。

项目经理应该首先采取哪两项行动来解决这个冲突？（选择两项。）

- A. 计划在冲刺后解决团队成员的冲突，并专注于实现目标。
- B. 安排与不能有效合作的团队成员的单独会议。
- C. 在团队会议期间解决冲突，让整个团队参与并找到解决方案。
- D. 在问题升级并影响团队绩效之前要求人力资源 (HR) 进行干预。
- E. 使用直接、协作的方法尽早受影响的团队成员中讨论冲突。

**正确答案：** BC

在执行阶段。项目经理发现一名团队成员无法按时完成工作，而且比预期晚了。这种延迟可能会影响项目里程碑。

项目经理首先应该做什么？

- A. 与高级管理层讨论并寻求他们的指导。
- B. 与团队讨论并评估导致延迟的原因。
- C. 请求团队成员的经理找到解决方案。
- D. 分配更多来自其他团队的资源用于后期工作。

**正确答案：** B



一个团队开发并测试了在飞行期间控制飞机的新软件。必须满足多项监管要求。

项目经理应该怎么做才能满足这些要求？

- A. 要求人力资源 (HR) 为团队指派一名合规专家。
- B. 确定与遵守法规有关的潜在威胁。
- C. 衡量项目遵守法规的程度。
- D. 验证软件是否符合标准和法规。

**正确答案：** B

一名项目经理被分配到一个团队成员分散的全球项目。以前，在与远程团队合作时，项目经理观察到团队成员往往无法完成高质量的工作。

项目经理应该怎么做才能确保项目按时保质完成？

- A. 与团队一起开会，并在一对一的会议中设定明确的共同目标。
- B. 鼓励团队在项目结束时参与同行评估活动。
- C. 引入时间表的使用，并要求团队成员定期审查并提交。
- D. 为团队安排定期的团队会议，以相互更新他们分配任务的进度。

**正确答案：** A

在第一个冲刺结束时，项目负责人注意到其中一名团队成员表现不佳。

项目负责人应该使用哪种沟通方式来处理这种情况？

- A. 非正式的书面交流，例如友情提醒
- B. 正式的口头交流，例如冲刺回顾结束时的谈话
- C. 正式的书面沟通，例如发送给经理的电子邮件副本
- D. 非正式的口头交流，例如谈话

**正确答案：** B

项目团队正在计划下一次冲刺评审。项目负责人收到一封来自高级经理的电子邮件，要求使用比发送给项目管理办公室 (PMO) 的月度报告所用模板更详细的模板来了解项目状态。该团队使用电子产品积压和看板来跟踪进度。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 授予高级经理访问产品待办事项列表的权限。
- B. 与经理一起组织对看板的审查。
- C. 联系高级经理并讨论他们的需求。
- D. 修改 PMO 模板以包含信息。

**正确答案：** C

一家公司正在经历结构性变革。一些人将离开公司，因为他们的职位被裁员了。团队成员不高兴，因为他们不明白为什么在项目步入正轨时要进行更改。

项目经理应该做什么？

- A. 建议团队按计划继续工作，因为时间表无法更改。
- B. 组织一次团队会议来讨论变化及其对公司的重要性。
- C. 将团队的不愉快告知项目发起人并索取加班费。
- D. 告知团队变革由 CEO 决定，必须实施。

**正确答案：** B

一个镇想建立一个社区中心，并任命了一名项目经理。找到了一个站点，并完成了所有必要的批准和管理。项目启动时，发现没有咨询当地农民团体，他们将场地用作月度集市。

项目经理应该怎么做才能推进项目？

- A. 继续建设中心，因为不需要咨询农民团体。
- B. 与所有利益相关者讨论项目目标。包括农民团体，并审查他们的要求。
- C. 记录与农民团体可能给项目带来的影响相关的风险。
- D. 要求项目发起人与农民团体讨论对失去的生意的补偿。

**正确答案：** B

项目发起人想要包括一个新的可交付成果。发起人联系项目经理，以寻求有关在接下来的 2 个月内完成可交付成果的最有效方法的建议。

项目经理应该做什么？

- A. 建议发起人进行成本效益分析以确定可行性。
- B. 告知发起人评估项目不是项目经理的职责。
- C. 使用管理储备以加快在 2 个月内完成可交付成果。
- D. 改变项目方法以在 2 个月内完成可交付成果。

**正确答案：** C

一个项目即将与全球项目团队一起启动。对于项目团队成员来说，出差不是一个可行的选择，因此大多数人将以虚拟方式参与。

项目经理应该怎么做才能让团队参与进来？

- A. 投资虚拟协作/托管环境。
- B. 与团队成员进行一对一的会谈以改善沟通。
- C. 向人力资源 (HR) 寻求团队建设建议。
- D. 安排每周一次的团队会议以鼓励协作。

**正确答案：** A

一位经验丰富的项目经理正在领导一支热情的团队，但意识到该团队缺乏成功完成工作的经验。

项目经理应该怎么做才能降低项目失败的风险？

- A. 为团队成员提供必要的辅导和指导。
- B. 要求发起人在团队中增加经验丰富的专业人员。
- C. 批准团队成员的适当培训计划。
- D. 分配专门的资源来检查每个可交付成果的质量。

**正确答案：** A

项目经理刚刚成功完成部署，并准备在开始收尾操作之前将项目转换为可操作状态。

项目经理应该怎么做才能确保项目已准备好进入运营状态？

- A. 审查项目章程中的项目批准要求，并确认谁将批准该项目。
- B. 与项目团队会面，审查工作分解结构 (WBS) 并确认可交付成果已交付。
- C. 参考项目的在制品 (WIP) 报告，以确保积压中没有额外的工作。
- D. 制定偿还项目期间产生的技术债务的计划，并确保项目发起人同意该计划。

**正确答案：** B

供应商项目经理和团队正在整个组织中实施软件解决方案。在销售过程中不在场的客户利益相关者要求团队在不增加项目额外成本的情况下实施超出范围的要求。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将额外要求的问题上报给执行领导团队。
- B. 相应地调整范围基准和进度基准。
- C. 实施客户提出的所有要求。
- D. 请利益相关者参考工作说明书 (SOW) 中的交付规范。

**正确答案：** D

项目经理正在为开发人员的项目团队执行 scrum master 角色。在每日站会上，一些开发人员抱怨来自邻近团队的噪音、他们笔记本电脑的性能以及预订会议室的困难。

项目经理应该做什么？

- A. 将行动分配给所有利益相关者并监督其实施。
- B. 承认障碍并促进他们的解决。
- C. 注意障碍并将其上报给产品负责人。
- D. 注意障碍并在以后解决它们。

**正确答案：** B

项目经理正在领导一个技术复杂的项目。该项目是战略工作计划的一部分，也是第一个使用敏捷方法的项目。其中一位董事会成员有兴趣参加会议，了解项目范围的交付进展情况。

项目负责人应该做什么？

- A. 邀请董事会成员参加单独的演示。
- B. 邀请董事会成员参加下一次冲刺评审。
- C. 邀请董事会成员参加下一次冲刺回顾。
- D. 邀请董事会成员参加下一次每日站会。

**正确答案：** B

项目进度会议通过虚拟电话会议召开。在每次项目进度会议中，一个团队成员在讨论过程中不断打断其他人。其他团队成员通常没有机会交谈或完成他们的解释。

项目经理应该做什么？

- A. 以审查基本规则、会议目标和议程开始会议。
- B. 与总是打断谈话的团队成员单独交谈。
- C. 使用议程有效地管理时间并要求每个参与者做出贡献。
- D. 与不参与对话的团队成员单独交谈。

**正确答案：** A

一位项目经理正在与在多个国家开展业务的团队成员和客户合作。该团队正在努力实施一项新技术，其中包括技术和最终用户对该解决方案的期望方面的模糊性、不确定性和未知数。

项目经理应该做什么来保持利益相关者的参与？

- A. 使用会议作为沟通渠道。
- B. 使用电子邮件作为沟通渠道。
- C. 使用反馈和决策工具。
- D. 使用共享协作平台。

**正确答案：** D

一个项目提前完成了设计活动。突然，供应商通知项目经理，由于资源短缺，可交付成果可能无法满足约定的交付时间框架。内部团队询问他们是否应该继续按计划交付。

项目经理应该做什么？

- A. 通知项目团队他们可以以更轻松的步伐进行。
- B. 与项目团队讨论按计划交付的备选方案。
- C. 通知项目团队他们中的一些人将为供应商工作。
- D. 与团队讨论延长工作时间以尽量减少影响的必要性。

**正确答案：** B

利益相关者将一些与合规性相关的差距和问题告知项目经理。然后，利益相关者向项目经理提出一些解决问题的建议。

项目经理应该做什么？

- A. 与负责合规问题的员工讨论建议。
- B. 与项目发起人一起审查这一点，以避免合规性差距和问题。
- C. 在经验教训登记簿中记录来自合规差距的反馈。
- D. 使用合规性问题来确定辅导和指导机会。

**正确答案：** A

项目团队正在进行冲刺计划。根据估计的工作量，只有 95% 的项目可以交付到 sprint 中。产品负责人向项目经理征求有关如何确定积压项目优先级的建议。

应该使用什么来确定积压项目的优先级？

- A. 技术复杂性
- B. 商业价值
- C. 交货风险
- D. 估计精度

**正确答案：** B



一位项目经理正在领导一个混合项目，该项目正在为旅游行业初创公司构建应用程序。由于不可预见的事件，由于新的旅行限制，许多客户将无法使用这些功能和整体解决方案。

项目经理首先应该做什么？

- A. 释放团队并帮助他们在新项目中发挥潜力。
- B. 如果无法达到商业价值，则暂停项目并收集经验教训。
- C. 评估环境变化并为项目推荐一个支点。
- D. 向组织的管理层征求有关项目方向的建议。

**正确答案：** D

一个正在偏远农村建设的项目，工程接近尾声。项目理想与利益相关者分享这个好消息。

项目经理应该如何与当地社区沟通？

- A. 电子邮件
- B. 会议
- C. 报纸
- D. 社交媒体

**正确答案：** D

在项目执行期间，关键利益相关者向项目经理抱怨最近的沟通。关键利益相关者解释说，项目团队提供的相关信息不完整且迟交。结果，主要利益相关者开始脱离项目。

项目经理应该做什么？

- A. 向关键利益相关者解释项目团队沟通信息的方式。
- B. 更新沟通管理计划以满足关键干系人对相关信息的期望。
- C. 同时向所有关键利益相关者发送相关信息以确保一致的沟通。
- D. 要求项目发起人与关键利益相关者举行会议，以确保利益相关者参与项目。

**正确答案：** B

一个软件开发项目完成了启动阶段。技术设计得到了项目指导委员会的批准。后来发现这个设计会影响公司的生产系统。必须找到新的技术设计，这可能会使项目延迟 3 个月。

项目经理首先应该做什么？

- A. 成立指导委员会会议来审查项目延迟。
- B. 继续进行已批准的设计，以免项目延误。
- C. 在项目风险日志中将技术设计延迟记录为风险。
- D. 要求指导委员会批准一项新的技术设计。

**正确答案：** C

在施工项目执行过程中，附近的一家企业抱怨目前的建筑高度与最初的项目计划不符。

项目经理首先应该做什么？

- A. 请邻居就他们的顾虑提交正式投诉。
- B. 通知邻居投诉将上报给项目发起人。
- C. 通知邻居所有项目文件都已获得批准。
- D. 要求邻居立即离开该地点，因为该地点属于私人财产。

**正确答案：** A

项目经理收到了利益相关者关于项目进度沟通不畅的反馈。每周向项目管理办公室 (PMO) 提供状态报告，并遵循标准的沟通管理计划。

项目经理应该做什么？

- A. 为实施在线协作工具创建变更请求。
- B. 分发状态报告的硬拷贝并确认消息已被阅读。
- C. 对现有的沟通方法进行根本原因分析 (RCA)。
- D. 确保所有抱怨的利益相关者都在分发名单上。

**正确答案：** C



一个项目团队正在完成设计，而另一个位于不同国家/地区的团队正在执行实施。

项目经理应该如何将设计传达给实施团队？

- A. 将设计文件上传到项目库中。
- B. 与所有利益相关者一起举办研讨会。
- C. 发送一封包含完整设计文档的详细电子邮件。
- D. 与两个团队一起举办研讨会。

**正确答案：** D

关键项目团队成员在关键项目迭代过程中请病假。项目发起人了解到，迭代结束发布的任何延迟都会让业务干系人不高兴。尽管所有团队成员都是跨职能的，但他们也在接近满负荷工作。

项目经理应该如何应对这种情况？

- A. 与团队讨论这个问题，以便他们可以完成不在的团队成員的工作，并争取在发布截止日期前完成。
- B. 与团队讨论这个问题，以便他们能够重新确定关键任务的优先级并瞄准发布截止日期。
- C. 与发起人讨论这个问题，并与利益相关者举行会议，以便分担所有团队挑战。
- D. 与发起人讨论问题，充分传达资源不可用的问题和正在完成的工作量。

**正确答案：** B

一家征信公司正在实施新软件，以在致电客户付款时协助客户服务代理。该软件将使员工腾出时间从事其他项目，从而使公司受益。多个业务领域希望利用这一优势。

项目经理应该做什么？

- A. 与所有团队召开利益相关者会议，以商定并记录收益并建立所有权。
- B. 要求项目发起人决定谁将拥有收益并记录该决定。
- C. 请求项目发起人批准将项目收益平均分配给业务领域。
- D. 要求所有业务领域平均规划一部分福利，并将其纳入其人员配置计划。

**正确答案：** A

拖放

将左侧的组织特征拖到右侧的正确场景中。

| Organizational Characteristic             | Scenario                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roadblock to achieving changes            | Work is decomposed into department silos, creating dependencies that prevent accelerated delivery                                                 |
| Appetite for change by leading by example | The scrum master tries to use agile techniques and practices wherever possible                                                                    |
| Change tolerant                           | Organization's willingness to shift the way it views, reviews, and assesses employees                                                             |
| Change associated with agile              | Decomposing work into iterative prototypes involves rework and needs change management techniques to address the hurdle of transitioning to agile |

正确答案:

| Organizational Characteristic             | Scenario                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roadblock to achieving changes            | Organization's willingness to shift the way it views, reviews, and assesses employees                                                             |
| Appetite for change by leading by example | Work is decomposed into department silos, creating dependencies that prevent accelerated delivery                                                 |
| Change tolerant                           | Decomposing work into iterative prototypes involves rework and needs change management techniques to address the hurdle of transitioning to agile |
| Change associated with agile              | The scrum master tries to use agile techniques and practices wherever possible                                                                    |

一位项目经理正在领导一个预算低、时间紧的小项目。许多利益相关者都在组织内部，并且有不同程度的兴趣。

项目经理应该对利益相关者使用哪种方法？

- A. 提供每日报告以最大限度地与利益相关者进行沟通。
- B. 在项目完成之前尽量减少沟通，因为它会很快完成。
- C. 与利益相关者共享所有相关的项目信息。
- D. 安排与利益相关者的一对一会议以提供项目更新。

**正确答案：** A

一位项目经理正在从事跨越国内和国外部门的企业资源规划 (ERP) 实施项目。项目经理了解门审查和定期检查的重要性。

项目经理应该利用以下哪项？

- A. 项目管理计划
- B. 治理框架
- C. 整合计划
- D. 项目管理办公室 (PMO)

**正确答案：** B

敏捷团队正在集思广益，根据严重程度确定所有风险的优先级。

团队应该如何处理已识别的风险？

- A. 减轻适用于当前和后续迭代的风险。
- B. 关注项目可交付成果而不是记录在案的风险。
- C. 同意当任何问题成为问题时都可以处理。
- D. 承认风险将在相应的迭代中得到处理。

**正确答案：** A

项目经理正在与产品所有者和客户利益相关者合作，确定产品待办事项的优先级并规划产品交付日期。客户利益相关者要求将几个可交付成果列为高优先级。产品经理也有技术任务应该被添加为高优先级。

项目经理应该做什么？

- A. 允许客户干系人定义项目优先级并设置交付日期。
- B. 与团队一起估算任务和交付日期，然后创建项目路线图。
- C. 带领团队在每次交付迭代中确定产品目标并明确优先级。
- D. 创建冲刺板，让所有客户利益相关者了解任务状态和障碍。

**正确答案：** B

一个项目已经顺利完成。该项目提前完成，低于预算，并交付了预期的收益。项目发起人对此表示满意，并向主要项目团队成员颁发了认可证书。然而，项目发起人不小心忘记给关键团队成员颁发证书。

项目经理应该如何对待错过的关键团队成员，以避免失望和消极情绪？

- A. 邀请团队成员与业务负责人和项目发起人共进午餐。
- B. 在公开会议上感谢团队成员对项目的重大贡献。
- C. 向团队成员说明情况，并跟进对他们进行奖励和表彰。
- D. 向项目发起人请求为错过的团队成员提供额外的认可证书。

**正确答案：** C

一个定制模块正在实施到一个现成的企业资源规划 (ERP) 解决方案中。项目范围已由发起人明确定义，项目经理即将开始用户验收测试。然而，新当选的政府推出了一项重要的税收改革方案。

项目经理应该做什么？

- A. 联系财务团队并寻求建议。
- B. 搁置项目，等待信息。
- C. 与项目团队一起评估潜在影响。
- D. 按计划继续进行用户测试。

**正确答案：** C

一家公司的预算周期为 2 年。项目经理被分配了一个高知名度的项目，以提供全新的创新能力。在定义新功能的要求时，解决方案设计才刚刚开始。项目经理的老板担心最终的解决方案会超出项目的预算。

项目经理下一步应该做什么来预测解决方案的预算影响？

- A. 应用挣值技术，将计划价值与项目关键点交付的实际价值进行比较。
- B. 制定工作分解结构 (WBS) 并执行基于活动的成本估算。
- C. 对每个解决方案设计进行场景规划，并将估算纳入下一个预算周期。
- D. 咨询其他公司的同事并使用历史信息来预测最终成本。

**正确答案：** C

作为公司团队能力建设规划工作的一部分，项目经理被要求向管理层提供项目团队所需培训的清单。

项目经理应该做什么？

- A. 回顾项目执行过程中发现的差距，准备一份推荐培训清单，并在团队会议上进行讨论。
- B. 审查项目进度和团队成员的表现，并决定团队所需的软技能和相关培训。
- C. 审查项目管道，确定执行能力方面的差距，并决定所需的培训。
- D. 审查团队成员的最新表现，找出能力差距，并决定所需的培训。

**正确答案：** A

项目经理决定使用高度适应性的方法来管理大型项目。在这个项目中，有许多需要高度专业化专家的迭代任务。项目经理希望创建切实可行的计划，并获得团队成员的高度支持。

项目经理接下来应该做什么？

- A. 将关键任务分配给最有经验的团队成员。
- B. 解释分配给团队的更高层次的目标。
- C. 与团队一起审查所需资源的预算。
- D. 与团队一起回顾从类似项目中吸取的经验教训。

**正确答案：** D

在软件开发项目中，一些可交付成果不满足特定的性能要求。

项目经理应该采取什么行动？

- A. 与项目团队一起审查问题以解决问题。
- B. 在下次会议上审查需求可追溯性矩阵。
- C. 向主要利益相关者报告问题并讨论后续行动。
- D. 确保符合质量管理计划。

**正确答案：** A

一个经验丰富、高绩效的团队有两名新团队成员。在与新团队成员进行几次迭代后，项目经理注意到团队的绩效有所下降。

项目经理应该做什么？

- A. 评估两名新团队成员。
- B. 更换两个新的团队成员。
- C. 为团队提供辅导课程。
- D. 允许团队自行组织。

**正确答案：** C
