

PMP项目管理

《第5章 过程-规划、执行与整合》



什么是整合管理？



项目整合管理




项目整合管理包括对隶属于项目管理过程组的各种过程和项目管理活动进行**识别、定义、组合、统一和协调**的各个过程。在项目管理中，**整合兼具统一、合并、沟通和建立联系**的性质，这些行动应该贯穿项目始终。

项目整合管理由**项目经理负责**。虽然其他知识领域可以由相关专家（如成本分析专家、进度规划专家、风险管理专家）管理，但是项目整合管理的责任不能被授权或转移。




项目整合管理

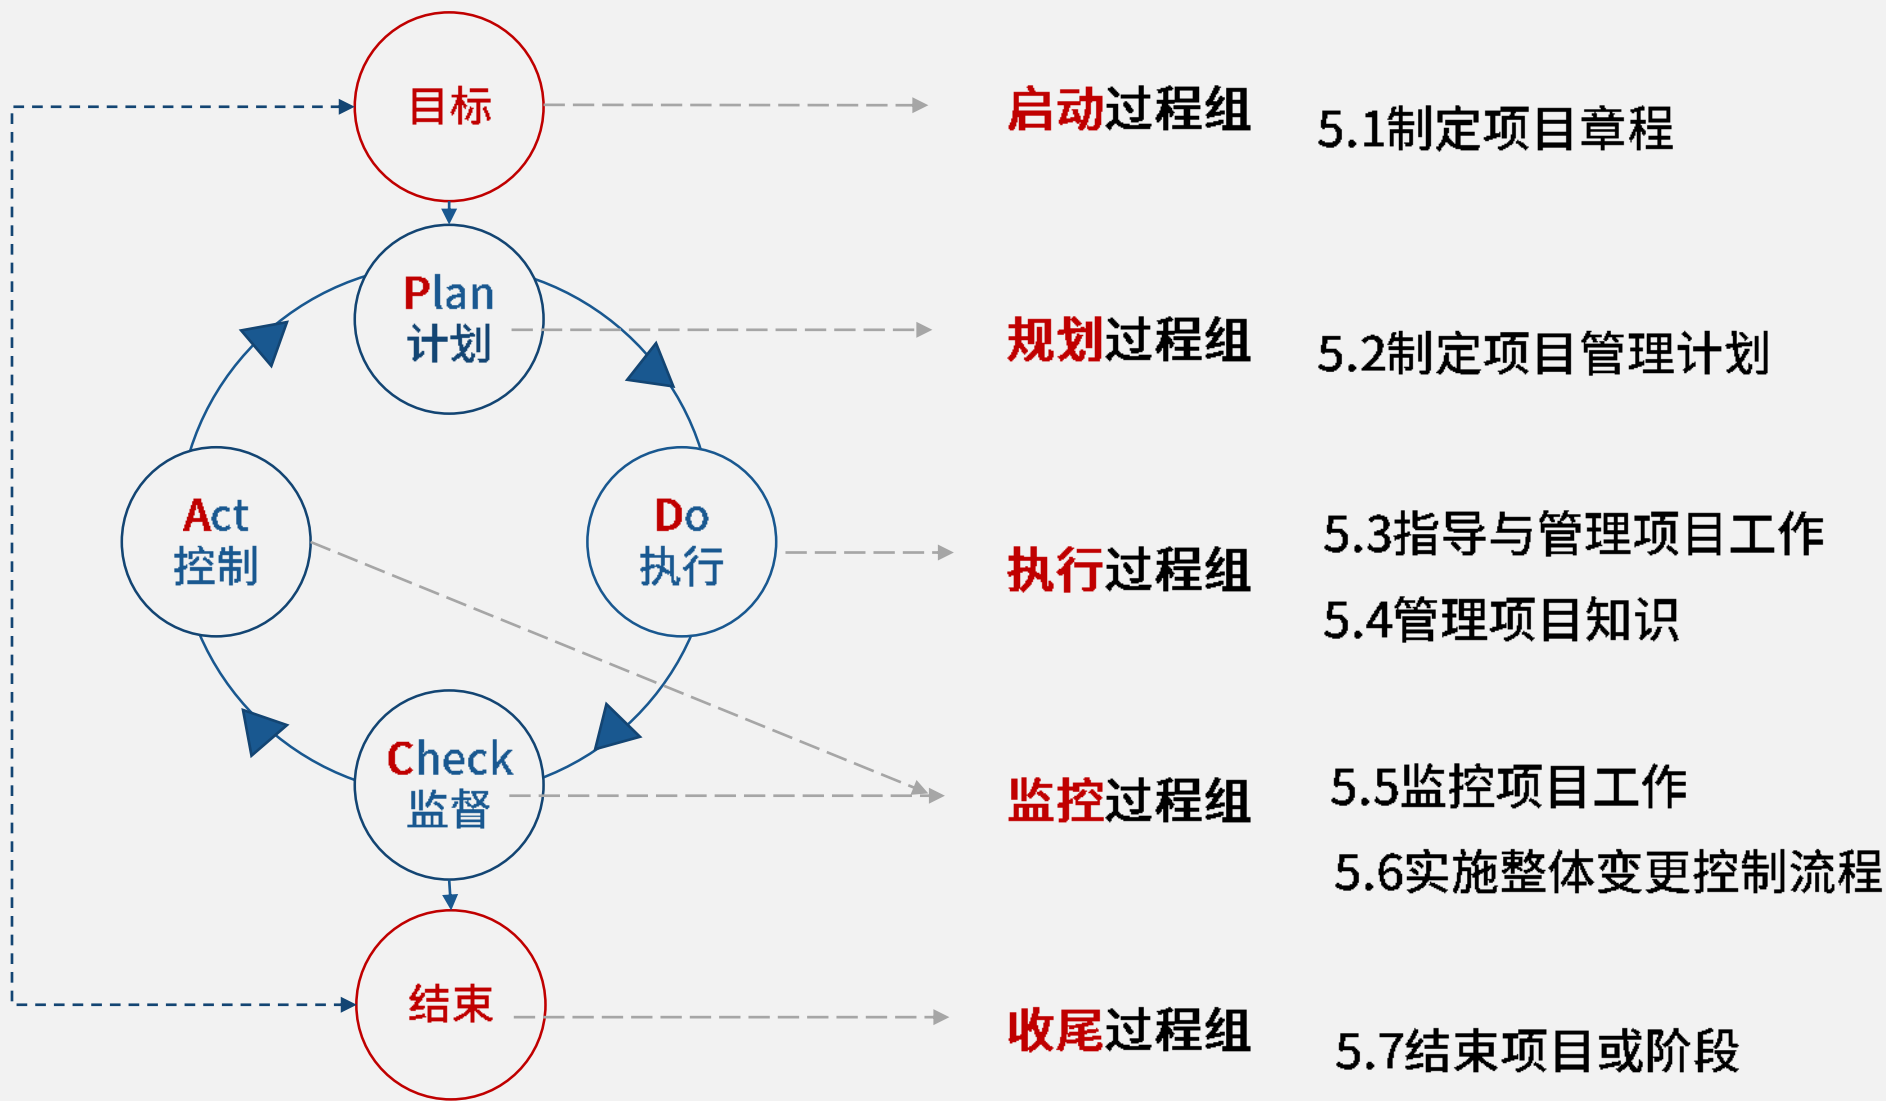



制定项目章程

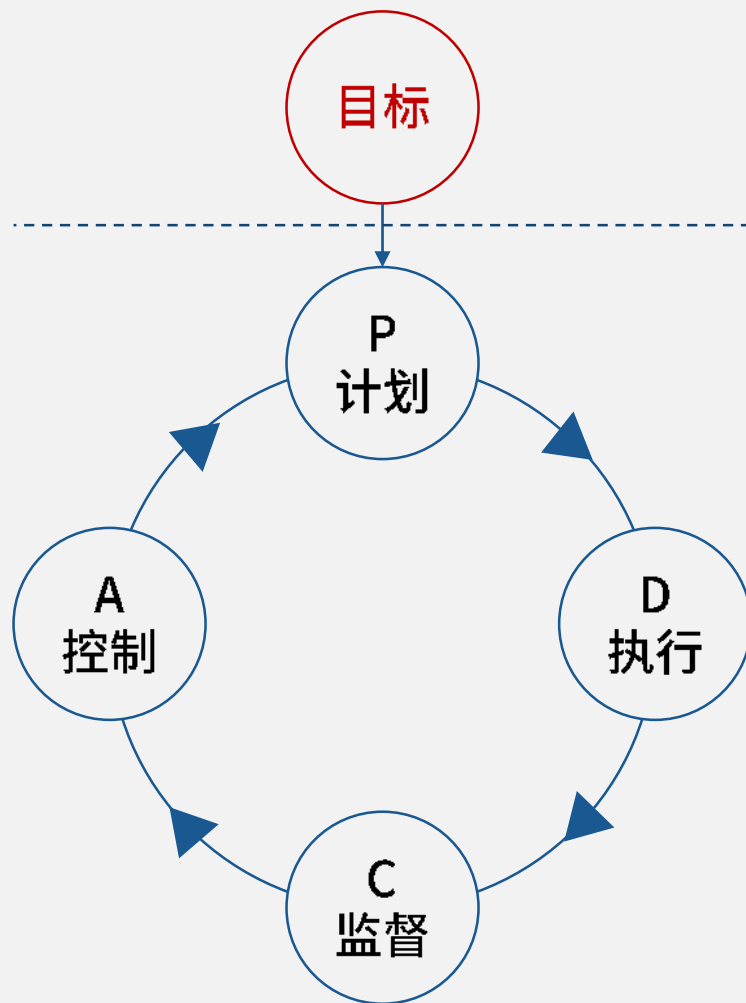

有的放矢
选择vs努力



制定项目章程

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
- 商业文件 (商业论证、效益管理计划) - 协议 - 事业环境因素 - 组织过程资产	略	- 项目章程 - 假设日志


- 制定项目章程——编写一份正式批准项目并授权项目经理在项目活动中使用组织资源的文件的过程。



制定项目章程



项目章程的作用

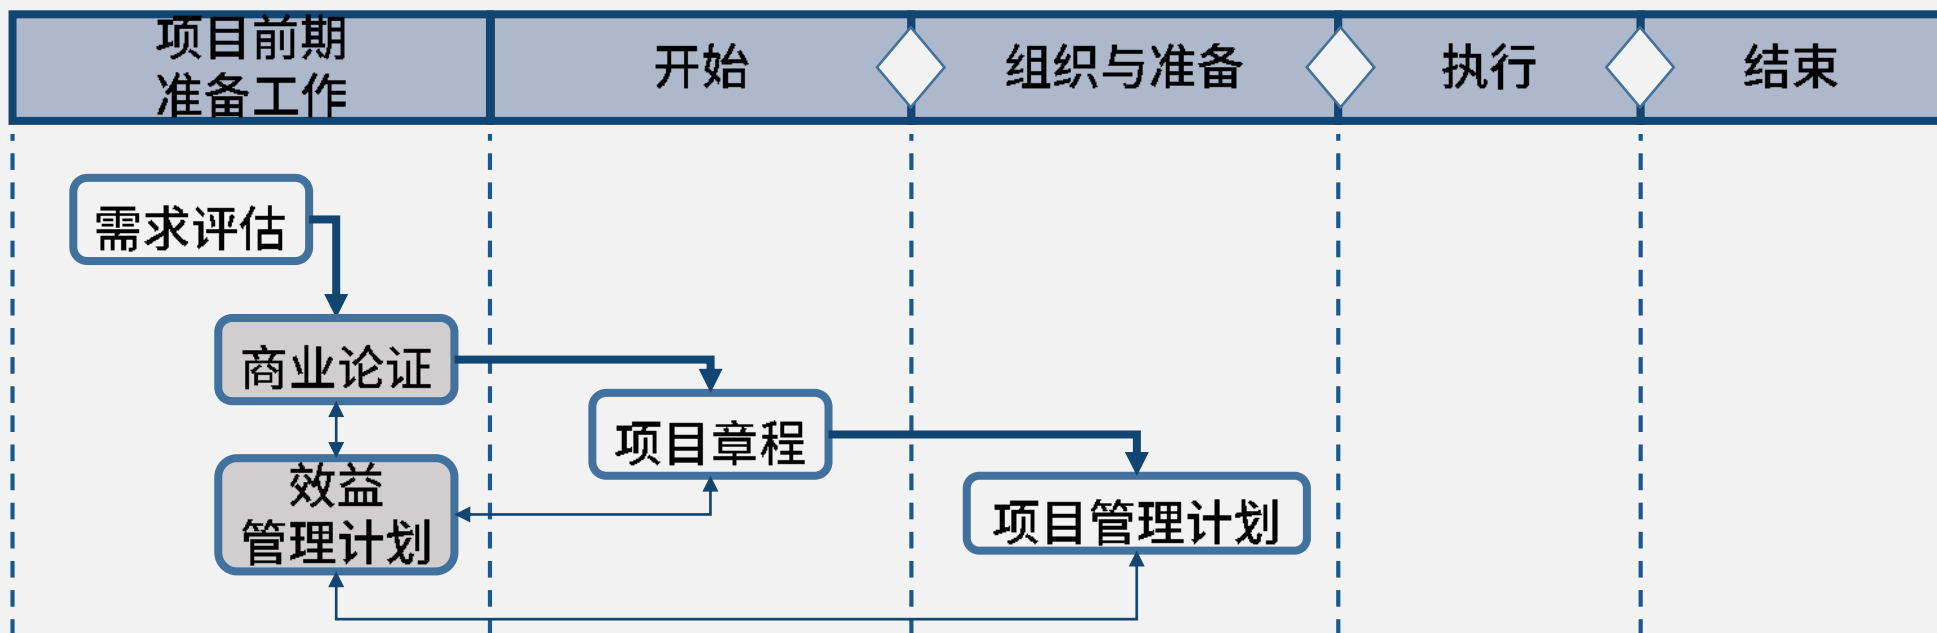



制定一份正式**批准项目**并**授权项目经理**在项目活动中**使用组织资源**的文件的过程。作用是**明确项目与组织战略目标之间**的直接联系，确立项目的**正式地位**，并展示组织对项目的承诺。



制定项目章程



项目章程的作用

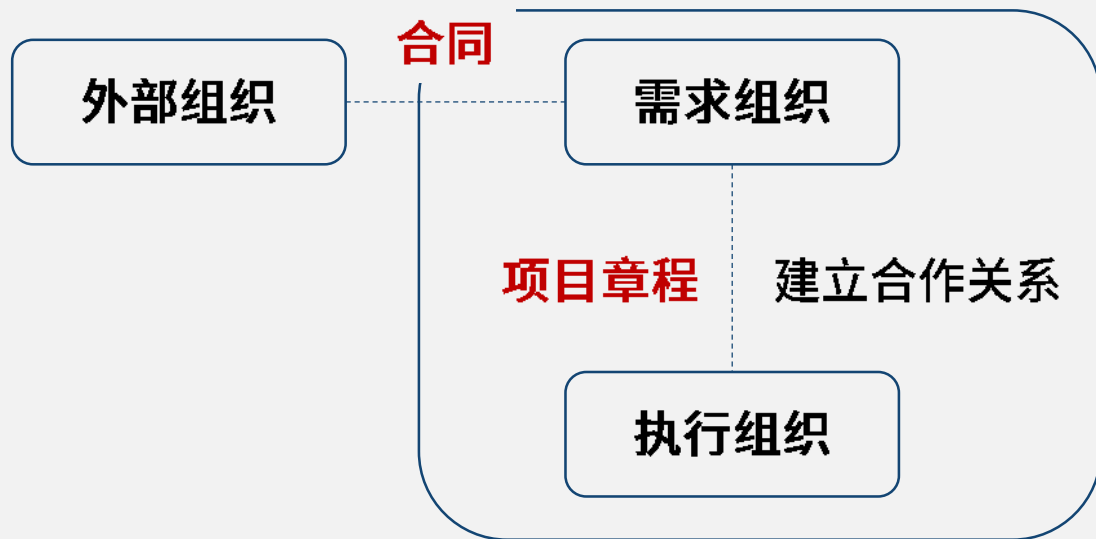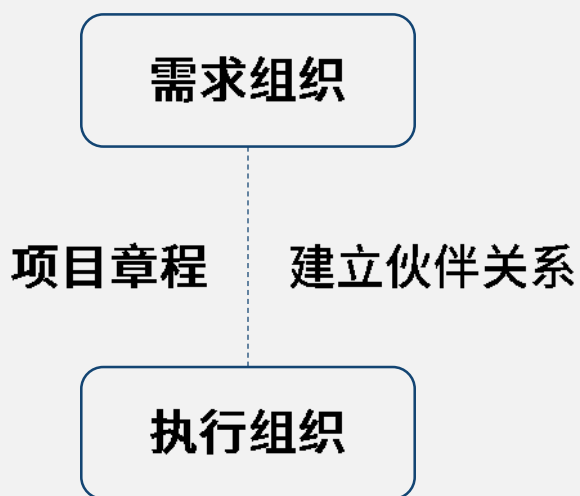

项目由项目以外的机构来启动，如发起人、项目集或项目管理办公室（PMO）、项目组合治理委员会主席或其授权代表。项目启动者或发起人应该具有一定的职权，能为项目获取资金并提供资源。（提供支持）



制定项目章程



项目章程的编制与审核

项目章程是由**项目启动者或发起人发布**的，项目章程一旦被**批准**，就标志着项目的**正式启动**。在项目中，应尽早确认并任命项目经理，最好在制定项目章程时就任命，且总应在规划开始之前任命。

项目章程可由发起人编制，或者由**项目经理与发起机构合作编制**。通过这种合作，项目经理可以更好地了解项目目的、目标和预期效益，以便更有效地向项目活动分配资源。项目章程授权项目经理规划、执行和控制项目。



制定项目章程



项目章程的内容

项目章程是由**项目启动者或发起人**发布的，**正式批准项目成立**，并**授权项目经理使用组织资源**开展项目活动的文件。它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的**高层级信息**，例如：

- **项目目的**
- **高层级需求**
- **整体项目风险**
- **总体里程碑进度计划**
- **项目审批要求**（如用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目结束）
- **项目退出标准**（如在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）
- **委派的项目经理及其职责和职权**
- **发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权**
- **可测量的项目目标和相关的成功标准**
- **高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果**
- **预先批准的财务资源**
- **关键相关方名单**



制定项目章程



公司计划为某高校开展一项晴雨操场的建造项目，在一次相关方会议上，某相关方表示该项目就是要打造一个可以供晴天和雨天都能使用的操场，而项目的关键可交付成果是要在操场的上方建造一项可伸缩的设备，预计该项目的造价为8000万元。其他相关方对该观点都表示赞同。为了启动项目，项目经理接下来可以完成哪份文件？

- A.商业论证
- B.项目章程
- C.项目管理计划
- D.效益管理计划



制定项目章程



公司计划为某高校开展一项晴雨操场的建造项目，在一次相关方会议上，某相关方表示**该项目就是要打造一个**可以供晴天和雨天都能使用的操场，而项目的**关键可交付成果**是要在操场的上方建造一项可伸缩的设备，预计该项目的造价为8000万元。其他相关方对该观点都表示赞同。为了启动项目，项目经理接下来可以完成哪份文件？

A.商业论证

B.项目章程

C.项目管理计划

D.效益管理计划



制定项目章程



一项产品开发完成，即将进入测试阶段。项目经理正在协商获取测试资源，测试经理认为项目经理无权使用测试人员，因为这是职能部门下的资源。项目经理应该向测试经理提供什么？

- A.沟通管理计划
- B.资源管理计划
- C.项目章程
- D.书面的资源需求



制定项目章程



一项产品开发完成，即将进入测试阶段。项目经理正在协商获取测试资源，**测试经理认为项目经理无权使用测试人员**，因为这是职能部门下的资源。项目经理应该向测试经理提供什么？

- A.沟通管理计划
- B.资源管理计划
- C.项目章程**
- D.书面的资源需求



制定项目章程



方法——人际关系和团队技能

方法	适用情况
冲突管理	冲突管理有助于相关方就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容 达成一致意见 。
引导	引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。引导者 确保参与者有效参与，互相理解 ，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。
会议管理	会议管理包括准备议程、 确保邀请每个关键相关方 群体的代表，以及准备和发送后续的会议纪要和行动计划。



制定项目章程



项目经理刚刚开始领导一个项目团队，前任项目经理已经辞职。经过对项目的快速评估，很明显，由于对如何完成任务不断产生分歧，团队的士气很低。任务的时间比预计的要长，项目的进度也不理想。项目经理应该怎么做？

- A.与项目团队召开会议，讨论并解决分歧的来源
- B.告知干系人，由于之前的团队管理，项目将被推迟
- C.缩短项目时间表，确保项目按计划进行
- D.发出变更请求，根据确定的延误情况延长项目进度



制定项目章程



项目经理刚刚开始领导一个项目团队，前任项目经理已经辞职。经过对项目的快速评估，很明显，由于对如何完成任务**不断产生分歧**，**团队的士气很低**。任务的时间比预计的要长，项目的进度也不理想。项目经理应该怎么做？

- A.与项目团队召开会议，讨论并解决分歧的来源
- B.告知干系人，由于之前的团队管理，项目将被推迟
- C.缩短项目时间表，确保项目按计划进行
- D.发出变更请求，根据确定的延误情况延长项目进度



制定项目章程



工件——假设日志


在项目启动之前编制商业论证时，识别**高层级**的战略和运营**假设条件与制约因素**。这些假设条件与制约因素应**纳入项目章程**。

较低层级的活动和任务假设条件在项目期间随着诸如定义技术规范、估算、进度和风险等活动的开展而生成。**假设日志**用于记录整个项目生命周期中的所有**假设条件和制约因素**。例如：施工前的征地拆迁。

编号	分类	假设条件或制约因素	责任方	到期日	活动日	状态	说明



制定项目管理计划

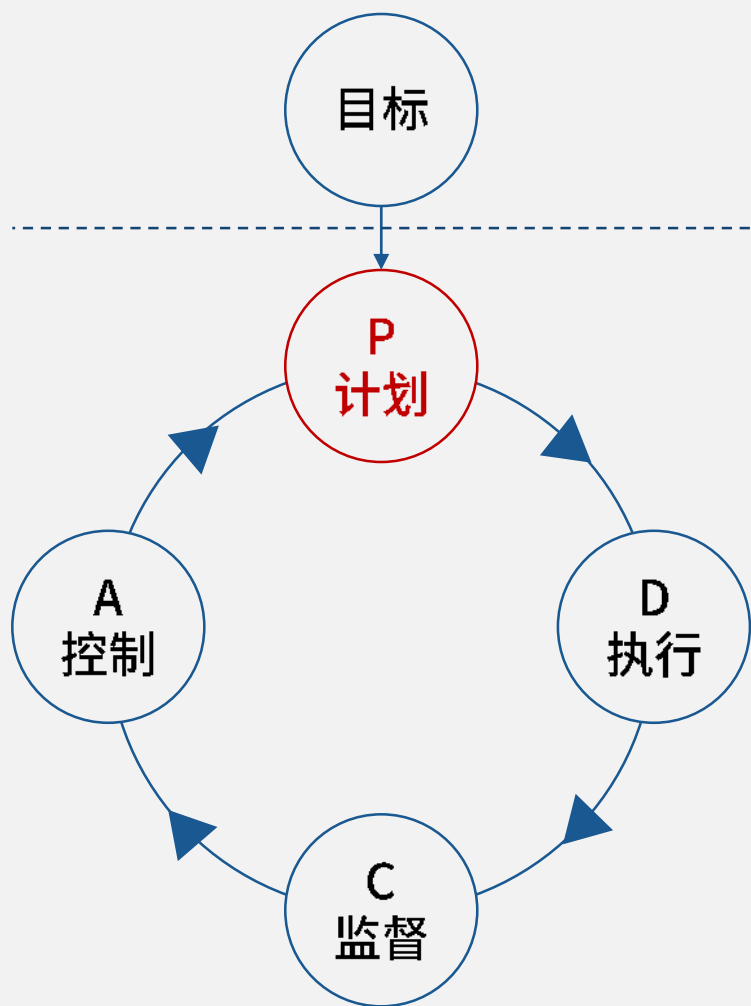


制定项目管理计划是定义、准备和协调**项目计划的所有组成部分**，并把它们整合为一份综合项目管理计划的过程。本过程的主要作用是，生成一份**综合文件**，用于确定所有项目**工作的基础及其执行方式**，它仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。



制定项目管理计划

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

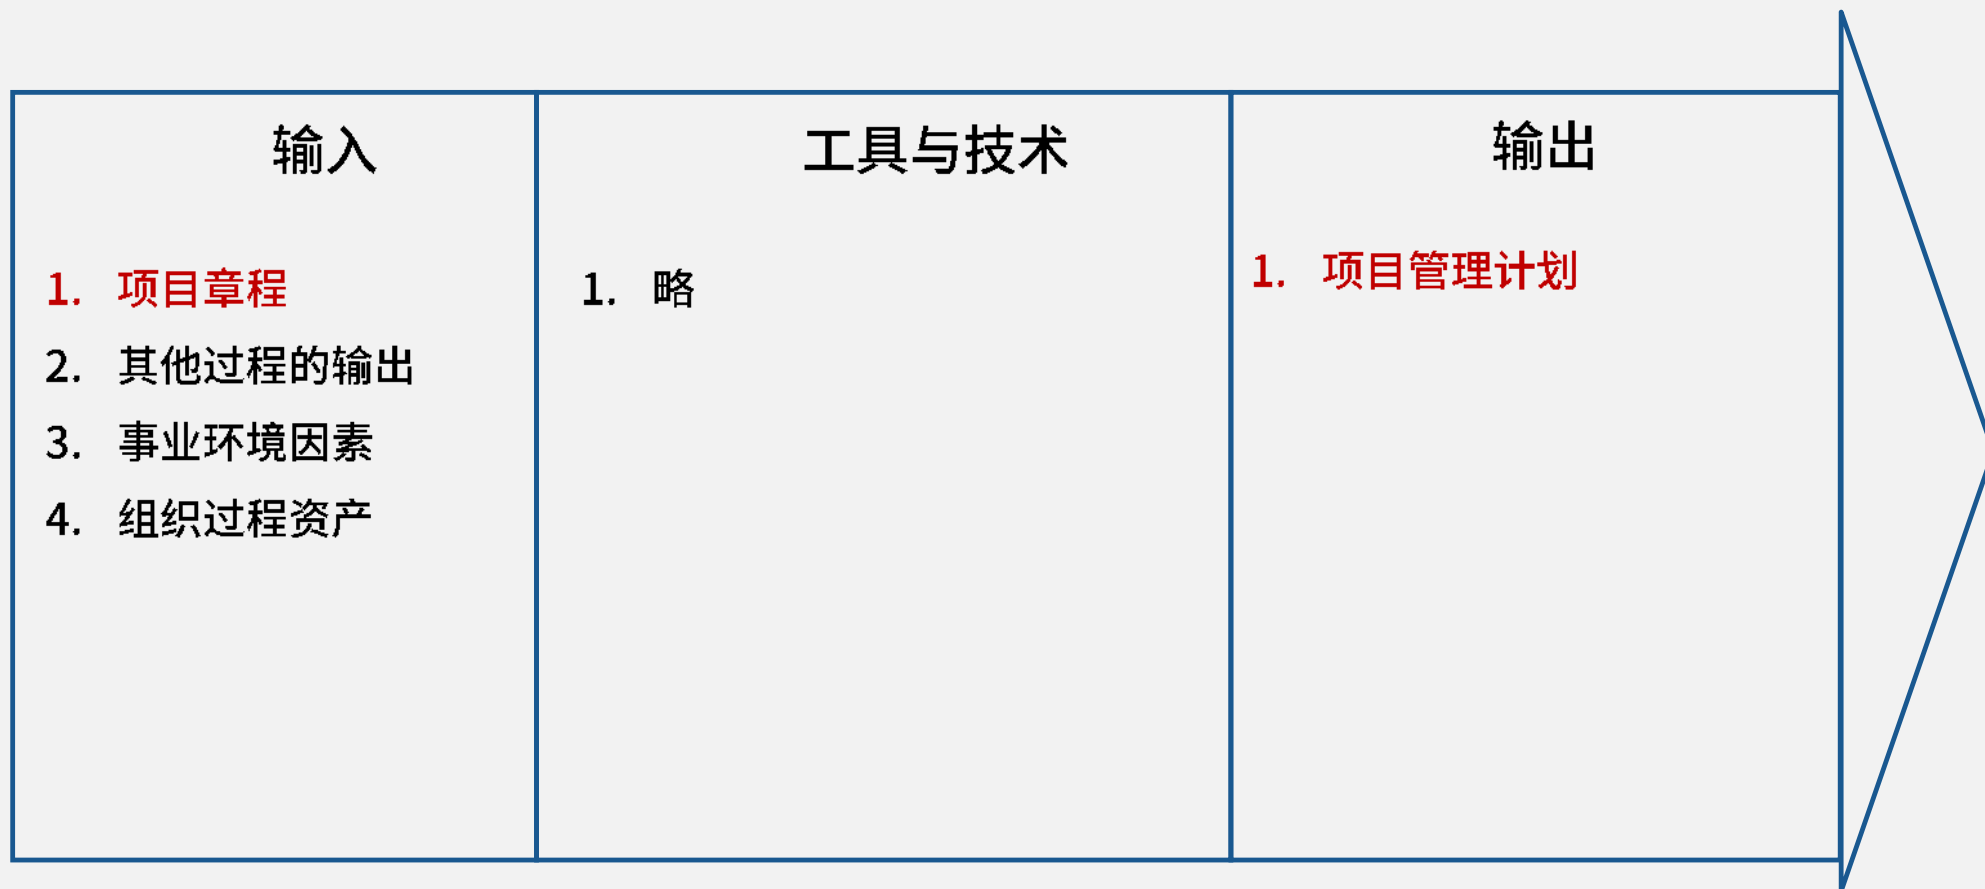

- 制定项目管理计划——定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，并把它们整合为一份**综合项目管理计划**的过程。项目管理计划包括经过整合的项目基准和子计划。


► 拓展补充



制定项目管理计划



项目管理计划的作用

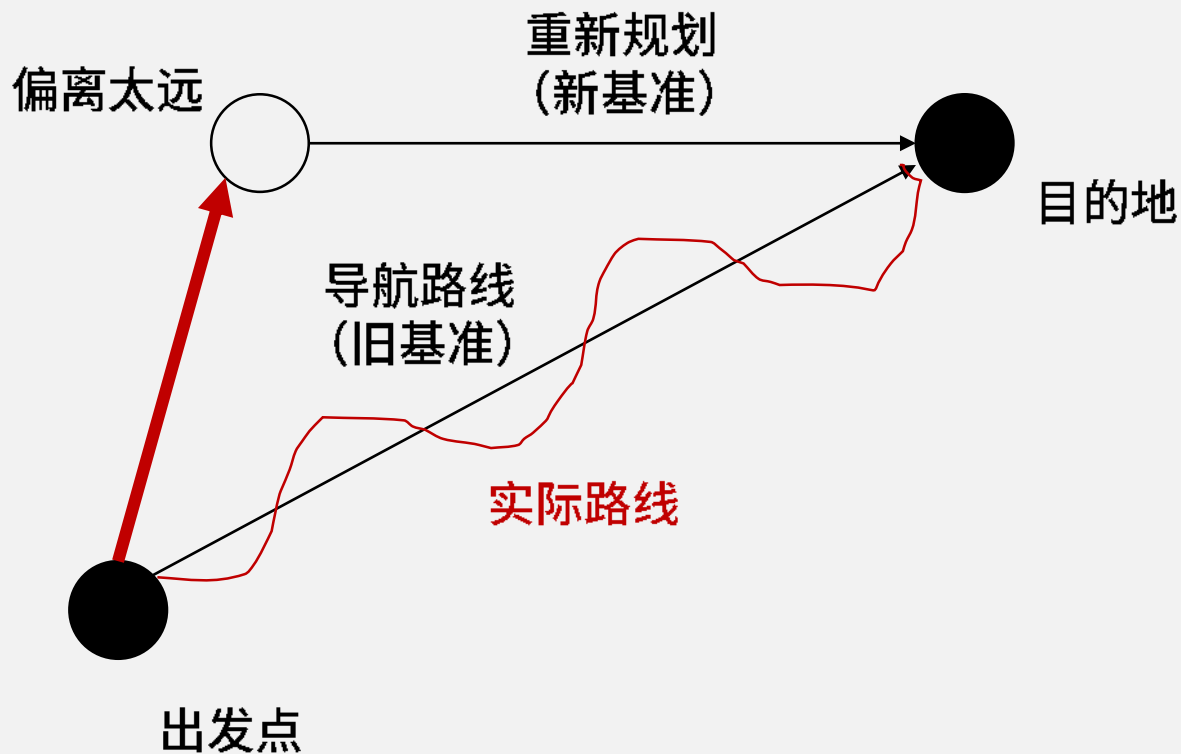

计划
基准
变更



制定项目管理计划



在项目实施过程中，项目经理因为个人原因离职，组织任命了一位新项目经理继续开展项目。新项目经理首先做什么来了解该项目？

- A. 召开团队会议
- B. 询问发起人
- C. 参考现有的项目管理计划
- D. 要求查看最新的工作绩效报告



制定项目管理计划



在项目实施过程中，项目经理因为个人原因离职，组织**任命了一位新项目经理**继续开展项目。新项目经理**首先做什么**来了解该项目？

A.召开团队会议

B.询问发起人

C.参考现有的项目管理计划

D.要求查看最新的工作绩效报告



制定项目管理计划



项目章程	项目管理计划		开工会议	项目文件	
	范围管理计划	范围基准		项目范围说明书	
	需求管理计划			需求文件、需求跟踪矩阵	
	进度管理计划	进度基准		活动属性、活动清单、持续时间估算、里程碑清单、项目进度计划	
	成本管理计划	成本基准		估算依据、成本估算、成本预测	
	质量管理计划			质量控制测量结果、质量测量指标、质量报告、测试与评估文件	
	资源管理计划			物质资源分配单、项目日历、项目团队派工单、资源分解结构、资源日历	
	沟通管理计划			项目沟通记录	
	风险管理计划			风险登记册、风险报告	
	采购管理计划				
	相关方管理计划			相关方登记册	
	变更管理计划			变更日志、问题日志	
	配置管理计划				
	绩效测量基准等文件			假设日志、经验教训登记册	



制定项目管理计划



项目章程	项目管理计划		开工会议
	范围管理计划	范围基准	
	需求管理计划		
	进度管理计划	进度基准	
	成本管理计划	成本基准	
	质量管理计划		
	资源管理计划		
	沟通管理计划		
	风险管理计划		
	采购管理计划		
	相关方管理计划		
	变更管理计划		
	配置管理计划		
	绩效测量基准等文件		

项目管理计划应**基准化**，即至少应规定项目的**范围、时间**和**成本**方面的基准，以便据此考核项目执行情况和管理项目绩效。

在确定基准之前，可能要对项目管理计划进行多次更新，且这些更新无需遵循正式流程。但是，一旦**确定了基准**，就**只能通过实施整体变更控制**过程进行更新。



制定项目管理计划



项目章程	项目管理计划		开工会议
	范围管理计划	范围基准	
	需求管理计划		
	进度管理计划	进度基准	
	成本管理计划	成本基准	
	质量管理计划		
	资源管理计划		
	沟通管理计划		
	风险管理计划		
	采购管理计划		
	相关方管理计划		
	变更管理计划		
	配置管理计划		
	绩效测量基准等文件		

开工会议Kick-off meeting

开工会议（项目启动会）

在本过程中，可以通过会议讨论项目方法，确定为达成项目目标而采用的工作执行方式，以及制定项目监控方式。

项目启动会通常意味着**规划阶段结束**和**执行阶段开始**，旨在①**传达项目目标**、②**获得团队对项目的承诺**，以及③**阐明每个相关方的角色和职责**。

项目启动会可能在不同时间点举行，对于多阶段项目，通常在**每个阶段开始时**都要举行一次项目启动会。



制定项目管理计划



一个老年健身项目已经顺利启动，目前已经经历项目的规划阶段。前几天，项目经理通过邮件告知发起人该阶段已经完成了。正式执行项目之前，必须传达项目的目标和阐明每个相关方的角色和职责。

项目经理下一步应该怎么做？

- A. 召集所有相关方举行项目开工大会
- B. 将项目管理计划的电子档发送给所有相关方
- C. 将项目的目标分别口头传达给每一位项目相关方
- D. 要求发起人审核项目管理计划



制定项目管理计划



一个老年健身项目已经顺利启动，目前已经经历项目的规划阶段。前几天，项目经理通过邮件告知发起人该阶段已经完成了。正式执行项目之前，必须**传达项目的目标和阐明每个相关方的角色和职责**。项目经理**下一步**应该怎么做？

- A. 召集所有相关方举行项目开工大会
- B. 将项目管理计划的电子档发送给所有相关方
- C. 将项目的目标分别口头传达给每一位项目相关方
- D. 要求发起人审核项目管理计划

项目启动会通常意味着规划阶段结束和执行阶段开始，旨在①传达项目目标、②获得团队对项目的承诺，以及③阐明每个相关方的角色和职责。



制定项目管理计划



一些关键相关方不能参加预定的项目启动大会，项目负责人要求项目经理继续举行会议，因为他们还要参加其他会议。项目经理应该做什么确保顺利召开项目启动大会，以便能够开始执行项目？

- A. 在没有太多项目负责人参与的情况下继续召开会议
- B. 取消会议，并单独跟进各个相关方
- C. 推迟会议，直到所有相关方和项目负责人都可以参加
- D. 重新安排会议，以便除项目负责人以外的所有相关方都可以参加



制定项目管理计划




一些关键相关方不能参加预定的项目启动大会，项目负责人要求项目经理继续举行会议，因为他们还要参加其他会议。项目经理应该做什么确保顺利召开项目启动大会，以便能够开始执行项目？

- A. 在没有太多项目负责人参与的情况下继续召开会议
- B. 取消会议，并单独跟进各个相关方
- C. 推迟会议，直到所有相关方和项目负责人都可以参加**
- D. 重新安排会议，以便**除**项目负责人以外的所有相关方都可以参加



指导与管理项目工作

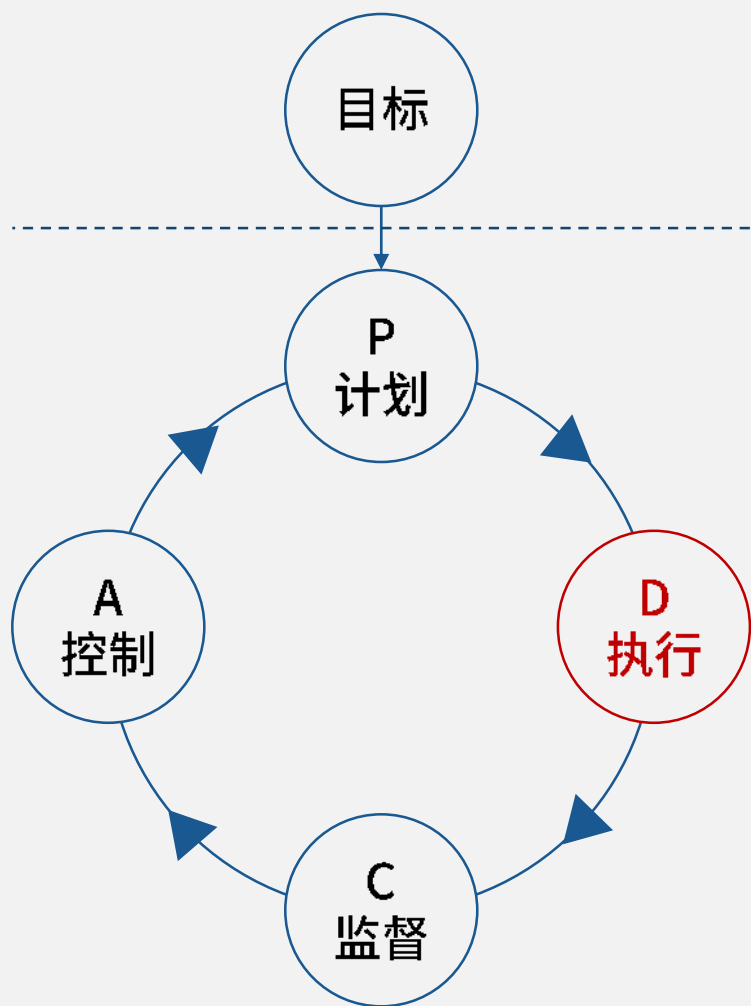

指导与管理项目工作

是为实现项目目标而**领导和执行**项目管理计划中所**确定的工作**，并**实施已批准变更**的过程。本过程的主要作用是，对项目工作和可交付成果开展综合管理，以提高项目成功的可能性。本过程需要在整个项目期间开展。



指导与管理项目工作

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 批准的变更请求 4. 事业环境因素 5. 组织过程资产	1. 略	1. 可交付成果 2. 工作绩效数据 3. 问题日志 4. 变更请求 5. 项目管理计划更新 6. 项目文件更新 7. 组织过程资产更新

- 指导与管理项目工作——为实现项目目标而领导和执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更的过程。



指导与管理项目工作



问题日志

在整个项目生命周期中，项目经理通常会遇到问题、差距、不一致或意外冲突。项目经理需要采取某些行动加以处理，以免影响项目绩效。问题日志是一种**记录和跟进所有问题**的项目文件，所需记录和跟进的内容可能包括：

- 问题类型
- 问题描述
- 由谁负责解决问题
- 问题状态
- 问题提出者和提出时间
- 问题优先级
- 目标解决日期
- 最终解决情况



问题日志

在整个项目生命周期中，项目经理通常会遇到问题、差距、不一致或意外冲突。项目经理需要采取某些行动加以处理，以免影响项目绩效。问题日志是一种**记录和跟进所有问题**的项目文件。

问题日志可以帮助项目经理有效跟进和管理问题，确保它们得到调查和解决。在整个项目生命周期应该随同监控活动更新问题日志。问题日志可参考以下模板：

[illegible]




指导与管理项目工作



问题日志

简化四部曲：记录—分析/评估—制定解决方案—实施

问题处理的流程：记录——**分析**——计划——执行——检查——回应

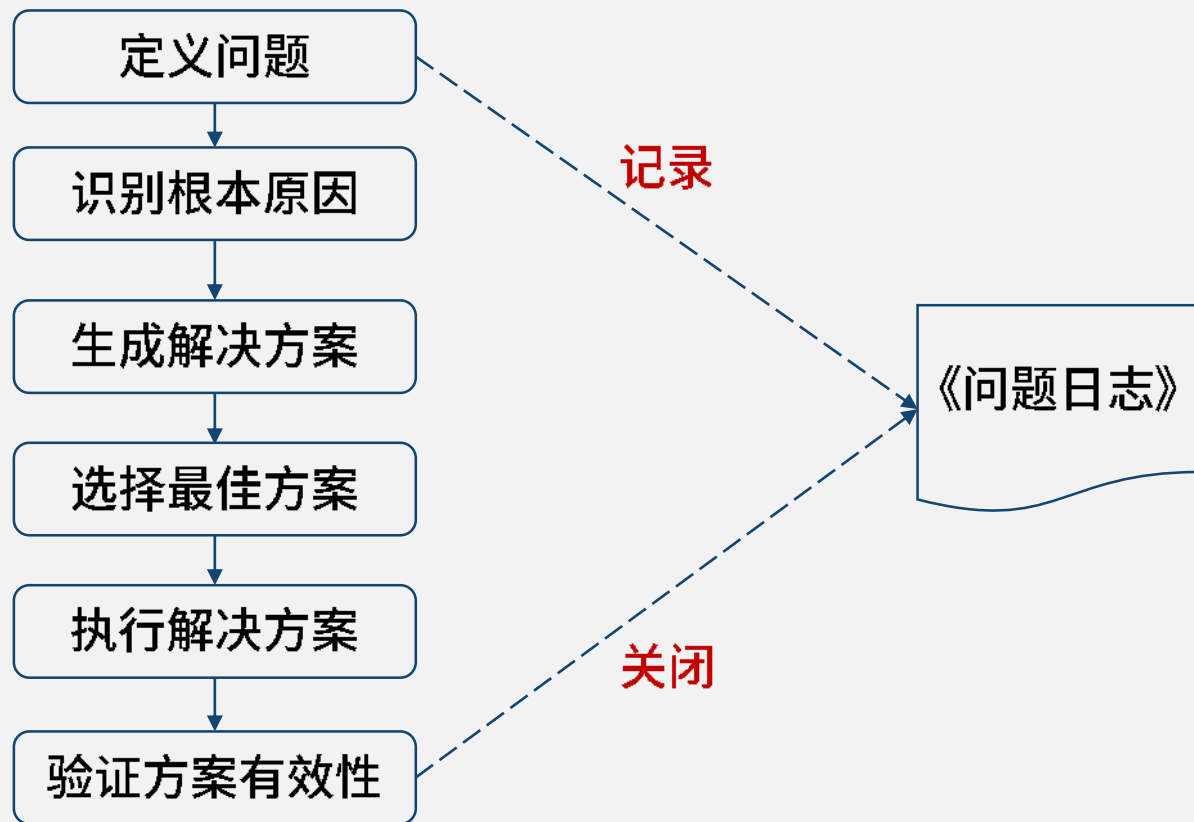



指导与管理项目工作



生产线产出了一批产品，质量监测团队检查出某些产品不符合质量测量指标。项目经理准备实施必要的纠正措施，在此之前，项目经理应该首先做什么？

- A.更新问题日志并分析纠正措施的影响
- B.更新项目采用的质量标准
- C.更新风险登记册并寻找应对策略
- D.查看经验教训并采取有效处理方式



指导与管理项目工作



生产线产出了一批产品，质量监测团队检查出某些产品不符合质量测量指标。项目经理准备实施必要的纠正措施，在此之前，项目经理应该**首先做什么**？

- A.更新问题日志并分析纠正措施的影响
- B.更新项目采用的质量标准
- C.更新风险登记册并寻找应对策略
- D.查看经验教训并采取有效处理方式

区分《风险登记册》《问题日志》《经验教训登记册》

- 1、风险登记册：风险是还没有发生的，具有不确定性。
- 2、问题日志：问题是已经发生了的并且对项目产生了影响。
- 3、经验教训登记册：防止将来出现同样的问题。



指导与管理项目工作



某项目正处于执行阶段，项目经理从供应商处得知负责整个项目外包产品设计的一名设计师因病住院，未来一个月都无法工作，而供应商无法获取新的设计师，这将会使整个项目进程延后。某关键相关方表示公司总部有一位资深设计师可以在计划时间内帮助完成产品的设计研发。项目经理接下来应该做什么？

- A.更新问题日志，并审查采购协议以确保适当修改资源需求
- B.按照项目采购协议的相关规定，要求供应商解决该问题
- C.将使用公司内部资源识别为一项新的风险
- D.宣布该问题已解决并要求公司内部的设计师开始工作



指导与管理项目工作



某项目正处于执行阶段，项目经理从供应商处得知负责整个项目**外包**产品设计的一名**设计师因病住院**，未来一个月都无法工作，而供应商无法获取新的设计师，这将会使整个项目进程延后。某关键相关方表示公司**总部有一位资深设计师**可以在计划时间内帮助完成产品的设计研发。项目经理**接下来**应该做什么？

- A.更新问题日志，并审查采购协议以确保适当修改资源需求
- B.按照项目采购协议的相关规定，要求供应商解决该问题
- C.将使用公司内部资源识别为一项新的风险
- D.宣布该问题已解决并要求公司内部的设计师开始工作



指导与管理项目工作




变更请求

变更请求是关于修改任何文件、可交付成果或基准的正式提议。**任何项目相关方都可以提出**变更请求，应该通过实施整体变更控制过程对变更请求进行审查和处理。变更请求源自项目内部或外部，是可选或由法律（合同）强制的。变更请求可能包括：

- **缺陷补救** 为了**修正**不一致**产品**或产品组件的有目的的活动。（质量）
- **纠正措施** 为使项目工作绩效**重新**与项目管理计划一致，而进行的有目的的活动。
- **预防措施** 为确保项目工作的**未来**绩效符合项目管理计划，而进行的有目的的活动。
- **更新** 对正式受控的**项目文件或计划**等进行的**变更**，以反映修改或增加的意见或内容。



管理项目知识

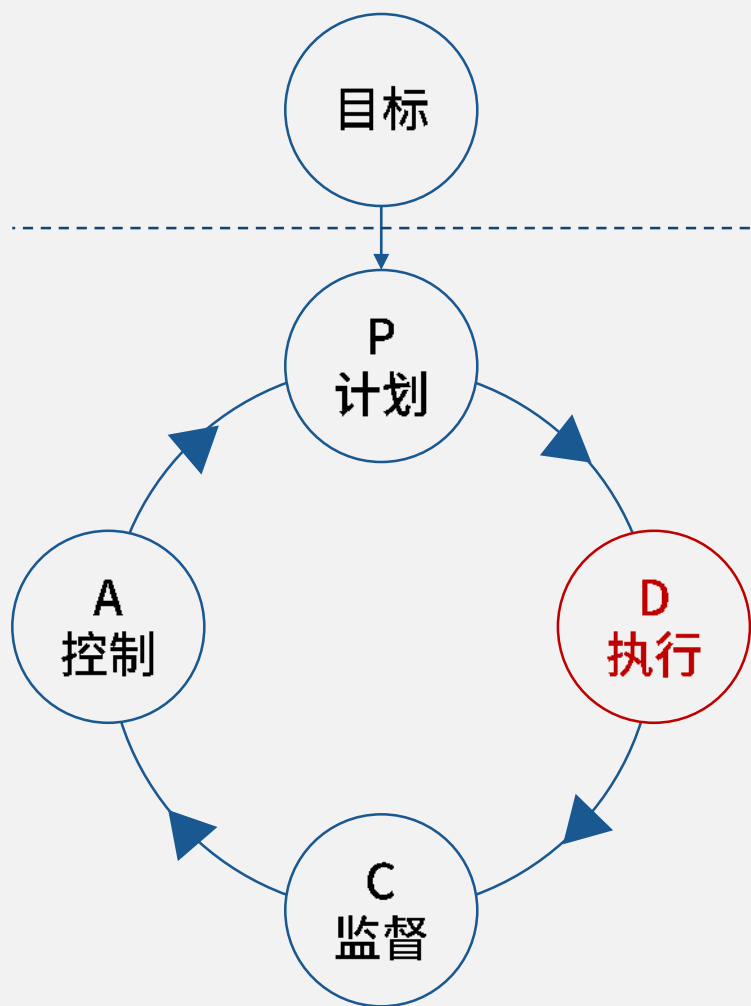

管理项目知识是使用现有知识并**生成新知识**，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。本过程的主要作用是，利用已有的组织知识来创造或改进项目成果，并且使当前项目创造的知识可用于**支持组织运营和未来的项目**或阶段。本过程需要在**整个项目期间**开展。

知识管理包括**管理显性和隐性知识**，旨在重复使用现有知识并生成新知识。

关键活动是**知识分享**和**知识集成**。



管理项目知识



管理项目知识的含义

实践中常见问题

- 1、根本**没有**将隐性知识整理成显性知识的**制度**。
- 2、知识管理**只是将知识记录**下来用于分享。
- 3、知识管理**只是在项目结束时总结**经验教训，以供未来项目使用。

显性知识

易用文字、图片和数字进行编辑的知识

隐性知识

个体知识难以明确表达，如信念、洞察力和经验等

隐性知识虽蕴含情境，却很难编撰。它存在于专家个人的思想中，或者存在于社会团体和情境中，通常经由**人际交流**和**互动**来分享。



管理项目知识



一位没有项目管理相关知识的高技术团队成员，识别到一个可以提高工作效率的方法，在后续的绩效评估会议上，该团队成员工作绩效十分突出得到了客户的认可，其他团队成员对此产生了敌意。该团队成员不清楚在何时分享这些信息，作为项目经理应该如何指导？

- A.在整个项目阶段持续进行
- B.行政收尾时
- C.阶段关口
- D.在收集到客户的反馈后



管理项目知识



一位没有项目管理相关知识的高技术团队成员，识别到一个可以提高工作效率的方法，在后续的绩效评估会议上，该团队成员工作绩效十分突出得到了客户的认可，其他团队成员对此产生了敌意。该团队成员不清楚在**何时分享这些信息**，作为项目经理应该如何指导？

- A.在整个项目阶段持续进行
- B.行政收尾时
- C.阶段关口
- D.在收集到客户的反馈后



管理项目知识

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背



- 管理项目知识——使用现有知识并生成新知识，以实现项目目标，并且帮助组织学习的过程。


► 拓展补充



管理项目知识



管理项目知识的方法

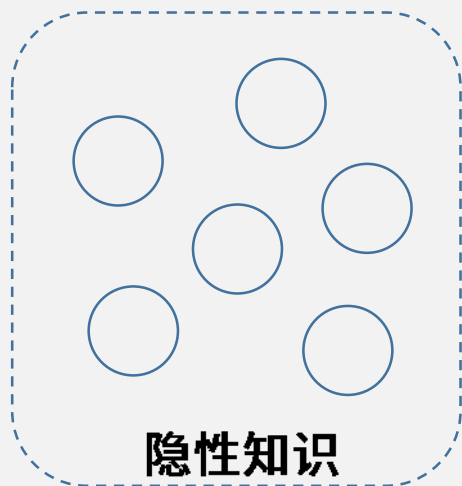

知识
管理
方法

相互信任的氛围



信息
管理
方法



从组织的角度来看，知识管理指的是确保在项目**开始之前**、**开展期间**和**结束之后**得到运用。



管理项目知识



知识管理方法

知识管理方法和技术将员工联系起来，使他们能够合作生成新知识、分享隐性知识，以及集成不同团队成员所拥有的知识。

- 讲故事
- 会议，包括虚拟会议
- 讨论论坛，如焦点小组
- 实践社区和特别兴趣小组
- 创造力和创意管理技术
- 交互式培训
- 人际交往，包括非正式社交和在线社交
- 工作跟随和跟随指导
- 知识分享活动，如专题讲座和会议
- 研讨会，包括问题解决会议和经验教训总结会议
- 知识展会和茶座



管理项目知识



信息管理

信息管理方法和技术用于创建人们与知识之间的联系，可以有效促进简单、明确的显性知识的分享。

- 编撰显性知识的方法，例如，如何确定经验教训登记册的条目；
- **经验教训登记册**；
- 图书馆服务；
- 信息收集，例如搜索网络和阅读已发表的文章；
- **项目管理信息系统（Project Management Information System, PMIS）**，提供信息技术(IT)软件工具，例如进度计划软件工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统，以及进入其他在线自动化系统(如公司知识库)的界面。



藏经阁



管理项目知识



工件——经验教训登记册

经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，经验教训登记册还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案。经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。

经验教训登记册在项目早期创建，作为本过程的工件。

在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入，也可以作为工件而不断更新。

在项目或阶段结束时，把相关信息归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。



管理项目知识



工件——经验教训登记册

编号	分类	触发源	经验教训	责任方	说明
输入一个唯一的经验教训编号	记录经验教训的类别，如过程、技术、环境、相关方、阶段等	描述背景、事件或引发挑战和问题，获得效益的条件	可以在其他项目或组织中传递的、清晰描述的经验教训	识别有助于实施任何变更、确保经验教训被传递的人	清晰说明有关挑战、问题、良好实践或其他相关信息
JY10086	技术	助教将PPT转为PDF，上传后台供学员下载，部分学员下载后显示乱码	原因：助教电脑上的PDF转换软件，未识别字体 解决：安装某一插件	助教主管	插件：Doro PDF Writer 获取地址：电脑管家-软件管理



管理项目知识



Subject Matter Expert

一个项目处于知识转移阶段，一些主题专家（SME）到客户现场进行知识转移，SMEs捕获了各种流程偏差而没有与项目团队共享。项目经理如何确保跨团队的知识转移？

- A.要求项目组与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法如期上线
- B.要求项目管理办公室（PMO）为团队成员提供偏差的实时可见性，并帮助团队成员解决问题
- C.要求主题专家通过将文档放入项目管理信息系统（PMIS）中与所有其他成员共享知识转移文档
- D.要求项目团队在项目收尾阶段举办一次经验教训会议，以纳入这个问题



管理项目知识



一个项目处于知识转移阶段，一些主题专家（SME）到客户现场进行知识转移，SMEs捕获了各种流程偏差而没有与项目团队共享。项目经理如何确保跨团队的知识转移？

- A.要求项目组与客户召开偏差日志审查会议，强调项目可能无法如期上线
- B.要求项目管理办公室（PMO）为团队成员提供偏差的实时可见性，并帮助团队成员解决问题
- C.要求主题专家通过将文档放入项目管理信息系统（PMIS）中与所有其他成员共享知识转移文档**
- D.要求项目团队在项目收尾阶段举办一次经验教训会议，以纳入这个问题



管理项目知识



在一个项目期间识别到的技术问题得到了有效解决，项目经理希望正式采用该解决方案的方法，并在整个组织中利用该方法。项目经理能够如何完成这项工作？

- A.在项目管理计划中存档该决定
- B.将问题日志分发给整个公司
- C.将该解决方案更新到经验教训登记册中
- D.要求技术团队记录该解决方案



管理项目知识




在一个项目期间识别到的技术问题得到了有效解决，项目经理希望正式采用该解决方案的方法，并在整个组织中利用该方法。项目经理能够如何完成这项工作？

- A.在项目管理计划中存档该决定
- B.将问题日志分发给整个公司
- C.将该解决方案更新到经验教训登记册中
- D.要求技术团队记录该解决方案



监控项目工作

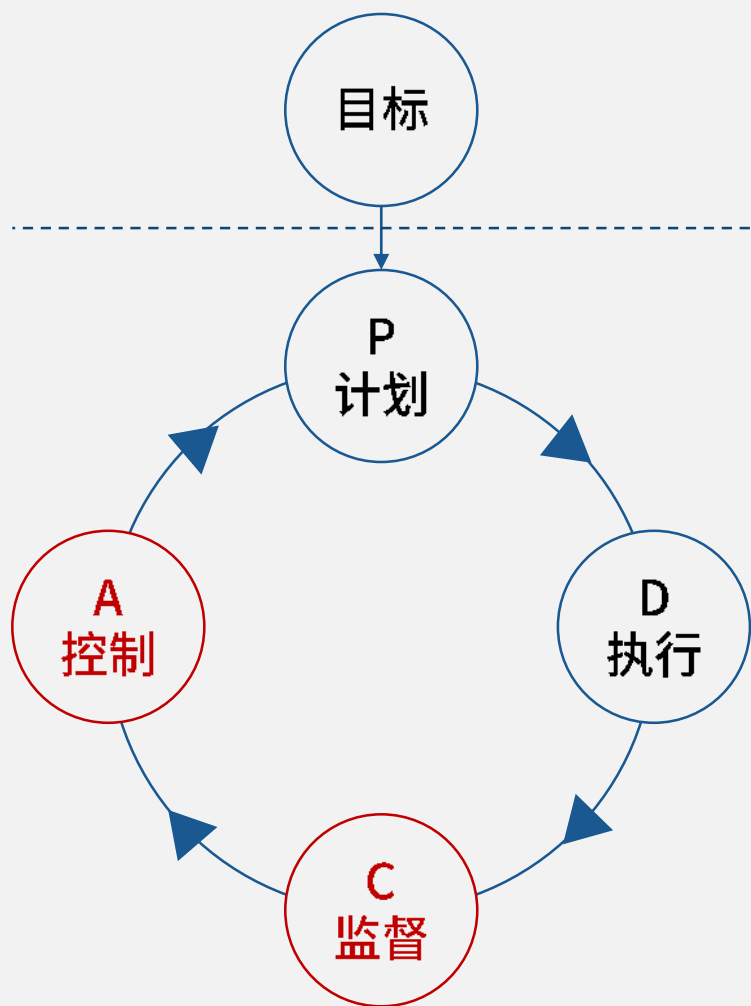

监督是贯穿于整个项目的项目管理活动之一，包括**收集、测量和分析测量结果**，以及**预测趋势**，以便推动过程改进。

持续的**监督**使项目管理团队能洞察项目的健康状况，并识别须特别关注的任何方面。

控制包括制定**纠正或预防措施**或**重新规划**，并跟踪行动计划的实施过程，以确保它们能有效解决问题。



监控项目工作

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目文件 3. 工作绩效信息 4. 协议 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 专家判断 2. 数据分析 (备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、趋势分析、偏差分析) 3. 决策 4. 会议	1. 工作绩效报告 2. 变更请求 3. 项目管理计划更新 4. 项目文件更新

- 监控项目工作——跟踪、审查和报告整体项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程。



► 拓展补充



监控项目工作



监控过程中的文件

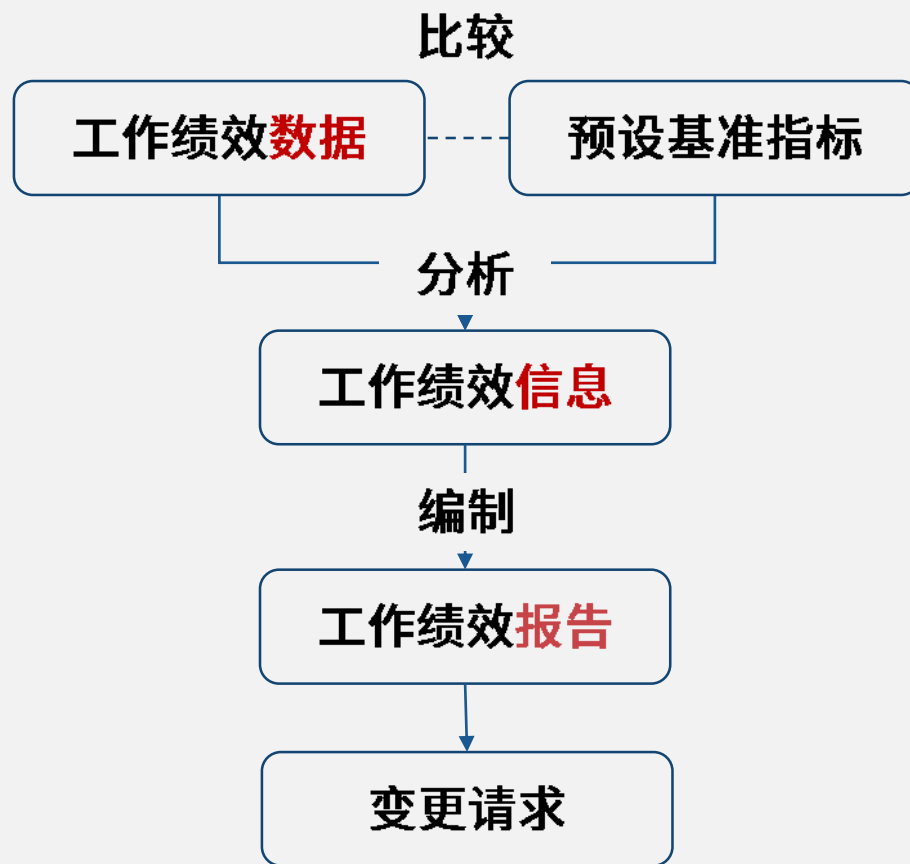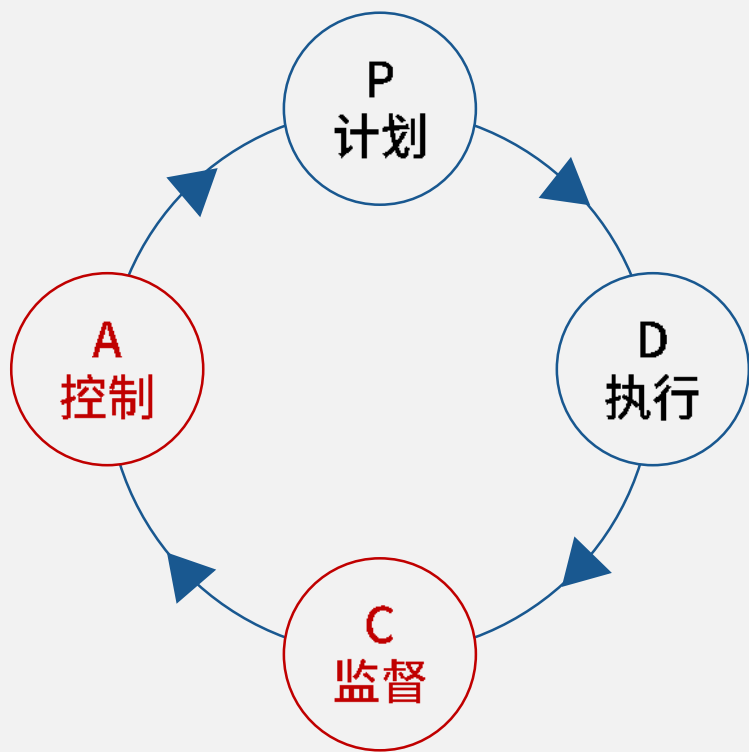



监控项目工作



工作绩效数据	工作绩效数据是在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的 原始观察结果 和 测量值 。数据通常是 最低层次的细节 ，将交由其他过程从中提炼出信息。在工作执行过程中收集数据，再交由控制过程做进一步分析
工作绩效信息	在工作执行过程中收集工作绩效数据，再交由控制过程做进一步分析。将 工作绩效数据 与项目管理 计划组件 、 项目文件 和其他 项目变量比较 之后生成 工作绩效信息 。通过这种比较可以了解项目的执行情况
工作绩效报告	工作绩效信息可以用实体或电子形式加以 合并、记录和分发 。基于工作绩效信息，以实体或电子形式 编制工作绩效报告 ，以制定决策、采取行动或引起关注。根据项目沟通管理计划，通过沟通过程向项目相关方发送工作绩效报告



监控项目工作




监控过程使用的方法

- 备选方案分析
- 成本效益分析
- 根本原因分析
- 挣值分析
- 趋势分析 (未来)
- 偏差分析 (当下)

趋势分析：

旨在审查项目绩效随时间的变化情况，以判断绩效是正在改善还是正在恶化

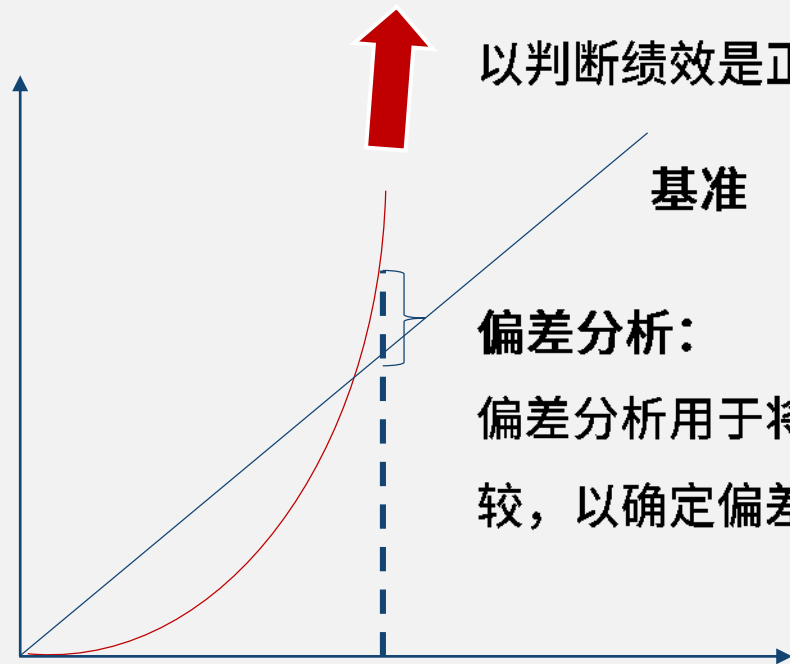

偏差分析：

偏差分析用于将基准与实际结果进行比较，以确定偏差是否处于临界值区间内



监控项目工作



一个项目发起人想要包括一个新的可交付物。发起人联系项目经理，以寻求在未来2个月内完成可交付物的最有效方法的建议。项目经理应该怎么做？

- A.更改项目方法论，以在2个月内完成可交付物
- B.告知发起人评估项目不是项目经理的工作
- C.建议发起人进行成本效益分析，以确定可行性
- D.使用管理储备，以加快2个月内完成可交付物



监控项目工作




一个项目发起人想要包括一个新的可交付物。发起人联系项目经理，以寻求在未来2个月内完成可交付物的最有效方法的建议。项目经理应该怎么做？

- A.更改项目方法论，以在2个月内完成可交付物
- B.告知发起人评估项目不是项目经理的工作
- C.建议发起人进行成本效益分析，以确定可行性
- D.使用管理储备，以加快2个月内完成可交付物



实施整体变更控制

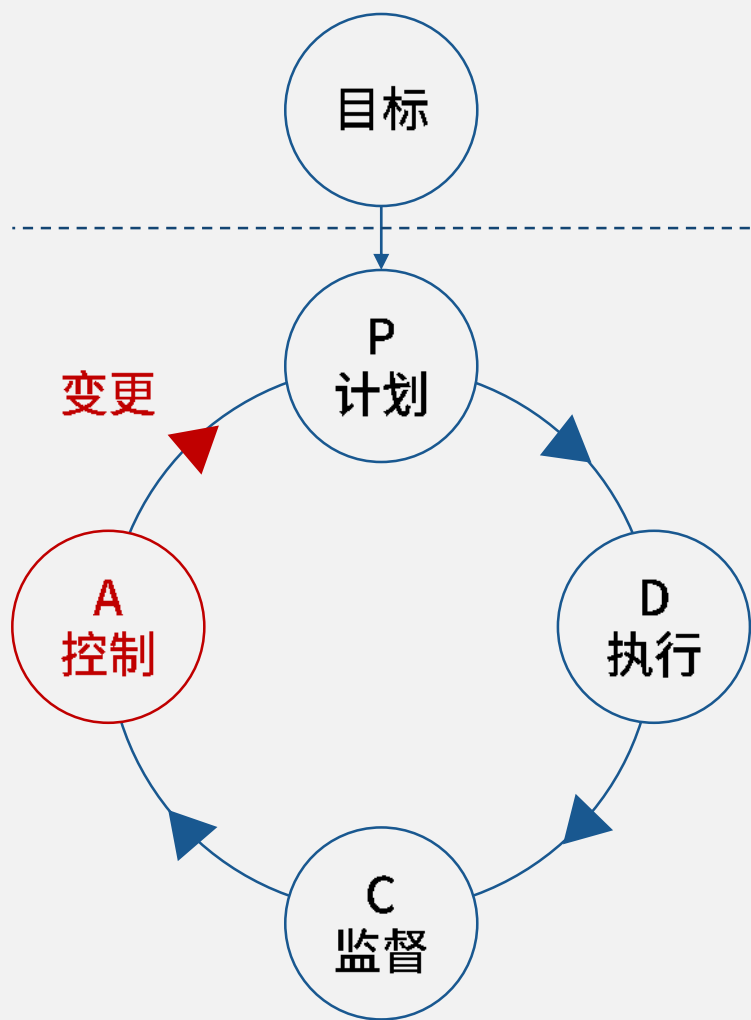

变更请求可能影响项目范围、产品范围以及**任一**项目管理计划组件或任一项目文件；在整个项目生命周期的**任何时间**；参与项目的**任何相关方**都可以**提出变更请求**。

实施整体变更控制是**审查**所有变更请求、**批准变更**，**管理**对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。

如果不考虑变更对整体项目目标或计划的影响就开展变更，往往会**加剧整体项目风险**。

实施整体变更控制过程贯穿项目始终，**项目经理**对此承担最终责任。



实施整体变更控制

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背


输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 (如变更管理计划、范围基准、进度基准、成本基准) 2. 项目文件 3. 工作绩效报告 4. 变更请求 5. 事业环境因素 6. 组织过程资产	1. 略	1. 批准的变更请求 2. 项目管理计划更新 3. 项目文件更新 (如变更日志)

- 实施整体变更控制——审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、项目文件和项目管理计划的变更，并对变更处理结果进行沟通的过程。该过程贯穿项目始终。

► 拓展补充



实施整体变更控制

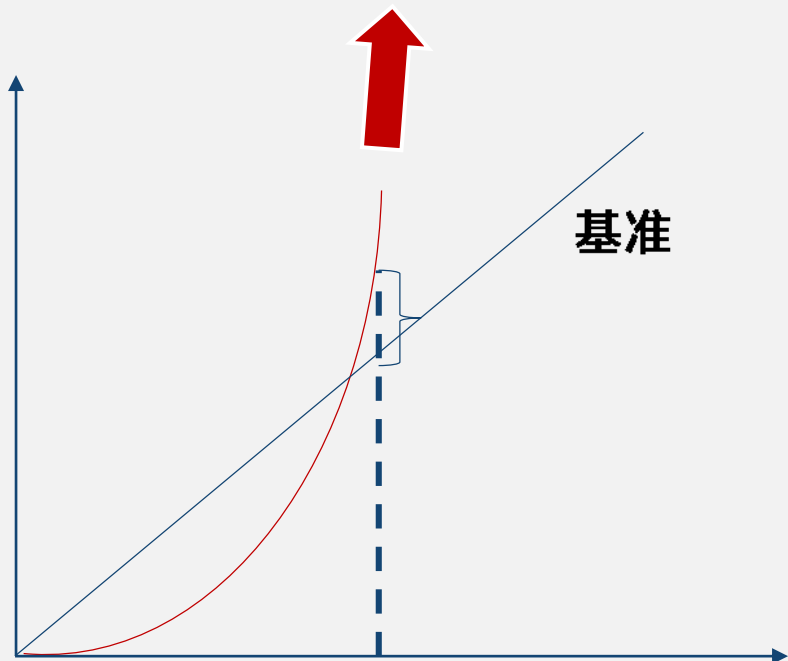

在基准确定之前，变更无需正式受控于实施整体变更控制过程。一旦**确定了项目基准**，就必须通过本过程来处理变更请求。

尽管也可以口头提出，但所有变更请求都**必须以书面**形式记录到**变更日志**中，并纳入变更管理和（或）配置管理系统中。



实施整体变更控制



变更日志：用于记录项目期间发生的变更，它包含了整个项目或阶段期间的所有变更请求的状态。

变更管理计划：定义管理项目变更的过程，用来明确如何对变更进行监控。为管理变更控制过程提供指导，记录变更控制委员会的情况。

变更管理计划

项目名称：准备日期：

变更管理方法

描述变更控制的程度，以及如何把变更控制与项目管理的其他方面整合在一起

变更的定义

进度变更：定义进度变更与进度修正，识别进度偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

预算变更：定义预算变更与预算修正，识别预算偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

范围变更：定义范围变更与范围修正，识别范围偏差什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

项目文件变更：确定什么时候更新项目管理文件，或其他项目文件什么时候需要通过变更控制过程重新确定基准

变更控制委员会

姓名	角色	职责	职权
人员姓名	在变更控制委员会中的地位	职责和需要进行的 活动	批准或拒绝变更的 职权层级

变更控制过程


变更请求提交	描述变更请求提交的过程，包括谁接受请求和需要使用的 所有专门的表单、政策或过程
变更请求跟踪	描述从提交到最终进行处理的跟踪变更请求的过程
变更请求审核	描述审核变更请求的过程，包括对项目目标影响的分析，如 进度、范围和成本等
对变更请求的处理	描述可能的结果，如同意、搁置、拒绝

附上用于变更控制过程的相关表单



实施整体变更控制

Change Control Board

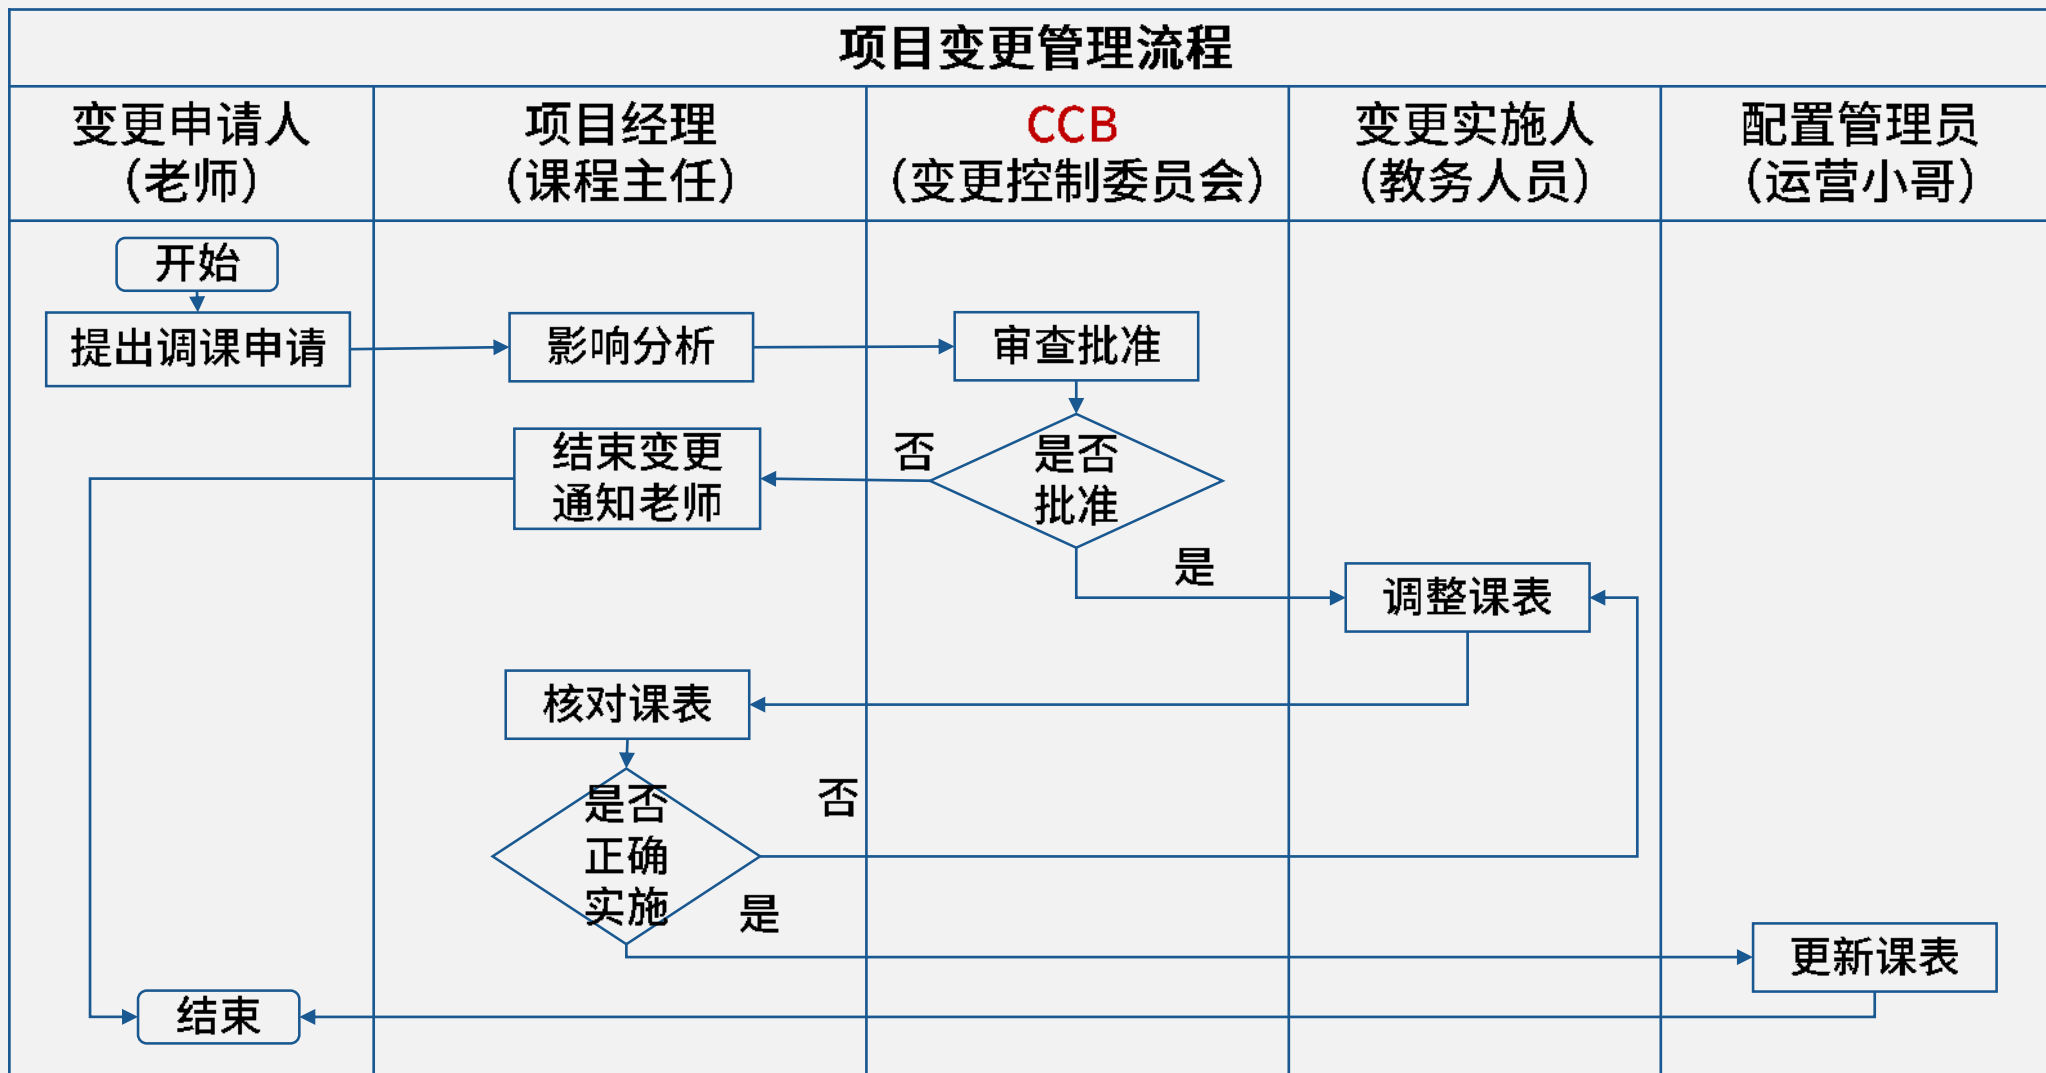




实施整体变更控制



有变更，走流程！

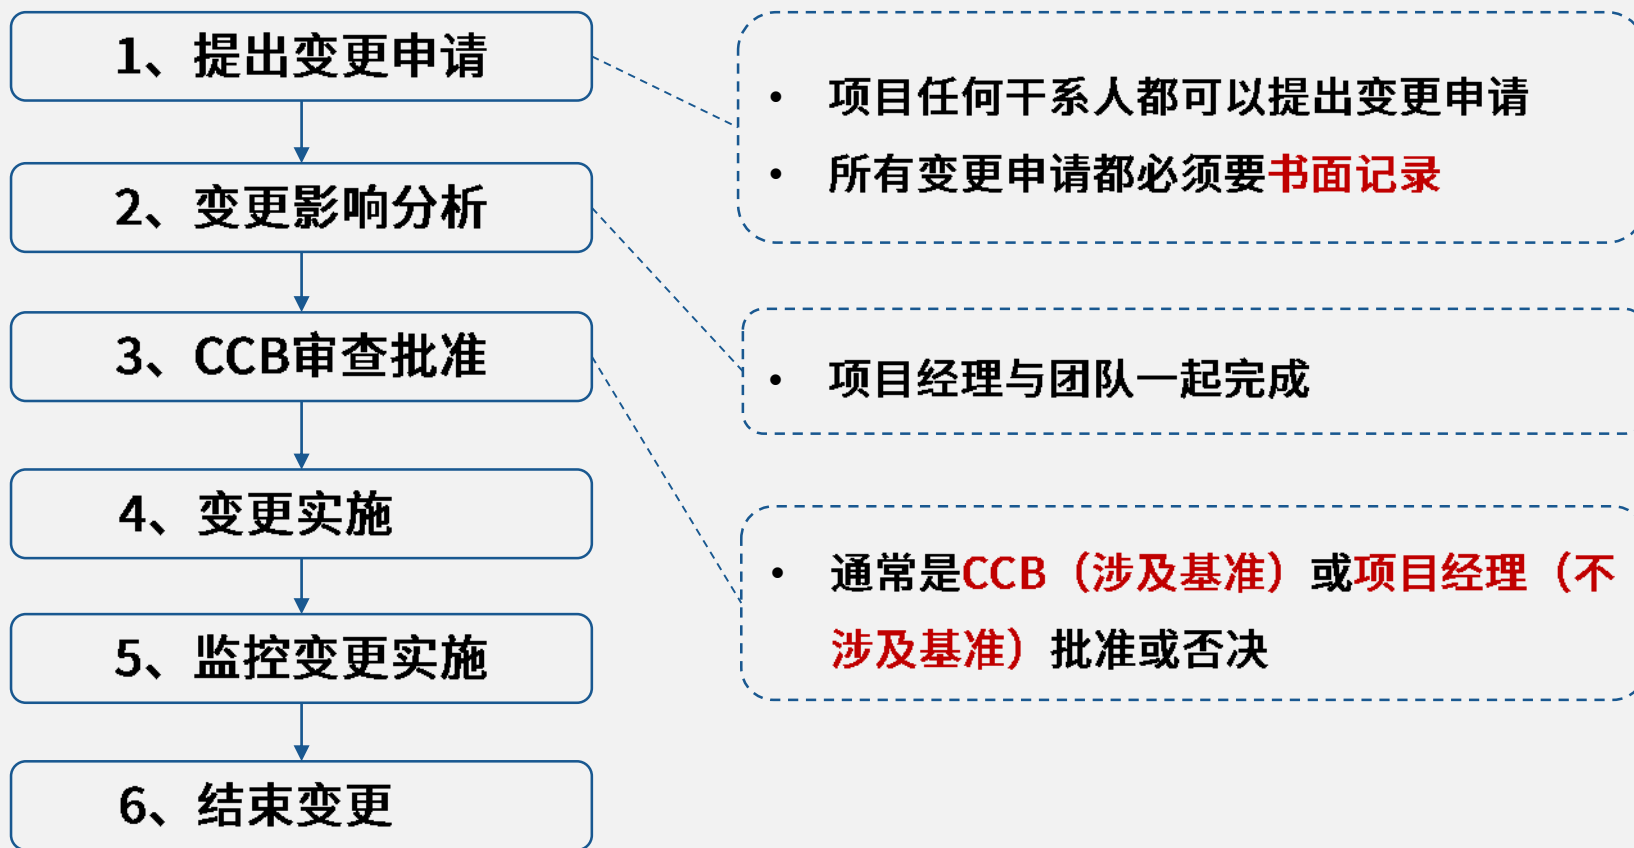




实施整体变更控制




有变更，走流程！

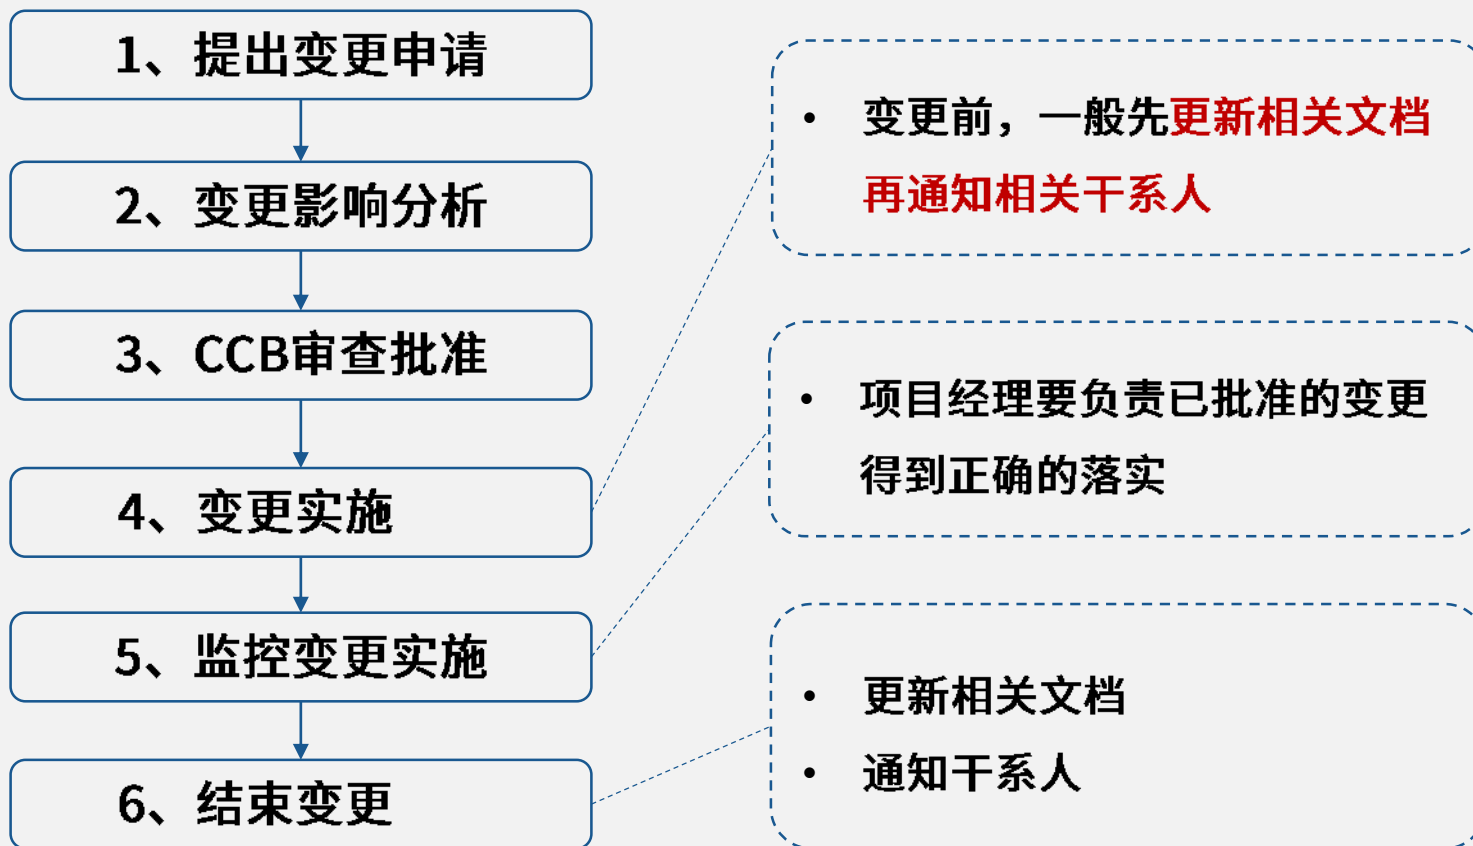



实施整体变更控制

知识点：变更流程

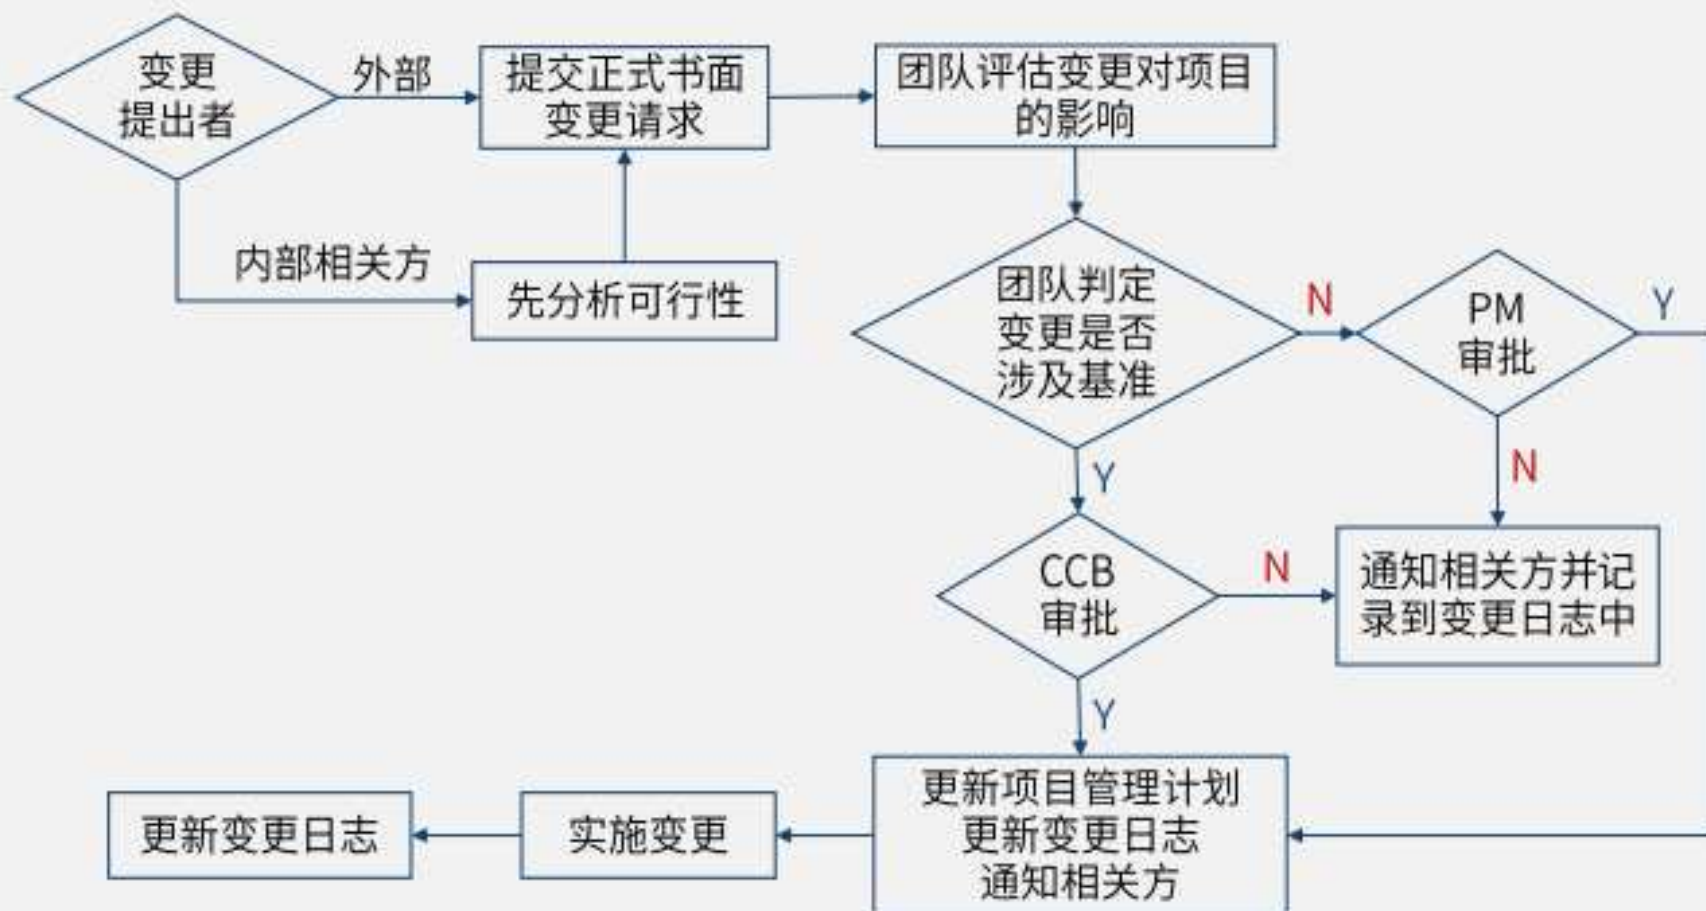



实施整体变更控制



知识点：变更流程


- 有变更，走流程！！！！
- 如果没有走流程就直接实施了变更，要事后补流程

- 变更请求默认提交给PM/团队
- 综合评估，包含基准和非基准

- 审批权限：CCB和PM
- 涉及基准CCB，不涉及基准PM

- 以团队为界，变更提出者分内/外部
- 内部：先分析再提交（考的极少）
- 外部：先提交再分析

- 变更日志要实时更新，追踪变更的状态，变更请求记录在变更日志，而非变更管理计划

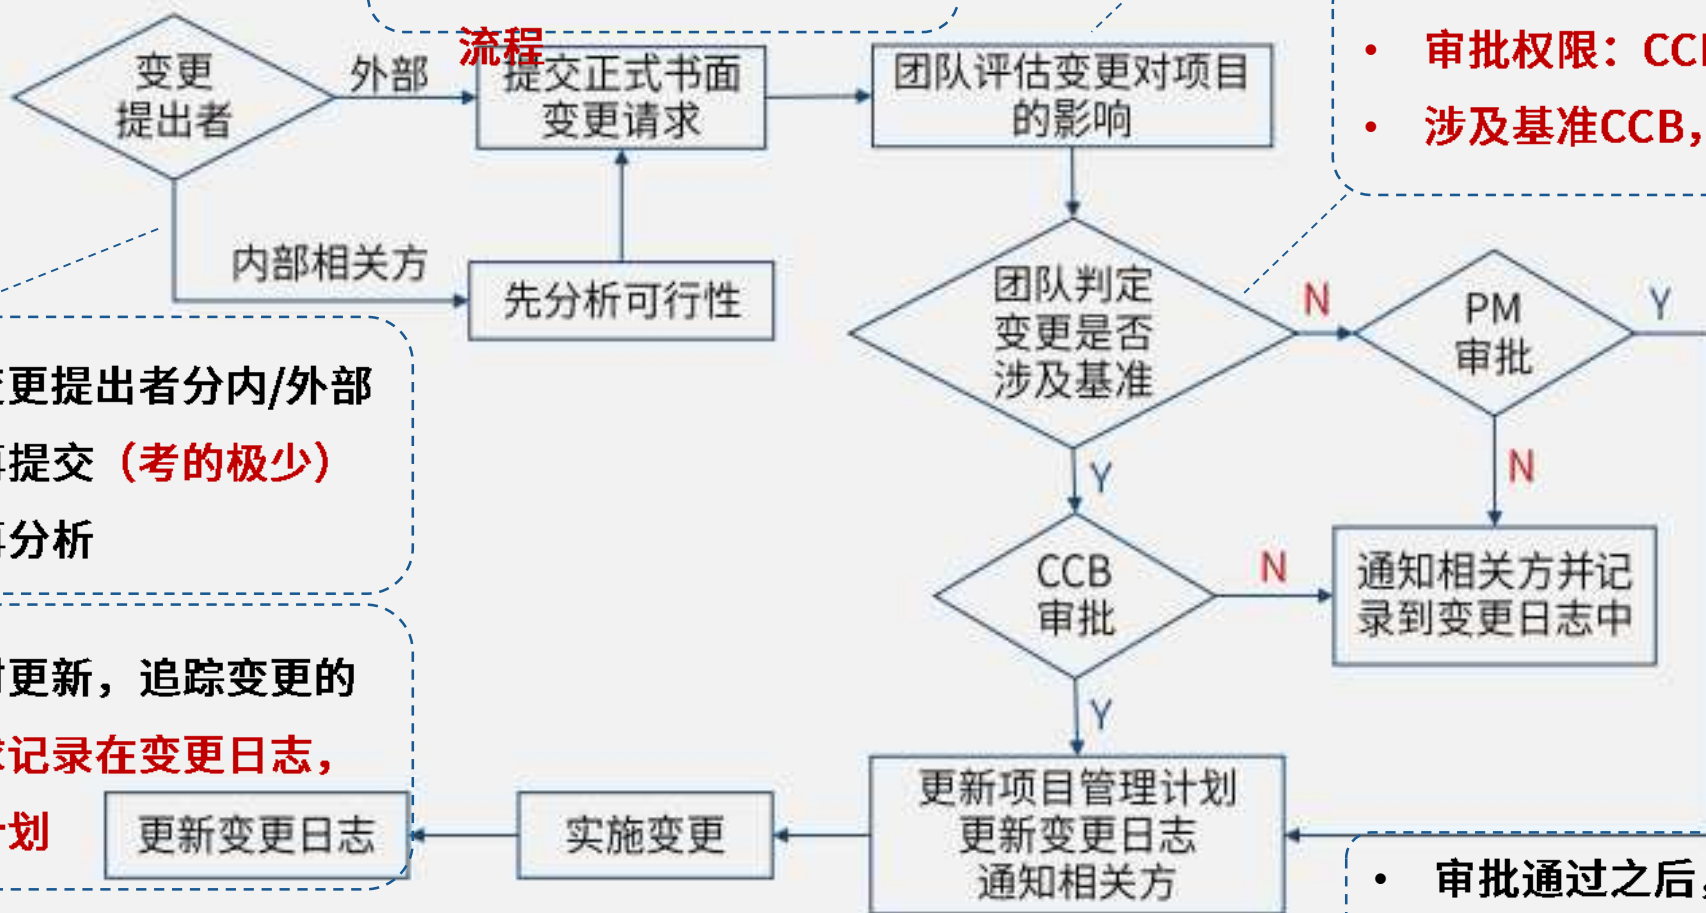

审批不通过，也要更新变更日志

- 审批通过之后，一般来说，是先更新文件再通知相关方



实施整体变更控制



项目经理发现，团队成员经常擅自添加项目相关方的需求，开展了许多额外的工作，这已经偏离了项目基准。项目经理担心长此以往，项目将会提前终止。项目经理应该怎么做？

- A.拒绝任何变更范围的请求
- B.与相关方沟通需求的内容
- C.上报至发起人，以获得帮助
- D.实施严格和正式的变更控制过程



实施整体变更控制



项目经理发现，团队成员经常擅自添加项目相关方的需求，开展了许多额外的工作，这已经偏离了项目基准。项目经理担心长此以往，项目将会提前终止。项目经理应该怎么做？

- A.拒绝任何变更范围的请求
- B.与相关方沟通需求的内容
- C.上报至发起人，以获得帮助
- D.实施严格和正式的变更控制过程



实施整体变更控制



团队成员在执行项目任务期间发现，公司的网络系统时常会出现信息识别速度很慢的情况。因此该团队成员建议能够使用更高等级的网络处理器以加快信息流动并推动项目进展。项目经理应该借助以下哪项文件来实施该项建议？

- A.进度管理计划
- B.相关方参与计划
- C.变更管理计划
- D.风险管理计划



实施整体变更控制



团队成员在执行项目任务期间发现，公司的网络系统时常会出现信息识别速度很慢的情况。因此该团队成员**建议能够使用更高等级的**网络处理器以加快信息流动并推动项目进展。项目经理应该**借助以下哪项文件来实施**该项建议？

- A.进度管理计划
- B.相关方参与计划
- C.变更管理计划**
- D.风险管理计划



实施整体变更控制



在项目的实行过程中，客户提出了新的需求，该项需求涉及到项目基准的变更，经过项目团队的讨论，认为该项需求是有必要实施的，如果确认实施该项需求，项目经理应该怎么做？

- A.提交变更请求，获得变更控制委员会的批准
- B.与客户协商实施该项需求的相应措施
- C.上报发起人寻求帮助
- D.与团队成员分析后实施相应的策略以满足新需求



实施整体变更控制



在项目的实行过程中，客户提出了新的需求，该项需求涉及到项目基准的变更，经过项目团队的讨论，认为该项需求是有必要实施的，如果确认实施该项需求，项目经理应该怎么做？

- A.提交变更请求，获得变更控制委员会的批准
- B.与客户协商实施该项需求的相应措施
- C.上报发起人寻求帮助
- D.与团队成员分析后实施相应的策略以满足新需求



实施整体变更控制



一IT公司的项目经理正在管理一个停车管理系统的研发，项目执行过程中，一名团队成员发现如果在该系统中增加配置功能，则会减少后期运营的很多工作量。项目经理应该怎么做？

- A.提交变更请求
- B.评估该变更的可行性，确定对项目的影响
- C.与运营负责人讨论，是否确定增加该配置功能
- D.把该功能纳入项目管理计划中



实施整体变更控制



一IT公司的项目经理正在管理一个停车管理系统的研发，项目执行过程中，一名团队成员发现如果在该系统中增加配置功能，则会减少后期运营的很多工作量。项目经理应该怎么做？

A.提交变更请求

B.评估该变更的可行性，确定对项目的影响

C.与运营负责人讨论，是否确定增加该配置功能

D.把该功能纳入项目管理计划中



实施整体变更控制



项目相关方提出了一项变更请求。分析了该变更请求的影响后，CCB认为该变更会增加巨大的额外成本，对该变更请求不予通过。项目经理首先应该更新什么？

- A.成本基准
- B.经验教训登记册
- C.变更管理计划
- D.变更日志



实施整体变更控制




项目相关方提出了一项变更请求。分析了该变更请求的影响后，CCB认为该变更会增加巨大的额外成本，对该变更请求不予通过。项目经理首先应该更新什么？

- A.成本基准
- B.经验教训登记册
- C.变更管理计划
- D.变更日志



结束项目或阶段

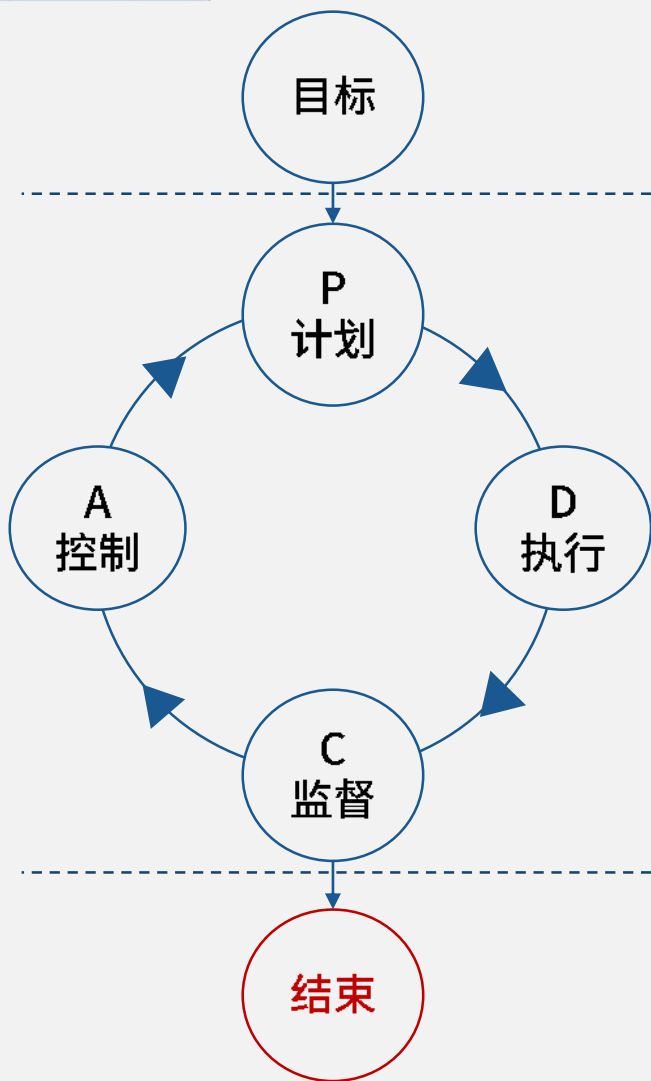

结束项目或阶段是终结**项目、阶段或合同**的所有活动的过程。本过程的主要作用是：

- ①存档项目或阶段信息；
- ②完成计划的工作；
- ③释放组织团队资源以展开新的工作。

它仅开展一次或仅在项目的预定义点开展。



结束项目或阶段

注：ITTO的展示只为梳理逻辑，看下就行，不用去背

输入	工具与技术	输出
1. 项目章程 2. 项目管理计划 3. 项目文件 4. 验收的可交付成果 5. 商业文件 6. 协议 7. 采购文档 8. 组织过程资产	1. 略	1. 项目文件更新 (经验教训登记册) 2. 最终产品、服务或成果移交 3. 最终报告 4. 组织过程资产更新

● 结束项目或阶段——终结项目、阶段或合同的所有活动的过程。

► 拓展补充



结束项目或阶段



行政收尾

为**达到阶段或项目的完工**或退出标准所必须的行动和活动，例如：

- 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且所有问题都已得到解决；
- 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的正式验收；
- 确保所有成本都已记入项目成本账；
- 关闭项目账户；
- 重新分配人员；
- 处理多余的项目材料；
- 重新分配项目设施、设备和其他资源；
- 根据组织政策编制详尽的最终项目报告。



结束项目或阶段



结束工作	组织过程资产更新
最终产品、服务或成果验收	项目或阶段收尾文件
移交给运营或下一阶段	运营和支持文件
项目文件形成最终版 (总结经验教训)	项目文件 (含 经验教训登记册)
关闭合同协议 (供应商)	
最终报告	最终报告文档
提前终止	正式收尾文件中说明终止原因
释放资源	



结束项目或阶段



项目经理承接了一个道路施工项目，由于施工期间需要封闭施工，于是项目分几期进行，每一期完成2公里的修建工作，第一期所有范围已经按时完成，并且成本符合，并且已经获得客户的验收，项目经理接下来应该做什么？

- A.执行质量审计
- B.请求项目组合经理批准
- C.开始规划项目的下一期工程
- D.执行本期工程的行政收尾



结束项目或阶段



项目经理承接了一个道路施工项目，由于施工期间需要封闭施工，于是项目分几期进行，每一期完成2公里的修建工作，第一期所有范围已经按时完成，并且成本符合，并且**已经获得客户的验收**，项目经理接下来应该做什么？

- A. 执行质量审计
- B. 请求项目组合经理批准
- C. 开始规划项目的下一期工程
- D. 执行本期工程的行政收尾**



结束项目或阶段



通过最终产品、服务或成果验收

- 确保所有文件和可交付成果都已是最新版本，且**所有问题都已得到解决**；
- 确认可交付成果已交付给客户并已获得客户的**正式验收**；
- 测量相关方的**满意程度**。
- 验收的可交付成果可包括批准的**产品规范、交货收据和工作绩效文件**。对于分阶段实施的项目或提前取消的项目，还可能包括部分完成或中间的可交付成果。



结束项目或阶段



产品移交

项目交付的产品、服务或成果可**转交**给另一团队或组织，并由其在整个生命周期中进行**运营、维护和支持**。

本工件所指的正是把项目交付的最终产品、服务或成果（对于阶段收尾，则是所在阶段的中间产品、服务或成果）从一个团队转交到另一个团队。



结束项目或阶段



关闭合同协议（供应商）

为关闭项目合同协议或项目阶段合同协议所必须开展的活动，例如：

- 确认**卖方**的工作已通过**正式验收**；
- 最终处置未决**索赔**；
- 更新记录以反映最后的结果；
- 存档相关信息供未来使用。



结束项目或阶段



项目文件（最终版）

可在本过程更新**所有项目文件**，并标记为**最终版本**。

特别值得注意的是，**经验教训登记册**的最终版本要包含阶段或项目收尾的最终信息。

最终版本的经验教训登记册可包含关于以下事项的信息：

- 效益管理
- 商业论证的准确性
- 项目和开发生命周期
- 风险和问题管理
- 相关方参与
- 以及其他项目管理过程



结束项目或阶段



编写最终报告

用**最终报告**总结项目**绩效**，其中可包含诸如以下信息：

- 项目或阶段的**概述**；
- **范围、质量、成本、进度**结果；
- 关于项目过程中发生的**风险或问题**及其解决情况的概述；
- 最终产品、服务或成果的**确认信息**的总结；
- 关于最终产品、服务或成果如何满足商业计划所述**业务需求**的概述。



结束项目或阶段



提前终止

如果项目在完工前就提前终止，结束项目或阶段过程还需要制定程序，来调查和记录提前终止的原因。并把该项目的已完成和未完成的可交付成果移交他人。



结束项目或阶段



释放资源

一切结束后，关闭项目账户，
重新分配人员；重新分配项目设施、设备和其他资源。



结束项目或阶段



作为项目经理，你为一家食品公司研发了一个流水线生产的机器，该项目已经完成，并通过了所有的验收。然而验收完成一个月后，客户表示有一部分预期功能没有实现，通过调查，你发现是运维人员不会操作机器导致的。请问你接下来应该怎么办？

- A. 重新召集项目团队，评估客户诉求的根本原因并纠正产品的功能
- B. 重新审查项目的收尾文件，确保项目按照合同要求完成了知识转移工作，并得到客户的确认
- C. 将客户的问题形成报告，与高级管理层反映以获得他们的支持
- D. 回顾项目的风险管理计划，看有没有应对措施



结束项目或阶段



作为项目经理，你为一家食品公司研发了一个流水线生产的机器，该项目已经完成，并通过了所有的验收。然而验收完成一个月后，客户表示有一部分预期功能没有实现，通过调查，你发现是运维人员**不会操作机器导致的**。请问你接下来应该怎么办？

- A. 重新召集项目团队，评估客户诉求的根本原因并纠正产品的功能
- B. 重新审查项目的收尾文件，确保项目按照合同要求完成了知识转移工作，并得到客户的确认**
- C. 将客户的问题形成报告，与高级管理层反映以获得他们的支持
- D. 回顾项目的风险管理计划，看有没有应对措施



结束项目或阶段



在正式结束项目之前，项目经理审查了所有相关项目文件。并根据合同向第三方供应商支付现金。供应商未能接受付款，而是请求更多资金。项目经理下一步应该做什么？

- A.将风险添加到风险登记册中并联系供应商
- B.遵循变更控制程序来变更供应商
- C.将供应商的请求升级上报给项目发起人
- D.让采购团队参与解决供应商请求



结束项目或阶段



在正式结束项目之前，项目经理审查了所有相关项目文件。并根据合同向第三方供应商支付现金。供应商未能接受付款，而是请求更多资金。项目经理下一步应该做什么？

- A.将风险添加到风险登记册中并联系供应商
- B.遵循变更控制程序来变更供应商
- C.将供应商的请求升级上报给项目发起人
- D.让采购团队参与解决供应商请求



结束项目或阶段



在工艺研发项目的中后期，项目工作的范围、质量、进度、成本都符合计划，一个月后，项目可以进行验收。此时，发起人识别到与法律法规相关的制约因素，考虑到相关风险过高，希赛的高级管理层商议后决定取消该项目。项目经理下一步应该做什么？

- A. 停止项目工作，接手新项目
- B. 继续执行，因为项目所剩工作不多
- C. 释放资源以用于其他项目
- D. 记录取消的原因，开始收尾工作



结束项目或阶段



在工艺研发项目的中后期，项目工作的范围、质量、进度、成本都符合计划，一个月后，项目可以进行验收。此时，发起人识别到与法律法规相关的制约因素，考虑到相关风险过高，希赛的高级管理层商议后**决定取消该项目**。项目经理**下一步**应该做什么？


- A. 停止项目工作，接手新项目
- B. 继续执行，因为项目所剩工作不多
- C. 释放资源以用于其他项目
- D. 记录取消的原因，开始收尾工作**



本章小结



项目整合管理

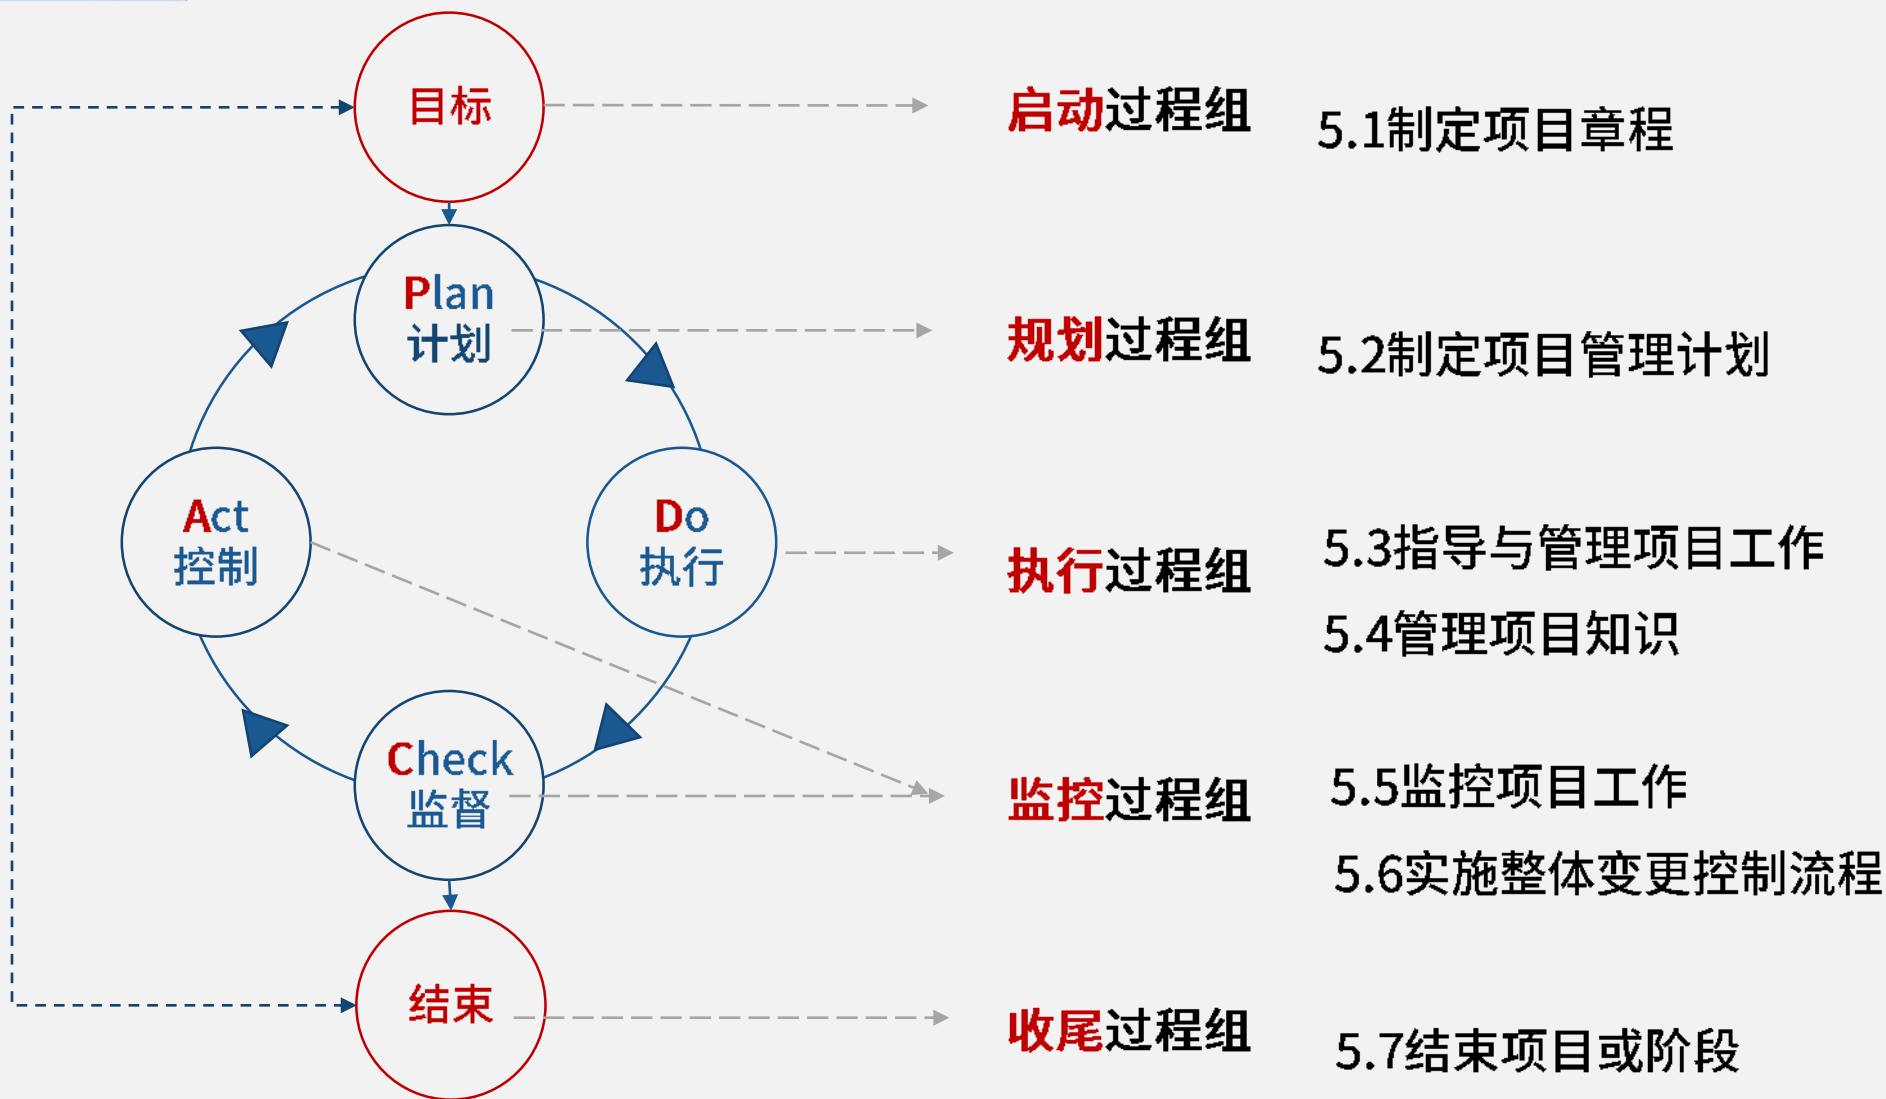



项目整合管理

制定项目章程

项目章程

- 内容 初期、初始、早期、原始、启动阶段；高层级、主要、总体、管理层
- 作用 正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源
- 编制与审批
 - 可由发起人编制，或者由项目经理参与编制
 - 一般是发起人审批
- 修改 遵循“谁签发谁修改”的原则

假设日志

假设条件和制约因素

制定项目管理计划

项目管理计划

- 内容 十大领域的管理计划+三大基准+其他组件
- 作用 规划阶段的产出物，执行阶段的先决条件及说明文件
- 编制与审批
 - 由项目经理和项目团队共同编制
 - 由关键相关方一致审批，确定基准
- 修改 基准确定后，只能通过实施整体变更控制修改

开工会议

传达项目目标、获得团队对项目的承诺，以及阐明每个相关方的角色和职责

指导与管理项目工作

内涵

为实现项目目标执行项目管理计划中所确定的工作，并实施已批准变更；首次输出可交付成果

问题日志及更新

- 发现问题，记录在问题日志，实时更新
- 问题的处理流程：记录-分析/评估-制定解决方案-实施

管理项目知识

管理项目知识

显性知识vs隐性知识

知识和信息管理工具

确保项目文件等经验教训在储存库（或PMIS）中，并确保是最新的，防止人员流动，知识流失

经验教训登记册及更新

- 作用 避免其他项目，再次发生，类似问题
- 环境要求 开放信任的环境



监控项目工作

工作绩效报告

工作绩效数据VS工作绩效信息VS工作绩效报告



实施整体变更控制

变更的工件

变更管理计划VS变更日志

批准变更的权限
(变更流程图)

不涉及基准的变更

项目经理

涉及基准的变更

CCB

已执行的变更未走流程，需要补变更流程

项目整合管理

结束项目或阶段

变更的截止时间点

一般验收完成，就不再进行变更；除非是本该做的没做，或者是产品质量问题

提前终止


需要调查提前终止的原因，也需要进行收尾

收尾事件主要顺序

1、移交成果 2、财务收尾 3、满意度调查 4、更新经验教训登记册 5、文件更新（组织过程资产更新） 6、最终报告 7、文件归档 8、庆功会 9、解散团队

方法

专家判断、头脑风暴、访谈、焦点小组、冲突管理、引导、会议管理、会议、核对单、备选方案分析、成本效益分析、挣值分析、根本原因分析、偏差分析、趋势分析



(=) 希赛 | 感谢您的观看
