

PMP项目管理

《第12章 过程 敏捷工件和会议》

常考点：

工件：产品待办事项列表和迭代待办事项列表的管理

事件：迭代规划会议、每日站会、迭代评审会议。迭代回顾会议的作用


支柱：公开透明



Scrum敏捷实践



敏捷教练

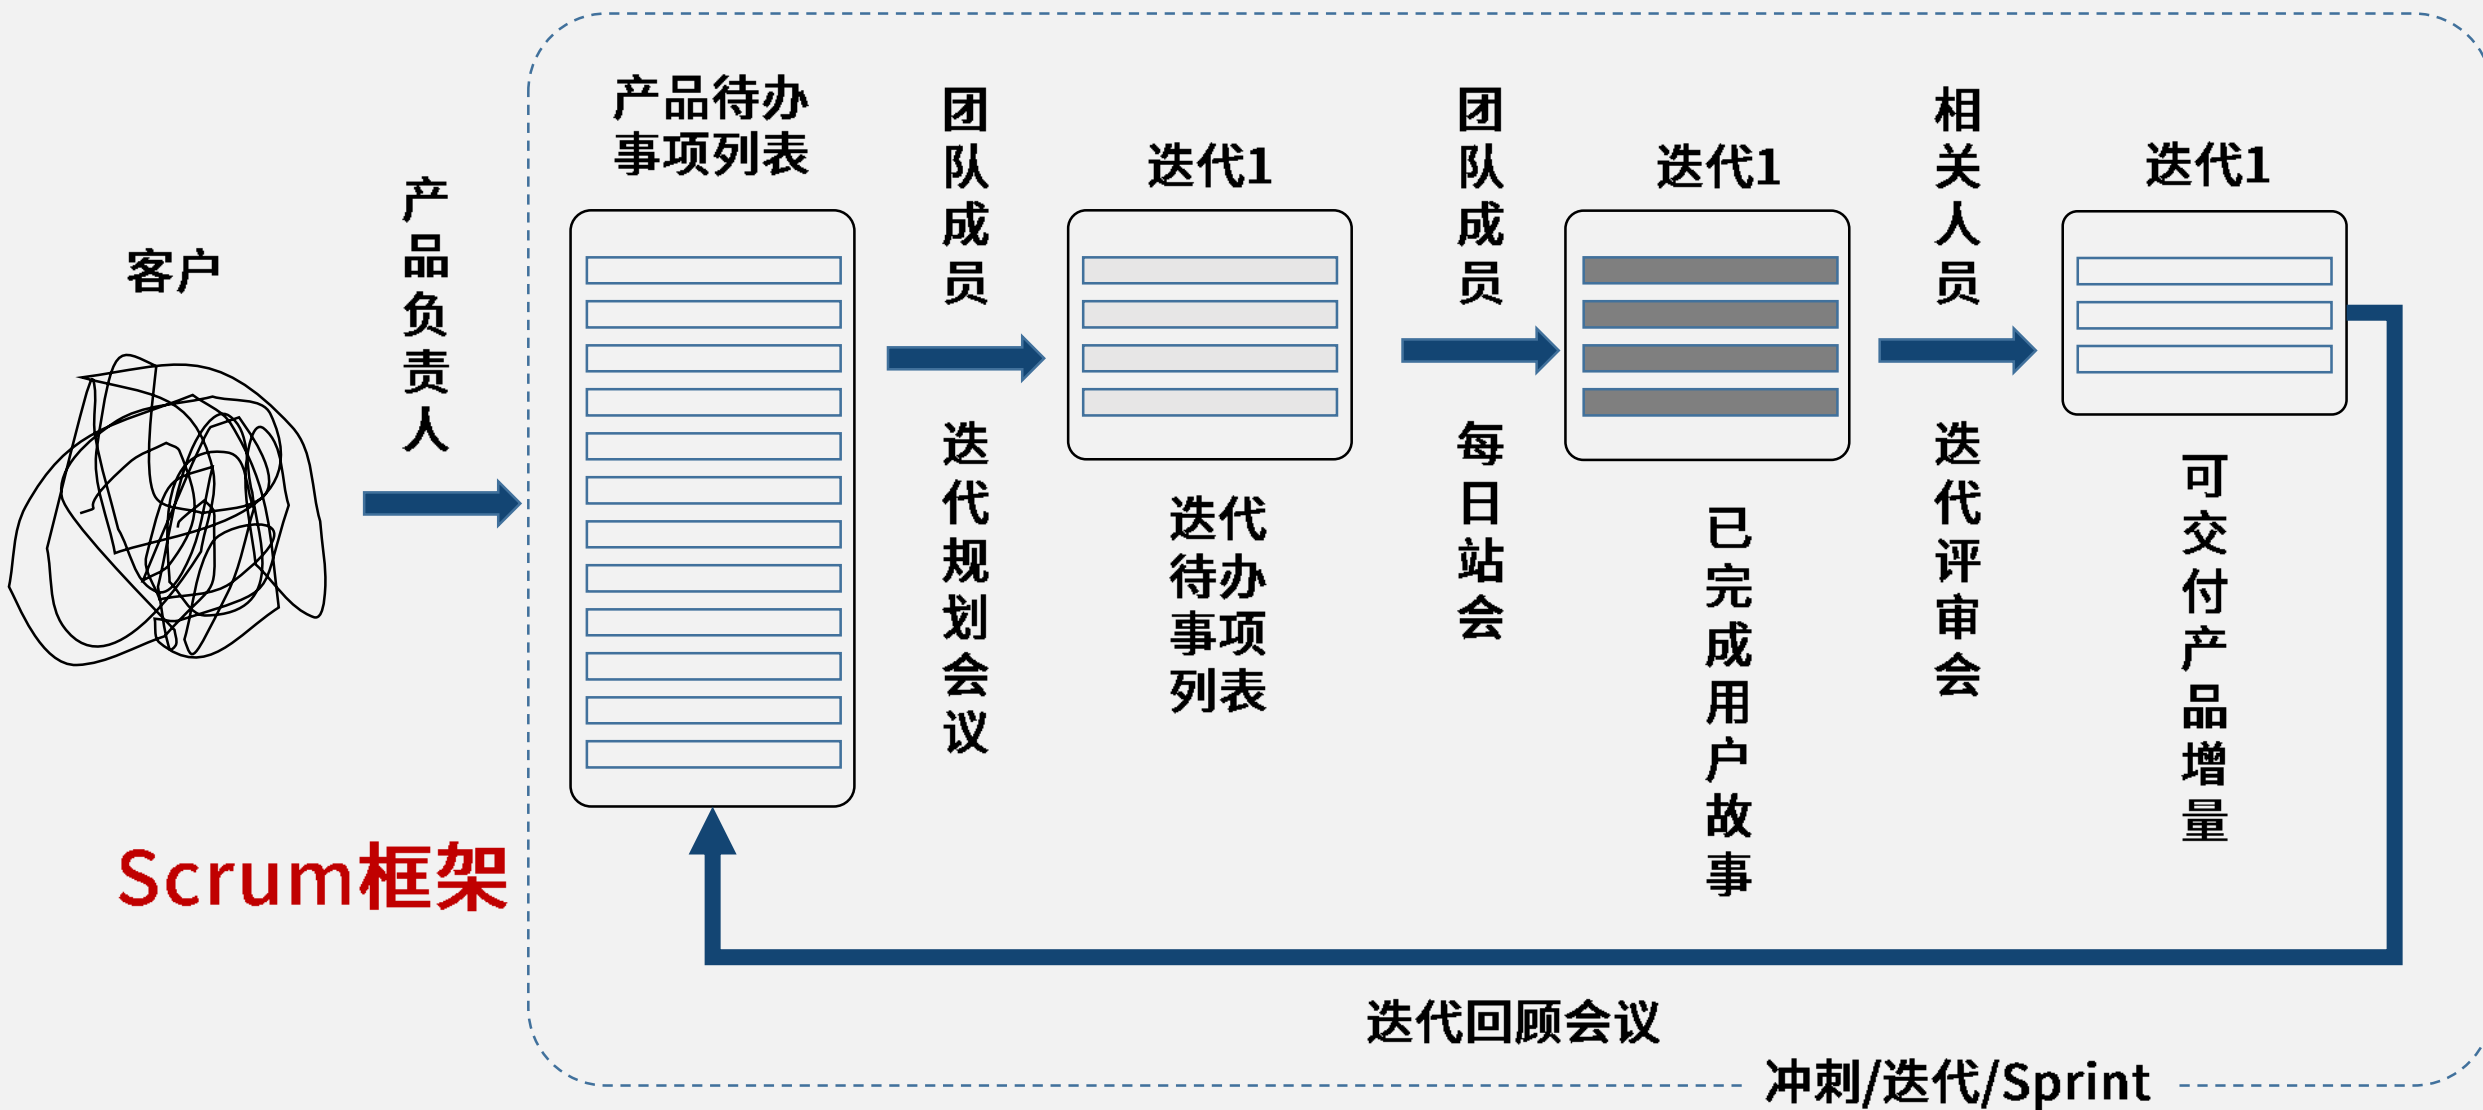



Scrum敏捷实践



Scrum框架中的33355

三个支柱	三个角色	三个工件
透明性 (Transparency)	产品负责人 (Product Owner)	产品待办事项列表 (Product Backlog)
检查 (Inspection)	敏捷教练 (Scrum Master)	迭代待办事项列表 (Sprint Backlog)
适应 (Adaptation)	项目团队 (Scrum Team)	可交付产品增量 (Increment)



Scrum敏捷实践



Scrum框架中的33355


五个事件		五大价值观	
冲刺/迭代 (Sprint)		承诺 (Commitment) – 愿意对目标做出承诺	
迭代规划会议 (Sprint Planning)		专注 (Focus) – 全身心都用到你承诺的工作上去	
每日站会 (Daily Scrum)		开放 (Openness) – 团队内所有信息对所有人开放	
迭代评审会议 (Sprint Review)		尊重 (Respect) – 每个人都有他独特的价值和经验	
迭代回顾会议 (Sprint Retrospective)		勇气 (Courage) – 勇于承诺，履行承诺，敢于说不	



Scrum敏捷实践



敏捷教练

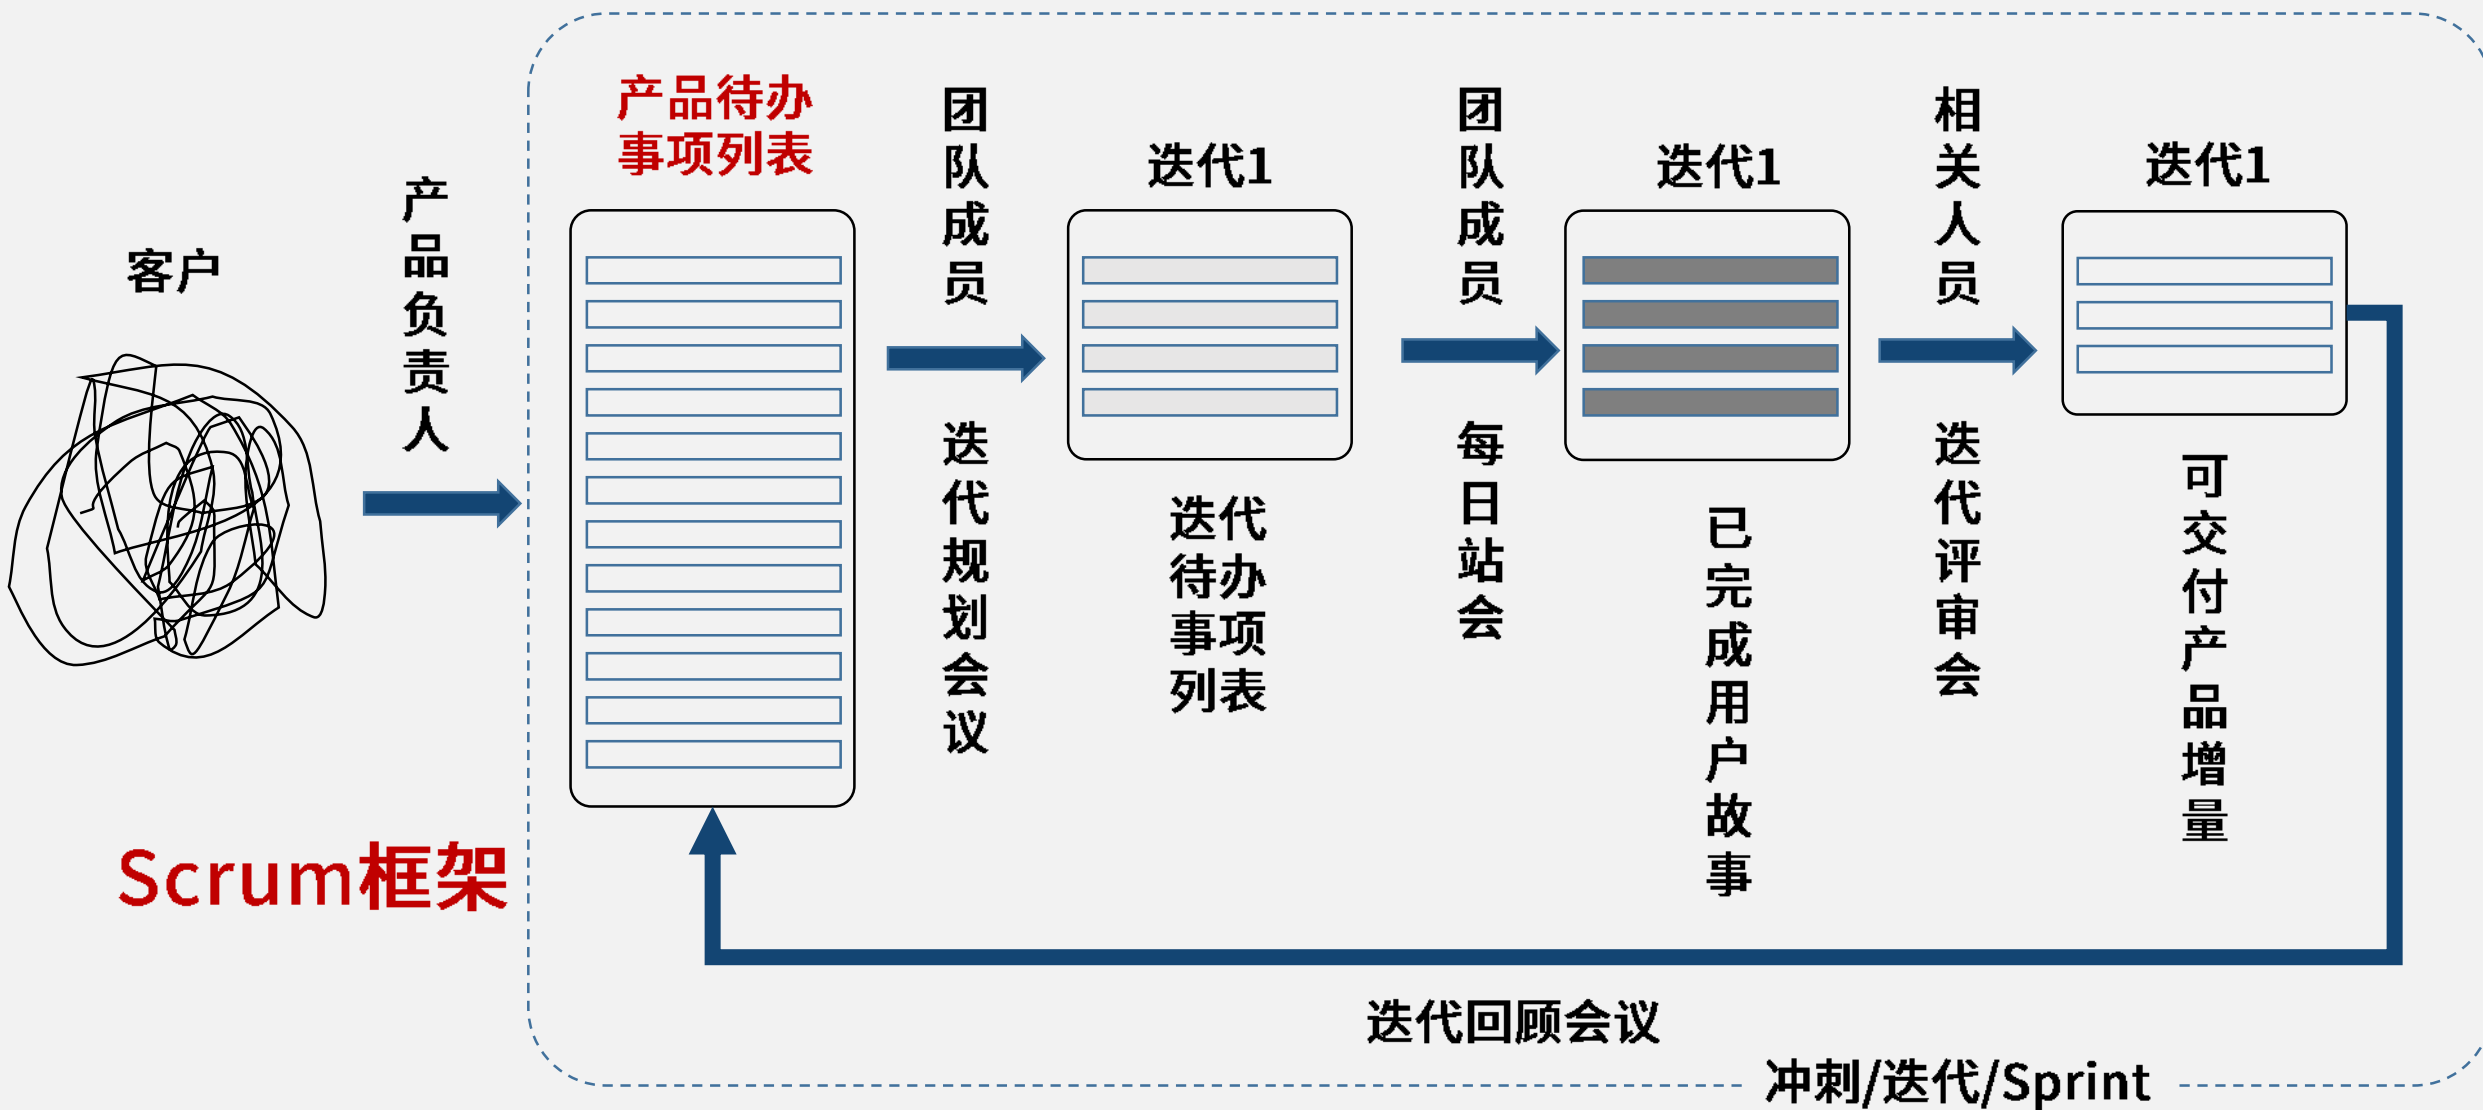




Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

产品待办事项列表是所有工作的有序列表，它以故事形式呈现给团队，价值越大的排在上面。

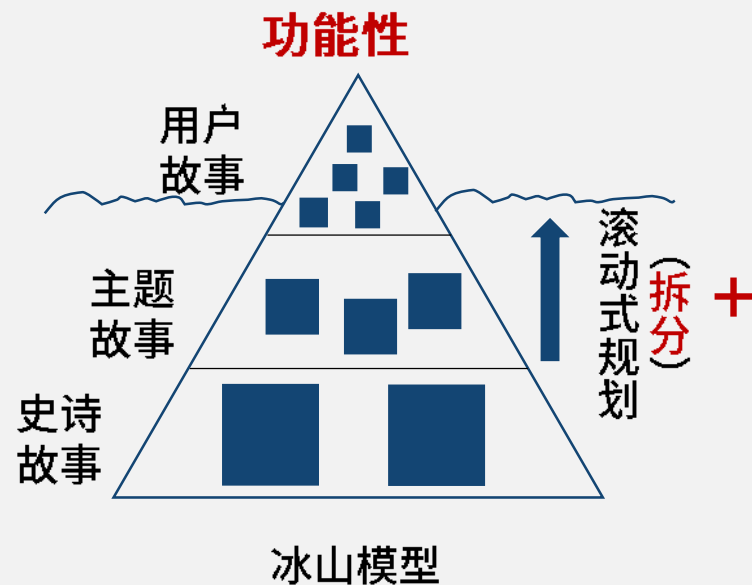

非功能性

培训需求
根本原因
纠正措施
风险应对
运维工作
技术债务
系统重构




产品待办事项列表
Product Backlog



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

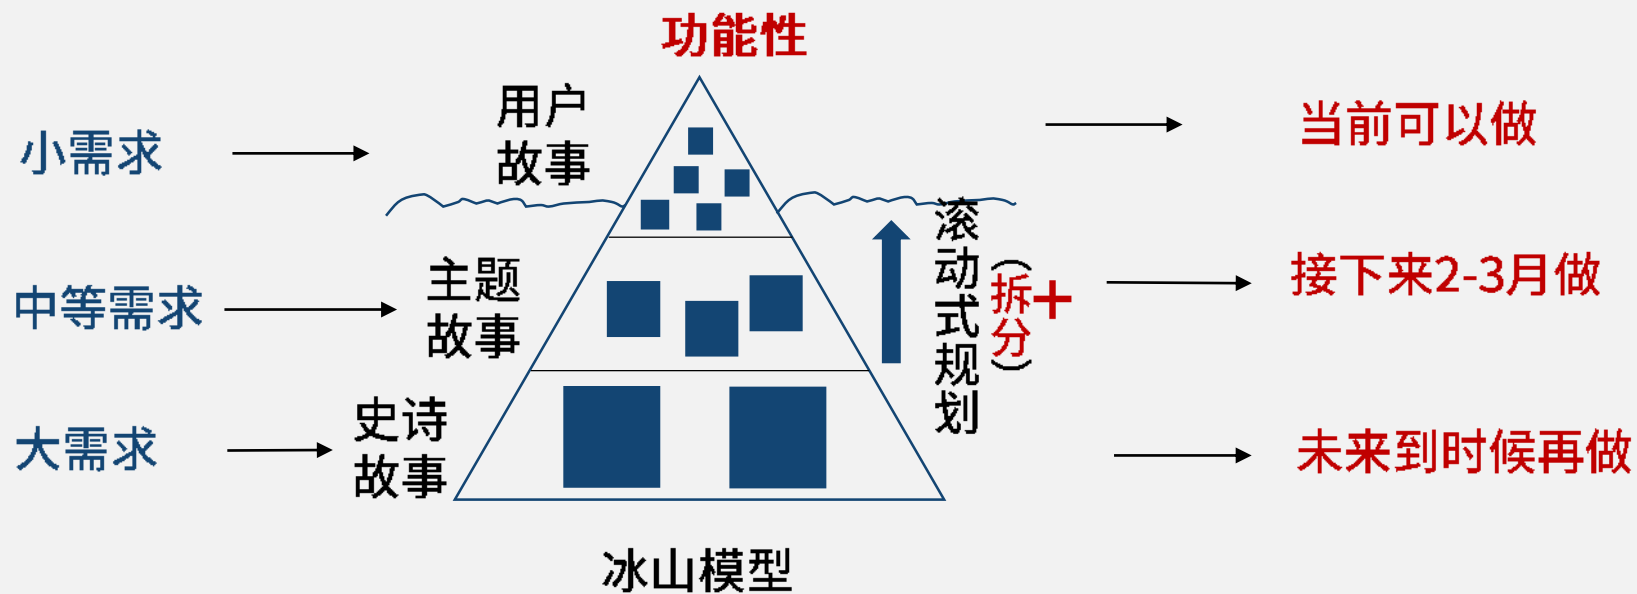



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

非功能性

培训需求

根本原因

纠正措施

风险应对

运维工作

技术债务

系统重构

技术债务：指在软件开发过程中出现的技术上的妥协或折中，这些妥协或折中可能会导致软件在未来的某个时间点需要进行额外的工作或成本以修复或更改。

系统重构：对现有软件系统进行结构上的调整和改善，从而提高其可维护性、可扩展性、可重用性、可理解性、性能等方面的质量。




Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

变化



细化待办

上期遗留

新增事项

优先插队

删除事项

办成增量

DEEP模型

- 详略适宜的 (Detailed Appropriately)
- 可估计的 (Estimable)
- 涌现式的 (Emergent)
- 排好优先级的 (Prioritized)

产品待办事项列表
Product Backlog



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

【要点1】产品待办事项列表的本质是所有工作的**有序列表**，以**价值为导向**

【要点2】产品待办事项列表的细化梳理是**渐进明细**的

【要点3】其排序考虑**价值+风险**，还可能考虑**成本、依赖、政治等**

【要点4】其包含功能性内容和**非功能性内容**，运维工作、技术债务、风险应对等作为非功能性用户故事列入待办事项



Scrum敏捷实践



敏捷项目的项目经理被要求将预算减少30%。由于这是一个小型项目团队，因此预算主要分配给资源，项目经理应该使用什么策略才能在受限环境中保持交付价值？

- A.平衡项目团队以适应预算挑战，并提供培训以降低绩效低下的风险
- B.优先考虑产品待办事项，以寻找高业务价值和低工作量，并调整项目预算和人员配置以完成项目
- C.将项目范围仅限于基本的关键功能，并以当前人员配置水平运行项目，直到用完所有预算
- D.减少项目人员，并相应调整范围和时间表以支持预算削减



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

【要点】产品待办事项列表的本质是所有工作的有序列表，以价值为导向

敏捷项目的项目经理被要求将预算减少30%。由于这是一个小型项目团队，因此预算主要分配给资源，项目经理应该使用什么策略才能**在受限环境中保持交付价值？**

- A.平衡项目团队以适应预算挑战，并提供培训以降低绩效低下的风险
- B.优先考虑产品待办事项，以寻找高业务价值和低工作量，并调整项目预算和人员配置以完成项目**
- C.将项目范围仅限于基本的关键功能，并以当前人员配置水平运行项目，直到用完所有预算
- D.减少项目人员，并相应调整范围和时间表以支持预算削减



Scrum敏捷实践



公司正在进行敏捷开发，新来的公司领导对敏捷并不了解，他询问敏捷项目管理专业人士关于待办列表中的事项，敏捷项目管理专业人士该如何答复他？

- A.应该对事项进行精细化分解，并准确估算
- B.应该对事项进行精细化分解，并在冲刺计划中估算
- C.应该对事项进行逐步精细化，并在迭代计划中进行估算
- D.应该对事项进行精细化分解，并在列入迭代待办列表之前估算



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

【要点】 产品待办事项列表的细化梳理是渐进明细的。

公司正在进行敏捷开发，新来的公司领导对敏捷并不了解，他询问敏捷项目管理专业人士**关于待办列表中的事项**，敏捷项目管理专业人士该如何答复他？

- A.应该对事项进行精细化分解，并准确估算
- B.应该对事项进行精细化分解，并在冲刺计划中估算
- C.应该对事项进行逐步精细化，并在迭代计划中进行估算**
- D.应该对事项进行精细化分解，并在列入迭代待办列表之前估算



Scrum敏捷实践



产品负责人正在对产品待办事项列表中的用户故事进行优先级排序，
在排序时重点考虑的因素是？

- A. 难度，价值和成本
- B. 价值，风险和难度
- C. 价值，成本和风险
- D. 价值，风险和便利



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

【要点】 产品待办事项列表的排序考虑价值+风险，还可能考虑成本、依赖、政治等。

产品负责人正在对产品待办事项列表中的用户故事进行**优先级排序**，在排序时**重点考虑**的因素是？

- A. 难度，价值和成本
- B. 价值，风险和难度
- C. 价值，成本和风险**
- D. 价值，风险和便利



Scrum敏捷实践



一个团队完成了第一版本的发布，高层又要开发团队完成第二版的发布，但是这个团队同时又要做第一个版本的运维和支持工作，作为敏捷管理人士，应该怎么办？

- A.团队应该开发新的版本，因为新的版本有高的价值
- B.满足投资回报率
- C.计算团队速度时应该考虑维护工作的影响
- D.团队把维护工作交给其他团队



Scrum敏捷实践



产品待办事项列表Product Backlog

【要点】 包含功能性内容和非功能性内容，运维工作、技术债务、风险应对等作为非功能性用户故事列入待办事项。

一个团队完成了第一版本的发布，高层又要开发团队完成第二版的发布，但是这个团队同时又要做第一个版本的**运维和支持工作**，作为敏捷管理人士，应该怎么办？


- A.团队应该开发新的版本，因为新的版本有高的价值
- B.满足投资回报率
- C.计算团队速度时应该考虑维护工作的影响**
- D.团队把维护工作交给其他团队



Scrum敏捷实践



敏捷教练

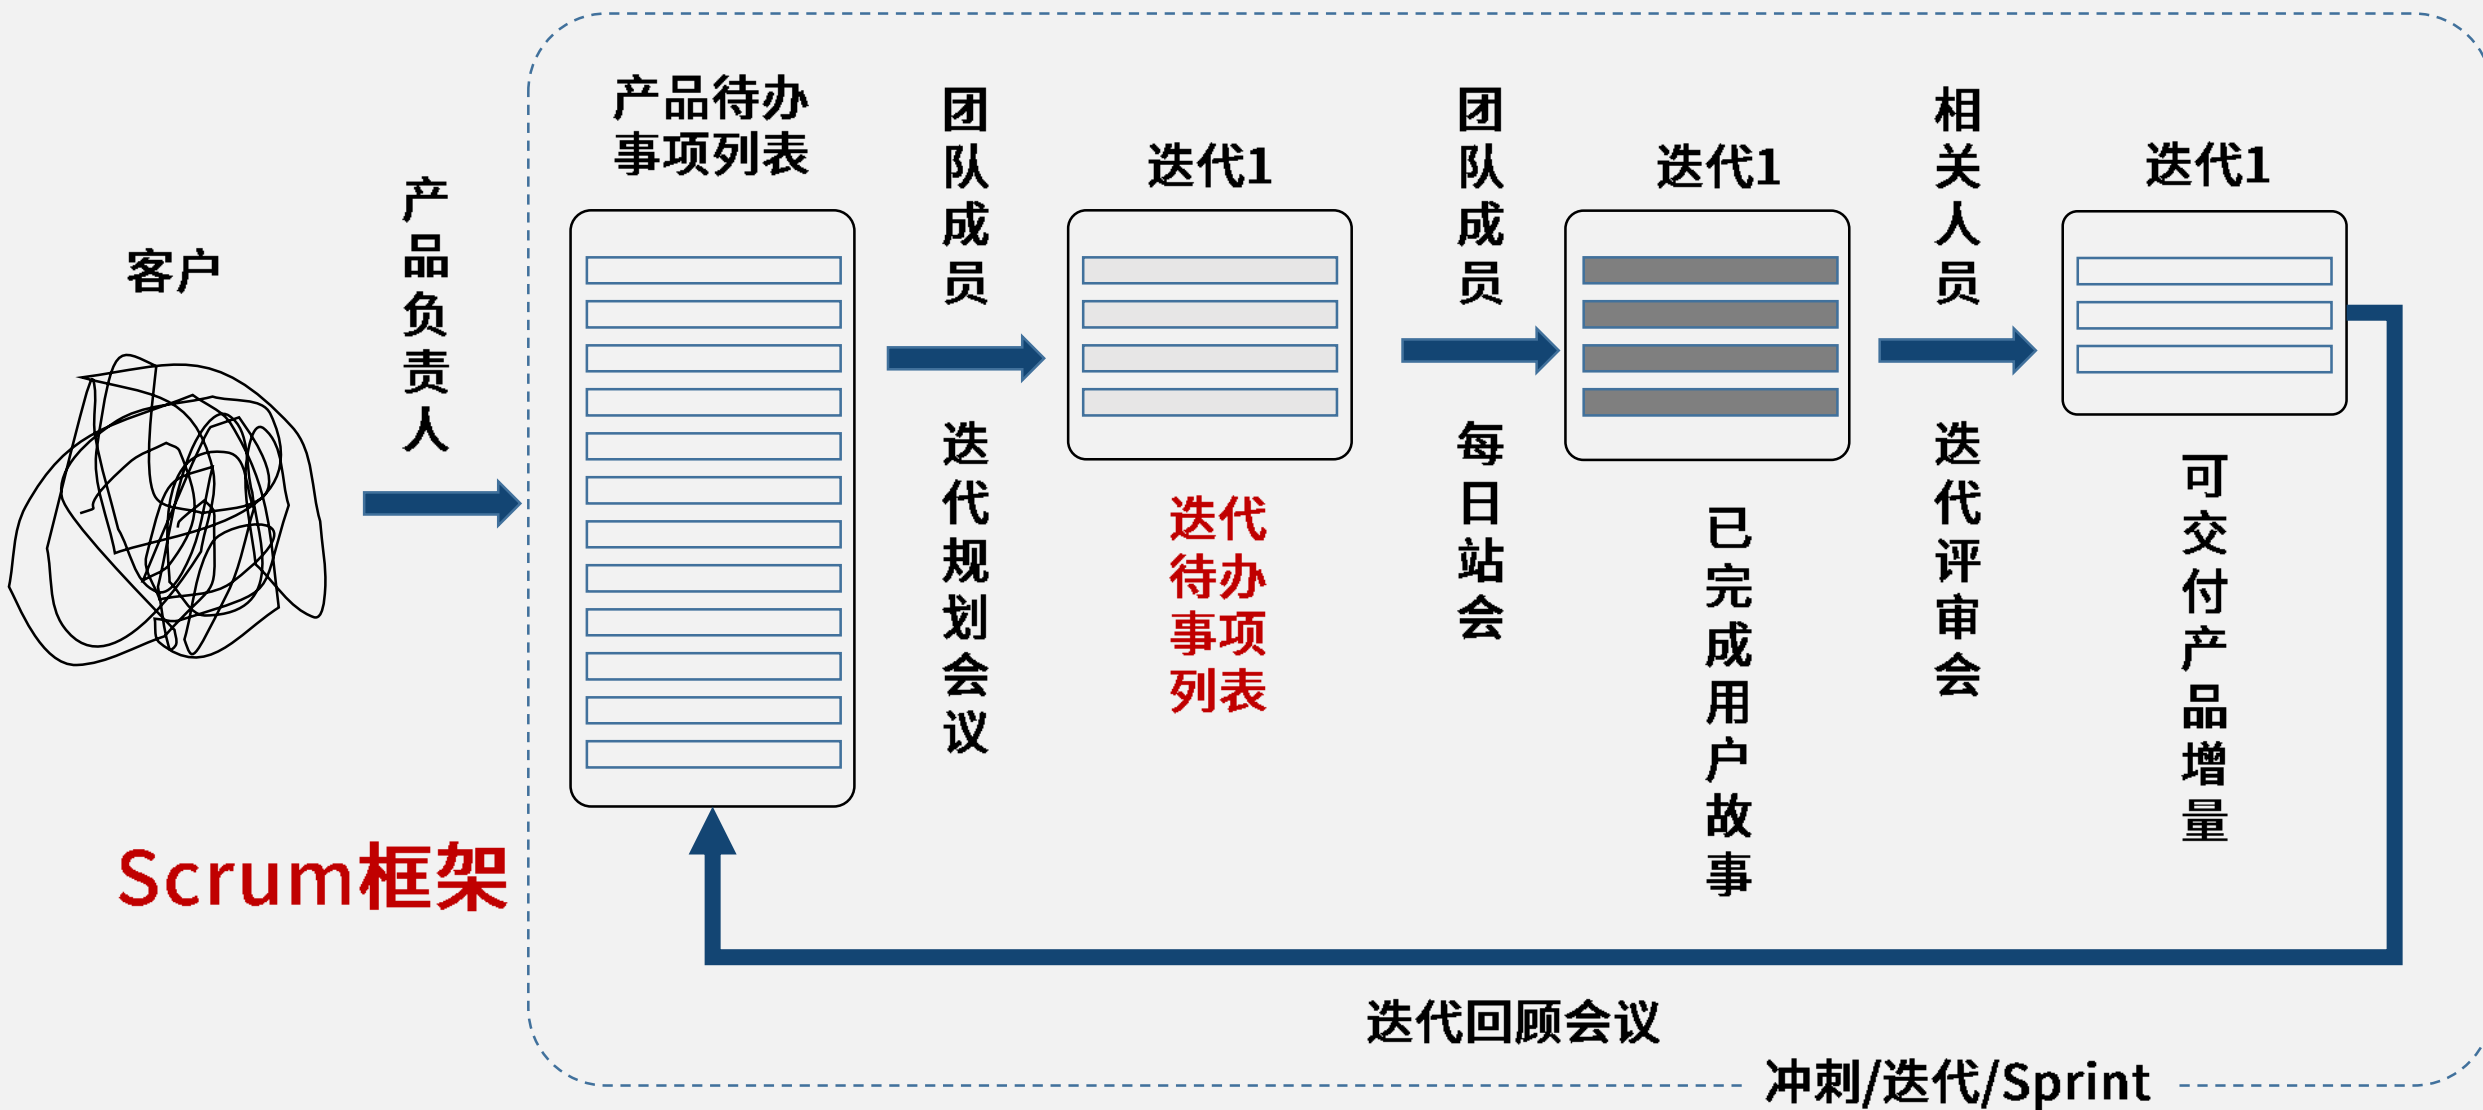



Scrum敏捷实践



迭代待办事项列表Sprint Backlog

- 定义**迭代的目标**，**明确迭代过程中具体**需要完成的**任务**，由团队负责
- **任务**不是分配下去的，而是团队讨论与个人挑选的结果（**自我管理**）
- 尽量放在方便团队看到的地方
- **迭代规划会议产出迭代待办事项列表**
- 在**迭代开始后**，迭代待办事项列表一般不改变，除非“用户故事已无价值”或涉及“项目生死存亡”
- 如果团队同意，对于一些事项，可以先做粗略估算，在迭代进行当中再分解成任务



Scrum敏捷实践



迭代待办事项列表Sprint Backlog

【要点1】 定义本轮迭代的目标、需要完成的工作项，由团队自行讨论认领

【要点2】 迭代待办事项列表在迭代规划会议上创建

【要点3】 迭代过程中迭代待办事项列表一般不会随意改变，我们首先要确保迭代任务的顺利完成

【要点4】 如果用户故事已无价值，或者当前情况紧急（不处理会危急整个迭代），可以对迭代待办事项列表进行调整



Scrum敏捷实践



一个Scrum团队的产品负责人发现利益相关者优先级有变化，他们还没有开始开发的一个可交付产品现在比目前他们正在完成的一个工作项更重要。团队处理这种情况的最佳方法是什么？

- A.完成当前sprint，并在下一个sprint计划会议上调整计划
- B.通过限制在制品减少瓶颈
- C.立即取消当前sprint，并创建一个新计划来反映这个新的优先级
- D.开始重构代码以反映更新后的优先级



Scrum敏捷实践



迭代待办事项列表

【要点】 迭代过程中迭代待办事项列表一般不会随意改变，我们首先要确保迭代任务的顺利完成

一个Scrum团队的产品负责人发现利益相关者优先级有变化，他们还没有开始开发的一个可交付产品现在比目前他们正在完成的一个工作项更重要。团队处理这种情况的最佳方法是什么？

- A.完成当前sprint，并在下一个sprint计划会议上调整计划
- B.通过限制在制品减少瓶颈
- C.立即取消当前sprint，并创建一个新计划来反映这个新的优先级
- D.开始重构代码以反映更新后的优先级



Scrum敏捷实践



Sprint进行到一半时，产品负责人收到DevOps（开发运维）团队的一个email，这个DevOps团队负责部署这个团队构建的软件，他们提醒说有一个新政策要求安装脚本做一个修改（所有部署中都必须包含这些安装脚本）。部署是召开sprint评审会议的必要条件。修改这个脚本会让其他工作延迟到这个sprint结束之后。产品负责人接下来应该做什么？

- A.与团队沟通在sprint待办列表中增加这个脚本修改工作，并把最低优先级的工作项移回到产品待办列表
- B.将脚本修改工作增加到产品待办列表
- C.延长sprint最后期限，以涵盖这个脚本修改工作
- D.安排与DevOps团队经理的一个面对面会谈



Scrum敏捷实践



迭代待办事项列表

【要点】 如果用户故事已无价值，或者当前情况紧急（不处理会危急整个迭代），可以对迭代待办事项列表进行调整

Sprint进行到一半时，产品负责人收到DevOps（开发运维）团队的一个email，这个DevOps团队负责部署这个团队构建的软件，他们提醒说有一个**新政策要求安装**脚本做一个修改（所有部署中都必须包含这些安装脚本）。**部署是召开sprint评审会议的必要条件**。修改这个脚本会让其他工作延退到这个sprint结束之后。产品负责人接下来应该做什么？

A.与团队沟通在sprint待办列表中增加这个脚本修改工作，并把最低优先级的工作项移回到产品待办列表

B.将脚本修改工作增加到产品待办列表

C.延长sprint最后期限，以涵盖这个脚本修改工作


D.安排与DevOps团队经理的一个面对面会谈



Scrum敏捷实践



敏捷教练

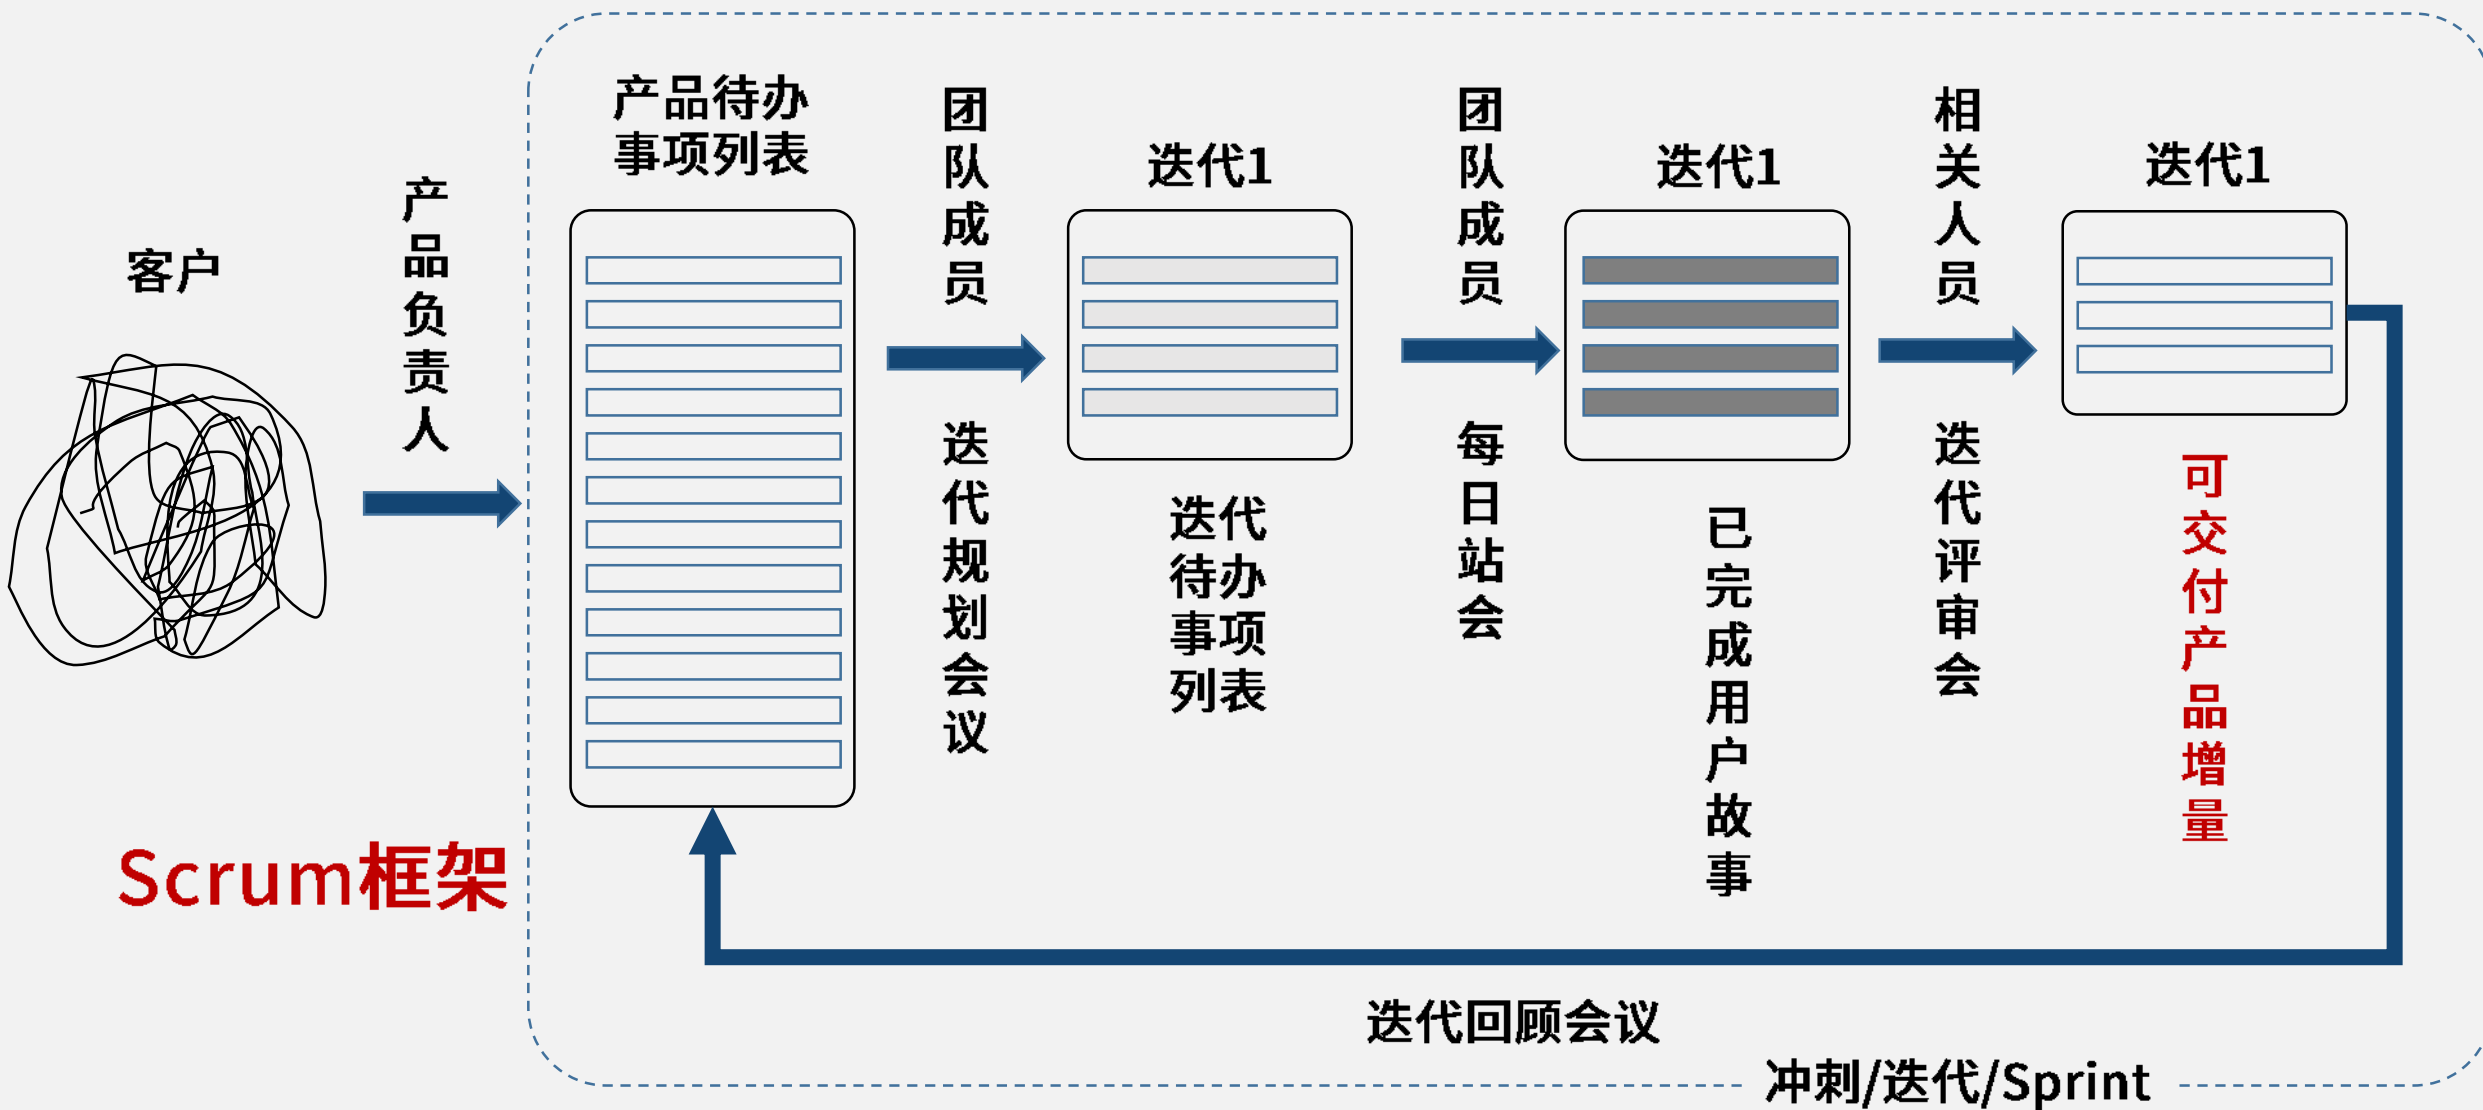





Scrum敏捷实践



可交付产品增量 Increment

【要点1】可交付产品增量是一次迭代中实际已完成已验收的用户故事

【要点2】可交付产品增量交付价值

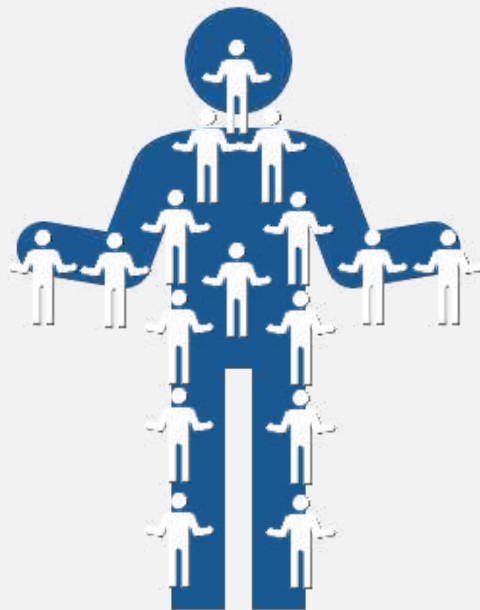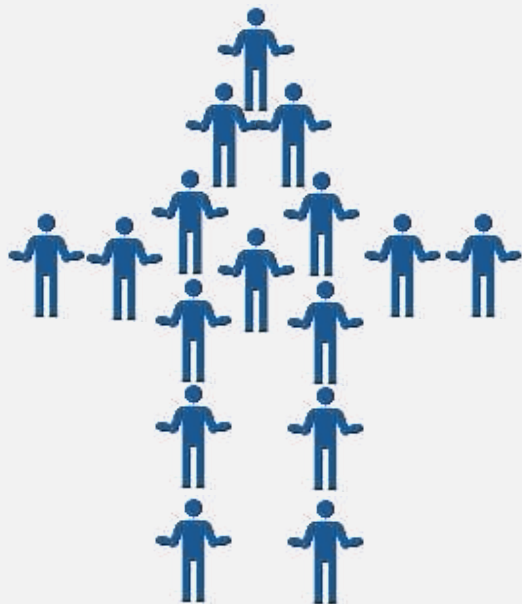



Scrum敏捷实践



某公司聘请了一位敏捷管理专业人士对公司内的团队进行敏捷培训，其中，多次强调了敏捷团队应该注重不断的交付增量，这是因为增量交付可以？

- A. 尽早的交付价值，可以更好的应对变化
- B. 捆绑产品特征，让客户感觉到产出，提高满意度
- C. 消除需求变化的可能性
- D. 使团队工作更简便轻松



Scrum敏捷实践



可交付产品增量 Increment

【要点】可交付产品增量交付价值

某公司聘请了一位敏捷管理专业人士对公司内的团队进行敏捷培训，其中，多次强调了敏捷团队应该**注重不断的交付增量**，这是因为**增量交付**可以？

- A. 尽早的交付价值，可以更好的应对变化
- B. 捆绑产品特征，让客户感觉到产出，提高满意度
- C. 消除需求变化的可能性
- D. 使团队工作更简便轻松



三个工件重点小结

产品待办事项列表
(产品负责人PO)
整体、更粗略

本质是所有工作的**有序列表**，以价值为导向，渐进明细
实时可变，拥抱变化
PO主导管理，选项没有PO时，SM代为管理
排序考虑**价值、风险、成本等**
运维工作、风险应对等作为非功能性内容列入待办事项

迭代待办事项列表
(团队)
部分、更详细

在迭代规划会议上产出，**定义本轮迭代的目标**，明确具体任务
团队**自行讨论认领任务**
一般**不会随意改变**，首先确保本轮迭代的顺利完成
当用户故事无价值，涉及生死存亡时可以考虑调整
怎么调整：PO确定优先级；无价值-删除；生死存亡-置换

可交付产品增量

一次迭代中实际**已完成已验收**的用户故事



Scrum敏捷实践



时间盒

“装着时间的盒子”，指**固定的时间阶段**，时间盒确定后不能随意改变。

时间盒

- 固定的一段相对较短的时间
- 计划的工作要在这段时间内完成



专注项目，对抗帕金森定律



优点：高度关注价值



缺点：可能导致“半成品”

时间盒越短，越频繁达成小的目标，给外部干系人建立信心

时间盒越短，反馈频率越频繁，能越早获得反馈，降低复杂度



Scrum敏捷实践



冲刺/迭代/Sprint

【要点1】 迭代时间盒应该和团队能力、项目特征协调一致


【要点2】 迭代时间盒一旦确定不会随意调整



Scrum敏捷实践



敏捷教练

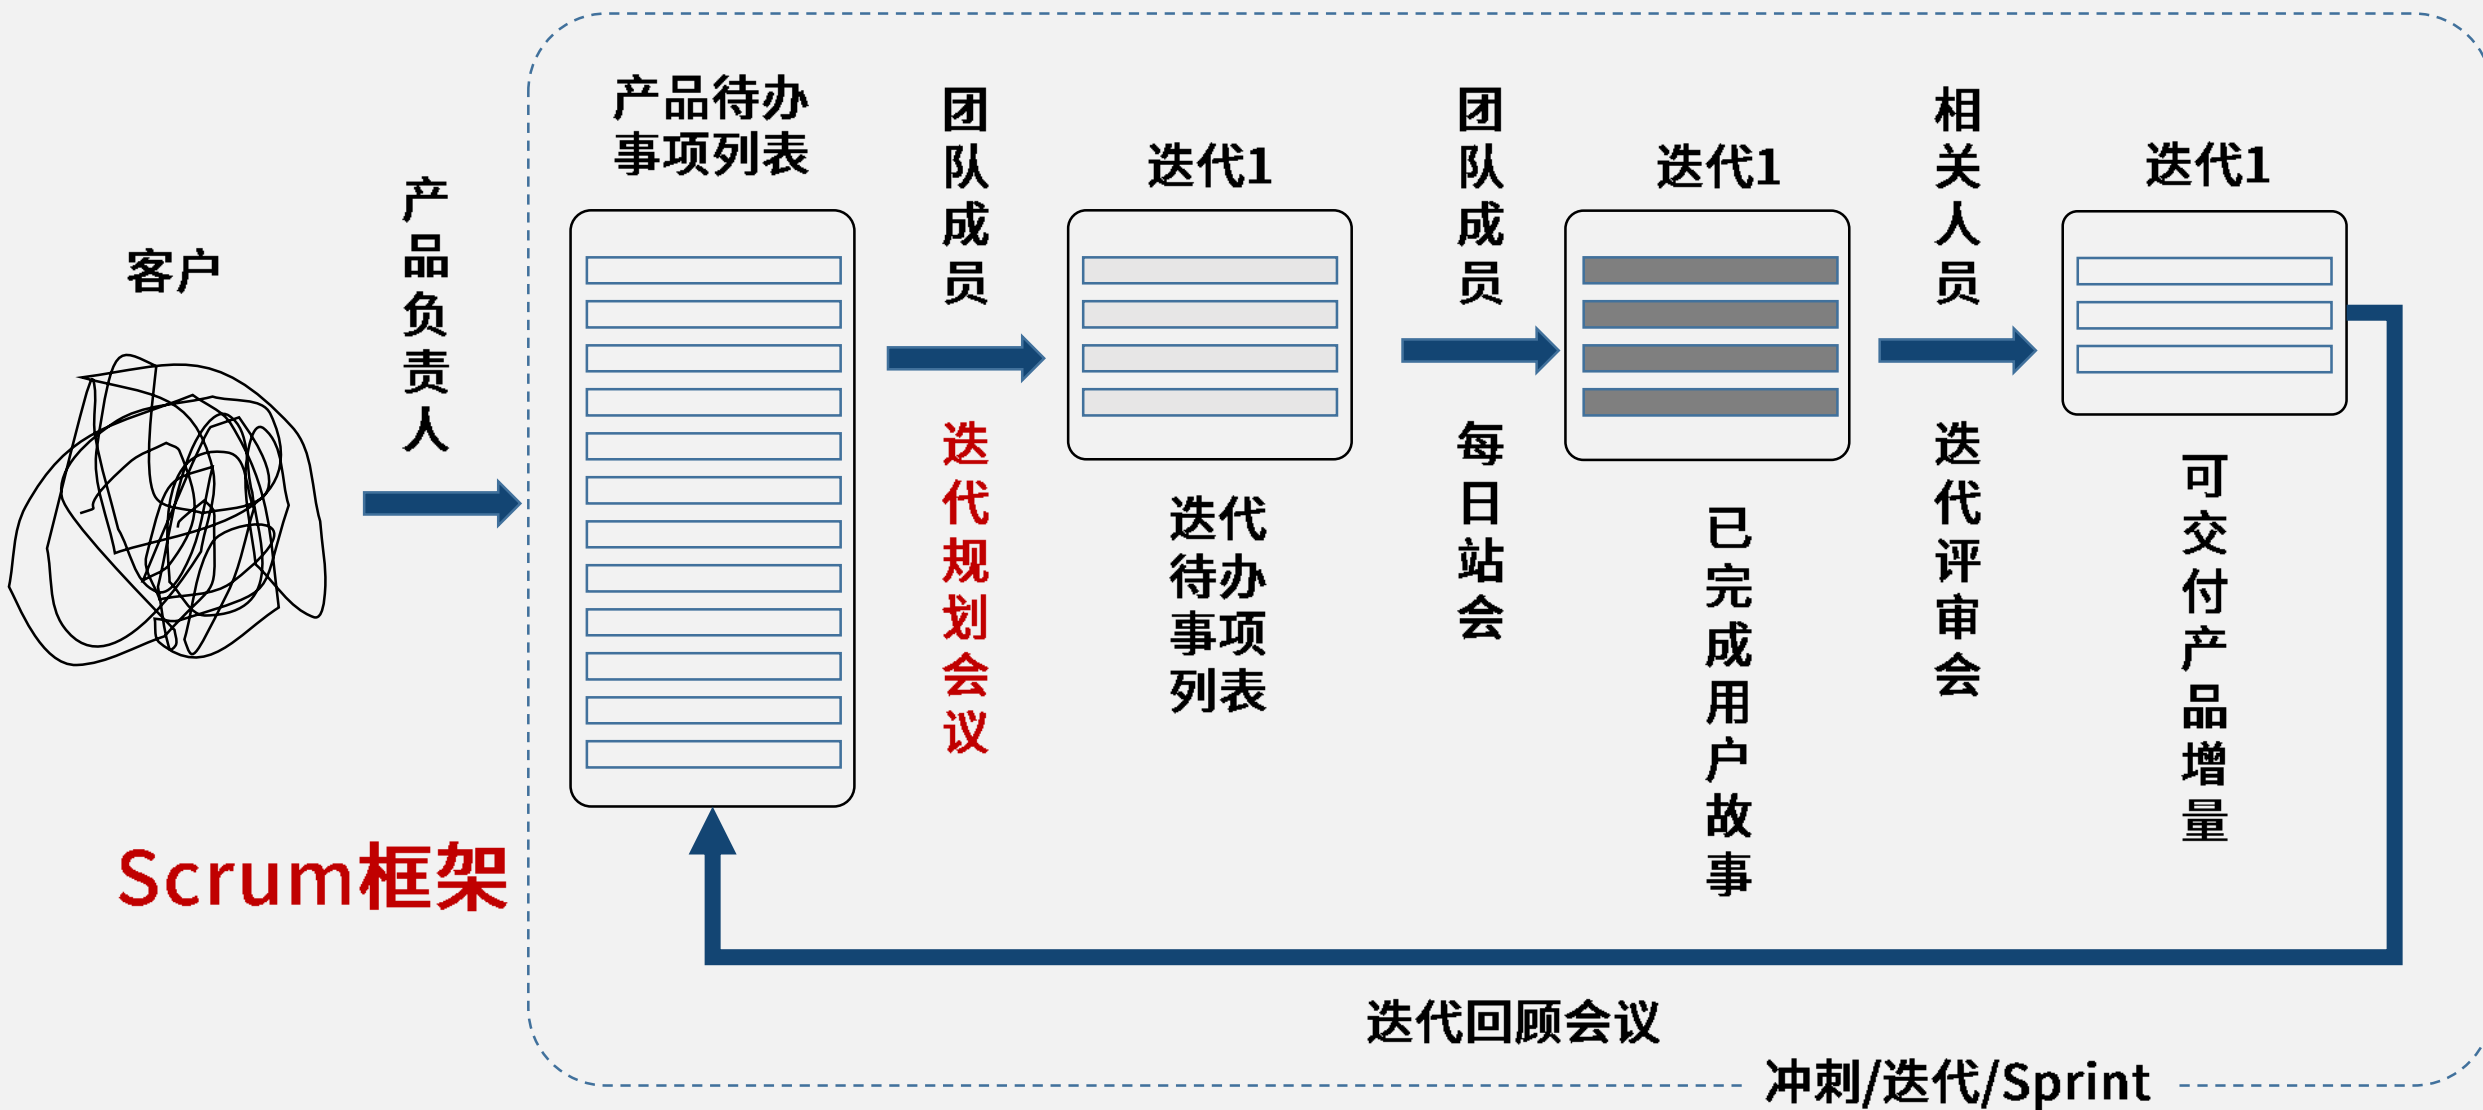



Scrum敏捷实践



迭代规划会议Sprint Planning

- 为即将要开展的**迭代制定计划**，**定义**本轮迭代要交付的内容如何**完成**
- 相关方可以通过参加迭代规划会议**了解团队情况和产品情况**
- 在迭代第一天进行，控制在8小时以内（每周迭代时长对应约2h会议时间）
- 会议基本内容：
 - 1、产品负责人在迭代规划会议中与团队合作，向团队介绍故事创意、潜在的挑战或问题，为即将进行的迭代准备故事，并确定验收标准（DOD）；
 - 2、细化用户故事，将用户故事拆分成任务，以便估算；
 - 3、团队成员主动认领任务；
 - 4、团队进行评估得出迭代待办事项列表。



Scrum敏捷实践



迭代规划会议Sprint Planning

- 【要点1】 确定迭代目标、事项和任务，讨论如何完成，产出迭代待办事项列表；
- 【要点2】 细化评估故事，团队成员自行领取任务，得到迭代待办事项列表；
- 【要点3】 相关方可以通过参加迭代规划会议了解团队情况和产品情况。



Scrum敏捷实践



敏捷开发模式强调根据环境和客户的需求变化来调整项目的工作事项。请问敏捷团队在下面哪一项会议上，确定迭代需要完成的工作事项？

- A.迭代规划会议
- B.迭代评审会议
- C.迭代回顾会议
- D.每日站会



Scrum敏捷实践



迭代规划会议Sprint Planning

【要点】 细化评估故事，制定迭代待办事项列表，团队成员自行领取任务

敏捷开发模式强调根据环境和客户的需求变化来调整项目的工作事项。请问敏捷团队在下面哪一项会议上，确定迭代需要完成的工作事项？

- A.迭代规划会议
- B.迭代评审会议
- C.迭代回顾会议
- D.每日站会



Scrum敏捷实践



项目经理正在与敏捷团队合作，一位关键相关方非常不高兴，因为最终产品的交付日期被推迟了三倍。项目经理应该做什么？

- A.指示产品负责人放弃其他正在进行的工作，并将此相关方的要求作为首要任务
- B.与关键相关方会面以了解关注点和业务影响，根据需要重新确定优先级，并邀请他加入 sprint计划会议
- C.与该相关方分享团队正在处理的优先事项，并邀请他们加入sprint计划会议
- D.获得一些额外的资金，为项目团队招募更多资源，以实现更快的交付



Scrum敏捷实践



迭代规划会议Sprint Planning

【要点】相关方可以通过参加迭代规划会议了解团队情况和产品情况

项目经理正在与敏捷团队合作，一位关键相关方非常不高兴，因为最终产品的交付日期被推迟了三倍。项目经理应该做什么？


- A.指示产品负责人放弃其他正在进行的工作，并将此相关方的要求作为首要任务
- B.与关键相关方会面以了解关注点和业务影响，根据需要重新确定优先级，并邀请他加入 sprint计划会议**
- C.与该相关方分享团队正在处理的优先事项，并邀请他们加入sprint计划会议
- D.获得一些额外的资金，为项目团队招募更多资源，以实现更快的交付



Scrum敏捷实践



敏捷教练

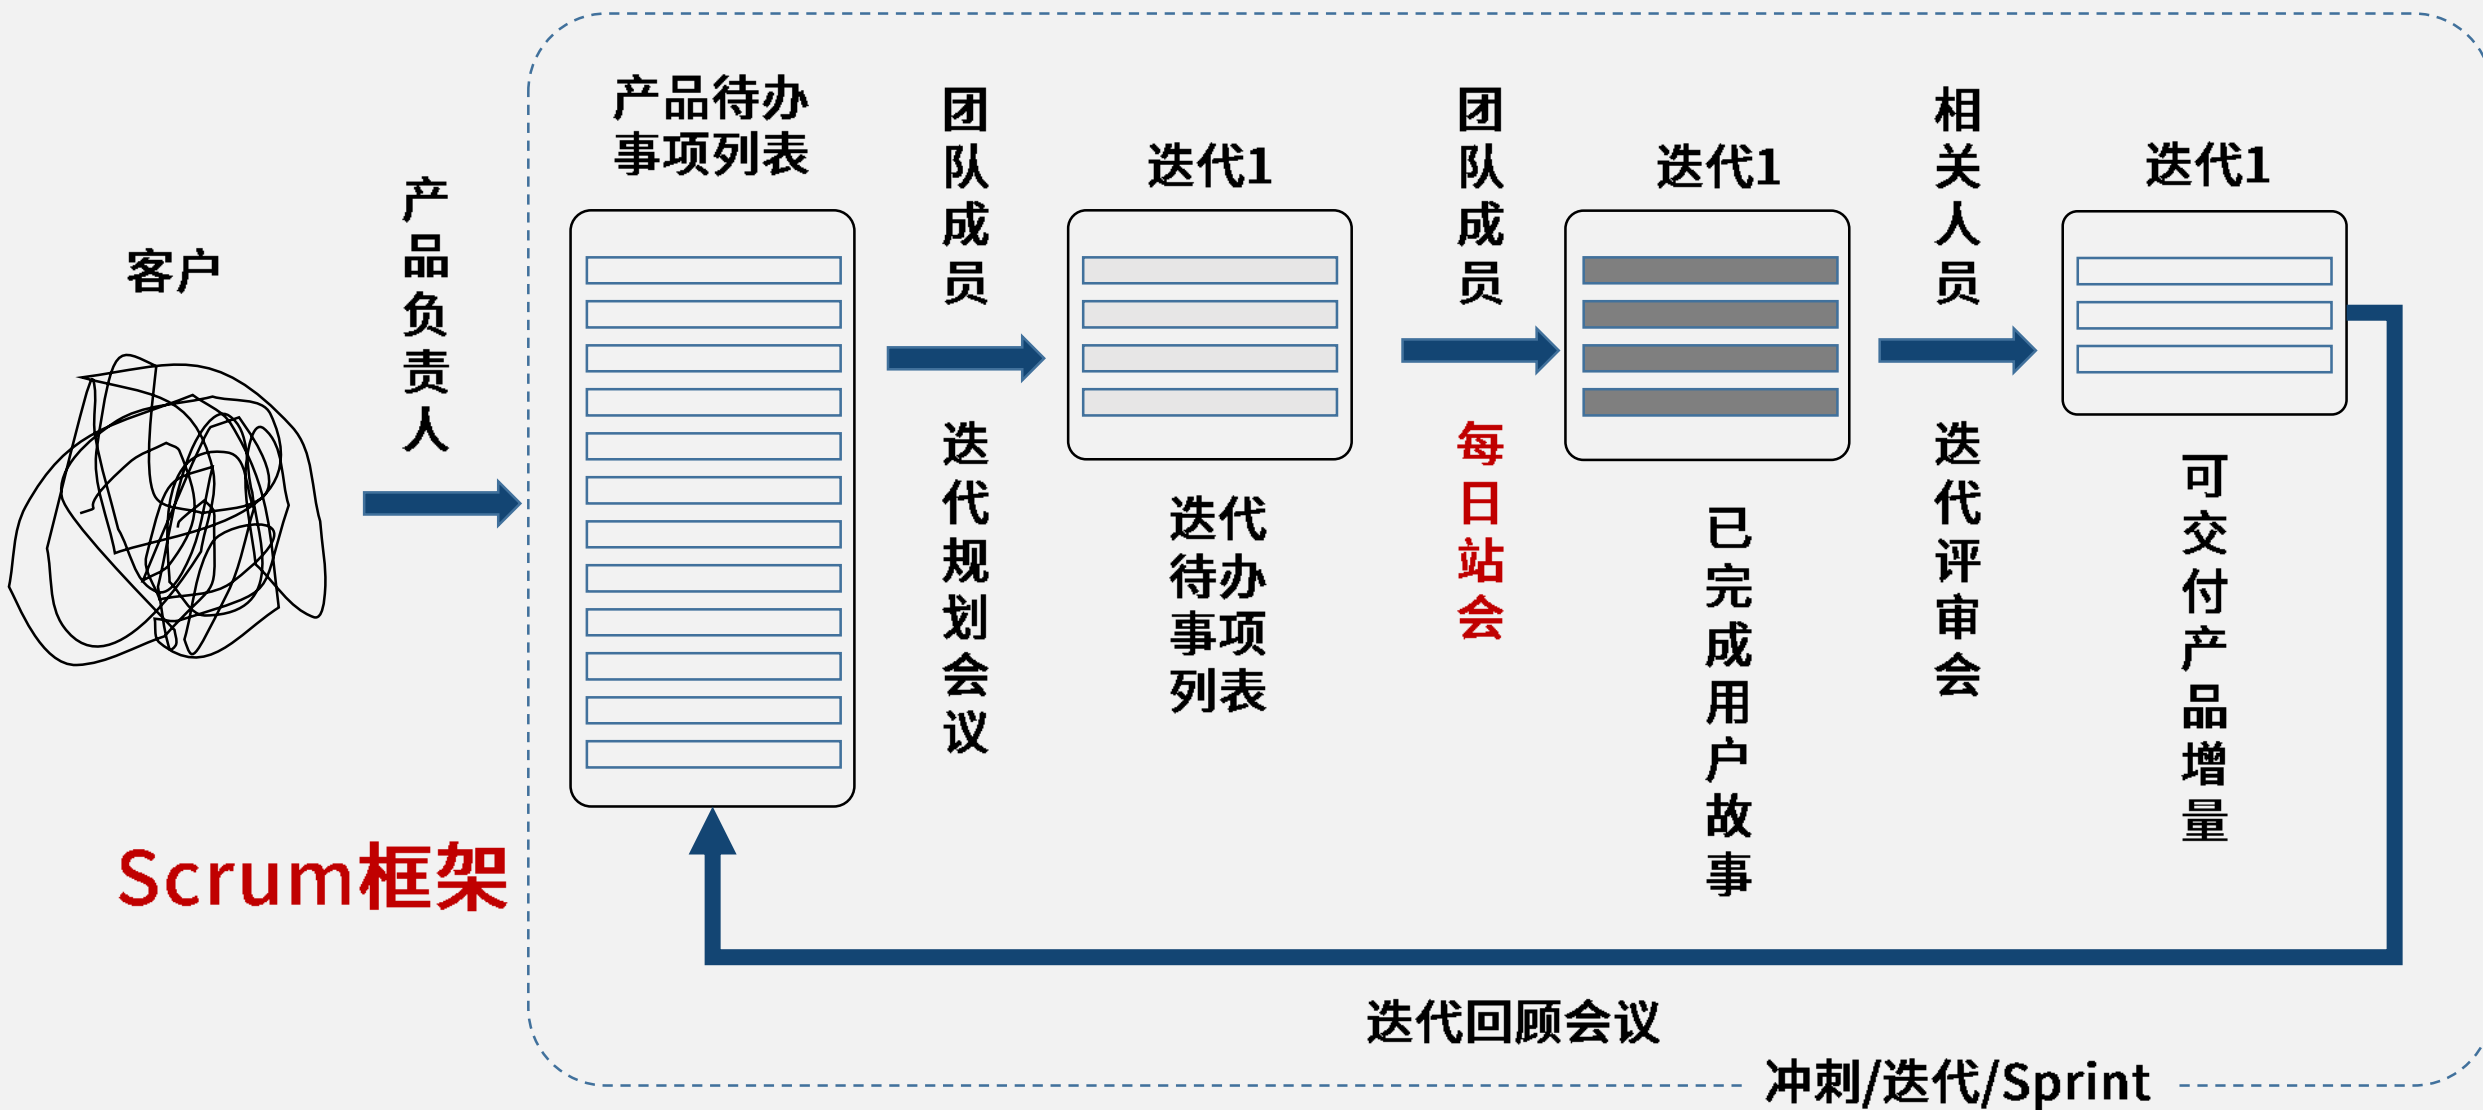




Scrum敏捷实践



信息发射源Information Radiator

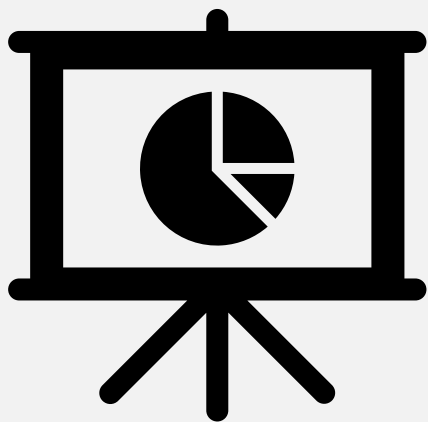

一个可见的物理显示屏，在不打扰团队的情况下向组织的其他部门提供信息，即时信息共享。

看板、任务板、白板等都可以作为信息发射源，信息发射源可以有线下实物版本，也可以有线上虚拟版本



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

- 团队“过一下”看板或任务板（信息发射源）；
- 站会是为了同步信息，发现问题，不提倡在站会上解决问题。
- 避免变成状态报告会议和问题解决会议。
- 对每一个任务，每天更新剩余任务工作量的估算；
- 注意时间盒，一般不超出**15分钟**；（人数过多可稍微延长，或划分团队）
- 团队中的**任何人**都可以主持站会；
- 每个人轮流回答问题：
 - 1、上次站会以来我都**完成**了什么？
 - 2、从现在到下一次站会，我**计划**完成什么？
 - 3、我的**障碍（风险或问题）**是什么？



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点1】 每日站会只同步信息，提出问题，不解决问题

【要点2】 解决问题可以每日站会后单独安排

【要点3】 每日站会是支撑敏捷原则最重要的基石之一，不可随意取消

【要点4】 注意时间盒，每日站会一般不超出15分钟

【要点5】 在遵循敏捷价值观的前提下，时间盒和团队人数都可以根据实际情况做调整



Scrum敏捷实践



一个复杂项目的执行期间，原来的7人开发团队感到非常大的压力，所以在第四个迭代周期结束后，组织安排了3名不同文化背景的新成员加入了团队。因为文化和语言的问题，每日站会无法在15分钟之内完成。团队识别到了这个障碍，并向你求助。作为敏捷管理专业人士，你能提出怎样的建议？

- A.因为文化背景的特殊性，将每日站会的时间盒适当延长，超过15分钟
- B.坚持15分钟的时间盒，因为这是众多敏捷项目的最佳实践
- C.因为团队人数过多，将团队分为2部分，分别举行每日站会
- D.取消每日站会，让团队成员在遇到问题的时候面对面沟通解决



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点】在遵循敏捷价值观的前提下，时间盒和团队人数都可以根据实际情况做调整

一个复杂项目的执行期间，原来的7人开发团队感到非常大的压力，所以在第四个迭代周期结束后，组织安排了**3名不同文化背景**的新成员加入了团队。**因为文化和语言的问题，每日站会无法在15分钟之内完成**。团队识别到了这个障碍，并向你求助。作为敏捷管理专业人士，你能提出怎样的建议？

- A.因为文化背景的特殊性，将每日站会的时间盒适当延长，超过15分钟
- B.坚持15分钟的时间盒，因为这是众多敏捷项目的最佳实践
- C.因为团队人数过多，将团队分为2部分，分别举行每日站会
- D.取消每日站会，让团队成员在遇到问题的时候面对面沟通解决



Scrum敏捷实践



一家公司过渡到敏捷实践，一个集中办公的团队采用 scrum 方法，scrum 主管主持召开每日立会，并坚持让所有团队成员亲自参加面对面对话，但是，出勤率很低。 scrum 主管应该怎么做？

- A.对缺席会议执行处罚
- B.通知团队成员他们可以为会议使用网络摄像头或视频会议
- C.允许团队成员呼叫会议视频
- D.强调这一敏捷原则的重要性，并要求每个人参加



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点】每日站会是支撑敏捷原则最重要的基石之一，不可随意取消。一家公司过渡到敏捷实践，一个集中办公的团队采用 scrum 方法，scrum 主管主持召开**每日立会**，并坚持让所有团队成员亲自参加面对面对话，但是，**出勤率很低**。scrum 主管应该怎么做？

- A.对缺席会议执行处罚
- B.通知团队成员他们可以为会议使用网络摄像头或视频会议
- C.允许团队成员呼叫会议视频
- D.强调这一敏捷原则的重要性，并要求每个人参加**



Scrum敏捷实践



组织正在转型敏捷，聘请了一位有专业敏捷知识的专家为敏捷教练，选取了几位非常优秀且思维独立的团队成员共同组成敏捷团队。在刚开始践行敏捷时，其中一位团队成员认为每日站会占用工作时间，质疑其意义。作为敏捷管理专业人士，应该如何回应？

- A.每日站会可以促进沟通，更好的检测障碍和问题
- B.每日站会便于敏捷教练对团队绩效的管理
- C.每日站会可以增加燃起图中的需求
- D.每日站会可以让相关方更加了解项目状态



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点】每日站会是支撑敏捷原则最重要的基石之一，不可随意取消

组织正在转型敏捷，聘请了一位有专业敏捷知识的专家为敏捷教练，选取了几位非常优秀且思维独立的团队成员共同组成敏捷团队。在刚开始践行敏捷时，其中一位**团队成员认为每日站会占用工作时间，质疑其意义**。作为敏捷管理专业人士，应该如何回应？

- A.每日站会可以促进沟通，更好的检测障碍和问题
- B.每日站会便于敏捷教练对团队绩效的管理
- C.每日站会可以增加燃起图中的需求
- D.每日站会可以让相关方更加了解项目状态



Scrum敏捷实践



敏捷团队正在为一个史诗故事的工作做准备，该故事可能要求集成一项新技术， 由于迭代规划会议已经完成， 敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.参与考察研究，更好地了解使用这项新技术的风险
- B.将该故事添加进风险登记册
- C.在每日站会上将其作为一个问题提出
- D.更改该故事，避免集成新技术



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点】 每日站会只同步信息，提出问题，不解决问题

敏捷团队正在为一个史诗故事的工作做准备，该故事可能要求集成一项新技术，由于迭代规划会议已经完成，敏捷管理专业人士应该怎么做？

- A.参与考察研究，更好地了解使用这项新技术的风险
- B.将该故事添加进风险登记册
- C.在每日站会上将其作为一个问题提出**
- D.更改该故事，避免集成新技术



Scrum敏捷实践



SM在每日站会中发现两个团队成员之间的重复摩擦，下一步该怎么做？

- A.立刻在每日站会中直接解决这个问题
- B.每日站会后安排一场会议去探讨和解决这个问题
- C.忽略该问题，因为一个自组织的团队应该可以解决这些冲突
- D.在他们还没有破坏团队生产力之前找新成员来取代他们



Scrum敏捷实践



每日站会Daily Scrum

【要点】 解决问题可以每日站会后单独安排

SM在每日站会中发现两个团队成员之间的重复摩擦，下一步该怎么做？


- A.立刻在每日站会中直接解决这个问题
- B.每日站会后安排一场会议去探讨和解决这个问题**
- C.忽略该问题，因为一个自组织的团队应该可以解决这些冲突
- D.在他们还没有破坏团队生产力之前找新成员来取代他们



Scrum敏捷实践



敏捷教练

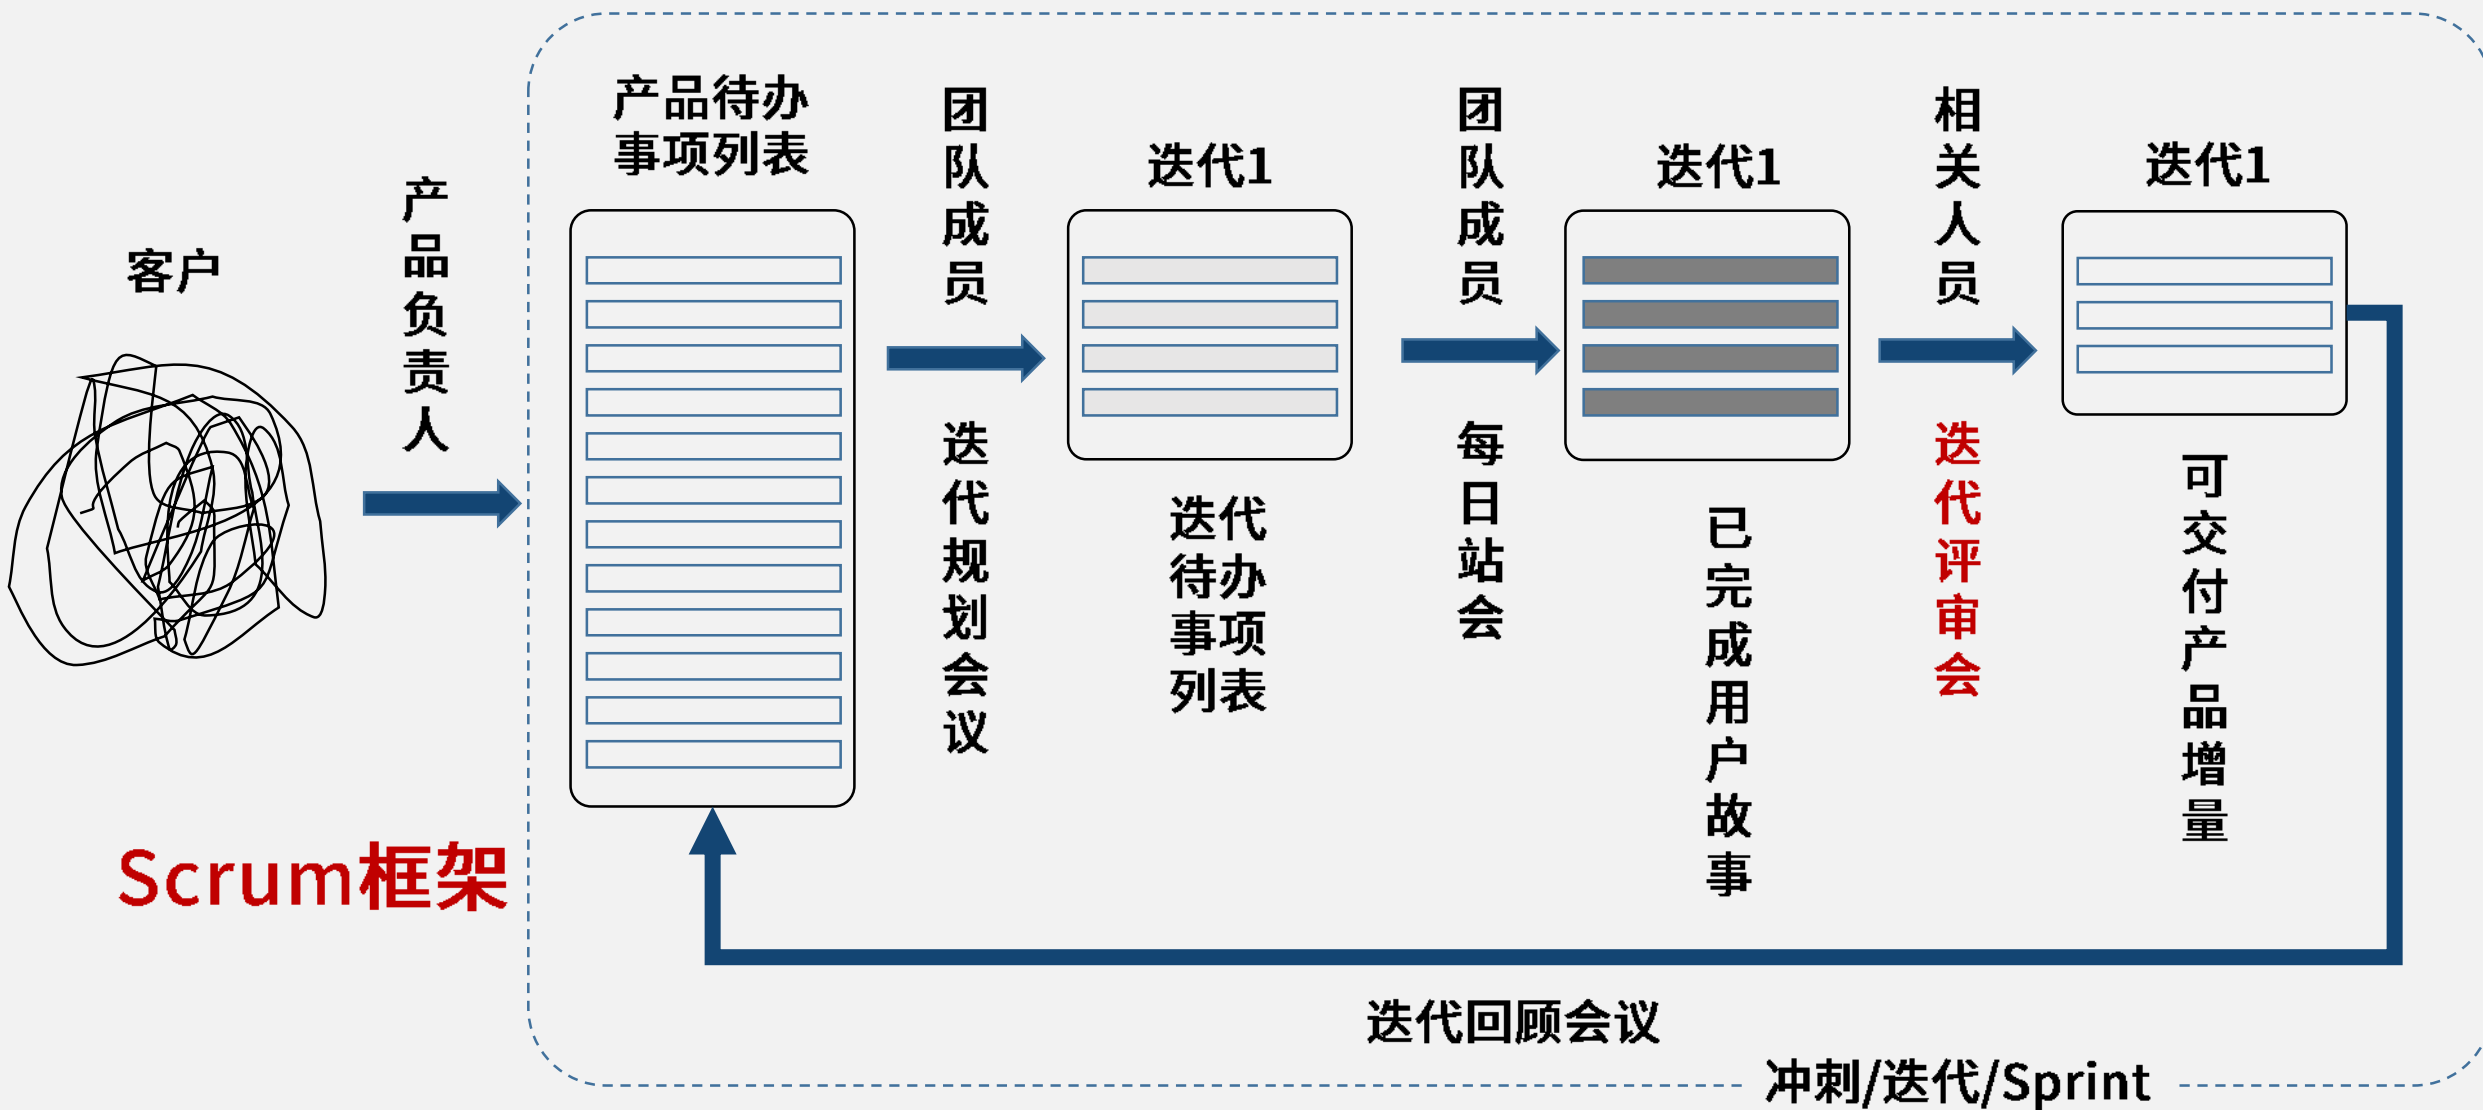



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

- 发生在迭代结束时，一般控制在4小时以内。
- 参会者包括**产品负责人PO**和**Scrum团队**及邀请的**主要利益相关者**。
- 主要会议内容：
 - 1.产品负责人说明哪些产品待办列表项已经“**完成**”和哪些“**没有完成**”；
 - 2.开发团队**汇报**在迭代期间哪些工作做的很好，遭遇到什么问题以及问题是**如何解决**的；
 - 3.开发团队**演示“完成”**的工作并解答关于所交付**增量**的问题，获得相关方**验收通过**；
 - 4.**未完成或未通过评审**的用户故事，**重新放回**产品待办事项列表；
 - 5.参会的所有人就**下一步的工作**进行探讨，**评审**市场或潜在的产品使用方式所带来的最有价值的**改变**；为**下个预期产品**功能或产品能力版本的发布，评审时间表、预算、潜力和市场。



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

【要点1】 PO鉴定“已完成”，客户验收已完成的用户故事，给出反馈

【要点2】 迭代评审会议，产品负责人原则上需要到场

【要点3】 未完成未通过验收的用户故事放回产品待办事项列表

【要点4】 讨论评估后期产品变更与趋势分析



Scrum敏捷实践



一个事项的状态被视为“已完成”，必须满足哪一项条件？

- A.团队与项目发起人达成该事项已完成的一致意见
- B.产品负责人接受该事项已完成
- C.产品负责人和客户批准用户故事
- D.团队和客户批准用户故事



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

【要点】PO鉴定“已完成”，客户验收已完成的用户故事，给出反馈
一个事项的状态被视为“已完成”，必须满足哪一项条件？

- A.团队与项目发起人达成该事项已完成的一致意见
- B.产品负责人接受该事项已完成**
- C.产品负责人和客户批准用户故事
- D.团队和客户批准用户故事



Scrum敏捷实践



团队正在进行某款APP开发工作，在执行完第4次迭代后，准备周一召开迭代评审会议，但产品负责人周一还有重要会议要参加，不能来，敏捷教练应该怎么办？

- A. 评审会议必须按时召开，不能延后
- B. 与相关人员商量重新安排时间，确保产品负责人参加并提供反馈
- C. 邀请另一个项目的产品负责人代替参加
- D. 要求其他相关方代替产品负责人参加



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

【要点】迭代评审会议，产品负责人原则上需要到场

团队正在进行某款APP开发工作，在执行完第4次迭代后，准备周一召开**迭代评审会议**，但**产品负责人**周一还有重要会议要参加，**不能来**，敏捷教练应该怎么办？

- A. 评审会议必须按时召开，不能延后
- B. 与相关人员商量重新安排时间，确保产品负责人参加并提供反馈**
- C. 邀请另一个项目的产品负责人代替参加
- D. 要求其他相关方代替产品负责人参加



Scrum敏捷实践



在一次迭代评审会议上，产品负责人及关键相关方对团队成员完成的五个用户故事进行审查。关键相关方表示，关于数据筛选的用户故事未能到达他的预期。产品负责人首先应该做什么？

- A.更新产品待办事项列表，添加价值更高的用户故事进行弥补
- B.实施整体变更控制来进行补救
- C.与相关方沟通需求，重新编写与此功能相关的用户故事
- D.更新迭代待办事项列表，在下一次迭代中对此功能进行修正



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

【要点】 未完成未通过验收的用户故事放回产品待办事项列表

在一次**迭代评审会议**上，产品负责人及关键相关方对团队成员完成的五个用户故事进行审查。关键相关方表示，关于数据筛选的**用户故事未能到达他的预期**。**产品负责人**首先应该做什么？

- A.更新产品待办事项列表，添加价值更高的用户故事进行弥补
- B.实施整体变更控制来进行补救
- C.与相关方沟通需求，重新编写与此功能相关的用户故事**
- D.更新迭代待办事项列表，在下一次迭代中对此功能进行修正



Scrum敏捷实践



你是敏捷项目中的开发团队成员，在第四次迭代开发过程中，你和其他团队成员一起完成了4个故事的开发。在迭代评审会议上，产品负责人根据DoD对开发完成的用户故事功能进行了评审，其中，ABC三个故事评审通过，故事D没有得到他的确认。请问，对于故事D，项目团队应该怎么处理？

- A.将该故事标记为完成，因为如果不合格，不会出现在迭代评审会议上
- B.将该故事标记为未完成，并且将其纳入到下一次迭代中
- C.将该故事标记为未完成，并与产品负责人协商，重新评定该故事的价值优先级
- D.将该故事标记为未完成，并将其从产品待办事项列表中移除



Scrum敏捷实践



迭代评审会议Sprint Review

【要点】 未完成未通过验收的用户故事放回产品待办事项列表

你是敏捷项目中的开发团队成员，在第四次迭代开发过程中，你和其他团队成员一起完成了4个故事的开发。在**迭代评审会议**上，产品负责人根据DoD对开发完成的用户故事功能进行了评审，其中，**ABC三个故事评审通过，故事D没有得到他的确认**。请问，对于**故事D**，项目团队应该怎么处理？


- A.将该故事标记为完成，因为如果不合格，不会出现在迭代评审会议上
- B.将该故事标记为未完成，并且将其纳入到下一次迭代中
- C.将该故事标记为未完成，并与产品负责人协商，重新评定该故事的价值优先级**
- D.将该故事标记为未完成，并将其从产品待办事项列表中移除



Scrum敏捷实践



敏捷教练

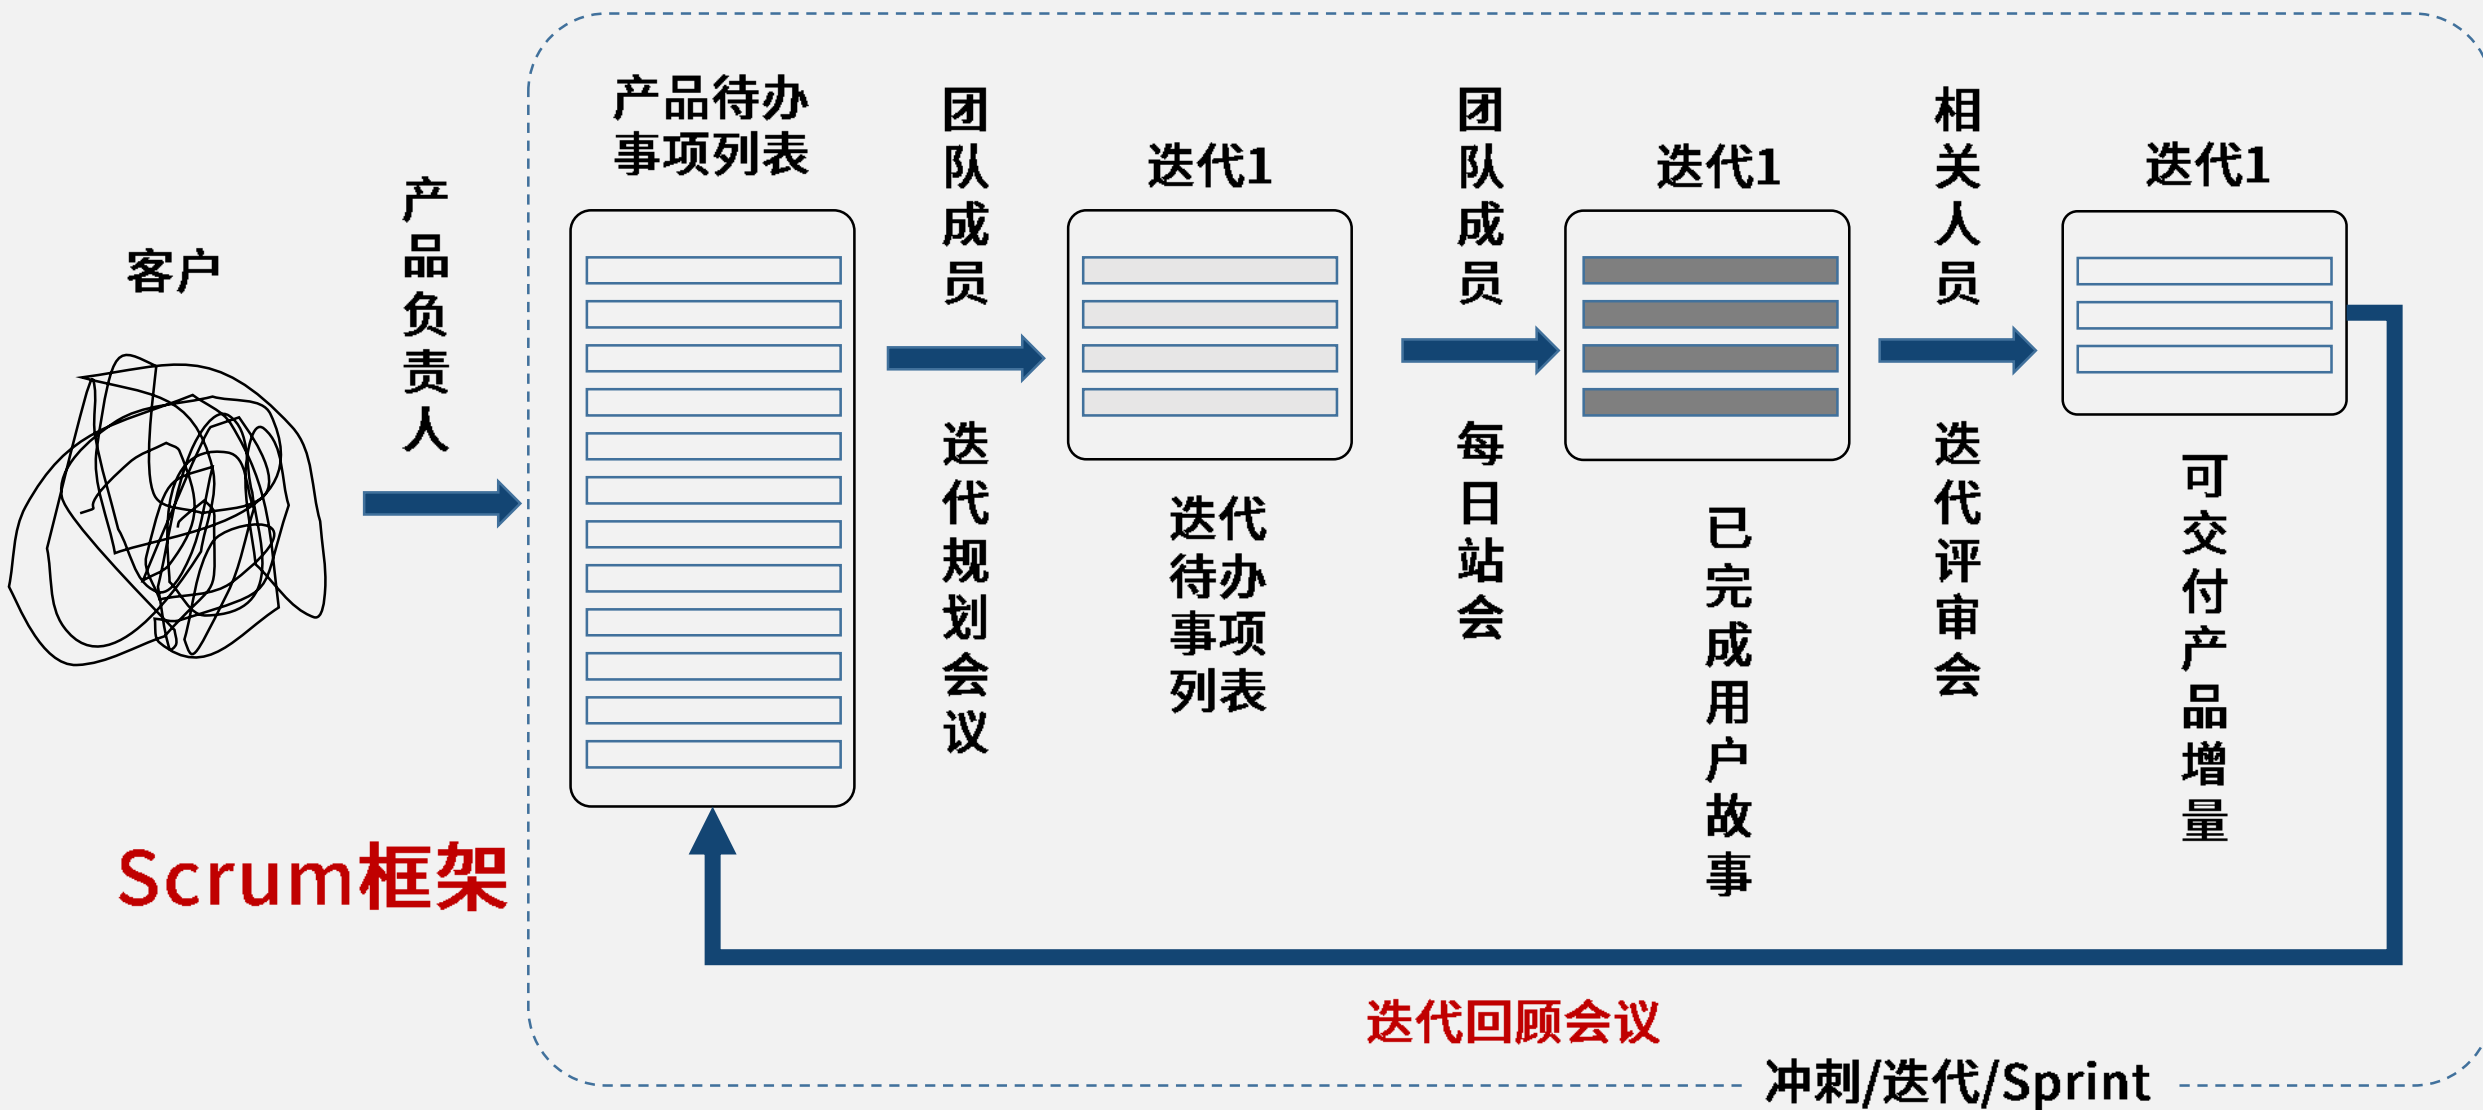



Scrum敏捷实践



迭代回顾会议Sprint Retrospective

- 迭代回顾会议中敏捷团队**检视**自身并创建下一个**迭代改进计划**。
- 迭代回顾会议发生在迭代评审会议结束之后，下个**迭代规划会议之前**。
- 迭代回顾会议时间一般不超过3小时（以1个月的迭代为例）。
- 敏捷教练要确保会议举行，让每个参会者都明白会议的目的，确保会议是**积极的和富有成效的**。
- 迭代回顾会议的目的在于：
 - 1.**检视**本轮迭代中关于**人、关系、过程和工具**的情况；
 - 2.找出并加以**排序**做得**好**的和潜在需要**改进**的主要方面；
 - 3.制定敏捷团队工作方式的**改进计划**。



Scrum敏捷实践



迭代回顾会议Sprint Retrospective

【要点1】 检视自身，关注过程，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划

【要点2】 迭代回顾会议的时间节点是迭代评审之后，下次迭代规划之前

【要点3】 一般是团队成员、敏捷教练参会，PO视情况，相关方受邀参与



Scrum敏捷实践



一个项目团队最近完成了为车队管理系统开发两个功能的冲刺。虽然该团队交付了所需的功能，但他们在冲刺期间遇到了一些问题和冲突。团队成员对这种经历感到不安，现在由于所发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A.与项目团队成员建立一对一的会议
- B.与项目团队成员一起审查 sprint 进度
- C.与项目团队成员一起审查 sprint 计划程序
- D.与项目团队成员进行 sprint 回顾



Scrum敏捷实践



迭代回顾会议Sprint Retrospective

【要点】 检视自身，关注过程，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划

一个项目团队最近完成了为车队管理系统开发两个功能的冲刺。虽然**该团队交付了所需的功能**，但他们在冲刺期间遇到了一些问题和冲突。团队成员对这种**经历感到不安**，现在由于所发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做什么来**帮助提高团队对项目的积极性和参与度**？

- A. 与项目团队成员建立一对一的会议
- B. 与项目团队成员一起审查 sprint 进度
- C. 与项目团队成员一起审查 sprint 计划程序
- D. 与项目团队成员进行 sprint 回顾**



Scrum敏捷实践



一个敏捷项目正在进行中，目前处于迭代周期内，一名经验丰富的高级开发人员发现，一名刚进入项目没多久的初级开发人员在规划会议时领取的任务，不能按时完成。该高级开发人员应该怎么做？

- A.要求初级开发人员将该领取的任务分配给其他
- B.要求初级开发人员的经理和他谈话
- C.要求Scrum主管警告该初级开发人员
- D.在迭代回顾会议上，教导团队如何更好地评估



Scrum敏捷实践



迭代回顾会议Sprint Retrospective

【要点】 检视自身，关注过程，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划

一个敏捷项目正在进行中，目前处于迭代周期内，一名经验丰富的高级开发人员发现，一名刚进入项目没多久的**初级开发人员在规划会议时领取的任务，不能按时完成**。该高级开发人员应该怎么做？

- A.要求初级开发人员将该领取的任务分配给其他
- B.要求初级开发人员的经理和他谈话
- C.要求Scrum主管警告该初级开发人员
- D.在迭代回顾会议上，教导团队如何更好地评估**



Scrum敏捷实践



敏捷团队正在完成一个客户的软件项目，有一名刚从事敏捷项目不久的团队成员，他不知道通过风险审计来检查风险应对的有效性应该在哪个会议上实施，敏捷教练应该如果告诉他？

- A.Sprint规划会议
- B.发布计划
- C.迭代回顾会议
- D.每日站会



Scrum敏捷实践



迭代回顾会议Sprint Retrospective

【要点】 检视自身，关注过程，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划

敏捷团队正在完成一个客户的软件项目，有一名刚从事敏捷项目不久的团队成员，他不知道**通过风险审计来检查风险应对的有效性**应该在哪个会议上实施，敏捷教练应该如果告诉他？

- A.Sprint规划会议
- B.发布计划
- C.迭代回顾会议**
- D.每日站会



Scrum敏捷实践

SCRUM的会议总结对比

敏捷SCRUM实践会议	时间盒	召开时间	主要内容
产品待办事项列表梳理会议 (Release Planning)	8h	迭代规划前	做准备
迭代计划会议 (Sprint Planning)	8h	迭代第一天	做规划
每日站会 (Daily Scrum)	15min	迭代每一天	做共识
迭代评审会议 (Sprint Review)	4h	迭代工作完成后	做验收
迭代回顾会议 (Sprint Retrospective)	3h	评审会议后	做回顾



五个事件重点小结

五个事件

迭代、冲刺

迭代时间盒=迭代周期=迭代持续时间

迭代的时间盒考虑团队能力、项目特征

时间盒固定，不会随意调整

冲刺计划会议

确定迭代任务和目标，讨论如何完成，产出迭代待办事项列表

相关方可以受邀参与，了解需求变化

每日站会

了解项目状态信息（掌握进度情况），团队个人状态，共识信息，发现问题

团队自行组织、团队任何人都可以主持站会

时间盒一般15分钟（除其他原因影响会议效果时可延长）

只发现问题，不讨论问题

问题可以站会后专门讨论解决，持续改进

不影响当前迭代目标，和整体流程相关的问题可以回顾会议讨论改进

迭代评审会议

PO鉴定“已完成”，客户验收，给出反馈

未完成或者未验收的用户故事放回产品待办事项列表

讨论下次预期和趋势

迭代回顾会议

检视自身，关注过程，回顾措施有效性，找出原因、提出改进计划

过程



Scrum敏捷实践



敏捷团队在某个会议上一起讨论并决定了在开发用户故事的过程中，使用什么测试方式对完成的工作进行检验，这个决策是在哪个会议上确定的？

- A.每日站立会议
- B.迭代回顾会议
- C.迭代评审会议
- D.迭代规划会议



Scrum敏捷实践



迭代规划会议Sprint Planning

【要点】 迭代规划会议是确定迭代目标、事项和任务，讨论如何完成，产出迭代待办事项列表

敏捷团队在某个会议上一起讨论并决定了在开发用户故事的过程中，使用什么测试方式对完成的工作进行检验，这个决策是在哪个会议上确定的？

- A.每日站立会议
- B.迭代回顾会议
- C.迭代评审会议
- D.迭代规划会议**



Scrum敏捷实践



项目经理领导着一个技术复杂的项目。该项目是战略工作计划的一部分，也是第一个使用敏捷方法的项目。一位董事会成员有兴趣参加一个会议，看看项目范围的交付进展如何。

项目负责人应该怎么做？

- A.邀请董事会成员参加下一次每日站会
- B.邀请董事会成员参加下一次冲刺回顾会议
- C.邀请董事会成员参加单独的演示
- D.邀请董事会成员参加下一次冲刺评审



Scrum敏捷实践



项目经理领导着一个技术复杂的项目。该项目是战略工作计划的一部分，也是第一个使用敏捷方法的项目。一位董事会成员有兴趣参加一个会议，看看项目范围的交付进展如何。

项目负责人应该怎么做？

- A.邀请董事会成员参加下一次每日站会
- B.邀请董事会成员参加下一次冲刺回顾会议
- C.邀请董事会成员参加单独的演示
- D.邀请董事会成员参加下一次冲刺评审



Scrum敏捷实践



在演示过程中，因为法规发生了变化，客户提供反馈并请求新的、紧急的增强功能。

敏捷项目经理下一步应该做什么？

- A.与团队一起审查新要求，并要求他们开始着手处理
- B.将新需求添加到迭代待办事项中
- C.下次迭代计划会议讨论新需求
- D.在回顾期间讨论新要求



Scrum敏捷实践



在演示过程中，因为法规发生了变化，客户提供反馈并请求新的、紧急的增强功能。

敏捷项目经理下一步应该做什么？

- A. 与团队一起审查新要求，并要求他们开始着手处理
- B. 将新需求添加到迭代待办事项中
- C. 下次迭代计划会议讨论新需求
- D. 在回顾期间讨论新要求



Scrum敏捷实践

一名资深业务经理要求团队在当前的迭代周期中添加“非常重要”的一项。

作为该敏捷团队的Scrum Master，你应该怎么做？

- A.把该项添加进来，因为资深业务经理是关键利益相关方之一
- B.告知产品负责人，让产品负责人和资深业务经理可以一起工作
- C.把该项加到下一个迭代周期中
- D.把该项添加进来，但是和产品负责人及团队共同决定该把哪项剔除，以满足承诺



Scrum敏捷实践

一名资深业务经理要求团队在当前的**迭代周期**中添加“非常重要”的一项。

作为该敏捷团队的Scrum Master，你应该怎么做？

- A.把该项添加进来，因为资深业务经理是关键利益相关方之一
- B.告知产品负责人，让产品负责人和资深业务经理可以一起工作**
- C.把该项加到下一个迭代周期中
- D.把该项添加进来，但是和产品负责人及团队共同决定该把哪项剔除，以满足承诺



敏捷宣言——十二原则

你是一个项目经理，你的团队正在构建嵌入式系统的网络固件。你召集大家开会，向技术水平很高的一些业务用户和客户提供演示，在这个会上演示了团队为控制面板界面开发的最新版本的代码。这是你第5次开这种会向用户演示软件。而在这第5次会议上，用户和客户有提出了一些特定的变更。团队现在又得回去开发第6个版本，这个过程又得再来一次。以下哪种说法最准确地描述了这种情况？

- A.团队不了解需求
- B.用户和客户不知道他们想要什么
- C.这个项目需要更好的变更控制和需求管理实践
- D.团队做到了尽早交付和持续交付



敏捷宣言——十二原则

你是一个项目经理，你的团队正在构建嵌入式系统的网络固件。你召集大家开会，向技术水平很高的一些业务用户和客户提供演示，在这个会上演示了团队为控制面板界面开发的最新版本的代码。这是你第5次开这种会向用户演示软件。而在这第5次会议上，用户和客户有提出了一些特定的变更。团队现在又得回去开发第6个版本，这个过程又得再来一次。以下哪种说法最准确地描述了这种情况？

- A.团队不了解需求
- B.用户和客户不知道他们想要什么
- C.这个项目需要更好的变更控制和需求管理实践
- D.团队做到了尽早交付和持续交付



Scrum敏捷实践



Scrum框架中的五大价值观

五大价值观

承诺 (Commitment) —— 愿意对目标做出承诺

专注 (Focus) —— 全身心都用到你承诺的工作上去

开放 (Openness) —— 团队内所有信息对所有人开放

尊重 (Respect) —— 每个人都有他独特的价值和经验

勇气 (Courage) —— 勇于承诺，履行承诺，敢于说不

关于“专注”的补充：


团队成员**全职**，专注本项目；


清除障碍，使得团队成员专注项目事宜；

本轮迭代专注迭代待办列表，非必要不更换；



回顾：Scrum敏捷实践

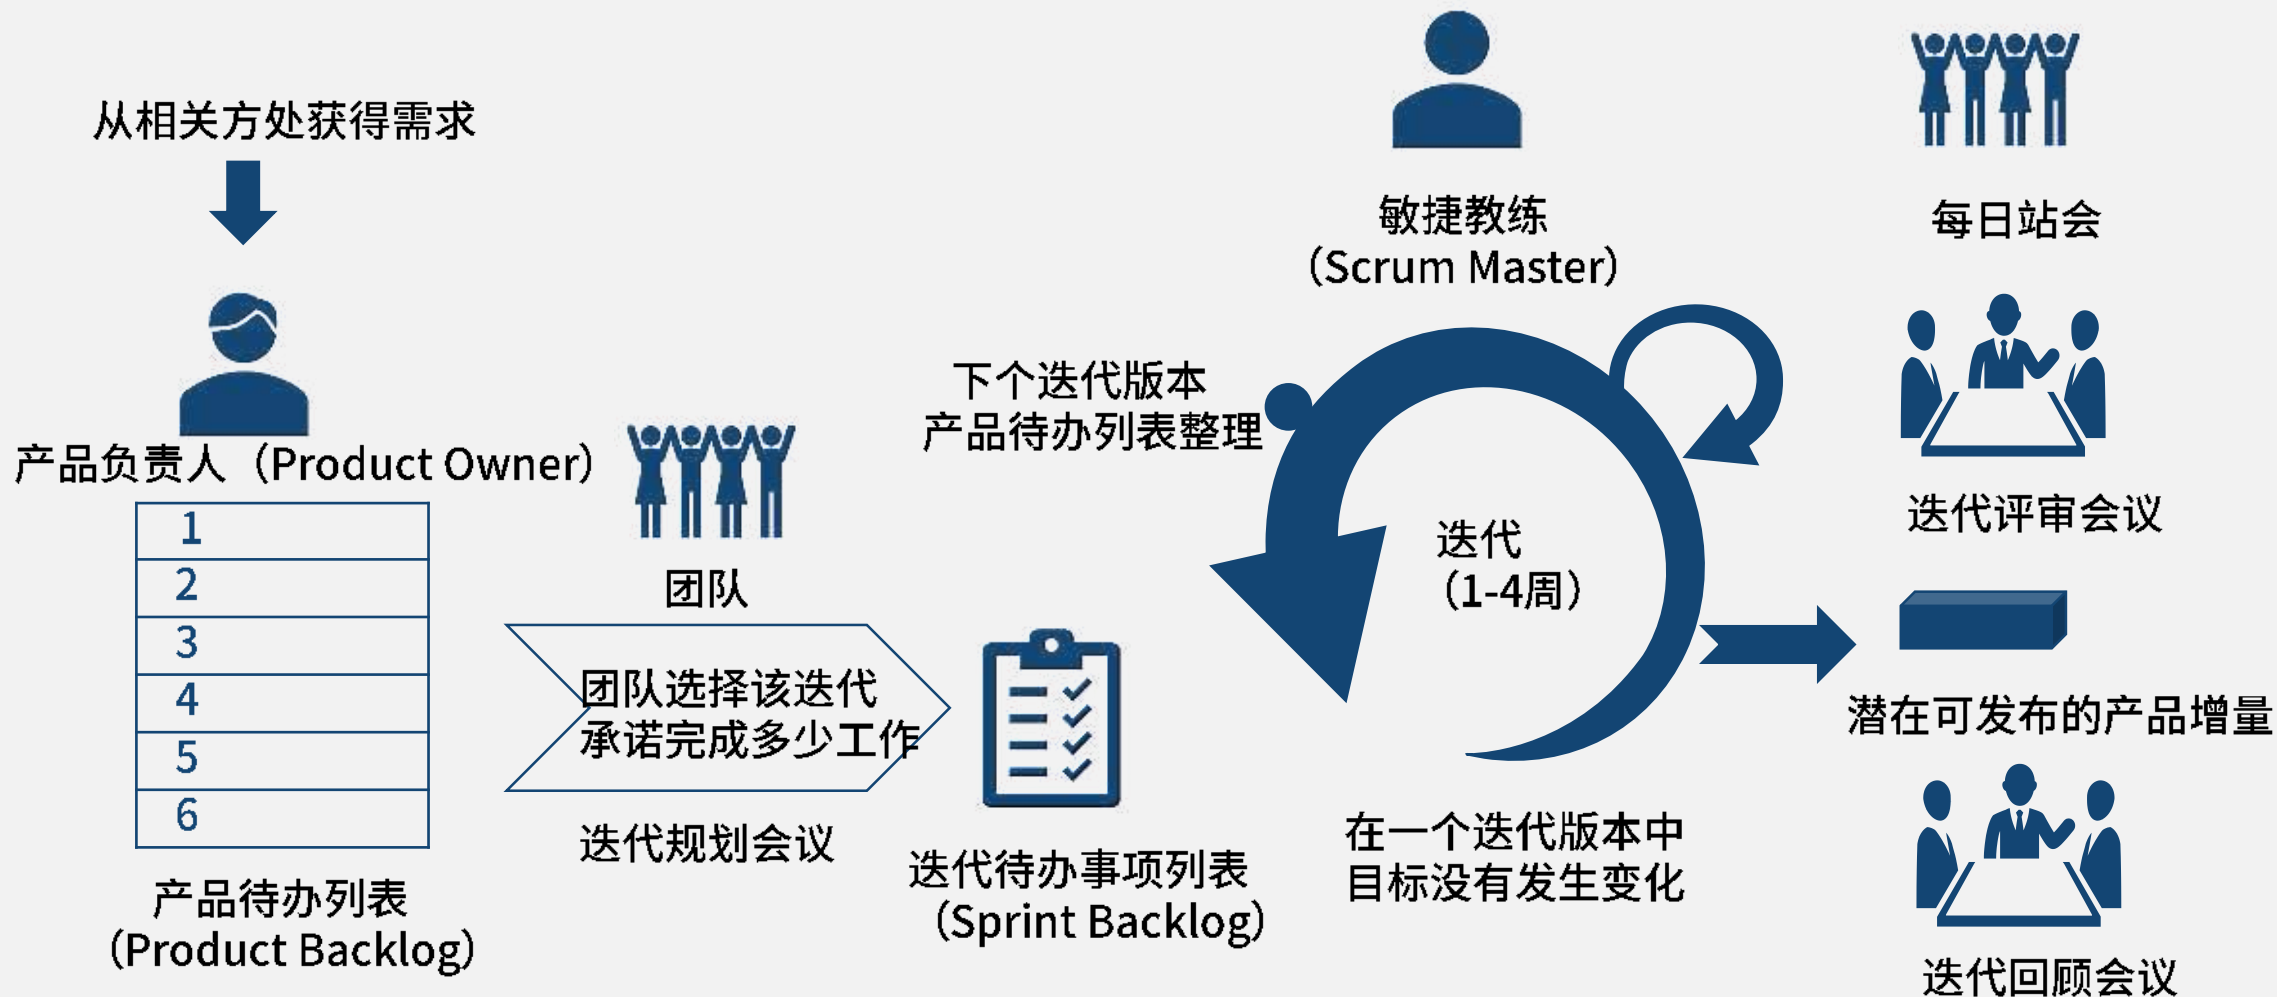



(=) 希赛 | 感谢您的观看
