

PMP 考点精粹之重点概念辨析

标准和制度的区别

在 PMBOK 指南第一章中，提到了“标准”：一种描述既定规范、方法、过程和做法的正式文件。和标准类似的概念是“规章制度”，二者的区别在于，“标准”是非强制的，可以选择的，如 ISO 推出的一系列标准，供全球各相关行业、企业参照，其执行力仅来自与 ISO 组织或标准本身的权威性，而不具有足够的强制性；“规章制度”是强制性的，是企业、部门、组织管理层根据自己实践、生产的需要，制定的一系列行为、工作准则，是必须遵守的。

项目集管理和项目组合管理的区别

项目集管理重点关注项目间的依赖关系，通过对彼此间存在内在联系的一系列项目的集中管理，实现项目集战略目标；

项目组合管理的目的是通过对其所有组成部分（项目集、项目和其他相关工作，但彼此间不一定存在必然联系）的审查，实现项目组合的价值最大化。

渐进明细和范围蔓延的区别

渐进明细是指信息越来越详细和估算越来越准确，而持续改进和细化计划。渐进明细是正常的，也是项目本身的一个特点，项目的范围不可能在开始的时候就非常清晰，需要不断地补充、细化、完善，这是客观规律。渐进明细不只是说范围，还包括项目管理计划的制定，项目费用、进度的估算，项目范围的确认等。

范围蔓延，简单的说，**没有得到有效控制的变更，就是范围蔓延**。造成范围蔓延的原因有两个方面，一个来自团队内部，一个来自团队外部（高层、客户、发起人或其他干系人）。因为没有通过正常的变更控制流程，导致项目范围发生改变，甚至范围失控。来自团队内部原因造成的范围蔓延又称为“镀金”，意指项目执行过程中，团队成员出于所谓“尽善尽美”，或为了讨好用户而不加控制的擅自增加产品功能、提高质量标准。来自团队外部原因造成的范围蔓延通常称为“范围潜变”，是说客户提出的小的，不易察觉的范围改变，如果不加控制，累计起来将导致项目严重偏离既定的范围基准，甚至导致项目失控和失败。

不论是范围潜变还是镀金，都应该是项目管理过程需要严加禁止的，一定要明确：项目成功的标志是“足够好”和“满足需求”，而不是“更好”和“完美”。而渐进明细是项目自身的特点，属于客观规律。

例：下列哪项说法不正确：

- A. 范围蔓延是未经评估对时间和成本的影响就增加的功能或服务
- B. 失控的变更通常指范围蔓延
- C. 范围蔓延与功能需求的渐进明细没有本质区别
- D. 范围蔓延并不一定总能提高客户满意度

正确答案是 C。

项目需求和产品需求的区别

项目需求包括商业需求、项目管理需求、交付需求等。产品需求则包括技术需求、安全需求、性能需求等

项目生命周期、项目管理生命周期和产品生命周期的区别

项目生命周期是各项目阶段的集合，阶段的名称和数量取决于参与项目的一个或多个组织的管理与控制的需要。通常来说，阶段是按顺序排列，但也存在互相的交叉，这种阶段交叠被称为“快速跟进”。项目生命周期根据不同项目的具体需要而不同。

项目管理生命周期由启动，规划，执行，监控，收尾等 5 大过程组构成，项目管理生命周期适用于任何项目。

产品生命周期包含通常顺序排列且不相交叉（注意与项目生命周期的区别）的一系列产品阶段，如市场调研、产品研发、量产、运营、维护、退市等。产品生命周期往往包括一个或多个项目生命周期。

项目进度管理计划和项目进度计划的区别

项目进度管理计划是项目管理计划的一部分，或者说是其中一个子计划，是在开始项目时间管理 6 个过程（定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划和控制进度）之前，项目团队开展规划工作的结果。PMBOK 指南指出，在进度管理计划中，确定进度计划的编制方法和工具，并为编制进度计划、控制项目进度设定格式和准则。由此可见，进度管理计划中并不包含项目具体进展、里程碑点等进度内容。

进度计划是指利用各种进度计划编制工具，如网络分析法、关键路径法、关键链法、资源平衡及相关项目管理软件等，在考虑资源约束的情况下，制定出一份标明各项活动的计划开始和结束时间，确定项目里程碑点的文件。被批准的进度计划就是进度基准，用来与实际的情况对比，得出项目进度绩效。

项目与日常运作的区别

项目与日常运作有着本质的区别。项目是一项独一无二的任务，任何项目都会具有一个最大的特点，那就是“一次性”，也就是说，一个项目完成以后，同样的项目就再也不会发生，区别的地方有：项目的大小、地点、时间、类型等等。而日常运作是连续不断、周而复始的重复活动，如食品厂每天制作蛋糕、邮递员每天送报纸，会计每天做账等等，这些活动都是反复进行的日常运作，并提供相同的产品、成果。

下表比较全面的体现了项目与日常运作的区别所在：

比 较 \ 名 称	项 目	日常运作
目 的	特殊的	常规的
责任人	项目经理	部门经理
时间	有限的	相对无限的
管理方法	风险型	确定型
持续性	一次性	重复性
特性	独特性	普遍性
组织机构	项目组织	职能部门
考核指标	以目标为导向	效率和有效性
资源需求	多变性	稳定性

主要项目干系人的区别

项目经理：是执行组织委派其实现项目目标的个人。项目经理领导项目团队，执行项目工作，并对项目目标的实现负责。项目经理最重要的工作是整合、协调，整合资源，协调各组织、部门、内外部客户，平衡众多项目利害干系人的利益，推动项目进展并完成。项目经理最重要的能力是沟通，包括团队内部的沟通，与管理层的沟通，与客户的沟通，与职能经理的沟通等等。项目经理可以不是技术专家，但是必须熟练掌握项目管理知识，项目管理知识的匮乏，项目管理混乱，是导致项目失败的最重要原因。虽然项目的成功必须要得到高层管理层的支持，但是作为项目经理，应该具备从高层获取支持的能力，所以两下相比，项目经理缺乏项目管理知识，项目管理水平不高，是导致项目失败的更主要原因。

在矩阵型组织中，团队成员虽然同是存在 2 个领导，即项目经理和职能经理，但是项目经理对团队成员的管理负有主要责任。如果团队成员之间发生冲突，或团队成员不能承担项目工作，项目经理负责协调沟通和安排技能培训，把问题推给职能经理，或要求换人的做法与项目经理积极主动的工作态度相违背，是不可取的。

高层管理层：是项目所在执行组织的管理部门，主要职责是从组织战略发展角度出发，审核项目的投资回报、价值、风险，确定项目是否可行。高层管理层掌握执行组织的全部资源，有权根据组织战略目标的需要，给不同的项目赋予不同的优先级，进而决定组织资源的流动方向。

发起人：发起人是指以现金或其他形式，为项目提供财务资源的个人或团体。简单说，**发起人就是项目出资人**。为项目提供资金支持（注意，不是资源）是发起人最主要的职责，除此外，在制定项目范围说明书，制定/批准项目章程和验收项目阶段及最终可交付成果等工作上，也起着重要作用。

职能经理：职能经理是企业的行政或职能领域承担管理角色的负责人。职能经理掌握拥有不同技能的人力资源，在组建项目团队的过程中，项目经理为了获得项目所需要的特定人力资源、有特殊技能的专家，需要同相关职能经理进行谈判，以说服职能经理为自己的项目提供必须的人员。在矩阵型组织结构中，职能经理和项目经理将分享权利，这有可能导致团队成员不得不向两个领导汇报工作，给项目团队的沟通带来障碍。在项目工作中，项目经理决定“如何做”，而职能经理决定“谁来做”。

客户/用户：客户/用户是将使用项目产品、服务或成果的个人或组织，可能来自执行组织内部，也可能来自执行组织外部。客户/用户的重要职责是对**项目可交付成果的接受，及正式验收**。而前期详细、全面、准确的收集客户需求，规划质量标准，并得到客户/用户的认可，是确保项目成功的重要保障。在项目执行过程中，客户/用户可能提出针对项目范围、质量、进度、成本等方面的变更需求，认真管理变更，确保只有通过整体变更控制流程认可的变更才被执行，是项目团队的重要工作。在现代项目管理中，客户/用户的满意度越来越被重视，项目团队应该定期，以及在项目收尾阶段了解他们的满意程度，并记录在案，是组织过程资产的重要组成部分。

卖方/业务伙伴：卖方又称为供应商、供房或承包方，是根据**合同协议**为项目提供组件或服务的外部公司。合同关系的法律特性决定了甲乙双方或多方之间的约束是双向的，包括买方有义务为卖方提供的产品、服务或成果支付费用，卖方有义务根据合同条款提供符合要求的合同标的物。即使由于内、外部环境、条件的改变，继续履行合同不再对某一方有利，合同条款也必须得到执行，除非经合同各方认可，相关合同条款才能被改动。

组织结构的区别

组织结构是一种事业环境因素，可能影响资源的可用性，并影响项目管理模式。考试中涉及到的组织项目包括**职能型、矩阵型和项目型**。其中矩阵型又分为弱矩阵、平衡矩阵和强矩阵。弱矩阵的特点更偏向于职能型，强矩阵更偏向于项目型。**如果题目中没有明确说明，则默认为平衡矩阵。**下面就这几种组织结构的特点和区别分别介绍。

职能型组织：职能型组织是最为传统和常见的组织形式，主要特点是组织内部存在自上而下的管理隶属关系，因而也被称为直线型组织。在职能型组织内部，一般没有专职的项目经理，每名雇员都有1位明确的上级领导，组织内按不同专业划分部门。**职能型组织最大的优点是可以兼顾项目和职能工作，缺点是容易忽视项目工作。**这种组织形式适用于工作内容单一，不需要跨专业，跨部门的简单项目。

矩阵型组织：矩阵型组织最大的特点是跨职能部门，有全职的项目经理，团队成员是根据项目工作需要临时从不同的职能部门招募的，如果组织内部缺乏拥有必要技能的人员，则需要从外部聘用。**虽然平衡矩阵型组织承认全职项目经理的必要性，但并未授权其全权管理项目和项目资金，项目经理和职能经理都对项目有一定的职责与职权。**他们之间分工的原则是：项目经理负责做什么，什么时候做，为什么要做，以多大成本做；而职能经理负责由谁来做以及怎么做的问题。所以团队成员除了对项目经理负责外，还要向自己的职能经理汇报，**这使得组织内部的沟通变得复杂。**矩阵型组织最大的优点是资源使用率高，缺点是沟通与管理工作复杂。这种组织形式适用于跨职能部门的，相对复杂的项目。

项目型组织：项目型组织中的项目经理拥有很大的**自主性和职权**，可以调动和支配所在组织的资源，用于项目工作需要。组织中的各个部门直接向项目经理汇报，或为各个项目提供支持服务。**项目型组织的优点是项目经理的权限大，对资源有控制权，但缺点是容易造成资源配置失衡，导致资源使用率低。**这种组织形式适用于需要高度控制资源，**规模大，风险程度高的项目。**

下表清晰的描述了各种组织类型的特点和区别：

组织结构		矩阵型			
项目特征	职能型	弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	项目型
项目经理的职权	很少或没有	有限	小到中	中到大	大到几乎全权
可用的资源	很少或没有	有限	少到中	中到多	多到几乎全部
项目预算控制者	职能经理	职能经理	职能经理与项目经理	项目经理	项目经理
项目经理的角色	兼职	兼职	全职	全职	全职
项目管理行政人员	兼职	兼职	兼职	全职	全职

项目联络员和项目协调员的区别

在职能型组织中，一般没有专职的项目经理，即使设立了相关岗位，往往也是以项目联络员的身份出现，通常被赋予沟通协调的职责，但既不能直接向高层领导汇报，也没有决策权。在弱矩阵组织中，这一职务称为项目协调员，虽然可以和高层领导汇报，但是依然没有决策权。

项目管理过程组和项目阶段的区别

根据各项目管理过程之间的整合、相互作用以及不同用途，将这些过程归纳为 5 类，即启动、规划、执行、监控和收尾 5 大过程组。项目管理过程组是项目管理自身特性决定的，这 5 大过程组之间有清晰和确定的相互依赖关系，在每个项目上通常都按相同的顺序进行，与应用的领域或行业无关。

为有效完成某些重要的可交付成果，在需要特别控制的位置将项目分界，就形成项目阶段。项目阶段大多是按顺序完成的，但在某些情况下也可以重叠。

将项目人为划分阶段，完全是出于便于有效管理、规划和监控的目的，所以项目的阶段划分是由具体项目的需求、特点决定的，不同的项目有不同的项目阶段。任何一个项目阶段都要有相应的阶段成果，成果的完成是阶段结束的标志。

项目阶段不同于项目管理过程组，每个项目阶段一定程度上可以看做一个“子项目”，因此不论这个项目阶段的名称是什么，具体执行时都要用到项目管理全部 5 大过程组，42 个过程的知识与技能。

阶段与阶段之间通常存在 3 种基本关系：顺序关系（依次完成，无法压缩进度）、交叠关系（可以“快速跟进”以压缩进度，但引入了风险）和迭代关系（走一步看一步，应用与不明确、不确定或快速变化的环境中，不利于长期规划）。在多阶段项目中，上述三种关系可能都有出现。

例：公司新产品研发项目处于市场调研阶段，应该使用哪种项目管理知识与技能：

- A. 规划过程组的全部过程
- B. 执行过程组的全部过程
- C. 启动过程组的全部过程
- D. 全部 5 大过程组的 42 个过程

正确答案是 D。虽然题目中说明的具体项目处于“市场调研”阶段，但对于整个新品

研发项目来说，只是其中一个项目阶段，一个子项目，应该使用全部 5 大过程组的全部 42 个过程加以管理。

焦点小组会议和引导式研讨会的区别

焦点小组会议和引导式研讨会都是项目范围管理知识领域收集需求过程的工具，其中焦点小组会议是把相关干系人、专家集中在一起，由专业的主持人引导大家就产品、服务或成果的期望和态度进行沟通。

引导式研讨会和焦点小组会议相类似的地方是也有主持人把控，但最显著的特征是，参与会议的人一定是跨职能部门的干系人。这种会议方式由于同时引入了不同职能部门人员参与，因而更容易发现问题，比单一的会议能更快的发现和解决矛盾，效率更高。

引导式研讨会的典型实例是软件行业的“联合应用开发”（JAD）和制造行业的“质量功能展开”（QFD）。

观察法和原型法的区别

观察法和原型法都是项目范围管理知识领域收集需求过程的工具，二者也都是通过体验，获得和理解干系人的真实、准确需求。其区别是，观察法是项目团队成员通过工作跟踪，从外部观察使用者的工作，体验流程或程序的实施方式，以便挖掘出隐藏的需求；原型法是在正式制造产品之前，项目团队先期为用户提供实用模型、原型机，让用户自己体验，并根据用户的体验感受不断修正模型和样机，通过渐进明细的方式，最终理解客户的真实需求。

项目工作说明书和项目范围说明书的区别

项目工作说明书（SOW）是制定项目章程过程的输入，是对项目所需交付的产品、服务或成果的叙述说明。项目工作说明书由项目团队以往的发起人、组织、客户等提供，内容相对简单，是对可交付成果简要介绍，主要包括项目的业务需求、产品范围的大致描述和项目所在组织的战略规划。

项目范围说明书是定义范围过程的输出，它详细描述项目的可交付成果，以及为提交这交付成果而必须开展，且仅需开展的工作。项目范围说明书的编制由项目团队完成的，是项目干系人之间就范围所达成的共识，主要包括产品范围描述、验收标准、项目除外责任、项目的制约因素和假设条件。

项目工作说明书和项目范围说明书，前者简略，后者详细，前者由项目团队以外的组织、发起人、客户提供，后者有项目团队共同编制。对它们的区分，要抓住上述特点。例如：

项目已经结束，但是客户不接受可交付成果。项目经理应该查看那份文件：

- A. 项目管理计划
- B. 项目范围说明书
- C. 项目工作说明书
- D. 项目章程

客户不接受可交付成果，说明客户要求和最终的可交付成果之间出现了偏差，应该查看关于可交付成果的最完整、准确的描述，项目工作说明书和项目章程中虽然有关于可交付成果的说明，但是内容都比较简略，项目管理计划是关于如果组织、管理项目各个过程、阶段的工作，确保项目进展符绩效要求，其中没有关于具体可交付成果的描述，所以正确答案是 B。

工作包和活动的区别

工作包是项目范围管理知识领域中，创建 WBS 过程的输出—工作分解结构的最底层单元。在这个分解过程中，被分解的对象是项目的可交付物，虽然叫“工作分解结构”，但是这里的工作是指经过努力而取得的产品、服务或成果，而不是“努力”，所以分解得到的工作包，也是精细化、具体化的可交付成果，是名词。可交付成果的分解通常遵循如下原则：分解层级一般控制在 5 层以内，完成每个工作包的工作时间控制在 80 小时以内（按每天工作 8 小时计算，即不超过 10 个工作日）。

活动是指为了完成工作包而必须开展的工作，是对工作包进一步分解的产物，是项目时间管理知识领域中，定义活动过程的输出。WBS 中的每一个工作包都要分解成活动，通过这些活动来完成可交付成果，所以分解得到的活动都是动词。活动是开展估算、编制进度计划以及执行和监控项目工作的基础。

产品范围和项目范围的区别

产品范围定义、描述的是产品、服务或成果的特性和功能，是以客户要求的产品需求为衡量标准。项目范围是为提供具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作。在确定范围时首先要确定最终可交付成果是什么，它具有哪些可清晰界定的特性。要注意的是特性必须要清晰，准确，能被项目参与人理解，绝不能含混，在此基础上才能进一步明确需要做什么工作才能产生所需要的产品。也就是说产品范围决定项目范围。

产品范围是否完成以产品需求作为衡量标准；项目范围是否完成以项目管理计划作为衡

量标准。

产品核实与范围核实的区别

产品核实关注的是生产项目预定产品的全部工作是否全部正确完成，产品是否符合相关质量要求标准，通常是对可交付成果的内部验收。

范围核实关注的是客户对已经完成的可交付成果的接受程度，是在项目监控过程中对可交付成果的外部验收。

节点图（紧前关系绘图法）和箭线图的区别

紧前关系绘图法是一种成熟的，应用非常广泛的的项目进度活动排列工具，特点是用方框或矩形（称为节点）表示活动，用代表逻辑关系的箭线连接活动的进度网络绘图法，又称节点图（AON）。与之类似的另一种进度网络图是箭线图（AOA），是用箭线表示活动，用圆圈进行连接。虽然在 PMBOK 指南第四版中不再提及箭线图，但考试时还有相关概念出现，应该对这两种绘图法的区别有所了解。

PDM 包括 4 种依赖关系，也叫逻辑关系：

完成到开始（FS）。紧前活动完成了，紧后活动才能开始，是最长见的逻辑关系，如烧好了水才能泡茶，烧水和泡茶这两个活动之间就是完成到开始的关系；

完成到完成（FF）。紧前活动完成了，紧后活动才能完成，如学生通过了毕业答辩，大学生活就结束了，通过答辩和大学毕业这两个活动就是完成到完成的关系；

开始到开始（SS）。紧前活动开始了，紧后活动才能开始，如工厂开始减少排出污水，河水的污染状况才能开始得到缓解，减少排污与河水污染缓解这两个活动之间就是开始到开始的关系；

开始到完成（SF）。紧前活动开始了，紧后活动才能完成，这种关系很少用到，只是为了保持 PDM4 中逻辑关系的完整，才将“开始到完成”列出。

AOA 图用箭线表示活动，并将活动写在箭线上，箭线尾表示活动开始，箭线头表示活动结束。这些表示活动的箭线通过叫做事件的圆圈连接起来。在 AOA 图中，只使用最常见的完成到开始（FS）关系，并且有“虚活动”的应用。所谓虚活动，是一种特殊的活动，它不消耗时间，仅仅为了表示活动间的逻辑关系，这在 PDM 图中是没有的。根据上面两点，就可以准确区分节点图和箭线图的差别了。

例：在一个项目进度网络图中，活动 A 和活动 B 是结束到开始的关系，活动 C 和活动

B 要同时开始，活动 D 在活动 C 结束后延迟 2 天开始，这个网络图是用什么方法绘制的：

- A. 紧前关系绘图法
- B. 箭线法
- C. 关键路径法
- D. 关键链法

正确答案是 A。从题目中可以知道活动 C 和活动 B 是开始到开始的关系，箭线法只使用结束到开始的关系，而 C 和 D 的选项与题目无关。

强制依赖关系和外部依赖关系的区别

强制依赖关系又叫硬逻辑关系、物理依赖关系，它们往往涉及一些实际的限制。如先计划、再生产；先地基、再盖楼；是活动本身的特性决定的，是刚性的。另外，合同中规定的，需要执行的条款，也属于强制依赖关系，不能随意改动。

外部依赖关系指涉及外部组织的，项目以外的，项目团队无法控制的约束，如政府的法律、法规等。例如工程的开工必须要通过政府环境测评，节假日的加班必须提前得到类似工会组织的批准等。

强制依赖关系是项目活动自身客观规律决定的，外部依赖关系多是项目外部组织、部门人为设定的，项目团队无法改变。

虽然合同也是法律文件的一种，必须要遵守，但是合同属于项目内部文件，所以也属于强制依赖关系，而不是外部依赖关系，要注意区别。

类比估算和参数估算的区别

类比估算和参数估算都是估算活动的工具与技术，包括估算活动时间，估算成本等过程中都有应用。类比估算是以过去类似项目的参数值为基础，来估算当前项目或未来项目的同类参数。采用类比估算实际上是把和当前类似以往项目数据照搬过来，直接应用。这种方式通常在项目早期，信息不足的情况下使用。类比估算的优点是耗费时间短，成本低，但估算的结果准确性较差，属于**粗略估算**。如果用于参考的项目与当前项目有本质的相似，而且参与估算的人员有足够的专业知识和经验，则这种估算结果也是可靠的。

参数估算也是参照过去的项目经验，但是与类比估算最大的区别是参数估算方法有成熟的数学模型或公式，通过套用公式，计算得出结果。参数估算通常适用于重复性的工作，如修路、搬砖、铺设电缆等。参数估算的准确性取决于**参数模型的成熟度和基础数据的可靠性**。

资源日历、资源直方图及责任分配矩阵的区别

资源日历是站在资源角度，说明相关人员、设备、物资等什么时间可投入项目，什么时间不可用或休息。资源日历中要列出资源的属性，包括经验和/或技能水平，以及资源的来源等信息。资源日历是估算活动资源过程的输入，组建项目团队过程的输出，实施采购过程的输出。

与资源日历概念类似，还有项目日历和自然日历。项目日历是指开展项目工作的基准日历，不含节假日；自然日历是自然时间标段，包括工作日和节假日，这两种日历仅仅表达时间概念，与项目资源无关。

资源直方图是站在项目的角度，说明项目工作对具体资源的需求，包括在整个项目期间每周（或每月）需要某人、某部门或整个项目团队的工作小时数。资源直方图是制定进度计划过程、制定人力资源计划的输出（人员配备管理计划的组成部分）。

责任分配矩阵显示工作包或活动与项目团队成员之间的联系，说明哪项工作由谁负责。可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免混乱。责任分配矩阵的典型应用是RACI（执行、负责、咨询和知情）图，用以具体说明每个人在具体工作中的职责差别。责任分配矩阵是规划质量过程的输出（项目文件的组成部分），是制定人力资源计划的工具。

上述概念在考试中通常会以如下方式出现：

某项目团队关键成员向你提出在下周的前3个工作日请假的需求，为了不影响可交付成果的按时提交，在批准他的请求之前，你需要查看：

- A. 资源日历
- B. 项目进度计划
- C. 资源直方图
- D. 责任分配矩阵

为了保证项目进展不受影响，应该从项目工作出发，检查项目工作在他请假的时段是否对他有需求，所以应该查看资源直方图，正确答案是C。

活动资源需求和资源分解结构（RBS）的区别

活动资源需求和资源分解结构（RBS）都是估算活动资源过程的输出。活动资源需求是从项目角度出发，以活动清单为依据，通过估算活动资源过程，识别出工作包中每项活动所需资源的类型和数量，列出对应于活动清单的资源匹配并完成汇总，得到每个工作包的资源

估算。

资源分解结构是站在资源的角度，按资源类别和类型而划分的资源层级结构。具体类别包括：人力、材料、设备和用品。资源类型包括：技能水平、等级水平或适用于项目的其他类型。

例如：

虽然你负责的项目规模不大，但是为了避免在以前项目中出现过的，项目执行到一边，才发现需要的重要设备没有被提前预定，你带领全体团队成员，用了一个下午的时间，把各个工作包充分的做了分解，得到了一份有关项目所需设备的正式文件，并将据此向组织提出使用申请。这个文件是：

- A. 资源需求
- B. 资源分解结构
- C. 资源日历
- D. 资源直方图

根据题目中的描述，所需设备是针对项目工作需要的，而且并没有涉及到具体设备的使用时间，已经项目在什么阶段需要使用什么设备等信息，所以是资源需求。正确答案是A。

关键路径法和关键链法的区别


关键路径法和关键链法都是制定项目进度计划的工具，从概念定义上来说，关键路径法是指在不考虑任何资源限制的情况下，在给定的活动持续时间、逻辑关系、时间提前量、时间滞后量和其他制约因素下，可开展各项活动的时间段，是由总时差为0的各个活动组成的活动序列。关键路径法是工作安排尽早开始。

关键链法是在考虑资源限制后，制订的符合资源情况的进度模型，特点是为影响进度的资源风险集中预留缓冲时间。活动历时先使用确定估算（即关键路径法），再采用概率估算（降低活动历时完成概率），在确定关键路径后，将资源的有无与多寡的情况考虑进去，确定资源限制进度计划。这种资源限制进度计划经常改变项目的关键路径。帕肯森定律：工作总是拖延到它所允许最迟完成的那一天。原因： 主观原因：没有压力就没有动力； 客观原因：没有激励就没有动力；避免的方式：安全裕量（浮动时间）不要放在具体的活动上，而是集中管理。

总浮动时间和自由浮动时间的区别

总浮动时间（也称为总时差）是指整个项目的最后一项活动的最早完成时间与项目要求的完工时间的差值。总浮动时间为正，说明进度计划不但可以满足项目按时完成的要求，而且还可以进一步压缩。总浮动时间为负，说明项目进度不能满足项目按时完工的要求，需要通过赶工等进度压缩技术才能弥补时间的差距。如某项目要求100天完成，进度计划规划105天才能完成，总浮动时间就是-5天。如果进度计划规划97天完成，总浮动时间就是+3天。如果进度计划规划也是100天完成，总浮动时间就是0。关键路径就是总浮动时间为0或负的路径，也即，关键路径法是一个时间约束性的进度计划规划方法，中间没有喘息的机会。关键路径法不考虑资源的约束。

自由浮动时间（也称自由时差）指某项活动在不影响其紧后活动最早开始时间的情况下可以延迟的时间量。是指向同一活动的各项活动总浮动时间之间的相对差值。既然自由浮动时间是指向同一活动的各项活动的总浮动时间的相对差值，那么只有两项或更多项活动指向同一活动时才存在自由浮动时间。自由浮动时间总是正值。下图，活动A的自由浮动时间为2天。



赶工和快速跟进的区别

赶工是指投入更多的资源，加快工作进度，进而缩短工期，如加班、增加人员、投入额外的费用。并不是所有工作都可以通过赶工压缩进度，赶工一般只对简单重复的工作有效，比如卸货，修路，挖沟等。一般情况下，赶工有可能导致风险和/或成本增加，但是如果当成本与项目持续时间有直接关联时，比如项目工作需要从组织外部聘请，按工作日计薪的技术专家，通过赶工，缩短工作周期，有可能节省成本。

快速跟进把原来应该串行的工作在一定程度上并行执行，比如大楼设计方案没有全部完

成的时候就开始挖地基。**快速跟进可能导致返工和风险增加。**

赶工和快速跟进都是进度压缩技术，两种方法相同的地方是，都不改变项目范围，都是针对关键路径上的活动，都可以缩短项目的进度时间，都可能引入风险。一旦压缩了历时，就要重新检查关键路径，压缩后可能出现新的关键路径。

直接成本和间接成本的区别

直接成本是指生产某种产品或提供某项服务时支付的直接费用，如原材料、人员工资支出等。某一时期(如一年)的直接成本总额随项目可交付成果的变化而变化，且随产量的增加大体上成正比增加，所以接成本又称为可变成本。

间接成本是指项目可交付成果生产费用发生时，不能或不便于直接计入某一成本计算对象，而需先按一定的分配方法，分摊到组织各个项目中的成本费用。车间房屋建筑物和机器设备的折旧、租赁费、修理费、机物料消耗、水电费、办公费等，通常属于间接成本。

制约因素和假设条件的区别

制约因素和假设条件存在于项目范围说明书中，制约因素是指已经客观存在的，对项目范围、成本、进度、人员选择等方面起限制、约束作用的因素。如客户或执行组织事先确定的预算、强制性日期或强制性里程碑（如果把北京奥运会的开幕式看做一个项目，开幕日期定在2008年8月8日，就是一个制约因素）。如果项目是根据合同实施的，那么合同条款通常也是制约因素。

假设条件是指当前不能确定的，假定为正确、真实或确定的因素。假设条件存在不确定性，影响到项目规划的所有方面，也是风险的重要来源。

制约因素和假设条件都会限制项目的灵活性，二者最大的区别就在于制约因素是确定的，客观存在的，而假设条件是当前不能确定的。作为项目范围基准的一部分，制约因素和假设条件是**定义活动、估算活动持续时间、制定进度计划、估算成本、制定预算、识别风险和规划采购等多个过程的输入。**例如：

以下哪个不是项目中常见的制约因素：

- A. 有限的预算
- B. 团队沟通不畅
- C. 规定的交付日期

D. 缺少可用的熟练资源和组织政策

正确答案是B。因为团队沟通不畅是团队组建早期的正常现象，随着成员之间磨合与适应，这种情况会逐渐好转，因此不属于项目制约因素。

应急储备、管理储备、项目预算及项目资金需求的区别

应急储备是估算成本过程中确定的，应对已知的未知风险（事先已经被识别出来的风险，但是不知道该风险发生的概率或影响），是项目成本基准的一部分，项目经理有权使用。一般情况下，应急储备的使用影响成本基准。

管理储备是制定预算过程中确定的，应对未知的未知风险（事先无法识别的风险，当然更无法知道发生的概率和影响），是项目成本基准之外的，项目经理需向高层管理层申请，并经批准后才能用。管理储备的使用不影响成本基准。

一般意义上的项目预算即项目完工预算（BAC），只包含基于WBS的成本估算和应急储备，并不包含管理储备。即：

项目预算(BAC)=基于WBS的成本估算 + 应急储备，经批准后即成为成本基准，是考核项目成本绩效的依据；

项目总资金需求=经批准的项目预算(BAC) + 管理储备。

偏差分析和趋势分析的区别

偏差分析是控制范围、控制进度、控制成本、报告绩效、监控风险等过程的工具与技术。是把实际项目绩效与计划或预期的绩效相比较，根据偏离程度决定是否采取纠正、改进等措施。

趋势分析是控制成本、控制质量和监控风险的工具与技术。是通过对项目绩效随时间的变化情况进行分析，推断绩效的发展趋势。

偏差分析是用当前的绩效数据判断当前的项目状态，趋势分析是用一段时间内的绩效进展情况推断今后的项目状态，含有有预测的成分。

完工预算（BAC）、完工估算（EAC）和完工尚需估算和的区别

项目预算决定了被批准用于项目的资金，这个被批准的预算考核项目成本绩效的基准。完工预算是在项目启动前作出的，并没有实际工作绩效可以参考，是通过对WBS工作包中活动成本进行估算，然后自下而上的汇总，最终得出整个项目的总成本，加上应急储备后就是项目完工预算。

完工估算是在项目已经启动，根据当前实际工作绩效估计的完工费用。由于工作进展期间的不确定因素影响，实际成本绩效可能偏离最初的完工估算（BAC），如果偏差过大，原绩效基准就需要用当前的完工估算（EAC）取代，成为新的成本基准。

完工尚需估算ETC指的是从进行估算的当前时间点到完工这段时间内的工作全部完成需要多少资金的一个估算值。

针对不同情况，完工估算和完工尚需估算有不同的计算公式，详见 PMP考点精粹之计算题解析。

质量和等级的区别

美国著名的质量管理专家朱兰（J.M.Juran）博士从顾客的角度出发，提出了产品质量就是产品的适用性，即产品在使用时能成功地满足用户需要的程度。用户对产品的基本要求就是适用，适用性恰如其分地表达了质量的内涵。从这个角度说，质量水平没有达到质量要求肯定是个问题，因为不能满足用户的需求。

等级在PMBOK指南上被解释为“对用途相同但技术特性不同的产品或服务的级别分类”。通俗的说，如果说丰盛的宴席是高等级的，那么路边大排档就是低等级的，虽然二者差别巨大，但是由于分别面对不同的客户群体，对应于特定的客户，低等级也是可以接受的，这一点和质量有所不同。

精确和准确的区别

精确是指重复测量的结果非常聚合，离散度很小。

准确是指测量值非常接近实际值。

精确不一定准确，准确也不一定精确。用一个例子可以很形象的说明二者的区别：如果一支枪面对靶子射出10发子弹，而在靶子上只留下了一个弹孔（10发子弹全部穿孔而过），但是弹孔却偏离了靶心，这支枪就是精确而不准确的。如果10发子弹都射中了靶心，却留下了10个弹孔，这支枪就是准确而不精确的。

规格上下限和控制上下限的区别

在控制图中，有2类控制线，分为规格上下限和控制上下限。其中规格上下限是根据合同要求制定的，代表可允许的最大值和最小值。

控制上下限是由项目经理和相关干系人设定的，反映了必须采取纠正措施的位置，以防止实际值超出规格界限。

在控制图中，规格线在外，控制线在内，控制线通常设定在 $\pm 3\sigma$ 的位置。

规格上下限是合同规定的，是刚性的，不能超越，控制上下限是项目团队确定的，出于监控项目过程是否受控的目的，和规格上下限相比，有一定的余量。

实验设计和敏感性分析的区别

实验设计是一种统计方法，识别哪些因素会对正在开发的流程或正在生产的产品特定变量产生影响。重要特征是系统的改变所有重要因素，而不是每次只改变一个因素。实验设计是规划质量的工具之一。

敏感性分析是实施定量风险分析的工具之一，用于确定哪些风险对项目具有最大的潜在影响。特点是每次只改变一个变量，来考察这个变化对目标产生多大的影响。

这两种工具的最大差别是实验设计每次改变多个变量，敏感性分析每次只改变一个变量。

属性抽样和变量抽样的区别

统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查，属性抽样与变量抽样同属于统计抽样技术，是质量规划、质量保证、质量控制的工具。属性抽样的结果或为合格，或为不合格，变量抽样是在连续的量表上标明结果所处的位置，以此表明合格的程度。例如：通过抽样检测，一批产品95%在可接受的范围内，这是属于属性抽样还是变量抽样呢？根据上面的定义，应该是变量抽样。

质量保证和质量控制的区别

质量保证和质量控制是一对比较难区分的概念，以往的考试中也多次出现过针对这两个概念的辨析题目，比如给出一个情景描述，让你判断这个动作是质量保证还是质量控制。下面将对质量保证和质量控制分别详细说明。

实施质量保证是执行过程组的一个过程，PMBOK指南上对实施质量保证的定义是：审计质量要求和质量控制测量结果，确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。简单说，质量保证关注的是与质量活动相关的政策、制度、流程、规范等。如某个生产过程中因为少了一道检测环节，或检测过程不合理，比如抽样率过低，导致产品的废品率升高，将这个缺失的环节进行补充，重新修正抽样率之后废品率回落到正常范围。这个弥补缺失环节，修正抽样率的动作就是质量保证。

质量控制是监控过程组的一个过程，PMBOK指南上对质量控制的定义是：检测

并记录质量活动的结果，从而评估绩效并建议必要变更的过程。质量控制活动可识别造成过程低效或产品质量低劣的原因，并建议和/或采取措施来消除这些原因。具体说，**质量控制是针对项目活动或项目可交付成果的具体的质量问题，质量缺陷，发现并给以消除。**如具体解决软件中的BUG，发现并修复机器零部件的缺陷，使之恢复正常工作等。

实施质量保证的对象更宏观，如果涉及整体项目，就是质量保证；质量控制的对象相对更具体，如果涉及项目的具体工作成果，就是质量控制。

如果**涉及经验教训的汲取或组织过程资产的更新，是在做质量审计，属于质量保证工作。**如果**涉及具体工作成果是否可以被接受，就是质量控制。**

如果涉及对项目质量标准重新评价，以确认它们是否仍然适用，就是质量保证（属于制度、政策层面），如果涉及具体工作成果是否符合具体的质量标准，就是质量控制。

如果在实施阶段，就是质量保证，如果是项目监控阶段，就是质量控制。例如：

你受聘于一家生产计算机零部件的小公司，协助质量部门制定和优化流程。你发现这家公司虽然有一些人在从事与产品质量相关的工作，但是都是兼职的，而且似乎最终产品的废品率并没有因为一些制度、要求的颁布而有明显的下降。你找到总经理，用了一个上午的时间向他说明产品质量对企业生存和发展的意义。最终总经理同意，由你牵头成立一个独立的质量管理小组。你所做的工作属于：

- A. 质量规划
- B. 质量控制
- C. 质量保证
- D. 质量管理

你做的事情是制定企业的质量制度，优化流程，属于质量保证工作，正确答案是C。

再比如：

全新设计的自行车生产线即将投入运行，一名经验丰富的工程师及时发现并调整了生产线上2处不起眼的设备参数，事后证明，这2个参数的调整避免了关键零件的尺寸误差超出允许范围，有效保证了成品质量的废品率处于可接受范围。这个调整工

作属于：

- A. 质量规划
- B. 质量控制
- C. 质量保证
- D. 质量管理

题目中虽然有“保证了成品质量”的字眼，但是从内容看，是针对具体问题的解决，因此属于质量控制，而不是质量保证。正确答案是 B。

预防和检查的区别

预防和检查是实施质量控制的工具。预防是保证过程中不出现错误，检查是确保错误被及早发现，不会落到客户的手中。

公差和控制界限的区别

公差和控制界限也和实施质量控制有关，公差是指结果的可接受范围，比如零部件的加工精度在 ± 0.01 毫米，实测值只要落在这个范围内，零件的加工精度就是可以接受的，可以认为是合格的。

控制界限是显示过程是否失控的临界值，超过这个界限，就认为过程是失控的。二者的区别是，公差针对结果，而控制界限是针对过程。

绩效报告和工作绩效信息的区别

绩效报告是对收集到的信息进行组织与归纳，并通过与绩效测量基准的比较，来分析和展示绩效。绩效报告是正式的，主要向外部干系人提交的项目过程文档，要有对比，有分析，有结论，并定期提交，如工程项目日/周/月报等。绩效报告是报告绩效过程的输出。

工作绩效信息是从项目活动中收集的实施情况信息。相对于经过组织、归纳的绩效报告，工作绩效信息更像原材料，是没有经过加工的原始信息，可以包括项目活动过程中的各种状态、进展、阶段的情况。工作绩效信息可以内部共享并相互传递，但不适合直接提供给外部干系人。工作绩效信息是报告绩效过程的输入。


发布信息 and 报告绩效的区别

发布信息是沟通管理知识领域中执行过程组的过程之一，报告绩效是沟通管理知识领域中监控过程组的过程之一。

发布信息发布的是在项目执行过程中自然产生的各种过程信息；而报告绩效是则是经过汇总、分析和整理后的项目信息。报告绩效是一种特殊的信息发布，即发布关于项目的成本、进度、范围等绩效信息，包括与项目计划基准的对比，根据当前进展情况，对项目未来趋势的预测，已经针对当前偏差的建议、预防措施和纠正措施。

风险分解结构（RBS）和风险概率影响矩阵的区别

风险分解结构是按风险类别和子类别来排列已识别的项目风险的一种层级结构，显示潜在风险的所属领域和产品原因。**风险分解结构**只给出可能产生风险的原因（方面），而不包含具体的风险内容，如对风险发生状况的描述，对风险后果的预计等等。

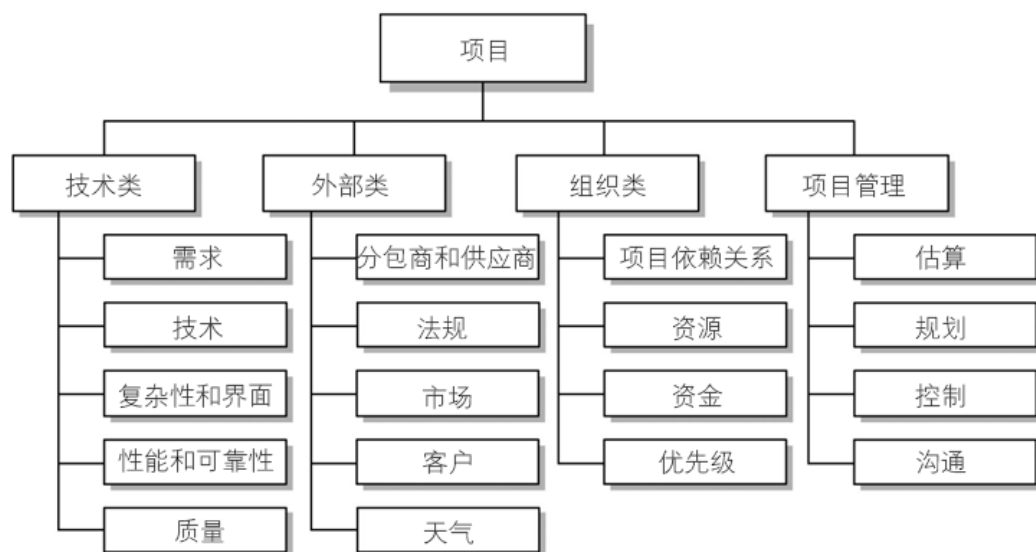

本风险分解结构（RBS）列出了一个典型项目中可能发生的风险类别和子类别。不同的RBS适用于不同类型的项目和组织。采用RBS的一个好处是，提醒风险识别人员风险产生的原因是多种多样的。

风险概率影响矩阵是根据风险发生概率和风险影响的各种组合，把风险划分为高、中、低级别，以便进行相应的风险应对规划。

风险概率影响矩阵包含的信息比风险分解结构更丰富，虽然还没有涉及到具体的风险内容（具体风险是通过接下来的识别风险过程被逐一识别的，并且这是一个全员参与，反复进行的过程），但已经可以根据风险对项目的影响进行优先排序。风险分解结构（RBS）和风险概率影响矩阵都是规划风险管理的输出中，风险管理计划的组成部分。

风险对主要项目目标的影响量表（仅反映消极影响）					
项目目标	相对量表或数字量表				
	很低 0.05	低 0.10	中等 0.20	高 0.40	很高 0.80
成本	成本增加不显著	成本增加小于 10%	成本增加 10%~20%	成本增加 20%~40%	成本增加大于 40%
进度	进度拖延不显著	进度拖延小于 5%	进度拖延 5%~10%	进度拖延 10%~20%	进度拖延大于 20%
范围	范围减少微不足道	范围的次要方面受到影响	范围的主要方面受到影响	范围缩小到发起人不能接受	项目最终结果没有实际用途
质量	质量下降微不足道	仅有要求极高的部分受到影响	质量下降需要发起人审批	质量降低到发起人不能接受	项目最终结果没有实际用途
本表示范性地定义了风险对 4 个项目目标的影响。在风险管理规划过程中，应根据具体项目的情况以及组织的风险临界值对这些定义进行“剪裁”，可以用类似方法对机会进行影响定义。					

风险承受力和风险门槛的区别

风险承受力是指组织、项目团队、客户或其他项目干系人能够或不能够承受的风险种类，**风险门槛**是指相关干系人能够承担的最高损失金额。

不同合同类型之间的区别

合同类型总的来分有三种类型，即**总价类合同**，**成本补偿类合同**和**工料合同**（也称订单合同）。三种类型的合同区别描述如下：

总价合同：这种类型的合同为既定产品或服务的采购设定了一个总价。适用与总价合同的项目，买方必须准确定义合同标的物（产品或服务）的范围，除非范围变化，合同价格不允许改变。这种合同对卖方有最高的成本风险。总价合同包括如下几种类型：

固定总价合同（FFP）：这种合同的采购价格在一开始就被确定，并且不允许改变（除非工作范围发生变更），合同执行过程中任何因不良绩效而导致的费用增加都由卖方承担。

总价+经济价格调整合同（FP-EPA）：这种类型的合同适用于合同周期比较长，或者合同各方要维持多种长期关系。在这个前提下，允许根据条件的变化，如通胀、油价上涨、外币风险等指标，对合同的最终价格进行最终调整。这种合同可以减轻外界不可控因素对买卖双方的影响，有利于长期合作。

总价+激励费用合同（FPIF）：这种类型的合同允许有一定的绩效偏离，包括对预计成本的超支或节省，并对偏离部分的费用有买卖双方分担和分享的比例约定。合同中需要设立

一个价格上限，实际合同价格如超出上限价格，超出部分全部由卖方承担。

总价+奖励费用合同（）：

成本补偿合同：这种合同向卖方支付为完成工作而发生的全部合法实际成本，外加一笔费用作为卖方的利润。适用于成本补偿类的合同，工作范围在开始时无法准确定义，后续还要进行调整，或者项目工作本身有较高的风险。这种合同类型使项目具有较大的灵活性，对买方有最高的成本风险（范围不确定导致的合同最终价格不确定）。

成本+奖励费用合同（CPAF）：这种合同的特点是，买方按合同约定支付全部合法成本，但是只有满足了合同中规定的某些笼统、主观的绩效标准情况下，才向卖方支付大部分费用。对卖方实际表现的判断以及奖励费用的额度，全部根据买方的主观判断决定，卖方通常无权参与意见和提出异议和申诉。

成本+激励费用合同（CPIF）：这种合同为卖方报销合同工作所发生的一切可列支成本，并在卖方达到合同规定的绩效目标时，向卖方支付预先确定的费用（激励费用）。针对预计成本的超支或节省，在合同中有买卖双方分担和分享的比例约定。这种合同与总价+激励费用合同（FPIF）有类似的地方，比如按比例分担、分享，但是没有价格上限。

成本+固定费合同（CPFF）：这种合同为卖方报销合同工作所发生的一切可列支成本，外加一笔固定的费用（利润），该费用以项目初始成本（计划成本、目标成本）的某一百分比计算，除非范围变化，否则费用固定。

工料合同（T&M）：这种合同的范围可以变化，导致合同总价因成本的增加而增加；同时由于其确定了特定资源的单位价格，又与固定单价合同相似。工料合同也称订单合同，特点是可以在较短的时间内签订。

合同类型选择取决于范围，风险是最主要影响因素！

下面的实例可能对理解合同类型差别及选择有所帮助：

再有4个月，你结婚10周年的纪念日就要到了。为了纪念这个美好的日子，你决定把自己的房子重新装修一遍。经朋友推荐，你找到了一个口碑不错的装修公司，你现在把能想到的合同类型都列在下面，准备选择其中一种合同和该公司签订正式协议。

1、固定总价合同（FFP）。你大致估算了一下，给出总价5万元让装修公司完成从设计到采购到装修的完整过程，这5万元是一口价，把全部成本和利润都包括在内了。

2、**总价+激励费用合同 (FPIF)**。你为了能控制成本，提高绩效，给出了目标成本为 4 万 5 千元，激励金为 2 千元，最高价为 5 万元，分享比例为 80/20，也就是说如果装修公司的实际成本低于目标成本时，节约出的成本部分由买卖双方分享，买方分得 80%，卖方分得 20%。例如，如果装修公司的实际成本为 4 万元，那么车主可以分得 $(5-4) \times 20\% = 2$ 千元。如果装修公司成本控制不当，超出了合同中约定的最高价，比如实际成本为 5 万 1 千元，那么你也只需支付最高价 5 万元。

3、**总价+经济价格调整合同 (FP-EPA)**。如果装修材料和装修工人的工资有所调整（涨价或降价），装修合同的最终价格也要相应改变。

4、**成本+固定费合同 (CPFF)**：你把装修公司所花费的所有合理成本包括设计、材料、人工等全部费用都统计出来，由你全部承担，此外再给装修公司一笔固定金额的奖金，例如，5 千元。

5、**成本+激励费用合同 (CPIF)**：你给出目标成本为 4 万 5 千元，激励金为 2 千元，分享比例为 80/20。

6、**成本+奖励费用合同 (CPAF)**。你给出目标成本为 4 万 5 千元，激励金为 2 千元，分享比例为 80/20。但是只有装修公司的的工作让你满意（主观的、笼统的），你才肯支付激励金。

7、**工料合同 (T&M)**。你列出了装修房屋所需的全部材料价格，乘上材料用量，再加上装修公司报给你的人工费用，总计 5 万 5 千元付给装修公司。

通过对上述不同情境下的合同排序，可以弄清哪种合同对你有利：

1、固定总价合同对买方最有利。因为你（买方）给的价是固定不变的，装修公司负完全责任。不论装修过程中发生什么意外情况，超出预算的成本都由卖方承担。总价合同适用于范围很明确的项目。

2、总价加激励合同次之。这种类型的合同通过分成的方式鼓励装修公司控制成本，并设立了分享比例，同时设置了一个最高合同额，对你的风险进行了减轻。

3、总价加经济价格调整合同再次之。这种合同类型适用于卖方执行合同需要跨越相当长的周期的情况。

4、工料合同居中。这种合同对双方来说都存在一定的风险。适用于不能编写出准确的工作说明书，同时又需要尽快签订合同的情况。

5、成本加奖励费用合同排在第五。这种合同与成本加激励费合同类似，但是由买方主观确定装修公司的工作成果绩效，然后再决定给付奖励费用，所以总体来说还是对合同买方有利。

6、成本加激励费用合同排在第六。这个合同和固定总价加激励合同类似，也通过分成的方式鼓励装修公司控制成本。但没有设置最高价格进行保护，对合同买方来说，风险比总价加激励费合同要高。

7、成本加固定金合同排在第七。装修公司无论花费多少成本，只要是合法的，可列支的，你都要全额报销。除此之外，你还需付出一笔固定金给装修公司作为报酬。

合同收尾和行政收尾的区别

合同收尾工作包括结束合同工作，进行采购审计，结束当事人之间的合同关系，并将有关资料收集归档。

行政收尾阶段要做的工作包括：确认全部工作都按照要求完成了，项目的产品符合既定的要求；支付最后的项目款项，完成财务结算；完成项目绩效报告和项目团队成员的业绩记录；总结经验教训，进行项目完工后的评价，进行组织资产更新，结束项目干系人在项目上的关系，解散项目团队。

行政收尾结束后，需要达到如下结果：客户对项目产品正式接受，形成完整的项目文档，组织过程资产得到更新，全部项目资源得到释放。

合同收尾和行政收尾都需要进行产品核实，都需要总结经验教训，对资料进行归档和整理，更新组织过程资产。其中行政收尾针对项目和各阶段，而合同收尾针对合同。合同收尾发生在行政收尾之前，行政收尾需要由项目发起人或高级管理层给项目经理签发书面确认，而合同收尾则要由买方采购管理员向卖方签发合同结束的书面确认。
