

每日一练第三天 0821-答案

1、指导委员会要求一位在敏捷方面有经验的项目经理提供一个中型项目剩余时间的指示，可以使用什么工具来提供这些信息？

- A、发布燃尽图
- B、业务需求文档分析
- C、其余用户故事的故事点
- D、替代测量值

解析：A，燃尽图展示剩余故事和剩余时间的关系。

2、一家公司的项目经理正在考虑由组织中表现出色的初级成员担任当前项目的新项目经理。项目经理应该做些什么来准备向高级管理层提出建议？

- A.从会议记录中突出团队成员的主要亮点。
- B.请团队成员写一篇简短的传记，列出他们的资历
- C.收集展示团队成员高绩效的项目工件
- D.计算团队成员工作过的项目的健康状况


解析：C，突出项目团队成员的优秀，需要用项目的工作绩效报告、会议纪要、团队成员的KPI、个人绩效评价等项目文件和指标来证明，用客观数据来展示。

3、在结束过程中，项目经理了解到一个可交付成果没有达到客户的期望。项目经理应该如何进行？

- A.要求客户发出变更请求，并提供分析和解决方案所需的信息。
- B.审查可交付成果要求，检查客户验收标准，并相应地继续收尾。
- C.与客户会面，就双方都满意的可交付成果范围达成一致。
- D.联系项目发起人，并在与客户协商项目结束时寻求帮助。

解析：B，收尾过程证明已全部完成验收，如果仍发现问题，按照收尾过程再最终报告中记录遗留问题，不做更改，继续执行收尾。C答案，可以与客户会面告知这个问题，但不能就范围再次达成一致，这很有可能会重新修改范围。目前的范围基准就是一致的标准，并基于范围基准完成验收的。

4、Scrum 团队正在分析 15 天冲刺的第四天的燃尽图。燃尽图表如下所示。团队下一步应该做什么？

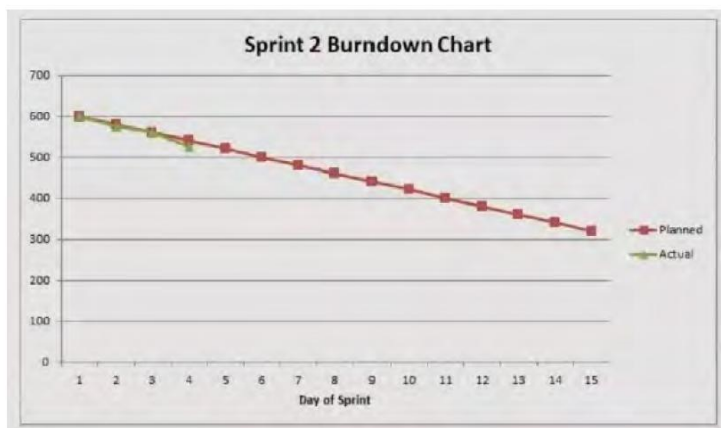

(A) 继续进行冲刺 (sprint)，因为进度显示有潜在中断的缓冲区。

- (B) .询问产品负责人是否可以从冲刺 (sprint) 中删除一些低优先级的故事。
- (C) .按计划继续进行冲刺工作, 并保持监控。
- (D) .要求项目团队选择任何其他故事, 因为它们相比计划的具有额外的容量。

解析: C, 任务超前计划, 继续保持监控项目进展。

5、在设计阶段, 项目经理意识到项目将从使用自适应工具中受益。这种方法的有效性已在组织内过去的项目中得到证明。项目经理应该首先做什么?

- A.更新项目文档以包括自适应工具和工件, 并计划第一次迭代。
- B.联系项目发起人, 请求熟悉自适应项目的新团队成员。
- C.在将自适应工具和工件引入项目之前, 确认团队能力。
- D.冻结设计阶段, 寻找外部资源以额外成本运行迭代设计。

解析: C, 组织的变革, 先评估组织文化 (过去组织已成功实施并有效), 再评估对项目的影响 (团队的能力)。

6、对于一个新项目, 公司要求项目经理识别潜在的项目团队成员。项目经理下一步应该怎么做?

- A. 请职能经理提供项目团队成员
- B. 创建一份资源管理计划
- C. 制定一份具有岗位描述的组织图。
- D. 使用专家判断

解析: B, 如何识别资源, 写在资源管理计划 (指导如何识别、获取、管理资源)。

7、一个集成项目涉及硬件和软件的交互, 发起人已经批准了进度管理计划。项目团队评估了产品功能和加速测试的可行性。项目经理作为仆人领导应该做什么?

- A.根据需要提供团队, 以找到最低可行产品 (MVP) 。
- B.修改项目预算, 将 MVP 测试包括在内。
- C.向项目发起人提交变更请求, 以进行加速测试。
- D.按照计划开发产品, 以进行集成和测试。

解析: A, 加速项目工作, 支持团队采用 MVP, 但不需要提交变更修改预算。

8、一家供应商在他们项目末尾面临财务困难, 正在推动买方项目经理获得财务、法律和行政的批准, 以便传达他们正式的项目结束并确保责任转移。项目经理下一步应该做什么?

- (A) .将取得的成果与合同要求进行比较。
- (B) .项目完工时支付最后一笔款项。
- (C) .转移剩余差异并关闭项目。
- (D) .上报上级管理, 加快审批。

解析: A, 是否批准供应商的财务付款做行政收尾, 参照合同, PM 不要擅作主张。

9、一家公司正在将项目从预测性方法过渡到敏捷性方法。CFO 担心其中一个敏捷项目有一个对财务部门很重要的功能被推迟到以后的迭代。项目经理应该做什么来澄清这种情况?

- A.建立一个执行委员会来审查产品待办事项列表, 并重新规划下一次的迭代。
- B.就如何处理这种情况向 CEO 请求支持。
- C.向 CFO 说明优先级的确定是基于商业价值的。
- D.增加团队的规模, 以符合 CFO 之前的任何期望



解析：CFO 担忧，属于干系人情绪问题。解决的方法是沟通，用商业价值来说明迭代功能的优先级。

10、由于产品需求不明确，与质量部门合作的 Scrum 团队已经转向业务部门。现在是第三次冲刺，业务和 Scrum 两个团队都已经停滞几天了。项目负责人应该如何解决这种情况？

- A. 与两个团队一起分析问题，以确定是否必须重做工作。
- B. 选择新的团队成员，努力获得新的想法来解决僵局。
- C. 要求业务团队停止浪费时间，并确定产品的最终要求。
- D. 告诉业务团队和 Scrum 团队继续遵循最初的计划。

解析：A，需求的不明确，导致两个团队一直努力开展需求确认工作，且未取得进展，遇到瓶颈，PM 应该与两个团队一起面对问题。

11、一个关键的项目利益相关者没有参加任何项目会议，并且正在提供项目团队没有按时交付的错误信息。项目经理应该如何应对这种情况？

- (A) 为关键利益相关者创建一个新的沟通工件。
- (B) 通过电子邮件将最新状态报告发送给关键利益相关者。
- (C) 与关键利益相关者分享会议记录。
- (D) 与关键利益相关者讨论沟通需求。

解析：D，需要与干系人分享项目正确的信息，先与干系人讨论他的沟通需求。

12、一个项目即将结束，项目经理正在召开会议，进行根本原因分析，准备项目结束报告草稿。项目发起人已与项目经理接洽，要求其留任更长时间，以确保章程中的利益在完成时得到跟踪。然而，一些利益要到项目实施后 1 年才能实现。项目经理应该怎么做？

- (A) 向项目发起人解释，项目经理只负责管理项目范围的预算质量和进度
- (B) 在项目最终报告中记录谁将跟踪收益实现，将跟踪什么，以及何时跟踪
- (C) 向项目发起人解释，他们有责任在项目完成后跟踪效益实现情况
- (D) 与项目管理办公室 (PMO) 讨论将项目经理的分配范围扩大，直到实现所有利益。

解析：B，项目收尾，一切问题及问题跟踪人都记录最终报告，按退出标准关闭项目，项目的利益实现情况，由效益责任人按照效益管理计划去跟踪收益的实现情况。

13、一个项目经理被分配到一个新项目。该项目是为了一个新产品，该公司希望尽快推出，以测试市场准备情况。该项目是大型业务转型的一部分，目标是为新产品打开交付渠道。项目经理应该推荐哪种交付方法？

- A. 具有丰富经验的预测方法。
- B. 具有清晰定义的用户故事的自适应方法。
- C. 具有松散定义的大史诗的自适应方法。
- D. 具有明确验收标准的预测方法。

解析：B，尽快交付，以获得市场的早期准备情况，又是新产品，用基于用户故事的适应型开发方法。不能基于史诗来交付，周期太长。

14、一个团队正在进行一个混合项目。由于对项目需求的不同理解，最终可交付成果与预期不一致。项目经理应该采取什么措施来防止这种情况发生？

- (A) 更新项目管理计划，以便重回正轨。
- (B) 确保团队收到客户用户的持续反馈。



- (C) 提交变更请求以调整项目范围。
- (D) 确保团队了解所有额外的项目需求。

解析：B，通过评审会收集来自客户的早期反馈，尽早发现不一致，及时纠正问题，避免最终成果不一致。参考 13 题解析。题目未提到不了解额外需求。

15、一支敏捷团队的每日站会通过三个团队之间的电话会议进行，每个团队位于不同的国家。会议通常持续 45 分钟，由于语言障碍，存在许多误解。项目经理应该如何为下一次迭代解决这个问题？

- A、将一半的待办事项转移到下一个迭代中，以便有更多的时间完成会议。
- B、将会议延长到 1 小时，并要求所有参与者提出所有问题。
- C、指示与会者在会议期间只谈障碍。

D、培训三名团队领导召开本地会议，然后召开总体状态会议。

解析：D，三个团队的站会，通过 SOS，站会不仅仅谈障碍，也有风险，也有任务的完成情况。

16、在混合项目中，利益相关者直接向团队成员之一请求一些特性修改。在进一步调查时，项目经理发现这是业务中的一种常见做法，与项目管理计划中所述的不同。项目经理应该做什么？

- (A) 更新风险登记册，包括不遵守变更流程可能导致范围蔓延
- (B) 确保所有利益相关者都了解并同意项目治理结构
- (C) 建议团队不要进行修改，除非遵循适当的变更审批流程
- (D) 上报项目管理办公室 (PMO)，要求更换接受请求的团队成员。

解析：B，无论是沟通过程还是变更过程还是风险管理还是上报流程，都属于项目治理，需要共同遵守。

17、项目经理正在与敏捷团队合作以增强产品。在即将开始的下一代，该团队计划升级技术环境，但无法就技术选型达成共识。项目经理应该首先做什么？

- (A) 举行一次技术选型会议，以决定如何开展技术组工作。
- (B) 将问题上报给产品负责人解决。
- (C) 将此冲突添加到下一次每日站立会议的讨论议程中。
- (D) 进行一次规划会议，以决定如何处理技术组工作。

解析：D，没有达成一致，就使用即将到来的敏捷仪式-规划会，确定团队资源的任务配置/可用性/投入/工作量，并达成一致。规划会的作用就是为了促进团队的一致理解，形成共同目标。A 是个什么会，没听过，这个会谁要求开的，没说过。我怀疑你在打扰团队。

18、在项目的 sprint 规划会中，团队成员对待办列表故事的相对大小以及它们是否适合下一个 sprint 存在分歧。考虑到混合方法，项目经理应该怎么做？

- (A) 请外部技术负责人提供意见并计划冲刺。
- (B) 对故事进行分解以便于更好的评估。
- (C) 根据更有意义的内容来决定待办列表项目。
- (D) 规划会上促进讨论，使团队成员能够达成共识。

解析：D，使用敏捷仪式-规划会，确定故事的规模/依赖/验收标准/是否能在一个迭代完成，并达成共识。参考上一题解析。



19、一家公司正在进行一项数字化转型项目，该项目的最后期限很长。营销团队希望借此实现与新产品相结合，而新分配的项目经理并不知道各个团队的依赖关系。使用混合方法，项目经理应该做些什么来确保相关性得到考虑？

- (A) 实施项目沟通，以便不同的团队成员能够了解每个项目的进展。
- (B) 将所有的小项目合并为一个大项目，这样团队就可以更好地作为一个大团队进行协作。
- (C) 促进沟通，促进 Scrum of Scrum，使不同的团队了解依赖关系和进展。
- (D) 确保每个单独的项目进度表与共同的截止日期保持一致。

解析：C，多个团队的依赖关系，工作协调，SOS。

20、团队已经完成了许多迭代，但没有正确确定故事的大小。在一些迭代中，团队确定了一些故事的大小并提前完成。在其他迭代中，该团队确定了故事的大小，但无法完成计划的活动。在规划下一次迭代期间，该团队应该采取哪些不同的做法？

- (A) 要求产品负责人和团队辅导员提供故事的大小
- (B) 平均每个团队成员为一个故事提供的故事点数
- (C) 继续多轮计划扑克，并达成故事的大小
- (D) 与不同的团队合作，达成故事的大小

解析：C，估算用户故事大小-规划扑克/亲和估算/宽带德尔菲/理想日，规划扑克，通过多轮出牌与讨论，估算值不断收敛，更加准确，最后达成一致，促进团队合作。同时不要忘记还有亲和估算、宽带德尔菲、理想日。

