

PMP® 考前冲刺 (二)

敏捷项目管理

讲师：杨波

2024年8月



CONTENTS

- 敏捷开发方法
- 敏捷发布与规划
- 敏捷流程与需求
- 敏捷团队与实践



方法	需求	活动	交付	目标
预测型	固定	整个项目执行一次	一次交付	管理成本
迭代型	动态	反复执行直至修正	一次交付	解决方案的正确性
增量型	动态	对给定增量执行一次	频繁更小规模交付	速度
敏捷型	动态	反复执行直至修正	频繁小规模持续交付	通过频繁小规模交付和反馈实现的客户价值

1、一个新品发布项目处于初期阶段，需求还在不断发生变化。由于市场竞争激烈，客户希望发布产品时保持范围的灵活性，项目团队打算根据对去年交付的一个类似项目所作的预测开始工作。哪种项目方法适合此情景？

A：将之作为一个有多个阶段关口的项目执行。

B：将之作为敏捷项目执行。

C：运用与参照项目相同的方法执行该项目。

D：将之作为预测型项目执行。

2、选项ABCD中显示了所创造的商业价值以及在产品中实施各种功能需要进行的开发工作。团队应**优先**实施哪项功能？

A：功能名称：A。商业价值（单位）：6。开发工作（周数）：2

B：功能名称：B。商业价值（单位）：10。开发工作（周数）：4

C：功能名称：C。商业价值（单位）：4。开发工作（周数）：4

D：功能名称：D。商业价值（单位）：8。开发工作（周数）：8

3、在一个混合项目中，客户决定对项目设计进行重大更改。此更改已获得批准，对进度和预算的影响是已知的。负责开发软件的软件团队负责人，拒绝承诺交付日期，声称他们使用敏捷方法工作，无法承诺最终交付日期。硬件团队依靠完整的软件来开发其产品部分，项目经理该怎么办？

- A.将此风险添加到风险登记册中，并根据风险管理计划进行监控
- B.将此问题上报给更高级别的管理层，并请求帮助解决此问题。
- C.将交付日期强加给软件团队负责人，并将情况通知职能经理
- D.要求软件团队负责人使用预测方法并确定交付日期

4、一名项目经理被指派启动一个大型项目，交付复杂的设备。项目的一部分将是长期研究过程的结果，但一旦完成，项目的另一部分必须逐步交付给客户。项目经理应该为这个项目选择哪种方法？

- (A) 敏捷
- (B) 瀑布
- (C) 预测
- (D) 混合

5、在大型项目的执行阶段，有大量的变更请求。因此，项目经理意识到交付成果被拒绝的风险较大。项目经理应该如何在改变完成日期的情况下降低这种风险？

- A.审查整体变更控制流程，以限制变更数量
- B.专注于通过多个较小的交付，以交付增量价值
- C.请求发起人支持，以获得用户和干系人的认可
- D.通过再次收集用户需求，重新启动干系人参与过程

CONTENTS


- 敏捷开发方法
- 敏捷发布与规划
- 敏捷流程与需求
- 敏捷团队与实践



不频繁

更新频率

频繁

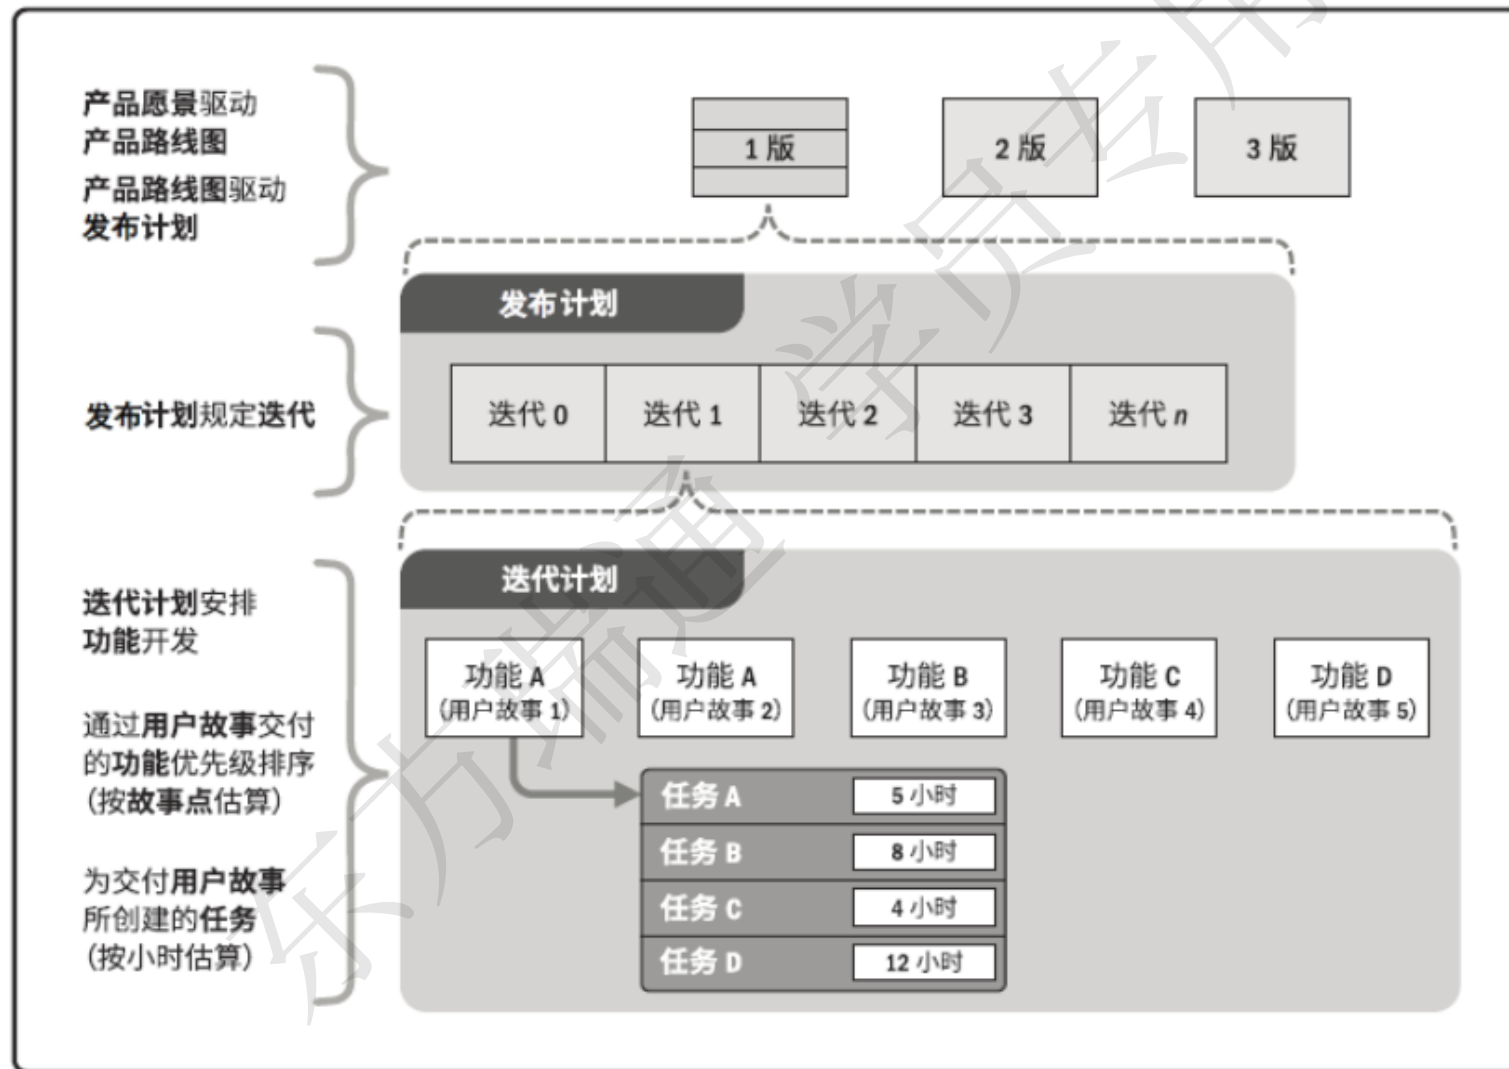

产品愿景是一个清晰的对于产品如何为产品相关人和客户带来价值的描述，是一个**高层级**的目标，并以此来**激励**团队并推动产品**战略**和执行。

产品路线图是产品需求的**高层次**概述，产品路线图将用户关注点/主题按优先级排序，分成若干阶段，是产品需求在时间轴上的**总体视图**和概览，也是建立共享的**项目愿景**。

用户故事地图基于简单的网格结构，规则是从左到右讲述**故事**，即叙事主线；自上向下的**拆分**，即由大到小的**细节**展现，并结合产品待办列表和产品路线图，确定发布（MVP）的内容。

产品愿景->产品路线图 -> 史诗->特性->用户故事->产品待办列表 -> 发布计划 -> 迭代计划->冲刺待办列表

产品愿景梳理会

产品需求梳理会

产品发布
规划会

产品迭代规划会

6、敏捷项目负责人希望确保产品愿景在整个项目过程中不会在团队成员的脑海中消失。对于敏捷领导者来说，实现这个目标的最佳方式是什么？

- A. 在启动会议上提出产品愿景声明
- B. 将产品愿景声明显示为信息发射源
- C. 将产品愿景声明邮件给所有项目干系人
- D. 在每次迭代开始时传达产品愿景

7、你正在创建在你的公司部署一个新的ERP软件的时间表。该公司目前正在进行敏捷转型，因此决定迭代开发新的ERP。你知道另一个全公司范围操作系统升级的项目计划在三个月内推出。为了让干系人看到产品随着时间演进的全貌，树立阶段目标，你应该首先确定以下哪一项？

- A. 发布计划
- B. 产品路线图
- C. 迭代待办事项列表
- D. 项目章程

8、由于需求不明确，团队很难完成工作。他们没有能够在几个月内成功完成一个迭代。为了帮助团队，项目负责人应该做什么？

- (A) .建议产品负责人查看待办列表（backlog）的细化流程。
- (B) .建议团队与干系人一起审查迭代周期的长度。
- (C) .建议限制正在进行的工作，以提高团队的专注力。
- (D) .建议对团队成员的个人表现进行审查。

9、项目经理正在从预测性的传统项目过渡到新的敏捷项目。项目经理应该如何管理和控制新项目的范围？

- A. 创建一个范围基线，并将其余部分作为待办列表事项。
- B. 估算团队可以完成的工作，并定义故事大小，以控制项目。
- C. 制定一个计划，在更短的时间内完成更多的工作。
- D. 用很短的时间来定义范围并构建原型来梳理需求。

CONTENTS

- 敏捷开发方法
- 敏捷发布与规划
- 敏捷流程与需求
- 敏捷团队与实践



➤ 项目章程

- **项目愿景/目标（确保目标一致）。**
- 项目的**发布/完成标准**。
- 预期的 **workflow**。
- 项目合法的证明文件，给项目经理授权的问题文件。
- 具体**产品的规划、实现和交付**授权给**团队来整合（团队自组织）**。

➤ 团队章程

- 团队社会契约，规定团队成员之间**彼此互动**的方式。
- **团队价值观（目标），工作协议（工作时间、DOD），基本规则（沟通、会议、冲突、决策、专注等），团队规范（团队协作、绩效衡量）。**
- 仆从式领导可以和团队**一起决定**处理**工作行为**的方式。

- 10、八个人在一个项目上工作了很长一段时间。范围发生了重大变化，产品负责人已多次更换。团队成员感到与该项目脱节。项目经理应该做些什么来确保团队与目标保持一致？
- (A) 请新产品负责人解释项目的重要性。
 - (B) 通过电子邮件向团队发送业务需求的详细概要。
 - (C) 让团队审查项目章程。
 - (D) 促进对项目愿景的讨论和理解。

11、一位仆人领导即将开始一个涉密的敏捷研究项目。已确定存在团队成员向外部人员披露项目细节有关的高风险。仆人领导应该做些什么来应对这种风险？

- (A) 将此限制作为基本规则，并通过在每次迭代结束时审查基本规则来确保所有团队成员都熟悉它。
- (B) 预测风险成本，以计算在风险发生时需要分配的所需应急准备金。
- (C) 要求职能经理对团队进行风险教育，并确保采取纪律处分。
- (D) 联系人力资源（HR）部门，确保如果员工泄露任何机密信息，将采取纪律处分

12、一个敏捷团队正在一起做他们的第一个项目。第一次迭代的目标没有实现，并且开发团队的成员之间存在重大分歧。在迭代回顾中，我们发现一些团队成员工作时间不固定，并且在需要他们的时候工作繁忙。敏捷教练本可以做什么不同的事情来防止这种情况？ "

- A: 规定团队的标准工作时间
- B: 要求职能部门领导介入
- C: 没有办法能阻止描述的情况
- D: 促进建立精简的团队章程

13、一个项目经理被分配到一个新项目。项目管理办公室（PMO）和项目经理一致认为，这是包括每日站立会议的正确机会。项目团队从未使用过这样的工具，一些成员正在质疑这一决定。在这种情况下，项目经理应该做什么？


- A.聘请外部供应商以迭代方式执行设计阶段。
- B.要求将熟悉迭代方法的新团队成员分配到这个项目中。
- C.更新项目进度表，将每日站立视为项目设计阶段的一部分。
- D.定义基本规则、责任和冲突管理策略

14、已经成立了一个项目团队，并将任务分配给每个团队成员。所有团队成员都同意采用混合项目方法。项目经理应该做些什么来确保团队作为一个有组织的单元执行任务？

- (A) 建议团队调整工作习惯和行为，以便更好地解决冲突。
- (B) 召开团队会议，讨论团队成员的优势和劣势。
- (C) 为团队成员制定如果未达到目标而产生后果的规则和条例。
- (D) 建立团队行为，并简短的说明如何协同合作。

15、项目经理正在领导一个涉及现场和远程团队成员的项目。分配给另一个国家的团队成员的一项任务似乎落后于计划。当项目经理询问此事时，团队成员声称任务已经完成，并通过电话向团队主管报告了这一情况。项目经理应该怎么做？


- A.向项目干系人传达基本规则、原则和报告方法。
- B.对未正确更新项目文档的项目团队负责人进行处罚。
- C.与团队主管一起审查此问题，以了解解决此情况的可能方法。
- D.向团队成员发布直接向项目经理报告的指导。

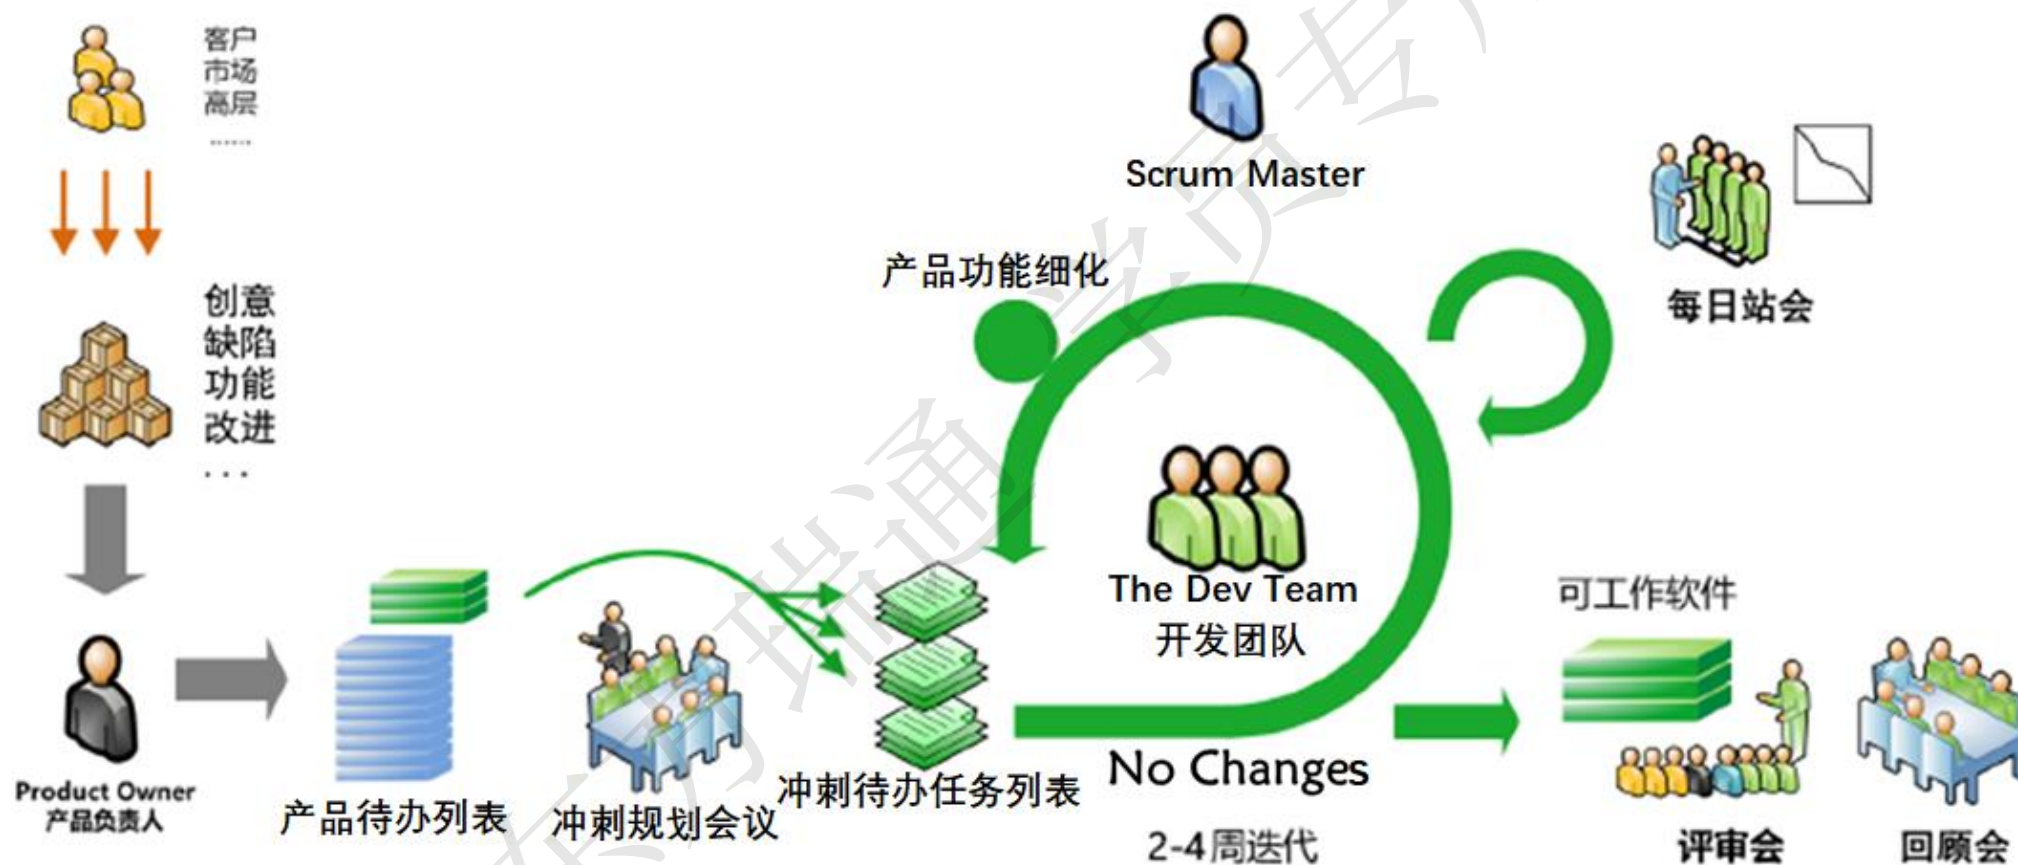

16、一个没有敏捷实践和项目领域经验的团队，正在使用Scrum框架。然而，团队认为Scrum仪式不能带来价值。因此，他们决定使用官方评审会议作为技术问题的知识共享平台。敏捷团队领导应该怎么做（）？

- A、 解释Scrum框架使用的是一种检查和适应的方式，并为团队组织Scrum培训。
- B、 允许团队使用其首选方法，并通知相关干系人。
- C、 将产品负责人替换为可以更好地传达Scrum框架及其领域知识的人员。
- D、 将团队成员替换为拥有项目领域相关知识的开发人员。

Scrum 3大工件

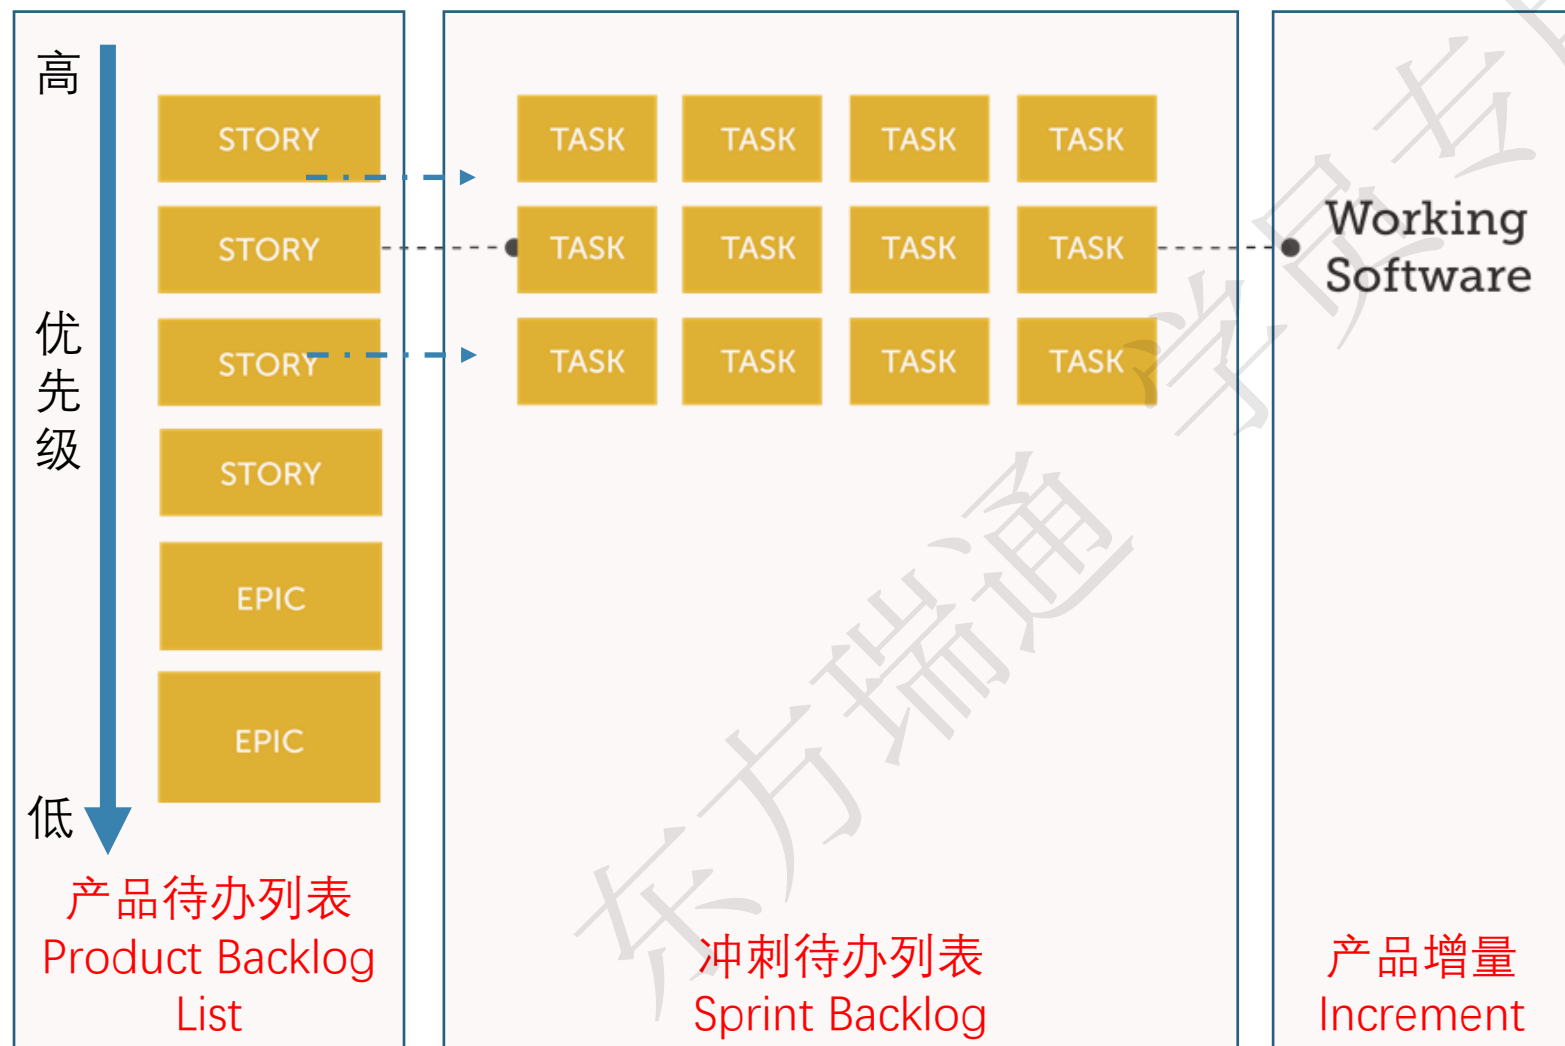

17、一个大型项目敏捷团队的项目经理正在开发新的工作流程，以满足不断变化的业务需求。

随着第二个sprint的运行，产品负责人和敏捷团队开始收到更多影响现有正在开展项的范围更改的信息。敏捷团队请求更改sprint目标和sprint待办列表。项目经理应该怎么做？

- A. 创建一个并行的sprint来交付额外的事项。
- B. 指导敏捷团队将新范围添加到产品待办列表中。
- C. 暂停sprint以留出时间来包含新项目。
- D. 调整对sprint质量的期望。

18、客户想要在未完项中添加一项**大工作**，并希望在下一次迭代时交付，这会严重拖延项目进度。

团队如何在承诺预期交付日期之前，确保关注相关需求（）？

- A、将这项大工作添加进下次迭代的未完项，进行优先级排序，并通知客户。
- B、将这项大工作分解成较小的故事，明确验收标准，并再次确定其在今后迭代中的优先级。
- C、向客户搜集这项大工作的验收标准，确保在下次迭代中包含这些特性。
- D、内部讨论这项大工作的价值，再次确定其在今后迭代中的优先级，并告知客户最新动态。

- 快速地构建出符合产品预期功能的**最小功能集合**，MVP并不是全功能产品，它只具备了用以**用户体验、检测市场反馈的基础功能、核心功能、关键功能**
- 通过评审并收集用户的反馈，快速迭代，不断修正，最终适应用户需求
- 使用MVP策略的四个目的（增量交付的好处）：
 - 1、产品能快速上线，**尽快交付商业价值**
 - 2、需求不清，发布原型，**澄清需求**
 - 3、**快速试错**，在项目生命周期**早期发现不一致和质量问题**并找到正确的方法
 - 4、通过审查产品增量，**尽早识别项目风险**。

19、一位项目经理正在努力创造一种产品，一旦通过严格的质量标准，就可以投放市场。从历史上看，该公司一直使用预测方法，但该公司正在探索敏捷方法的实施。该公司要求项目经理解释使用敏捷流程所获得的早期价值。项目经理应该如何回应？

- A.在产品完全发布之前，无法实现早期价值。
- B.通过在初始阶段测试最重要的特性来修复偏差，可以获得早期价值。
- C.只有beta产品投放市场，才能获得早期价值。
- D.只有提高速度将产品推向市场，才能获得早期价值。

20、一个敏捷项目团队正在构建一个新产品。需要持续为干系人说明项目的商业价值。项目经理应该如何进行？

- A.持续为干系人准备绩效价值报告。
- B.在每个冲刺结束时，包括产品构建部分的演示。
- C.为干系人准备一份项目报告，并每周分发一次。
- D.确认最小可行产品（MVP），并在其准备就绪时向干系人演示。

■ 3C原则

Card: 故事应该精简, 可写在一张小卡片上, 以促进沟通交流。

Conversation: 故事细节需要与用户协商谈论。

Confirmation: 包含验收标准和环节。

■ INVEST 特性

Independent: 独立的 (可单独开发, 不具有强耦合性)。

Negotiable: 可协商的 (通过沟通, 获取到更多的细节)。

Valuable: 有价值的 (故事必须有价值)。

Estimable: 可估算的 (故事是可以估算大小)。

Small: 小的 (在一个迭代完成)。

Testable: 可测试的 (故事是可以进行验收的)。

21、你正在记录你的可交付成果的验收标准。下列哪项是正确的 [选择两个] () ?

- A、 它们在项目范围管理计划中以一种预测性的方法被记录
- B、 它们不会在适应型方法中使用，因为工作是在迭代的开始前定义的，在迭代的结束验证
- C、 它们被用于预测型方法，用于测试或衡量项目的可交付成果是否可接受，当可交付成果完成时是否令人满意
- D、 它们以一种适应型方法记录在用户故事中，以测试或度量项目的可交付成果在迭代结束时是否可接受和令人满意

22、一个项目团队已经完成了迭代产品增量计划会议的参与。规划会议结束后，团队会返回一份要交付的功能列表。项目经理应如何确保产品增量满足预期要求？

- A.在发布期间任命一名专门的产品经理。
- B.让客户批准产品增量功能。
- C.确保每个用户故事都有验收标准。
- D.跟踪计划的用户故事的业务成果。

23、在回顾会议上，项目经理听说干系人在迭代演示中一直在抱怨产品功能没有按要求交付。

项目经理应向产品负责人提供哪些建议，以确保产品功能始终按要求交付？

- A.让干系人参加每日站立会议，以监督进展情况。
- B.在完善待办列表之前，与干系人一起确认验收标准。
- C.避免在迭代评审中包括干系人。
- D.创建需求跟踪矩阵并相应地分发。

“完成”的定义 (Definition of Done)，团队需要满足的**所有标准的核对单**，只有可交付成果满足该核对单才能视为可供客户使用。

DoD可以在多个层次中被定义，但不是一开始就被完整的定义，与利益干系人（PO、DEV、PM、发起人、客户等）一起定义DoD，确保满足业务要求。例如：

1) 开发完成的DoD

代码以及资源都已提交到代码库；

所有代码得到静态分析，不符规项已修正；

所有新增代码都得到评审；

所有功能单元测试已通过；

测试用例都已执行；

2) 迭代DoD

3) 发布DoD

.....

成功标准, 完成条件, 退出标准

24、在上一次迭代结束时，客户拒绝交付成果，因为它们没有满足客户的期望。项目经理应该采取什么措施来防止这种情况的发生？

- A.让客户更多地参与项目的规划过程，并确保在程序上达成一致。
- B.将所有相关标准纳入商定的完成定义（DoD），并制定了一个共享的产品愿景。
- C.在迭代开始时为客户提供backlog和指定的用户故事。
- D.与所有干系人密切合作制定完成定义（DoD），以确保他们的期望得到满足。

25、一个敏捷团队刚刚完成了最终项目可交付成果的开发。团队成员正在向项目经理寻求下一步的建议。项目经理应该建议团队下一步做什么？

- A. 确定验收标准
- B. 确保用户故事符合准备就绪的定义（DoR）
- C. 举行项目回顾
- D. 验证可交付成果是否符合完成的定义（DoD）

CONTENTS

- 敏捷开发方法
- 敏捷发布与规划
- 敏捷流程与需求
- 敏捷团队与实践



仆人式领导风格：引导、指导、辅导、鼓励、支持、尊重、相信、培训和帮助团队。

角色职责：

- 组建**跨职能**团队；
- **教育**干系人，使其了解**敏捷价值**以及**如何敏捷**；
- 为团队与外部合作**提供支持**（如学习知识，改进流程）；
- 为团队提供必要的**环境支持**（团队章程）；
- 营造相互欣赏积极的氛围并**促进团队内外部合作**（促进团队沟通与协作）；
- **帮助消除障碍**（如合规性工作、团队冲突、团队受外界打扰、冲刺目标无法完成等）；
- 工作障碍多，进行**优先级排序**；
- **确保敏捷仪式**的开展（规划会、每日站会、评审会、回顾会等）以及其他必要的会议；
- 团队效率低，为团队提供必要的**培训**，而不是亲自解决问题。
- 为组织变更提供支持（**混合的过渡、项目治理的裁剪以及指标的变化**）

26、一家公司的控制型项目管理办公室（PMO）一直在尝试在项目管理框架中实施自适应方法，并要求项目经理在下一个项目中使用自适应工具。这不是第一次提出要求，在实施自适应工具时，项目经理上一个项目失败了。项目经理应该怎么办？

- A.准备变更请求，并就新项目框架征求指导委员会的批准。
- B.与主要干系人进行单独访谈，以了解所有问题，然后制定沟通管理计划。
- C.找第三方公司为该特定项目开发和指导实施混合框架。
- D.向项目管理办公室（PMO）建议，现在不是开始在项目中实施自适应工具的合适时机。

27、在上一次冲刺审查中，主要干系人抱怨产品缺少了他们一直期待的许多功能。项目团队辩称，每一个增量都符合验收标准，并得到了主要利益干系人的批准。项目的成本效益指数（CPI）为1.15，进度效益指数（SPI）为1.43。项目经理应该怎么办？

- A.要求项目团队进行修改，因为项目预算和进度可以支持他们。
- B.要求干系人提交变更请求，以增加所请求修改的预算和时间。
- C.向干系人解释，由于满足了每个增量的验收标准，项目可以关闭。
- D.分析与双方理解差距的原因，并协商解决方案。

28、一家公司已经转型，现在正在使用混合方法而不是预测方法交付项目。分布式项目团队的敏捷知识是多种多样的。项目经理认为新方法会影响项目的及时交付。项目经理应该怎么做？

- (A) 由于存在预算和进度风险，要求采用预测方法执行项目
- (B) 规划对定义的混合方法中使用的敏捷工具和技术进行培训，以确保所有团队成员一致应用
- (C) 对不了解敏捷项目交付实践的团队成员使用预测方法
- (D) 使用赶工来减少关键路径，以确保有足够的缓冲区来包括敏捷方法更新的影响

29、项目经理在混合项目中充当scrum主管，并处理团队成员之间的冲突。应该使用什么策略来处理这种冲突？

- (A) 将冲突分为两组：积极冲突和消极冲突。
- (B) 将冲突分为结构性冲突和人际冲突。
- (C) 将冲突放在共享冲突列表中，并确保其可见。
- (D) 在日常Scrum站会中审查冲突，以便及时处理。

30、一家公司的项目管理办公室（PMO）正在整合更具适应性的技术并聘请了具有混合项目管理经验的新项目经理。团队采用新方法的速度很慢，并且没有及时更新项目中的项目工件。项目经理应采取哪些措施来提高团队的绩效？

- (A) .为所有项目团队成员设置培训课程
- (B) .联系职能经理寻求支持
- (C) .与每个项目团队成员单独讨论进行所需的更新
- (D) .发送一封电子邮件，要求所有项目团队成员在每天结束时完成更新

31、一个组织使用混合方法进行项目管理。一名项目经理被分配到一个外部项目，即项目A，项目中三个模块中的两个模块需要机器学习技能。组织中唯一的机器学习专家正在参与一个即将结束的内部项目B。项目经理应该怎么做？

- (A) 优先考虑项目A而不是项目B，因为A是外部项目，而B是内部项目。
- (B) 在冲刺中规划项目A，从不需要机器学习技能的模块开始。
- (C) 让人力资源经理为项目A聘请机器学习专家。
- (D) 在项目B结束时，当机器学习专家可用时开始计划项目A。

32、一个组织决定逐渐从传统方法过渡到混合方法，然后是敏捷方法。一家咨询公司被聘请来领导这一过程并为管理层提供建议。为了开始这个过程，顾问强调，随着这个转变，项目领导者的角色必须从命令和控制自顶向下的方法变更为敏捷服务型领导。这种转变对项目负责人的日常工作意味着什么

- A： 将任务分配给团队、监督和控制项目工作
- B： 管理产品待办事项列表中指定的用户故事和任务
- C： 为团队营造环境，提供指导，促进工作
- D： 不需要变更，因为领导者的角色保持不变

33、项目团队采用混合型框架进行项目交付。在执行某项目时，团队获悉客户提出一项新的合规需求，必须先于任何其他需求交付，项目经理该如何应对这种情况？

- A：与技术团队成员和产品负责人开展协作，审查该需求。
- B：将合规负责人纳入干系人名单，并等待举行下一次状态会议。
- C：将该新的合规需求增至待办事项列表，因为技术团队无法腾出人手开展相关工作。
- D：让该团队将该合规需求纳入当前冲刺并交付该需求。

34、某预测型组织最近决定转向敏捷交付方法。正在进行的项目仍将由项目经理领导，由于项目A预算意外超支，高层管理人员对敏捷项目团队是否已做好对项目预算进行自我管理的准备缺乏信心。项目A的项目经理应采取哪两种措施？（选择两项）

A：邀请高层管理人员参加站会，向其提供开支方面的状态报告。

B：与高层管理人员就开支问题确定上报层级。

C：让敏捷教练向高层管理人员提供项目开支周报。

D：邀请高层管理人员参加每个冲刺的回顾会议，以便对开支作出评估。

E：在敏捷教练的帮助下创建信息发射源，使开支可视化。

35、在软件开发项目中，产品负责人和开发团队就冲刺待办列表达成一致。待办列表中的最高优先级是构建一个支付模块。团队在冲刺的前半部分开发了该模块，但现在两名开发人员希望在冲刺剩下的时间里专注于重构另一个可能在未来产生问题的功能。项目经理应该怎么做？

A：向开发人员重申聚焦和达到冲刺目标的重要性。

B：对开发人员的积极主动性和注重质量予以称赞。

C：让开发人员专注于重构工作并在回顾会议上进行讨论。

D：将该问题上报给开发人员的职能部门经理。

36、项目经理正在管理一个混合项目参加迭代评审后，干系人告诉项目经理他们很忙，并询问为什么这些评审如此频繁。项目经理应该如何回应？

- (A) 与干系人协商减少审查出席人数，并更新干系人参与计划以反映出席人数的减少
- (B) 与干系人讨论混合项目的好处，以及频繁的审查是如何带来更大的价值和更少的返工
- (C) 将问题记录在问题日志中，并将冲突升级到项目发起人寻求帮助
- (D) 向干系人解释干系人参与计划要求他们参加所有审查

37、某产品负责人将待办事项列表提供给团队；由于存在各种障碍因素，团队成员对实施某些功能提出顾虑，项目经理应该建议产品负责人接下来做什么？

- A：估算这些障碍因素的财务影响，并请求额外拨款。
- B：记录这些障碍因素，并告知管理层需要他们的协助才能克服这些障碍因素。
- C：确保要记录这些障碍因素，并根据价值最高的功能确定这些障碍因素的优先级。
- D：开始消除这些障碍因素，先从最容易处理的着手，培养团队成就感。

38、一位关键干系人最近开始在一家公司工作，并被分配到一个混合项目中。尽管干系人在其领域非常有经验，但他们只接触过预测性项目方法。项目经理应该怎么做？

- (A) 告知干系人，他们必须与其他干系人分享知识。
- (B) 更新风险登记册以了解潜在影响，并通知指导委员会。
- (C) 通知项目管理办公室（PMO），团队将对该项目使用预测方法。
- (D) 在选定的项目方法中分配时间指导干系人

39、在项目执行期间，项目经理观察到较低的速度和测试队列中大量的任务。该项目使用的是混合方法，只剩下几个冲刺了，项目经理应该怎么做？

- A. 与团队一起测试，了解并解决这些问题
- B. 为所有的项目团队成员提供测试培训
- C. 增加冲刺时间，以便完成测试工作
- D. 在团队中增加一个具有测试技能的新资源

40、一个敏捷团队正在对人力资源（HR）应用系统进行基础设施更改。各干系人提交了相互冲突的要求。项目经理应该做些什么来帮助推进项目？

- A.审查其他团队提供的文件，如经验教训和风险矩阵。
- B.参加Scrum of Scrums，识别障碍并管理依赖关系。
- C.如果进展缓慢，研究技术以协助团队做出决策。
- D.通过促进会议和分享知识，鼓励与干系人进行合作。

41、一个新的敏捷团队正在形成，项目经理注意到该团队在许多领域都在苦苦挣扎。该团队正在经历无法满足迭代承诺和团队成员冲突的问题。项目经理接下来应该做什么？

- A.在回顾中提出问题并提出解决方案
- B.通知管理层承诺将无法兑现。
- C.让管理层参与进来，帮助解决冲突
- D.对整个团队和个人进行指导。

42、一家公司一直遵循预测方法，并总是等待前一阶段完成，然后再评估其产品的质量。一位具有混合方法经验的新项目经理被指派来帮助提高公司质量管理流程的效率。新项目经理应该做些什么来解决流程改进问题？

- A.从团队成员那里了解流程的背景和相互依存关系，然后确定改进措施
- B.按原样继续进行流程，并等待下一阶段提出任何改进建议
- C.与项目管理办公室（PMO）领导讨论流程改进，以更新项目交付框架
- D.定义一条基本规则以符合质量标准，并要求团队成员应用该规则。

43、一家大公司正在将其项目过渡到敏捷方法。过渡后，执行管理层要求提供以前在旧报告和仪表板中可用的信息。在过渡到敏捷实践后，许多旧报告和绩效指标不再相关。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- (A) 向管理团队解释报告和管理仪表盘不是有效的敏捷实践
- (B) 要求管理团队审查认可的敏捷概念，以证明旧信息不相关
- (C) 帮助管理团队了解敏捷方法的变化如何影响某些报告和关键绩效指标（KPI）的相关性
- (D) 提醒管理团队，敏捷方法使团队能够自我指导，因此无需报告。

- **情商 (EI)**。项目经理应提升内在（如自我管理和自我意识）和外在（如人际关系管理、理解他人）能力，从而提高个人情商。研究表明，提高项目团队的情商或情绪能力可提高团队效率，还可以降低团队成员离职率。
- **情商 (EI)**。控制自己的情绪，同时也能够控制团队的情绪。

44、在回顾过去的经验时，一位敏捷教练观察到，他对人的表情，动态和动机的理解能力在他的成功中起到了重要作用。以下哪项人际关系技能他的成功起了很大作用？

A：解决冲突的能力

B：情商

C：服务型领导

D：适应性领导

45、在头脑风暴会议期间，一名团队成员不如团队其他成员活跃。项目经理与该团队成员进行了单独的对话，并了解到该团队成员有轻微的听力障碍。该团队成员理解项目经理的担忧。然后，项目经理决定更改会议的时间和会议房间，以确保每个人都能参与讨论。什么项目经理使用了人际交往技巧？

- (A) 网络
- (B) 情商
- (C) 冲突管理
- (D) 影响

产品负责人确保团队做正确的（有价值的）事情，以符合客户的业务要求。

角色职责：

- 与干系人、客户及团队合作，定义**产品愿景和产品开发方向**。
- 利益干系人的代表，明确产品的ROI。
- 根据商业价值**对需求进行排序**。
- 产品负责人为团队创建**待办事项列表**，或与团队共同创建。
- 指导产品开发方向，**制定发布计划**。
- **验收产品增量**，决定是否可发布以及何时发布。
- 发布目标无法完成时，调整PBL优先级，并**调整发布计划**。
- 与团队开展日常合作，**提供产品反馈**（如澄清需求、分析需求、变更决策），为将要开发/交付的下一个迭代设定方向。

如果产品负责人是兼职的，敏捷促进者需要确认其可用性。

46、在迭代期间，敏捷团队的成员从迭代待办事项列表的顶部提取工作项。工作项描述了接下来要开发的功能。当团队成员阅读描述时，她意识到这些信息不足以开发该功能。团队成员向Scrum主管寻求建议。Scrum主管应该推荐什么做法？

- A： 与其他团队成员一起结对，补充功能的详细信息
- B： 继续分解成更细小的任务
- C： 将事项返回到待办事项列表并选择另一个事项
- D： 咨询产品负责人

47、对于试图开展更快速的动态项目的机构而言，敏捷思维对于管理角色至关重要。尤其是在混合管理中，决策、行动、方向和愿景通常来自管理层。当一个组织考虑应用 Scrum 时，他们不应该只期待团队工作方式发生变化，他们还应该开始考虑管理团队打算如何运作。由谁来确保工作按照领导层的**指示方向和产品的愿景**展开？

- A：产品负责人
- B：Scrum 主管
- C：团队
- D：敏捷教练

48、一家公司正在为外部客户运行一个敏捷项目。团队在冲刺审查会议上演示了网络用户界面的新功能后，一个干系人找到产品负责人，并建议对其中一个屏幕进行改进。干系人坚持认为，这种改进将使用户更容易在界面中导航。产品负责人的最佳行动方案是什么？

- A： 在下次冲刺中实施干系人的请求，因为它将增强客户体验
- B： 与客户讨论干系人的要求，并决定是否以及何时实施
- C： 为干系人的请求创建用户故事，并放在产品待办事项列表的底部
- D： 在每日站会上讨论干系人的要求，并让团队决定如何继续

49、项目经理通知敏捷团队成员，由于意外的个人问题，产品负责人将不能参加即将到来的冲刺评审。这种情况下最可能的结果是什么？

- A：不清楚团队在本次冲刺期间开发的产品增量是否被接受
- B：团队无法确定他们用于开发产品的过程是否需要改进
- C：不会产生任何严重后果，因为产品负责人参加了规划会议
- D：无法确定项目团队在冲刺期间要增加多少价值

50、沙迪的Scrum团队由10名队员组成。团队已经进入3周冲刺的第11天。一个来自组织内部的关键干系人给团队成员打电话，要求进行一个看似紧急的**变更**，并且可能与法规遵从性有关。该团队成员的最佳行动方案是什么？

- A：通知干系人与产品负责人合作，确定变更的优先级。
- B：团队成员通知团队并开始实施变更，因为团队在scrum中是自组织的。
- C：通知干系人等到完成当前的sprint，而当前的sprint只有几天的时间。
- D：让scrum主管与干系人沟通，以获得更多关于变更的信息。

51、产品负责人不定期参加演示仪式。因此，演示仪式不断被重新安排，工作受到多种影响。

项目经理认为产品负责人没有致力于该项目。项目经理应该做些什么来避免这种情况？

- (A) 定义了一组外部审计，可以将这种情况暴露给项目发起人
- (B) 与产品负责人就适当的项目治理级别达成一致
- (C) 设定已完成（DoD）的定义，如果未另行规定，则将工作视为已完成
- (D) 请另一位产品负责人代表产品负责人参加演示

52、一个团队正在为一个中等规模的迭代项目举行迄今为止所建软件的第一次演示。产品负责人发现了一些问题，他们希望在提供批准之前解决这些问题。项目经理应该如何处理这个问题？

A：让产品负责人参阅已签署的业务需求文件，并解释说目前的计划不能促进这些变化。

B：告诉产品负责人这些问题将在软件的第二个版本中解决。

C：计划与产品负责人一起梳理待办事项列表以考虑这些问题，并将其纳入下一个冲刺阶段。

D：让产品负责人参考变更管理计划，然后上报给指导委员会。

53、项目经理正在使用混合方法来遵守法规要求。规划和收尾阶段将使用预测方法，执行阶段将使用迭代方法。在第二次冲刺审查期间，项目发起人要求更改一些产品待办列表的优先级。

项目经理作为仆人领导应该做什么？

- (A) 要求发起人向变更控制委员会（CCB）提交变更请求
- (B) 支持产品负责人决定更改产品待办列表的优先级
- (C) 接受请求，并在下一个sprint中包含产品待办列表
- (D) 审查变更对进度管理计划基线的影响

54、一个关键的干系人感到不安，因为最终产品交付已被推迟第三次。项目经理与干系人会面并发现存在风险，如果新功能在 1 个月内未发布，则影响收入。项目经理应该怎么做？

- (A) .通知利益干系人，新要求将在下一个版本中考虑规划会议。
- (B) .将最新更改通知发起人，并要求发起人确定功能的优先级。
- (C) .请产品负责人确定是否需要将此要求视为顶部优先权。
- (D) .指导开发团队立即处理此需求。

55、敏捷项目的首席项目经理需要按重要性对需求排序，定义初始产品的范围，并在一系列多个版本中交付批准的范围。项目经理接下来应该做什么？

- A.与产品负责人合作，评估需求并确定优先级。
- B.请首席开发人员与干系人召开会议，就顺序列表达成一致。
- C.确定每个需求的预期收益，以最大化整体业务价值。
- D.根据提出请求的干系人的层次结构确定需求的优先级。

56、一个项目团队确定了一种可供购买的低成本软件产品，这将大大缩小开发范围。开发经理已确认该工具将满足业务需求。项目经理应该做什么？

- A.提醒团队，他们的主要职责是软件开发。
- B.添加一个用户故事到产品待办列表中以测试软件产品。
- C.在下次每日站会上讨论该选项，以最终确定决定。
- D.向产品负责人推荐该选项以供考虑。

具有生产可行产品所需的各种必要技能的团队成员，**“通才型”专家（多种技能），跨职能工作团队无需外部支持。**“通才型”专家，有利于减少“瓶颈”。团队成员在工作中以各种方式自组织开展合作（如面对面沟通、结对、群集），为实现团队目标**团队成员根据需要轮换着发挥领导作用。**

角色职责：

- 以自组织的方式开展工作，**任何人无权让团队以何种方式实现任务，即便是团队领导。**
- 频繁开发与交付，**消除技术层面的障碍（包括技术债务、需求细化、探针）；**
- 作为一个**整体**，团队交付完成的价值；
- 为完成任务，团队**被授权，整合**产品规划、设计和交付，**承担产品责任**，创造业务价值；
- 为团队内部和外部提供**演示和反馈**。

敏捷中团队领导提出的解决方案与团队不一致时，通常都会尊重团队的选择。

57、组织正在转型敏捷，这是以往都没有过的新尝试，为此，组织聘用了具有专业敏捷知识的专家作为敏捷教练。作为敏捷管理专业人士，你明确的知道一点，关于敏捷团队必须是被授权的，这是因为（）？

- A、团队被授权后可以减少范围蔓延的情况，因为团队的工作是固定的
- B、团队被授权后可以直接与客户沟通，以获取具体且不变的需求
- C、团队被授权后可以承担产品传递的责任，从而创造更多价值
- D、团队被授权后可以灵活地开展工作，以减少进度的制约

58、在一项智能语音通话设备的研发项目中，敏捷团队设立了较高的团队目标。一名新加入团队且工作热情很高的团队成员提出可以用另一种方法能更好地完成团队目标，项目团队应该怎么做（）？

- A、召开一个只包含经验丰富的团队成员的会议来分析是否采用该方法
- B、团队成员一起分析讨论后再决定是否采用该方法
- C、与产品负责人一起讨论决定是否采用该方法
- D、对新方法进行刺探，并编写一份详细的刺探分析报告。

59、其中一名团队成员经常缺席一些团队会议，但总是按时完成分配的任务。其他团队成员认为该成员应该参加会议。敏捷项目经理应该怎么做？

- (A) 指示该成员为下一次会议提供促进，以确保项目团队的协作。
- (B) 允许每个团队成员按时提交所需任务，并建议减少团队会议的次数。
- (C) 审查并更新项目基本规则，以强制要求参加会议。
- (D) 了解团队成员缺席的原因，并鼓励他们参加未来更多的会议。

60、一家电信公司正在进行一项涉及不断变化的技术要求的全国性网络推广。为了解决这种情况，该公司最近采用了混合项目生命周期。在一次回顾中，一些团队成员抱怨说，我的大多数故事已经准备好测试了，但还没有进步，因为他们正在等待项目经理的批准。项目经理应该怎么做？

- (A) 更新问题日志并查看经验教训登记册中的选项
- (B) 实施冲突解决以满足团队的需求
- (C) 运用决策技术推进故事
- (D) 使团队能够自我组织并做出自己的决定


- **制定和实施标准（提供用户故事、测试案例、累计流图等模板、敏捷工具、敏捷流程）**
- **通过培训和指导发展人才**
- **多项目管理**
- **促进组织学习**
- **提供敏捷相关的培训**

61、项目经理在一个正在向敏捷过渡的组织中工作。开发团队建议使用燃尽图向所有干系人提供项目进度的可见性。项目经理应该做些什么来确保整个项目的有效沟通？

- A.建议项目管理办公室（PMO）将燃尽图作为独立的沟通渠道。
- B.为干系人登记册中的每一类制定沟通管理计划。
- C.将燃耗图表包括在月度报告中，该报告将分发给所有干系人。
- D.推迟建议，因为组织目前没有定义的敏捷方法。

62、大型软件交付项目的项目经理正在最终确定项目治理，项目经理希望实施与组织项目管理办公室（PMO）要求的几个政策不一致的程序。项目经理认为，由于技术的独特性，项目管理中概述的程序对于该特定项目是必要的。项目经理应该怎么做？

- A.让干系人参与修改PMO概述的政策。
- B.推进项目治理并通知PMO。
- C.与PMO讨论拟议的变更。
- D.无视初始程序，遵循PMO制定的政策。

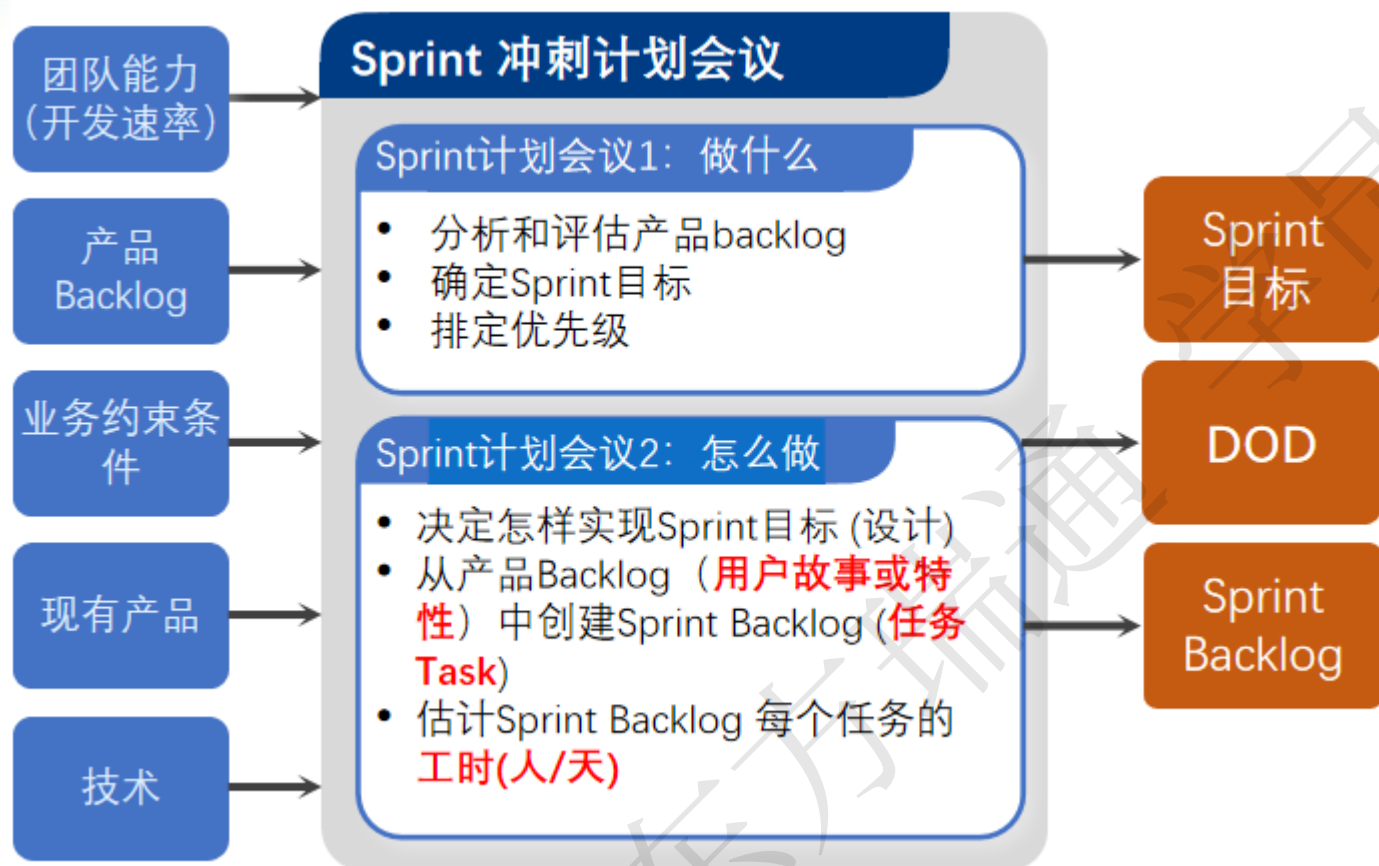

- **Sprint目标**在Sprint计划会议中确定Sprint。
- 让团队成员**充分参与迭代规划会**，加强团队成员**参与感**和对**迭代目标的认同**，同时要考虑**资源的可用性**。
- 无论使用**燃尽图**还是**燃起图**，团队都能看到在迭代过程中完成的工作。在迭代结束时，他们可能会根据自己在这个迭代中完成工作的能力（多少故事或故事点）来建立他们下一个迭代的能力衡量指标。

63、一家组织刚接触敏捷实践，组建了一支分布在不同地点的资源组成的团队，这组织过去一直都采取极具命令式的管理风格。若要提高团队对预期项目成果的投入程度，敏捷项目经理首先应该怎么做（）？

- A、组织安排面对面的开工会议，构建人际关系。
- B、咨询管理层的意见，让团队成员的目标与项目目标协调一致。
- C、邀请鼓舞人心的演说者来协助建立共同愿景。
- D、让团队参与（迭代/冲刺）规划会议，逐步培养投入精神

64、项目经理正在与敏捷团队合作以增强产品。由于截止日期紧迫，团队正试图通过同时投入多个资源来完成功能，这会打乱项目进度。但是，技术环境被配置为一次只允许一个资源处理一个功能。在即将开始的下一迭代，该团队计划升级技术环境，但无法就前进的道路达成一致。项目经理应该首先做什么？

- (A) 举行一次建立共识会议，以决定如何开展下一组工作。
- (B) 将问题上报给产品负责人解决。
- (C) 将此冲突添加到下一次每日站立会议的讨论议程中。
- (D) 进行一次规划会议，以决定如何处理下一组工作。

65、在项目的冲刺计划中，团队成员对待办事项的相对大小以及它们是否适合下一个冲刺存在分歧。考虑到混合方法，项目经理应该怎么做？

- A.请外部技术负责人提供意见并计划冲刺。
- B.由于无法估计大小，请从产品待办事项列表中删除这些项目。
- C.根据什么更有意义来决定待办事项。
- D.促进讨论，以便团队成员达成共识。

以Scrum为例，每日 Scrum 站会（Daily Scrum Meeting）**时间盒为 15 分钟。开发团队的内部会议，开发团队成员中任何人都可以来组织会议**，开发团队之外的人列席会议但不发言，不干扰会议进行

会议的目的：增进交流、保持工作步调一致，提出问题、风险、障碍，但不在会上解决问题。

站会问题多，设置优先级。同时也是防止镀金的最佳实践。

每日站会的反模式是变成状态会，所以应该由团队自己组织。

基于迭代的开发人员发言范例：

*昨天，我做了什么？ 今天，我准备做什么？ 我遇到的***障碍。*

针对会上提出的亟需处理的问题处理：

将问题添加到**停车场区**，然后创建另一次会议，它可以在站会之后立即召开，并在会上解决问题。

分布式团队：

分布式团队更需要站会来促进频繁且一致的沟通与协调（包括时差较大）

66、在回顾会议期间，项目经理听说干系人在迭代演示中不断抱怨产品功能没有按要求交付。

项目经理应向产品负责人提供哪些建议，以确保产品功能始终按要求提供？

- A.让干系人参加日常会议，以监督进展情况。
- B.在细化待办列表之前，与干系人一起确认验收标准。
- C.避免在迭代评审中包括干系人。
- D.创建一个需求跟踪矩阵，并相应地进行分发。


67、项目经理正在进行一个使用混合方法的项目。可交付成果的一个关键输入将来自使用敏捷方法的另一个项目的结果。项目经理下一步应该做什么？

- A. 参与其他项目的每日站会。
- B. 要求其他项目经理改变交付方法。
- C. 与其他项目经理的高层项目时间表保持一致。
- D. 要求其他项目经理制定一个工作分解结构(WBS)。

68、项目经理意识到，团队成员是混合方法的新手，不重视站立式会议。团队成员经常迟到，深入讨论问题，或者干脆跳过会议。项目经理应该如何与项目团队一起改善这种情况？

- A.让项目团队参与实施和改进站立会议的关键方面。
- B.要求产品负责人剔除不遵守站立会议规则的团队成员。
- C.向所有团队成员发送每日回顾报告，而不是举行站立会议。
- D.在站立会议中包括每日头脑风暴会议，以解决悬而未决的问题。

- Scrum of Scrums (SoS) 也称为 “meta Scrum” ，是由两个或多个 Scrum 团队而不是一个大型 Scrum 团队所使用的一种技术，其中一个团队包含三到九名成员来协调其工作。每个团队的代表会与其他团队代表定期召开会议，可能是每日例会，但通常是一周两次或三次，目的是协调团队之间的依赖关系以同步进展。

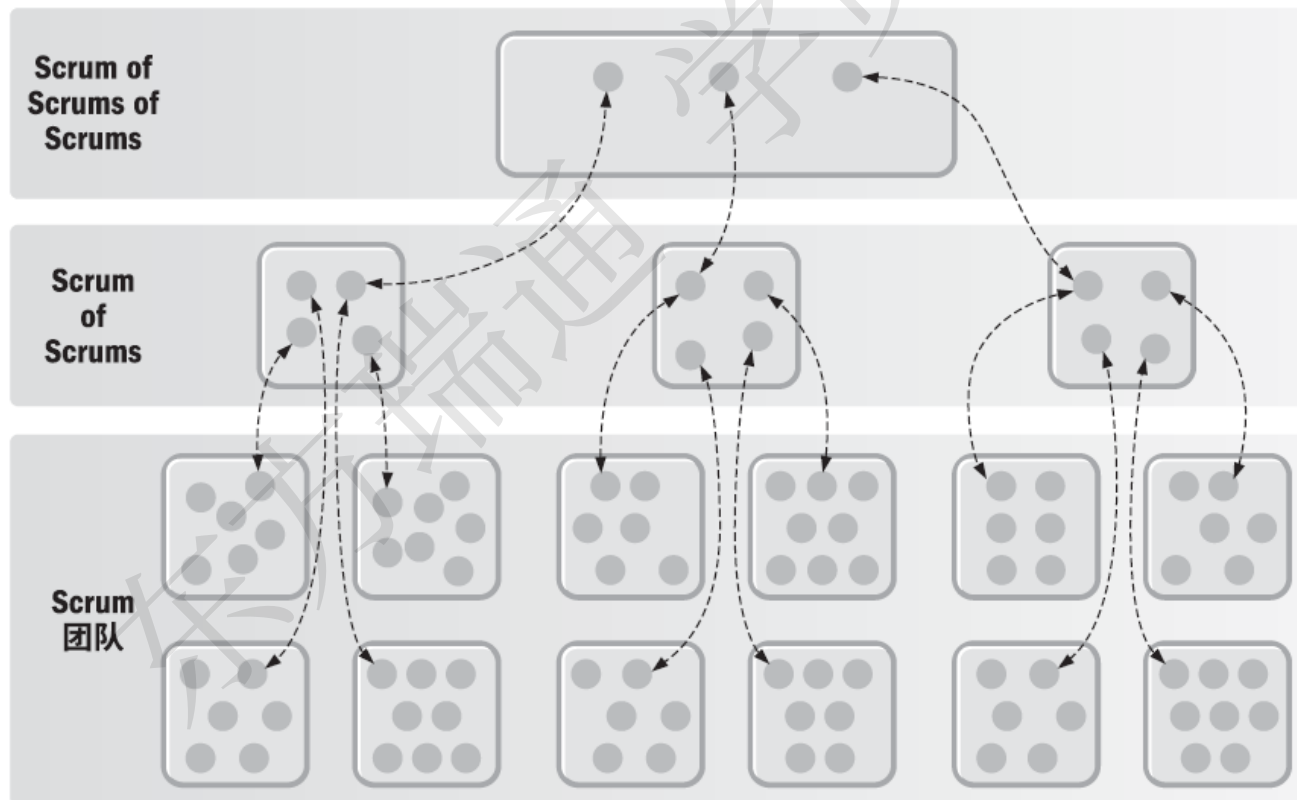

69、五个敏捷团队在一个产品上一起工作，最近进行了发布计划。在项目进行到一半时，每个团队都表明他们的进度已经上了轨道。当所有的团队在产品层面上进行整合时，发现了许多整合问题。整个产品的发布进度下降了，预测显示承诺的内容将无法完成。项目经理应该采取什么不同的措施？

- A： 组建一个单独的质量保证团队，在每个冲刺结束时测试来自每个团队的所有项目。
- B： 确保工作的频繁和持续的整合，以获得早期反馈和持续的学习。
- C： 定期进行Scrum of Scrums，以帮助各团队消除障碍。
- D： 安排了一次关于集成概念的在线会议，并向各团队推荐工具。

70、一家公司正在进行一项数字化转型项目，该项目的最后期限很长。营销团队希望将此实现与新产品相结合，而新分配的项目经理并不知道所有团队的**依赖关系**。项目使用混合方法，项目经理应该做些什么来确保相关性得到考虑？

- A.实施项目简报，以便不同的团队成员能够了解每个项目的进展。
- B.将所有的小项目合并为一个大项目，这样团队就可以更好地作为一个大团队进行协作。
- C.促进沟通，促进Scrum of Scrum，使不同的团队了解依赖关系和进展。
- D.确保每个单独的项目进度表与共同的截止日期保持一致。

以Scrum为例，**Sprint 评审会议**在 Sprint 快结束时举行，用以**检视所交付的产品增量并按需调整产品待办列表**。

- 参会者包括 Scrum 团队和产品负责人邀请的主要利益攸关者；
- **产品负责人**说明哪些产品待办列表项已经“完成”和哪些没有“完成”；
- **开发团队**演示“完成”的工作并**解答**关于所交付增量的问题；
- 会议的结果是一份**修订后的产品待办列表**，阐明很可能进入下个**冲刺/迭代**的产品待办列表项。
- 非正式会议，不是一个进度汇报会议，演示增量的目的是为了**获取反馈**并促进合作。
- 通过评审会，演示成果，让干系人更直观地**了解项目当前的进展**。
- 团队成员可以从每个迭代的展示/评审活动中得到干系人的反馈，**及时确认范围，展示商业价值，防止产品朝错误方向发展，防止干系人后期才发现问题**

71、经过几次迭代后，项目经理决定将产品展示给关键干系人，干系人的反馈是，团队在许多功能上没有抓住重点，项目经理应该如何避免将来出现这种情况？

- (A) .与所有关键涉众建立需求收集会议，以再次评估范围，并根据会议重新确定待办事项的优先级。
- (B) .安排足够的迭代演示，以收集干系人的早期反馈，并相应地调整计划。
- (C) .将设计思维实践纳入项目生命周期，以更好地理解产品的角色，并更有效地满足其需求。
- (D) .评估团队寻找具有产品设计经验的人员的技能，并将重建产品界面的任务分配给该人员。

72、一名产品负责人正在为一个自动处理特殊索赔的项目工作，依靠主题专家(SME)来解释这些索赔的预期行为。该主题专家缺乏敏捷项目的经验，提前将此类索赔的全部生命周期记录在案。但是，产品负责人更喜欢在每次审查后**获得反馈**，以确保特殊索赔接口与其它索赔的接口尽可能保持一致，产品负责人应该怎么做（）？

- A、 使用专家判断替代该主题专家做决定。
- B、 邀请该主题专家参加评审会议，并表明参加会议将获得的好处。
- C、 让开发人员使用该主题专家的全部生命周期文件作为参考。
- D、 让该主题专家直接与开发人员互动，以减少管理费。

73、一家制造公司包办了一个项目，开发公司生产线自动化所需的硬件和软件。可交付成果将使用敏捷框架生成。 什么样的策略可能适合获得产品范围的正式接受?(选择两个)

- A. 每当开发出足够的特征以形成一个连贯的集合时，就进行演示
- B. 一旦整个项目范围按照范围管理计划完成，就要执行确认范围过程
- C. 在每次迭代结束时，让团队向产品负责人演示已完成的用户故事
- D. 要求产品负责人参加每个冲刺的回顾，以审查和批准完成的产品增量
- E. 确保在初始项目计划期间，产品范围完全分解到工作包级别

74、在定期审查期间，敏捷项目的项目经理意识到利益干系人缺少有关正在开发的某些功能的关键信息。为了改善沟通并降低部署错误功能的风险，项目经理应该做什么？

- (A) .评估干系人的需求和沟通风格，并提出量身定制的定期报告状态报告和进度会议。
- (B) .邀请干系人参加定期的“展示和讲述”会议，以便干系人了解可以收集项目进度和反馈。
- (C) .进行利益干系人重新映射，根据兴趣和影响程度评估利益干系人，并进行相应的沟通。
- (D) .让干系人参与定期的项目沟通，以便可以密切跟进做出决定

75、在迭代演示期间，一位客户注意到他想对产品进行增强。团队接下来应该做什么？

- A.优化和估算增强，以便知道大小。
- B.将其添加到将来要完成的产品待办事项列表中。
- C.立即开始为客户进行改进。
- D.请产品负责人与客户一起确定事项的优先级。

76、一位项目经理正在管理一个项目，该项目旨在每三个月向市场提供增量交付。团队已经被分配，产品负责人创建了产品待办事项列表并对其进行了优先级排序。经过四次迭代后，产品负责人将投诉上报给首席执行官，因为产品不符合产品负责人的期望。项目经理应该做些什么来防止这种情况发生？

- A.与产品负责人一起实施冲刺评审，并与团队一起进行回顾，以尽量减少差距。
- B.在日常Scrum站会中执行风险管理分析。
- C.审查了组织过程资产（OPA）和从类似项目中吸取的经验教训。
- D.进行待办列表整理，以确保符合验收标准。

回顾是帮助团队**学习、改进和调整**其过程。回顾可以在必要时随时进行。

以Scrum为例，**冲刺回顾会**是团队检视/反省自身并创建下一冲刺或迭代改进的机会。

回顾会需要充分的准备，否则可能缺乏积极性而没有改进意见或者意见太多无法达成共识。

Sprint 回顾会议的目的在于：

- 检视前一个 Sprint 中关于人、关系、过程和工具的情况如何；
- 找出并加以排序做得好的和潜在需要改进的主要方面；同时，
- 制定改进 Scrum 团队工作方式的计划。

Sprint 回顾会的三个步骤，**反思—改进—计划**

自行纠正问题，是改进工作方式、提高产品质量的重要手段。

Scrum Master和团队对改进项进行**优先级排序**。

回顾会上团队会**分析研判导致障碍出现的原因，确认和分析风险**，以及制定解决方案，进而在随后的冲刺过程中解决。

77、一个项目团队最近完成了为车队管理系统开发两个功能的冲刺。尽管团队提供了所需的功能，但他们在冲刺过程中遇到了一些问题和冲突。团队成员对这次经历感到不安，现在由于所发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做些什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A.与项目团队成员一起审查冲刺进度
- B.与项目团队成员举行一对一会议
- C.与项目团队成员一起审查冲刺计划程序
- D.与项目团队成员一起进行冲刺回顾

78、产品负责人反复抱怨，称开发团队开发的功能与原始设计不一致。什么做法有助于解决这个问题？

- A： 让产品负责人参加下一次迭代审查会议，以了解产品的开发状态。
- B： 要求质量保证团队识别与初始设计相比较的任何功能不匹配。
- C： 要求开发团队重写功能，使其与项目范围相匹配。
- D： 在下一次回顾会议中安排时间讨论改进措施，并要求产品负责人参加会议

79、一个敏捷项目正在进行10次迭代中的第五次迭代。在上次回顾之后，团队成员意识到他们必须加班才能完成承诺的工作。项目经理应该做什么？

- A.要求增加团队成员以保持速度
- B.在迭代中实施检查点，以验证团队是否按计划进行
- C.进行重点回顾，帮助团队发现根本原因
- D.要求团队对下一次迭代做出较低的承诺

80、一个新的资源加入了迭代项目团队。项目经理注意到该资源无法按时完成可交付成果。项目经理应该如何解决这种情况？

- A.通过指导新团队成员来解决绩效不足的问题。
- B.与资源经理讨论提高绩效的方案。
- C.作为回顾仪式的一部分，提供绩效反馈。
- D.要求项目发起人提供更有效的替代资源。

81、作为第一次迭代评审的结果，干系人的反馈表明，他们看到的技术特征比业务特征更多。项目经理应该怎么做？

- (A) 在下一次迭代回顾中包括此主题
- (B) 在下一次迭代计划之前，与产品负责人一起回顾此主题
- (C) 在下一次日常会议上与团队讨论此主题
- (D) 请产品负责人在下一次迭代规划中回顾此主题

82、一名团队成员与他们的职能经理分享了回顾期间讨论的另一名团队人员绩效的一些负面细节。项目经理发现了这个讨论，项目经理应该采取哪两个行动？（选择两个）

A.联系团队成员的职能经理，邀请他们参加下一次回顾会

B.与整个团队会面，审查有关安全环境的基本规则

C.与产品负责人会面，讨论情况。

D.联系团队成员，解释哪些信息可以在团队外共享

E.与发起人会面，审查情况

83、一个项目团队最近完成了为车队管理系统开发两个功能的冲刺。尽管该团队交付了所需的功能，但他们在冲刺过程中遇到了几个问题和冲突。团队成员对这次经历感到沮丧，现在由于发生的事情而表现出缺乏动力。项目经理可以做些什么来帮助提高团队对项目的积极性和参与度？

- A.与项目团队成员一起审查冲刺进度
- B.与项目团队成员安排一对一的会议
- C.与项目团队成员一起审查冲刺计划程序
- D.与项目团队成员一起进行冲刺回顾

项目经理确保团队的交付质量，可以：

- 定义DoD
- 每日站会
- 短迭代的小批量（增量）交付
- 回顾会
- 基于看板的精益方法
- 结对编程、TDD、ATDD、持续集成、自动化测试

84、项目经理正在管理一个具有高度不确定性的复杂研究项目。要求实施一种机制来衡量可交付成果的质量。使用混合方法，可以使用哪些技术来实现这一目标？

A.每日Scrum站会和产品责任人质量评估。

B.ScrumMaster审查和质量看板方法

C.结对工作和用户画像方法。

D.时间限制迭代和每日站立会议

85、在执行阶段，项目经理发现可交付成果不符合主要干系人要求的**质量规范**。这导致进度绩效指数（SPI）从0.98恶化到0.72，成本绩效指数（CPI）从1.5恶化到1.1。项目经理应该采取什么行动来缓解可交付成果在下一次迭代中被拒绝的问题？

- (A) 提交变更请求，优先考虑质量问题的解决方案，以最大限度地减少对其余可交付成果的影响。
- (B) 在sprint规划期间强化DoD的定义，使团队对期望有一个共同的理解。
- (C) 确保产品待办事项的优先级适当，以避免导致拒绝的依赖关系。
- (D) 创建一个专门的sprint来完成以前sprint中所有挂起的规范

86、一家全球性公司聘请了一名项目经理。项目经理是敏捷专家，其任务是支持项目团队减少返工和不满，以保证质量。项目经理应该如何实现这些目标？

- A. 缩小产品组合的范围，并向客户发送新的解决方案。
- B. 向客户交付一份包含投资组合的时间表和交付的时间表。
- C. 采用向客户交付价值的增量循环。
- D. 准备更详细的交付，以满足客户的需求。

高绩效的敏捷团队

项目经理要想提高团队绩效、团队激情、团队投入，需要：

- 营造良好的**团队氛围**
- 培养团队的**敏捷价值观**
- 形成**自组织**框架
- 构建团队的**参与式决策**
- 提倡团队的**面对面沟通**、**透明沟通**和**渗透式沟通**
- **开展团队建设**

87、一家公司开始进行敏捷实践，以便更好的接触全球客户和市场。在过渡期间，很多团队都在与这个变化做斗争，因此影响士气。敏捷教练应该怎样做才能最好的利用敏捷实践并实现高绩效（）？

- A、与团队成员单独开会，为他们提供项目及其对组织带来好处的一个大蓝图
- B、与团队紧密合作，通过辅导、指导、教学和推进来识别和解决问题
- C、仅在团队层面教导，提供有关期望的信息，并帮助个人提升技能
- D、获得干系人对团队有效性的反馈，并与团队分享

88、一家公司转向采用跨职能团队进行项目开发的敏捷方法，并将项目经理分配到一个关键的项目。项目经理应该如何提高团队的工作积极性（）？

- A、与团队进行圆桌讨论、研讨会的决策会议
- B、成立一个委员会来确定敏捷方法
- C、要求人力资源部门制定该项目KPI以协助员工管理
- D、为所有项目团队成员协商更好的工资或项目奖金

89、在一个使用混合方法的项目中，团队在预测阶段的表现一直很出色。然而，当迭代开始时，团队成员开始表现出低承诺、冲突和混乱的迹象，导致士气低落。项目经理应该如何处理这种情况？

- A. 赋予团队成员更大的决策权。
- B. 开展团队建设活动，加强协作。
- C. 找出影响士气低落的团队成员。
- D. 指导团队成员掌握敏捷流程和价值观。

信息发射源 (Information Radiator)

可见的实物展示其向组织内其他成员提供信息在不干扰团队的情况下即时实现知识共享。

- **大型可视化的图表**，以物理形式向组织内其他成员展示信息，实现及时的知识共享。
- 发布在人们可以轻易看到信息的地方，而不是将信息放在日程安排或报告工具中。
- 应该易于更新，并且应该经常更新。
- 通常是“**低技术和高接触**”的，因为它们是手工维护的，而不是电子生成的。

90、项目集经理要求定期更新计划下项目的进展情况。除了一个项目外，所有项目都使用传统方法进行管理。项目集经理指出在该项目整个规划中有太多的范围变更，并希望看到这些变更是如何影响项目的总体进度的。对于领导敏捷项目的Scrum主管来说，要满足项目集经理的要求，最好的行动方案是什么？

- A： 邀请项目集经理参加迭代审查会议
- B： 建议项目集经理参加每日站会
- C： 让项目集经理查看持续更新的发布燃起图
- D： 每周给项目集经理邮件汇报整体工作进展

91、敏捷团队在墙壁上仅有非常有限的空间展示项目状态和进度。团队成员在纠结，是应该使用公司拥有永久许可的先进软件工具来展示进度，还是使用写有他们当前工作进度的卡片和图标在墙面上展示。敏捷团队使用以下哪种方法？

- A：在墙上展示卡片和图标，因为这将有利为干系人提供项目状态的实时更新
- B：使用软件，因为该公司有永久使用许可，不存在成本问题
- C：遵循其他敏捷团队使用的方法来展示公司的项目状态或进度
- D：写在详细的进度计划表里，并由项目经理负责维护

92、在执行过程中，一个新的Scrum主管加入了敏捷Scrum之后的软件开发项目。他想知道项目的范围，以及到目前为止完成的工作。他首先应该做什么？

- A：查看项目范围声明。
- B：查看燃尽图。
- C：查看燃起图。
- D：安排与团队的会议，以了解项目范围和已完成的工作。


93、指导委员会已要求在运用敏捷方法方面经验丰富的项目经理来有效组织工作并提供某中型项目剩余时间的说明。项目经理可以使用哪个工具以满足要求？

- A：业务需求文档分析。
- B：发布燃尽图。
- C：剩余用户故事的故事点。
- D：看板。

94、随着项目进行，项目经理收到干系人的抱怨，他们声称项目状态会议和电子邮件报告太少，无法让干系人了解项目的全部状态。项目经理审查沟通管理计划，并提交变更请求以修改报告状态的方式。项目经理最好在变更请求中包含以下哪项？

- A、结合使用信息发射源
- B、终止分发电子邮件报告
- C、在每日站会汇报项目状况
- D、将项目状态发送给更少的干系人

- 看板在精益生产中是一种用于规划库存控制和补给的系统，丰田精益生产中的思想是**拉动式生产 (Pull System)**，只补充已消耗的资源来达到控制资源流动的生产管理系统。
- 可以促进流程可视化，帮助价值流（增值/非增值）分析；限制在制品数量减少浪费；

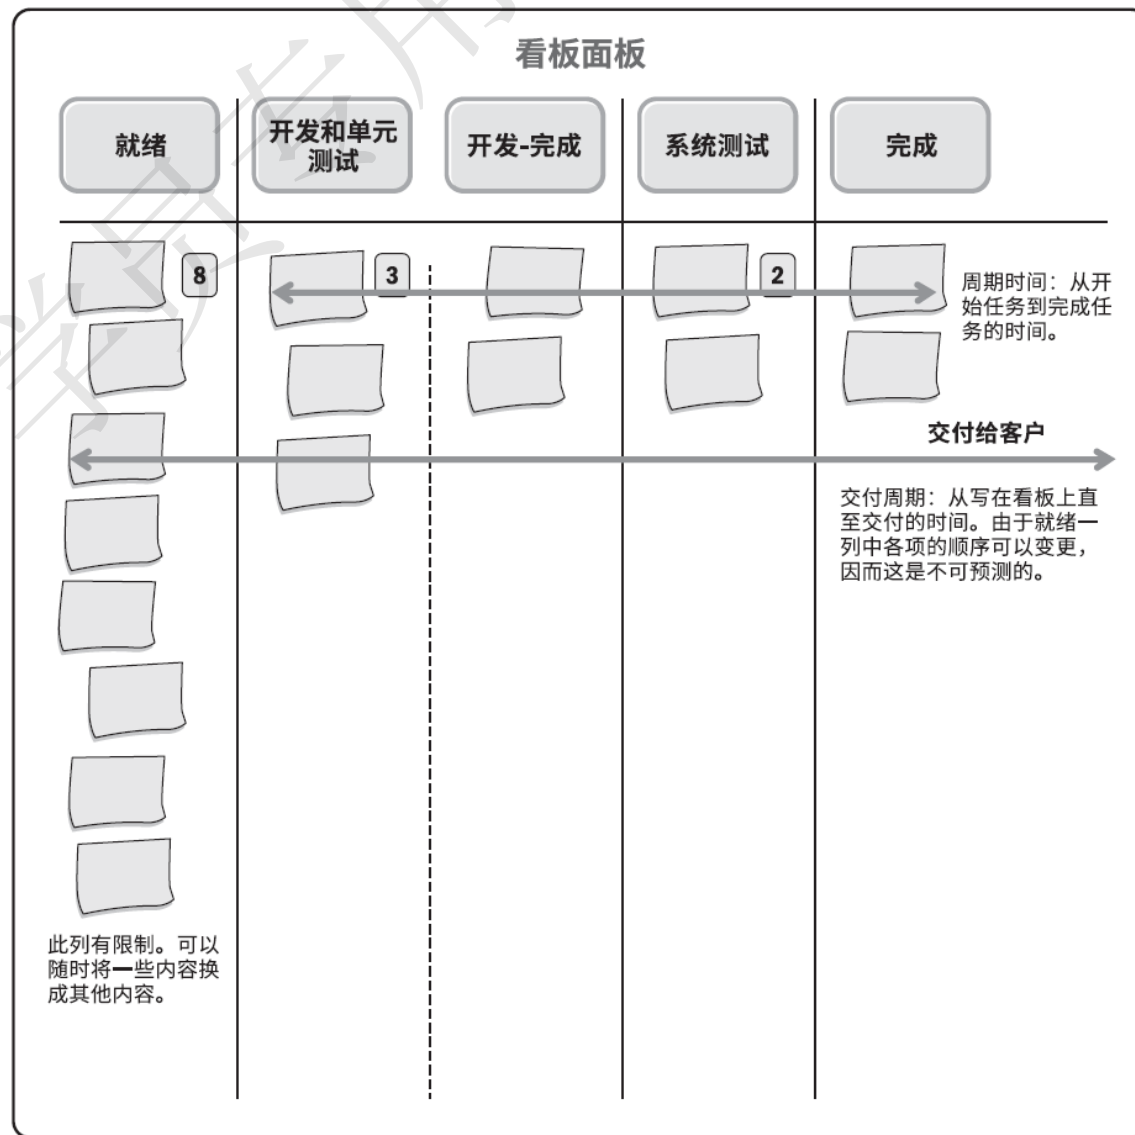

95、来自项目发起人的一封重要电子邮件指出，应立即优先开展一个待办列表事项。项目经理应该如何处理看板上仍然存在的许多任务？

- A.立即分解项目并开始工作。
- B.与团队讨论启动这个事项的影响。
- C.在分解项目之前，先完成正在进行的小任务。
- D.与项目发起人沟通影响。

96、一位新的敏捷项目经理正试图确定团队是如何按照发布时间表执行的。哪种工具可以更深入地了解团队的进展？

- A、 发布计划
- B、 产品路线图
- C、 看板面板
- D、 燃尽图

- 敏捷关注**过程效率**而非资源利用率，团队绩效由**平均速率**（迭代中完成工作量）来衡量。
- 如果采用用户故事，**不同的团队间速率不具备可比性**，因为用户故事可能参照的基准点是不一样的。
- 可以借助**燃尽图、燃起图、功能图、累积流量图**等评估。

“可用的软件是衡量进度的首要衡量标准。”

97、你的Scrum团队的速度是每一次迭代24个故事点。总共有165个故事点。关于这个问题，下列哪个陈述是正确的[选择两个]（）？

- A、速度（Velocity）用来估计敏捷团队的能力
- B、这个信息可以记录在燃尽图上
- C、项目需要7次迭代来完成项目的所有工作
- D、看板可以显示这些信息

98、敏捷项目和传统项目的管理有很大的不一致，在绩效衡量上也如此，目前项目经理领导的

一个敏捷项目的进度绩效指数低于 1.0 表示：

A： 项目没有完成预定的工作

B： 已取得的挣值达 100%

C： 项目永久性地损失了一部分时间

D： 项目可能没有按照时间表执行，但是项目经理不必在意这个问题

■ 规划扑克/计划扑克

每人10张数字牌，每个人选一张卡片，代表这个故事所花费的成本，这个时间点选择的卡片不能给他人看。所有参与者同时展示自己的卡片。团队一起来讨论这些估计值，尤其对异常值(最高的和最低的)要着重讨论。在一个单独的冲刺内，当要估算的**用户故事数目不多**时，可以使用计划扑克，是一种相对估算。

■ 亲和估算


快速估计大规模需求未完项的一种技术，利用衬衫尺寸(尺码S/M/L/XL/XXL等)、咖啡杯尺寸(小杯、中杯、大杯等)或斐波那契序列(序列中的数字等于前两个数字值之和)中的数字将用户故事快速置于规模**类似的群组**中。

■ 宽带德尔菲

一种基于团队共同参与的估算方法，**匿名提交估算结果**，彼此不知道真实的结果，这样可以提升团队成员对结果的认同感，也可以避免产生一些“光环效应”。一般会进行多轮，直到达成共识。相较于一般的德尔菲，宽带德尔菲是匿名投票后，会开放空间让大家交流和讨论。

99、项目团队在没有适当确定故事大小的情况下完成了许多迭代。在一些迭代中，团队确定了一些故事的大小并提前完成了它们。在其他迭代中，团队确定了故事的大小，但无法完成计划的活动。在规划下一次迭代期间，团队应该采取什么不同的做法？？

- A.要求产品负责人和团队辅导员提供故事的大小
- B.平均每个团队成员为故事提供的故事点数
- C.继续多轮计划扑克，并达到故事的规模
- D.与不同的团队合作，达成故事的规模

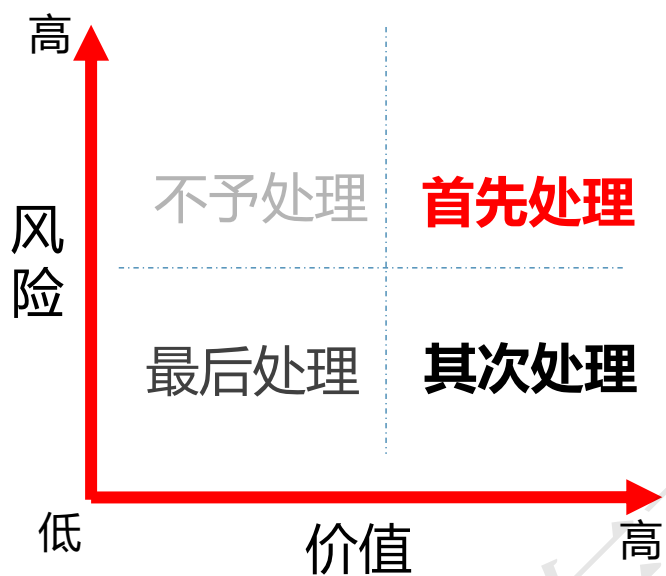

风险严重性=概率*风险发生的影响

- 风险识别和评估以及风险措施的识别应一起纳入迭代计划，在**每个迭代期间持续关注**。
- 可通过头脑风暴、风险研讨会、每日站会、评审会、回顾会进行开放性识别风险。**研讨会、审查会**有助于对风险的管理策略达成**一致**。
- 根据风险的严重性打分对风险进行**优先级排序**。
- 敏捷中对具体风险的应对所需活动或**任务**记入**风险调整待办列表**中，结合风险的严重性和任务的价值进行**排序**。
- 风险所有权必须由**团队成员**以与**用户故事**或其他敏捷项目**任务**大致相同的方式**承担**。
- 通过**风险燃尽图**、风险调整待办列表、用户故事地图，以透明的方式监控风险。

100、一个敏捷团队举行了一次发布回顾。讨论的重点是在软件发布之前的几周内发生的一些高风险事件。这些风险很难解决，并威胁到发布日期。风险在发布计划的早期就已经确定了，但是与对客户来说价值相对较高的用户故事相关联。为了避免这些风险在离预定发布日期这么近的时候发生，我们应该做什么呢？

- A、应该批准加班，并在发布前几周增加资源，以减轻高风险用户故事的影响
- B、产品负责人应该更勤奋地在待办事项列表中编写用户故事，以便将风险降到最低或完全消除
- C、真的没有什么可以避免所描述的问题，因为风险事件总是发生在预定的发布日期之前
- D、产品负责人可以在产品待办事项列表中提前而不是推迟完成高风险用户故事

101、项目经理正在为项目使用混合方法。项目团队在项目开始时与干系人一起创建并审查了风险日志。然而，在项目进行到一半时，项目团队和干系人对风险和缓解策略的意见变得不一致。什么时候应该审查风险，以确保项目团队和干系人之间的一致性？

- (A) 在风险登记册更新期间
- (B) 在回顾会期间
- (C) 在每次指导委员会会议期间
- (D) 在每次迭代和审查期间

Thanks.

杨波

2024年8月

只要你的能量足够大，你就能吸引非常多和你同样优秀的人围绕在你身边，事业亦将蒸蒸日上，这就是吸引力法则，不要忘了，修炼自己才是成长中第一重要的事情。你若盛开，蝴蝶自来。广阔的世界，还会有更多的人愿与你一起，共同编织绚烂多姿的精彩人生。努力！带着梦想，前行！

